


MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Tipo: *Recib*
Nº. 02001. 016 *64* / 2016-02
Recebido em: 14/9/2016
Assinatura *Daniel*

DIGITALIZADO NO IBAMA



Belo Horizonte, 14 de setembro de 2016

*Destinado a
Retornar*



AO COMITÊ INTERFEDERATIVO

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
Brasília - DF - CEP: 70818-900

REF.: RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AOS PROGRAMAS E AÇÕES PREVISTOS NO TTAC
(CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 192)

Prezada Senhora Presidente do Comitê,

A Samarco Mineração S.A., pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.628.281/0001-61, com sede na Rua Paraíba, nº 1.122, 9º, 10º, 13º e 19º andares, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.130-918, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("SAMARCO") vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor o quanto segue.

Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do Termo de Transação e Ajuste de Conduta, firmado em 2 de março de 2016 ("TTAC"), a Samarco deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do TTAC.


Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a Samarco apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de setembro de 2016, contendo informações atualizadas sobre dos programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de agosto de 2016.

EM BRANCO



A SAMARCO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,




Luis Alberto Silva Aguiar
Luis Alberto Silva Aguiar

OAB/MG 97.496

EM BRANCO



reparar, restaurar, reconstruir




EM BRANCO



Relatório mensal – Comitê interfederativo
Termo de transação e ajustamento de conduta

Agosto de 2016





EM BRANCO



ESTRUTURA DO ACORDO

Programas socioeconômicos

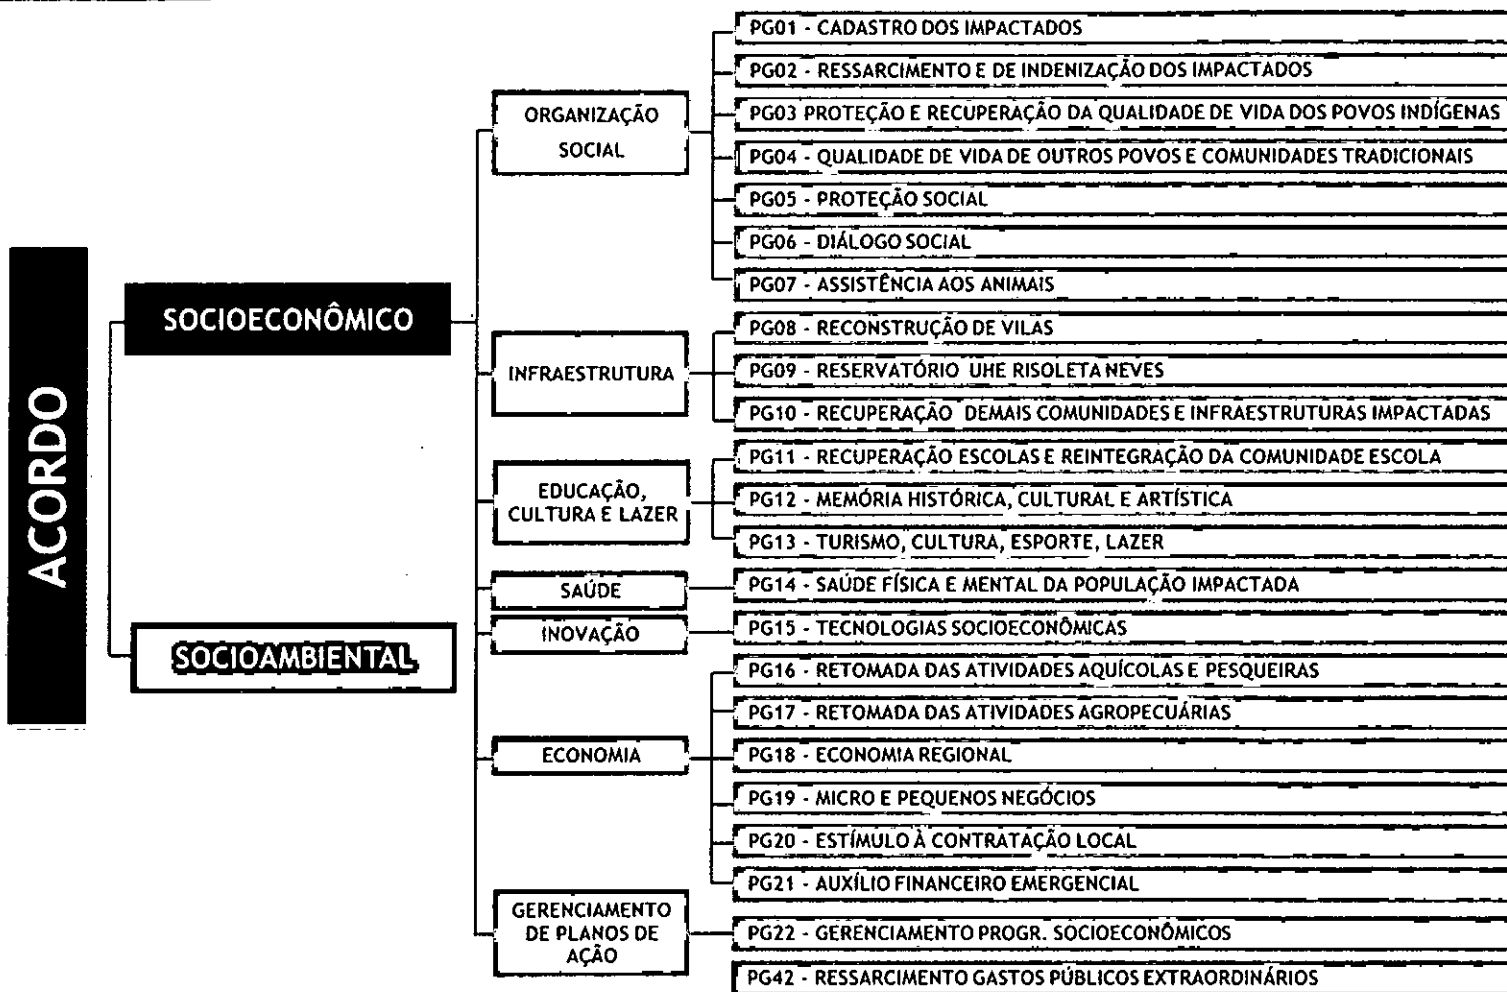


EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 45,9	Realizado: 10,5			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)				nov-15	out-19
Metas do Programa				dez-16	set-17
Cláusula 19 - Término do cadastramento dos impactados (Cadastramento socioeconômico definitivo)				dez-16	dez-16
Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados				mar-17	mar-17
Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				abr-17	abr-17
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo				set-17	set-17
Definição do Programa				jun-16	set-16
Execução do Programa				nov-15	jun-19
PF0059 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas				nov-15	set-17
Execução do Projeto			20,0%	nov-15	jul-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)				nov-15	jul-16
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)				jun-16	dez-16
Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados				ago-16	mar-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				out-16	abr-17
Elaboração de relatório de impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos impactados.				jan-17	jul-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)				jul-17	set-17
Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados				jan-17	jun-19
Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados				jan-17	jun-19
Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas				jun-17	jun-19
Monitoramento socioeconômico dos municípios				jun-17	jun-19
Estudos de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares				jun-17	jun-19
Encerramento do Programa				jun-19	out-19



EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):

- Follow up das ações realizadas e retorno da CT sobre o banco de dados emergencial integrado apresentado, relato da visita em Barra Longa e cronograma/prazo de execução.

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:


- Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa (Gesteira, Sede e Barretos) com base no cadastro emergencial;
- Reunião de diálogo sobre o cadastro integrado em Barra Longa.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Mobilização da equipe Synergia para as frentes de trabalho no Rio Doce;
- Treinamento dos entrevistadores de campo;
- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa.

Base de dados e Documentação:

- Análise técnica de consistência do cadastro emergencial do Rio Doce;
- Realização do DE/PARA do banco emergencial do Rio Doce com base no formulário integrado;
- Checklist para atendimento as solicitações de cadastro realizadas pelos Canais de Relacionamento.



EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

AÇÕES PRÓXIMO MÊS

Reunião com Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):

- Setembro (à confirmar 5ª reunião), 31 de outubro (6ª reunião), 03 de novembro (7ª reunião) e 02 de dezembro (8ª reunião), previstos.

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:

- Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa (Sede e Barretos) com base no cadastro emergencial;
- Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa (Gesteira, Sede e Barretos) com base no checklist para atendimento as solicitações de cadastro realizadas pelos Canais de Relacionamento;
- Entrega do formulário de cadastro para os impactados para revisão e validação;
- Previsão de início da apresentação do Programa para as comunidade após a mobilização da assessoria técnica (última semana de setembro).

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Início da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos.

Base de dados e Documentação:

- Consistência do banco de dados do cadastro emergencial de Barra Longa e Rio Doce.



EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS


LOCAIS	FAMÍLIAS	PESSOAS
Mariana e Barra Longa	942	2.810
Rio Doce	7.573	26.804
TOTAL	8.515	29.614

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016

MUNICÍPIO DE BARRA LONGA								
FASE	DESCRIÇÃO	CADASTROS PREVISTOS *	CADASTRO REAL **	REALIZA DOS	SEM FASE 2	RECUSAS	AUSEN TES	À REALIZAR
1	Agendamentos	434	487	455	0	3	20	9***
1	Cadastro Socioeconômico	434	487	455	0	3	20	9***
1	Agendamentos	434	487	199	17	2	8	261
2	Cadastro Físico	434	487	148	17	2	8	312

* Cadastros conforme lista do SGS. / ** Cadastros conforme a lista de propriedades, pode sofrer alteração no decorrer do levantamento. / *** Não localizados

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 05/09/16



EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS



Plantão de cadastro socioeconômico em Barra Longa, 01/08/16




Plantão de cadastro socioeconômico em Barra Longa, 01/08/16



Plantão de cadastro socioeconômico em Barra Longa



Plantão de cadastro socioeconômico em Barra Longa




EM BRANCO



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 388,8	Realizado: 11		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38)		dez-15	jan-20	
Metas do Programa		jun-17	jul-17	
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)		jun-17	jun-17	
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)		jul-17	jul-17	
Definição do Programa		set-16	out-16	
Execução do Programa		dez-15	out-19	
Ações Emergenciais		dez-15	jan-17	
Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS		dez-15	jan-17	
PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS		mar-16	out-17	
Execução do Projeto	32,0%	mai-16	jul-17	
Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares		mai-16	out-16	
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas		out-16	jan-17	
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada		out-16	jun-17	
Efetuar os Pagamentos de Indenizações		out-16	jul-17	
Encerramento do Projeto		jul-17	out-17	
Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes		jul-17	out-19	
Execução dos Eventuais Atendimentos Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações		jul-17	out-19	
Encerramento do Programa		out-19	jan-20	




EM BRANCO



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Realizadas reuniões de construção da matriz de danos junto a representantes da população impactada no ES e MG;• Apresentado programa para as prefeituras, poder judiciário e defensoria das cidades pertencentes a primeira fase do programa;• Realizadas rodadas internas de avaliação e aprovação dos danos sugeridos pela população impactada;• Validada a logística dos escritórios da fase 1 na CTOS;• Concluído as obras de adequação de infraestrutura dos escritórios, fase 1, Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce;• Realizado processo seletivo interno do PIM;• Aquisição e entrega dos móveis dos escritórios da fase 1;• Mapeado os imóveis para fase 2 dos escritórios de mediação;• Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios;• Implantação do módulo de agendamento DMA – SGS;• Realizado treinamento com a equipe de comunicação sobre agendamento DMA;• Desenvolvimento do módulo indenizatório DMA - SGS• Validado internamente o protocolo de elegibilidade para adesão ao PIM.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar reuniões devolutivas com a população impactada e o poder público sobre o formato final do programa após sugestões coletadas e avaliadas;• Executar plano de comunicação para início da operação dos escritórios;• Validar internamente e junto a CTOS a logística escritórios da fase 2;• Finalizar obras de infraestrutura no escritório de Mariana;• Finalizar mapeamento de interfaces do programa com demais programas do acordo;• Elaborar interface entre PIM e financeiro para os pagamentos das indenizações;• Realizar workshop de simulação do processo do PIM;• Homologar módulo indenizatório de DMA;• Finalizar desenvolvimento e homologar módulo indenizatório de DG;• Treinar equipes para abertura dos escritórios;
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Reunida documentação com todas as sugestões de danos a serem indenizados levantados junto aos grupos temáticos da população impactada;• Realizada atualização da matriz de danos com os prejuízos levantados junto à população impactada e considerados como procedentes;• Concluídas as obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce;• Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios;• Revisadas as especificações no módulo indenizatório DMA e DG;• Acompanhamento e suporte aos lançamentos de indenizações antecipadas no SGS;	




EM BRANCO



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

Orçamento (R\$MM)	Total: 61,7	Realizado: 6,8		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)		mar-16	jan-19	
Metas do Programa		mar-16	ago-18	
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak		mar-16	mar-16	
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado		abr-16	abr-16	
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak		jul-16	jul-16	
Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		ago-18	ago-18	
Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani		mar-16	mar-16	
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani		mar-16	mar-16	
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani		jul-16	jul-16	
Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)		ago-18	ago-18	
Definição do Programa		jul-16	out-18	
Execução do Programa		mar-16	out-18	
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak		set-16	ago-18	
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak		nov-16	mai-18	
Encerramento do Projeto		mai-18	ago-18	
Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)		out-18	out-18	
Processos de Apoio Emergencial		mar-16	ago-18	
Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		ago-16	ago-18	
Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		mar-16	out-16	
Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		mar-16	nov-16	
Fornecimento Emergencial de Água - Krenak		ago-16	mai-18	
Encerramento do Programa		out-18	jan-19	



EM BRANCO



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p>Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apresentação da Fundação Renova à Funai e indígenas (Tupiniquim Guarani, Comboios e Krenak)• Apresentação à Funai da consultoria antropológica• Início do Programa de Qualidade <p>Krenak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial• Manutenção das estradas para abastecimento de água• Reunião para apresentação da equipe da Samarco/Fundação Renova <p>Comboios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Repactuação das parcelas do acordo emergencial• Reunião para apresentação da equipe da Samarco/Fundação Renova <p>Caieiras Velhas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diálogo com caciques e lideranças de pesca para pleito de aditivo para pescadores profissionais indígenas• Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)• Reunião para apresentação da equipe da Samarco/Fundação Renova	<p>Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial para indígenas• Manutenção auxílio financeiro• Manutenção monitoramento de água• Reunião para definição dos papéis e responsabilidades da Funai e Sesai e, Samarco/Fundação Renova.• Apresentação à Funai e Sesai do resultado das análises das águas dos rios e litoral marinho <p>Krenak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das estradas para abastecimento de água <p>Comboios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro• Identificação do potencial de contaminação no rio Comboios por meio do canal Caboclo Bernardo <p>Caieiras Velhas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R\$7.092) por família a 126 famílias, disponibilização de R\$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água• Tupiniquim(TI Comboios): Auxílio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias• Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R\$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R\$ 662.942,70, depositado em uma conta vinculada à associação indígena.	



EM BRANCO




QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Orçamento (R\$MM)

Total: 0,5

Realizado: -

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)		ago-16	jun-18
Metas do Programa		set-16	mar-18
Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)		set-16	set-16
Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas		dez-16	dez-16
Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		mar-18	mar-18
Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		mar-18	mar-18
Definição do Programa		ago-16	mar-18
Execução do Programa (a definir)		mar-18	mar-18
Encerramento do Programa		mar-18	jun-18




EM BRANCO



QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS TRADICIONAIS

Estudo vila de Santa Efigênia

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Protocolo em 5 de Agosto de ofício junto à Fundação Cultural Palmares e junto ao próprio Comitê Interfederativo, com o registro da solicitação de revisão do Termo de Referência para estudo da comunidade Quilombola Vila de Santa Efigênia e adjacências.	<ul style="list-style-type: none">• Realização de reunião junto à FCP para revisão do Termo de Referência.• Liberação do TR revisado.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Liberação do Termo de Referência pela FCP (18 de maio)• Definição junto à Fundação Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de Referência expedido.• Protocolo do pedido formal de revisão do TR junto à FCP e CIF (5 de Agosto)	




EM BRANCO



PROTEÇÃO SOCIAL

Orçamento (R\$MM)	Total: 38,6	Realizado: -			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)				abr-16	jun-19
Metas do Programa				abr-16	abr-19
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social				abr-16	abr-16
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social				abr-19	abr-19
Definição do Programa				set-16	jul-17
Execução do Programa				abr-16	abr-19
Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social				abr-16	jul-17
Execução de ações socioassistenciais emergenciais				abr-16	jul-17
Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)				jul-17	abr-19
Encerramento do Programa				abr-19	jun-19




EM BRANCO



PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Atendimento às famílias impactadas(Bento e Paracatu)• visitas domiciliares, grupos temáticos, atividade socioculturais• Encaminhamento para rede pública: saúde, educação e assistência social (CREAS e Conselho Tutelar)• Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos e professores)• Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida• Reuniões de supervisão de casos com a equipe técnica do CRAS.• Reunião de discussão estudo técnico do MPMG sobre atendimentos psicossociais	<ul style="list-style-type: none">• Concluir discussão de Parâmetros Mínimos de Atendimento Psicossocial• Elaborar TR contratação de consultoria para proteção social• Manter atendimentos às famílias impactadas
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica(CRAS) e encaminhamento para Proteção Especial(CREAS) – quando for o caso• Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial• Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território	



EM BRANCO




DIÁLOGO SOCIAL

Orçamento (R\$MM)

Total: 224,5

Realizado: 8,5

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72)		nov-15	dez-30
Metas do Programa		dez-16	abr-17
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO		dez-16	dez-16
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria		abr-17	abr-17
Definição do Programa		set-16	out-16
Execução do Programa		nov-15	dez-30
Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social		nov-15	abr-17
Processo emergencial de comunicação institucional		dez-15	dez-16
Processo emergencial de participação e diálogo		nov-15	mar-17
Processo emergencial de canais de relacionamento		nov-15	mar-17
Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO		nov-15	abr-17
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO		ago-16	jul-17
Diagnóstico do processo emergencial existente de ouvidoria		ago-16	set-16
Implantação e adequação do processo de ouvidoria		set-16	abr-17
Encerramento do Projeto		abr-17	jul-17
Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social		dez-16	dez-30
Processo de comunicação institucional		dez-16	dez-30
Processo de participação e diálogo		mar-17	dez-30
Processo de canais de relacionamento		mar-17	dez-30
Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO		abr-17	dez-30
Encerramento do Programa		out-30	dez-30




EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Trecho I: 4 municípios (Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escavado e Rio Doce): 48 reuniões 1299 participantes)• Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio Doce: 40 reuniões (1708 participantes)• Monitoramento de famílias impactadas na região de Mariana e Barra Longa• Mapeamento/Monitoramento de stakeholders• Mediação de conflitos	<ul style="list-style-type: none">• Continuidade da adaptação do plano de Relacionamento com comunidades para o momento de transição• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios impactados• Manutenção do Mapeamento/Monitoramento stakeholders locais• Mediação de conflitos
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Estabelecimento e continuidade de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução.• Trecho I, II e III: aprofundamento e debates de temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 014, 017, 032.• Comunicação formal do início do funcionamento da Fundação Renova com participação do Presidente e Diretor em reuniões de Diálogo no território de Mariana.• Acumulado de reuniões: 316 com 10.026 participantes no trecho I* 207 com 9.255 participantes nos trechos II e III <p>*Os dados acumulados sofreram atualização considerando atualização de dados de fóruns não contabilizados anteriormente</p>	



EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL



Reunião com lideranças de Mariana com presença de Presidência e Diretoria da Fundação Renova.




Reunião com comunidade de Mariana, discussão sobre marcos do reassentamento e aprovação de assessoria técnica.




Reunião com comunidade de Barra Longa. Discussões sobre

Reunião para apresentação do Programa de Levantamento e Cadastro Integrado dos Impactados

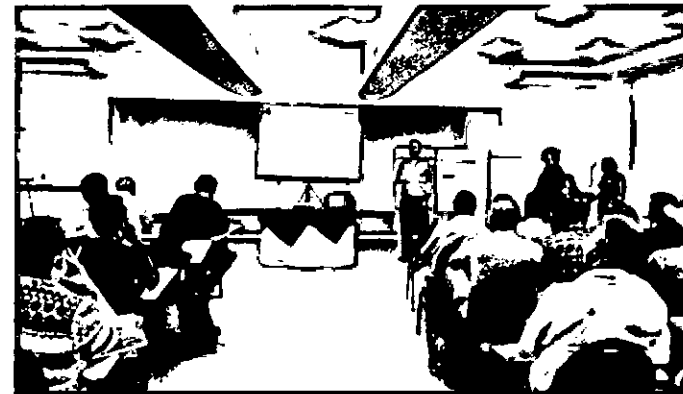

Reunião para construção de lista de Danos com o produtores rurais de Periquito, Naque e Cachoeira Escura (Belo Oriente)



EM BRANCO




ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

Orçamento (R\$MM)

Total: 16,4

Realizado: 12

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)		nov-15	jul-19
Metas do Programa		mai-19	mai-19
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais		mai-19	mai-19
Definição do Programa		set-16	out-16
Execução do Programa		nov-15	mai-19
Processo de Assistência aos Animais (incluindo Ações Emergenciais)		nov-15	mai-19
Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção		nov-15	mai-19
Encerramento do Programa		mai-19	jul-19




EM BRANCO



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Vistas de pós adoção• Participação em Evento de Adoção de Animais em Juiz de Fora - MG• Conclusão de adaptações de infraestrutura CATA• Visita de Veterinários da Comissão Extraordinária de Defesa dos Animais da Assembleia Legislativa de MG• Resgate de animal em Bento Rodrigues• Vacinação e vermifugação de animais• Liberação do isolamento de animais pelo IMA na Fazenda Bom Retiro• Devolução de animais de pequeno porte aos tutores• Atendimentos de animais em campo• Paralisação do processo de compra de animais de grande porte por solicitação do Ministério Público da 2ª Promotoria da Comarca de Mariana.	<ul style="list-style-type: none">• Retomada da negociação de compra dos animais de grande porte junto a equipe de assessoria técnica dos proprietários rurais• Acompanhamento de pós adoção• Participação de evento de adoção em Sete Lagoas/MG• Devolução animais de grande e pequeno porte aos proprietários• Extensão do contrato de locação da Fazenda Bom Retiro até Janeiro/17.• Relocação de animais da Faz. Sta. Tereza para Faz. Bom Retiro (Evitar óbitos de animais por intoxicação)
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 73 visitas de acompanhamento do pós adoção• 16 adoções de animais de pequeno porte• Capacidade atual do CATA é de 120 cães e 20 gatos• 9 animais devolvidos aos seus responsáveis	<ul style="list-style-type: none">• 1 animal resgatado• 342 animais sob guarda do programa



EM BRANCO




RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Orçamento (R\$MM)

Total: 322,5

Realizado: 13,9

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)		nov-15	mar-22
Metas do Programa		mar-19	jun-19
Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas		mar-19	mar-19
Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas)		jun-19	jun-19
Definição do Programa		set-16	out-16
Execução do Programa		nov-15	mar-22
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues		nov-15	jun-19
Definição do Escopo	8,5%	mai-16	ago-17
Planejamento da Execução		jan-17	dez-17
Execução do Projeto		jul-17	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar-19	jun-19
PF0047 - Reconstrução de Paracatú de Baixo		nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	80,0%	nov-15	ago-16
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		ago-16	ago-17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		abr-17	fev-18
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev-18	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar-19	mai-19
PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira		jun-16	abr-18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	8,4%	jun-16	mar-17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		jan-17	jul-17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		set-17	jan-18
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		jan-18	abr-18
PF0049 - Reconstrução da escola de Gesteira		fev-16	jan-17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola		fev-16	jul-16
Execução das obras de reconstrução da escola	22,9%	jul-16	out-16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola		out-16	jan-17




EM BRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
Processos de Assessoramento de IMPACTADOS		out-16	jul-17
Processo de Aporte Financeiro para Assessoramento de IMPACTADOS		out-16	jul-17
Processo de disponibilização de moradia temporária das pessoas desalojadas		nov-15	jun-19
Disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
Disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
Disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	abr-18
Processo de monitoramento do reassentamento após reconstrução das vilas		jan-18	mar-22
Acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
Acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
Acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		jan-18	jan-21
Encerramento do Programa		dez-21	mar-22




EM BRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Aprovado engajamento da CÁRITAS entre SAMARCO, MPMG e Comunidades, para assessoria técnica aos atingidos;• Elaboração do projeto urbanístico das casas e vila, bem como estudos do terreno, para Comunidade de Bento Rodrigues;• Articulação do prefeitura municipal de Mariana, para considerações e análise do projeto urbanístico de Bento Rodrigues (secretarias Obras, Meio Ambiente, Educação, SAAE, Promotoria do Municipal);• Concluídos estudos técnicos para definição de acesso às alternativas de terrenos de Paracatu de Baixo;• Concluído Levantamento de Expectativas para Casas e Vila para comunidade de Gesteira;• Construção da fundação e início da montagem das paredes em Concreto PVC da Escola de Gesteira.	<ul style="list-style-type: none">• Início da assessoria técnica da CÁRITAS;• Conclusão dos estudos do terreno e aprovação do projeto urbanístico das casas e vila, junto à Comunidade de Bento Rodrigues;• Votação para escolha do local para reassentamento dos atingidos de Paracatu de Baixo, e início do Levantamento de Expectativas e Estudos do Terreno;• Elaboração do projeto urbanístico das casas e vila, para Comunidade de Gesteira;• Conclusão da montagem do telhado da Escola de Gesteira.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Presença de 95% das famílias no processo de Delimitação dos Terrenos da Comunidade de Paracatu de Baixo;• Presença de 88% das famílias na atividade de Levantamento de Expectativas de Gesteira.	





EM BRANCO




RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Construção da escola de Gesteira

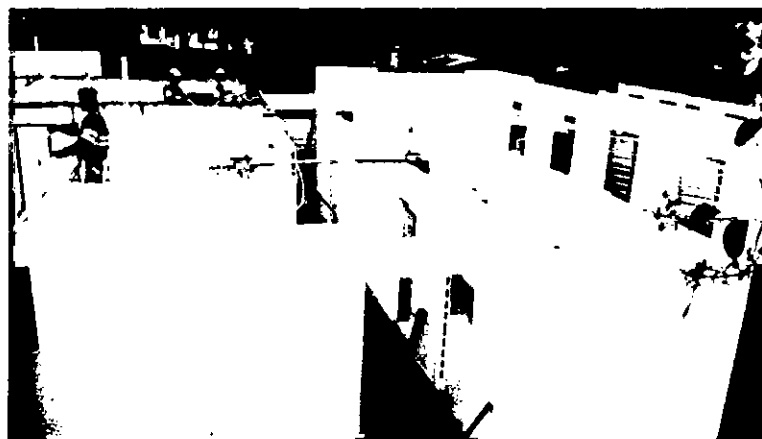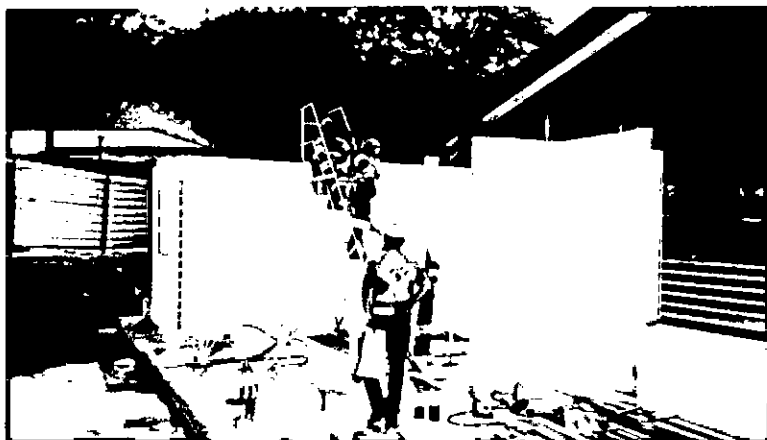

Finalização da montagem e concretagem das placas de PVC




EM BRANCO



RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

Orçamento (R\$MM)	Total: 261,3	Realizado: 41,3			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81)				nov-15	out-18
Metas do Programa				abr-18	abr-18
Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do				abr-18	abr-18
Definição do Programa				out-16	nov-16
Execução do Programa				nov-15	jul-18
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)				nov-15	jul-18
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves			30,2%	nov-15	jun-17
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m				jun-17	abr-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)			0,0%	abr-18	jul-18
Encerramento do Programa				jul-18	out-18




EM BRANCO



RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Aquisição da Fazenda Floresta e arrendada a faixa de servidão da tubulação;• Início da engenharia para disposição confinada no setor 4;• Início das atividades no Setor 8 (Velho Soberbo);• Volume acumulado de material removido superou o volume previsto para o período;• Duas dragas operando nos 400m;• Conclusão da 1ª etapa de dragagem (30m próximos ao barramento até a cota 308);• Conclusão dos serviços de cravação para os barramentos metálicos	<ul style="list-style-type: none">• Mobilização da empresa para execução dos barramentos metálicos;• Início do aterro para execução do barramento metálico B;• Início do dique do Velho Soberbo;• Contratação dos serviços para disposição encapsulada no Setor 4;• Conclusão da drenagem e vertedor provisório para disposição no Setor 5;• Conclusão das investigações na Fazenda Floresta;• Início da engenharia detalhada do dique intermediário da Fazenda Floresta;
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Dragagem de material para o Setor 4A• Alívio do barramento da UHE Risoleta Neves	





EM BRANCO



RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

Mapa de referência

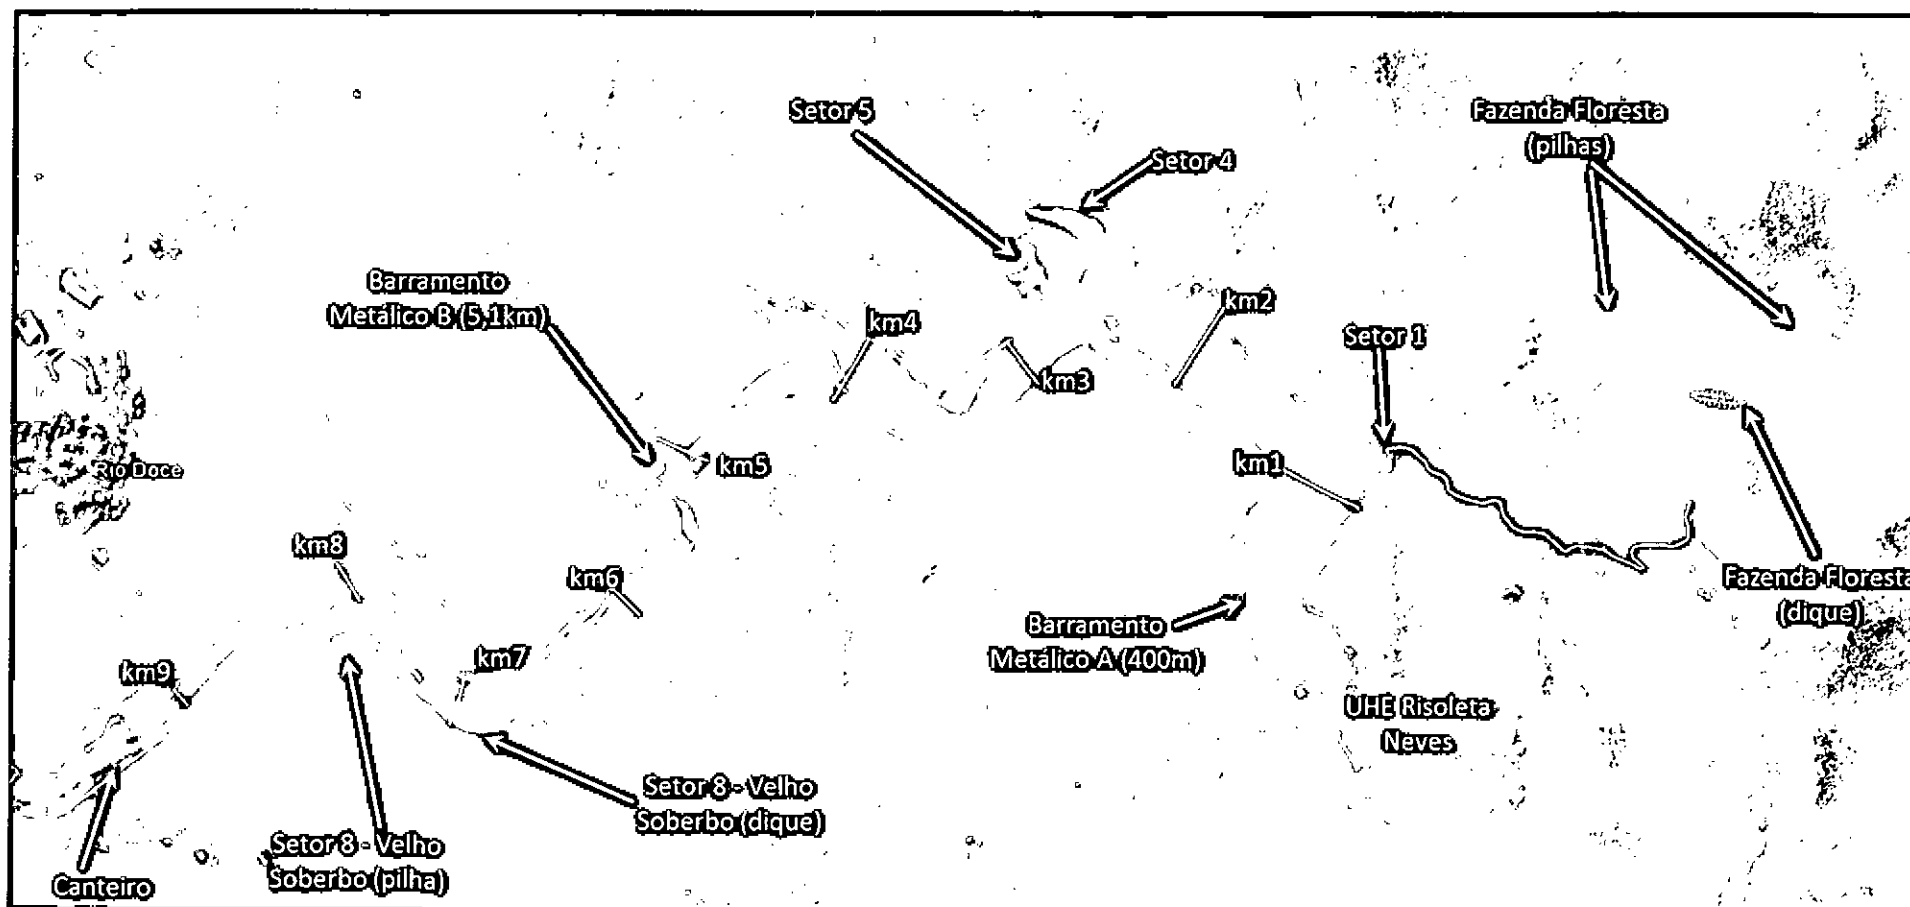


EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Orçamento (R\$MM)	Total: 293,1	Realizado: 166,6		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)		nov-15	fev-19	
Metas do Programa		mar-16	ago-18	
Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura		mar-16	mar-16	
Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do		ago-18	ago-18	
Definição do Programa		set-16	out-16	
Execução do Programa		nov-15	nov-18	
PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa (Ações Emergenciais)		nov-15	nov-16	
Execução do Projeto	94,0%	nov-15	ago-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago-16	nov-16	
PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa (Ações Emergenciais)		nov-15	jun-17	
Execução do Projeto	65,0%	nov-15	mar-17	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mar-17	jun-17	
PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (Ações Emergenciais)		jan-16	ago-16	
Execução do Projeto	100,0%	jan-16	mai-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	100,0%	mai-16	ago-16	
PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa (Ações Emergenciais)		fev-16	nov-16	
Execução do Projeto	95,0%	fev-16	ago-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago-16	nov-16	
PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP (Ações Emergenciais)		jun-16	nov-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	54,0%	jun-16	nov-16	
PF0037 - Reforma e Limpeza (Ações Emergenciais)		jan-16	dez-16	
Execução do Projeto	99,0%	jan-16	set-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-16	dez-16	
PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados (Ações Emergenciais)		nov-15	out-16	
Execução do Projeto	100,0%	nov-15	jun-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	37,0%	ago-16	out-16	




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0042 - Reconstrução de pontes (Ações Emergenciais)		nov-15	out-16
Execução do Projeto	100,0%	nov-15	jan-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	33,0%	ago-16	out-16
PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias (Ações Emergenciais)		fev-16	out-16
Execução do Projeto	100,0%	fev-16	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	32,0%	ago-16	out-16
PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos (Ações Emergenciais)		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	85,0%	fev-16	out-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-16	jan-17
PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço (Ações Emergenciais)		nov-15	out-16
Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço	100,0%	nov-15	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	35,0%	ago-16	out-16
PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais		jul-16	nov-18
Planejamento da Execução	79,0%	jul-16	dez-16
Execução do Projeto		dez-16	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago-18	nov-18
PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados		mai-16	abr-17
Execução do Projeto	41,0%	mai-16	jan-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	abr-17
PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio		jan-16	mar-17
Planejamento da Execução	100,0%	jan-16	jun-16
Execução do Projeto	43,0%	mai-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17
PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo		mar-16	abr-17
Planejamento da Execução	100,0%	mar-16	jun-16
Execução do Projeto	30,0%	ago-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	abr-17




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira		mar-16	mar-17
Planejamento da Execução	100,0%	mar-16	jul-16
Execução do Projeto	22,0%	abr-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17
PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira		mar-16	out-17
Planejamento da Execução	100,0%	mar-16	jul-16
Execução do Projeto	5,0%	mai-16	jul-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul-17	out-17
PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição		abr-16	mar-18
Planejamento da Execução	80,0%	abr-16	ago-16
Execução do Projeto	5,0%	ago-16	dez-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-17	mar-18
PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa		mar-16	mar-17
Execução do Projeto	65,0%	mar-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17
PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa		jul-16	mar-17
Planejamento da Execução	100,0%	jul-16	jul-16
Execução do Projeto	10,0%	ago-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17
PF0146 - Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens		fev-16	out-17
Execução do Projeto	32,0%	fev-16	jul-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul-17	out-17
PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1		jun-16	mar-17
Execução do Projeto	28,0%	jun-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17



EM BRANCO

EM BRANCO







RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Mariana

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e reforma em 01 da fazenda de Mainart.• Realizado fórum semanal para definição de diretrizes junto a equipe do Socioeconômico e demais disciplinas sobre as reconstruções de propriedades rurais.• Planejamento de execução do projeto.	<ul style="list-style-type: none">• Continuidade do atendimento de novas demandas enviadas pelo Sistema de Manifestações - SGS.• Continuidade da reforma da Fazenda de Mainart.• Continuidade do processo de definição de diretrizes junto a equipe do Socioeconômico e demais disciplinas sobre as reconstruções de propriedades rurais (encontros semanais)

RESULTADOS

- Reformas concluídas em 23 propriedades rurais e 17 espaços públicos em distritos atingidos

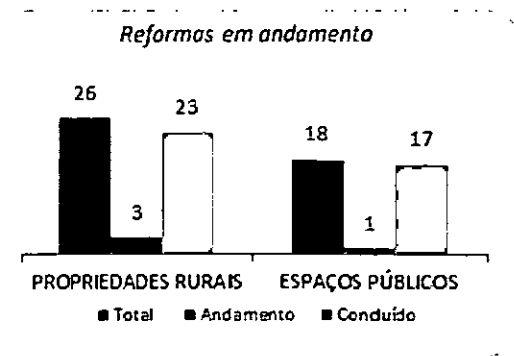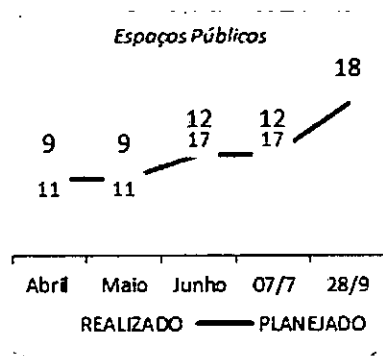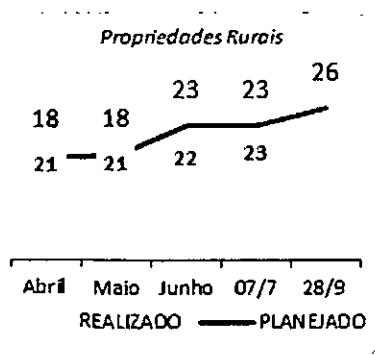


EM BRANCO





RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Mariana

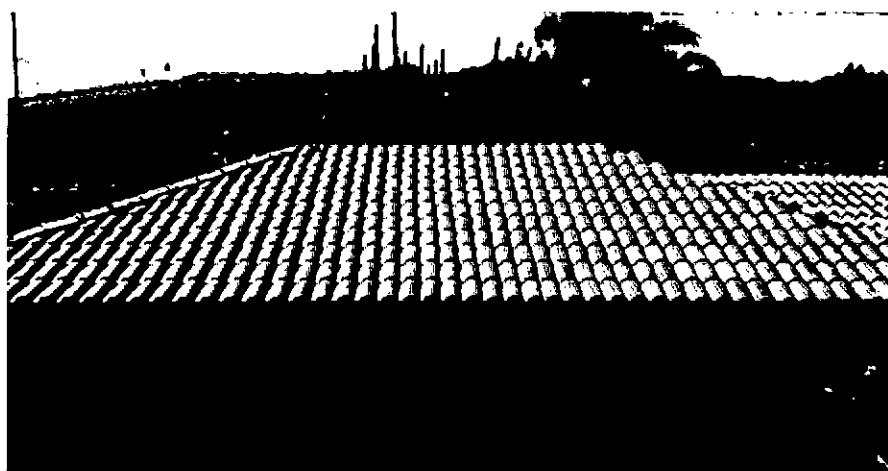

Obra em andamento - MAINART








RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Acessos/control de erosão

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Manutenção e umectação das vias não pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa.• Execução da Fase 2 (3 und.) de abertura de acessos à sirenes• Realizado 16,6KM de recolhimento de madeira em Barra Longa - Trecho 1.• Realizado 4,4KM de recolhimento de madeira em Gesteira - Trecho 2• Recuperação de 0,3km de calçamento em Claudio Manuel.• Recuperação de 37,7KM lineares de asfalto.	<ul style="list-style-type: none">• Recuperação do calçamento em Campinas.• Recuperação de 3,5KM de asfalto do trecho de Monsenhor Horta x Águas Claras• Recolhimento de Madeira no trecho 2 Gesteira x Ponte do Bucão. (8KM lineares).• Manutenção de estradas não pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Avanço de 21KM lineares de recolhimento de madeira - 33%.• 100% da pavimentação asfáltica em Barra Longa e Acaiaca concluída.• 88% do calçamento de Cláudio Manoel recuperado.• Abertura de acessos para sirenes fase 2 - 100% concluídos.	




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0040

PF0154 - Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental

Manutenção e aspersão nas vias não pavimentadas nos trechos de Ponte do Gama a Barra Longa




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0040

PF0041 - Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência (2ª Etapa).

**Finalizado a abertura de acessos às sirenes localizadas em Gesteira e Barra Longa.
Fase 2 100% concluída.**




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0039

PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas: Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta

Recuperação de 37,7 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca, Monsenhor Horta e Águas Claras danificados em função do trânsito intenso de veículos. Recuperação de 88% do calçamento em Cláudio Manoel.





EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0150

PF0150 - Recolhimento de Madeira

Atividade de recolhimento de madeira e material orgânico que estão acumulados nas bordas do rio.
Em execução em Gesteira.

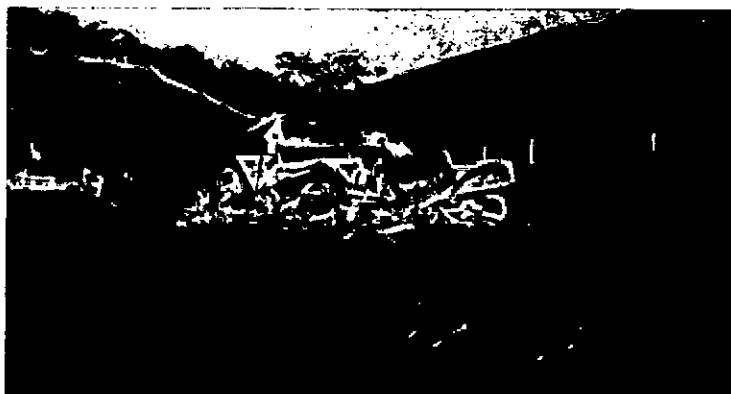








RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0146

PF0146 - RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Está sendo realizado projetos de recuperações ambientais pela empresa Golder.
Foi definido secções típicas e emitido projeto executivo por área onde é determinado a solução para implementação.
Foram elaboradas 21 diferentes soluções Técnicas para regularização da calha, margem e controle dos processos erosivos.
Em campo o ATO Golder irá selecionar a melhor solução.

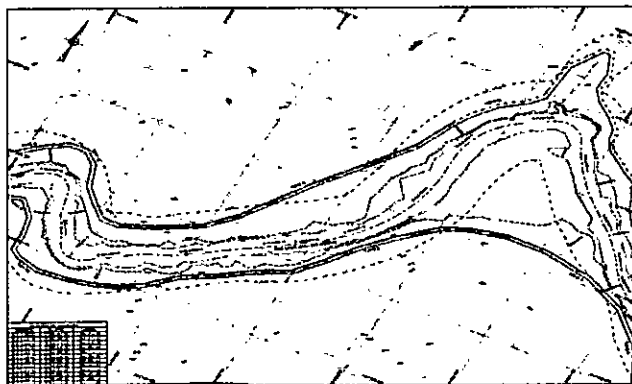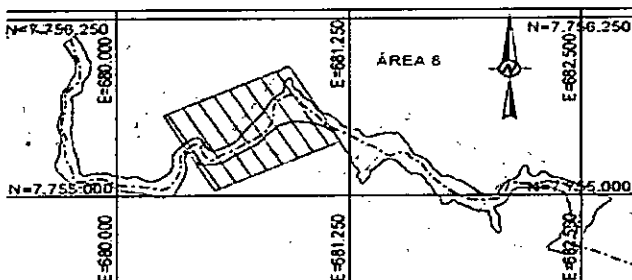

Opção	Descrição	Croquis/figura	Croquis/figura
Opção G: Live Crittwell / palçada de toras	Essa opção envolve a colocação de toras/mourões sem tratamento em estruturas laterais/vedadas formando estacas, ao longo do pé da margem do curso d'água. As estruturas tipo caixote são preenchidas com camadas de material de menor tamanho junto com estacas vivas com raízes, estendendo para dentro da margem.	 U and Eberman (2002)	 U and Eberman (2002)
Opção H: Enrocamentos plantados	Essa opção é uma combinação de enrocamento com estacas vivas colocadas nas juntas ou aberturas para permitir o restabelecimento da vegetação.	 U and Eberman (2002)	 U and Eberman (2002)
Opção I: Biormatras/colchão de galhos	Essa opção envolve estacas vivas e galhos instalados paralelamente à direção do curso da água da margem, para formar um colchão. Este colchão pode ser fixado com ancoras ou grampos. As estacas vivas e galhos são chavetados no pé da encosta da margem em valetas rasas revestidas com pedras.	 U and Eberman (2002)	 U and Eberman (2002)
Opção J: Revestimento com árvores	Essa opção envolve amarrar árvores mortas inteiras e ancorá-las no pé da margem.	 U and Eberman (2002)	 U and Eberman (2002)




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0146

PF0146 - Controle de erosão e dispositivos de drenagem

○ Projeto foi protocolado junto à Semad, estamos aguardando liberações dos órgãos competentes.

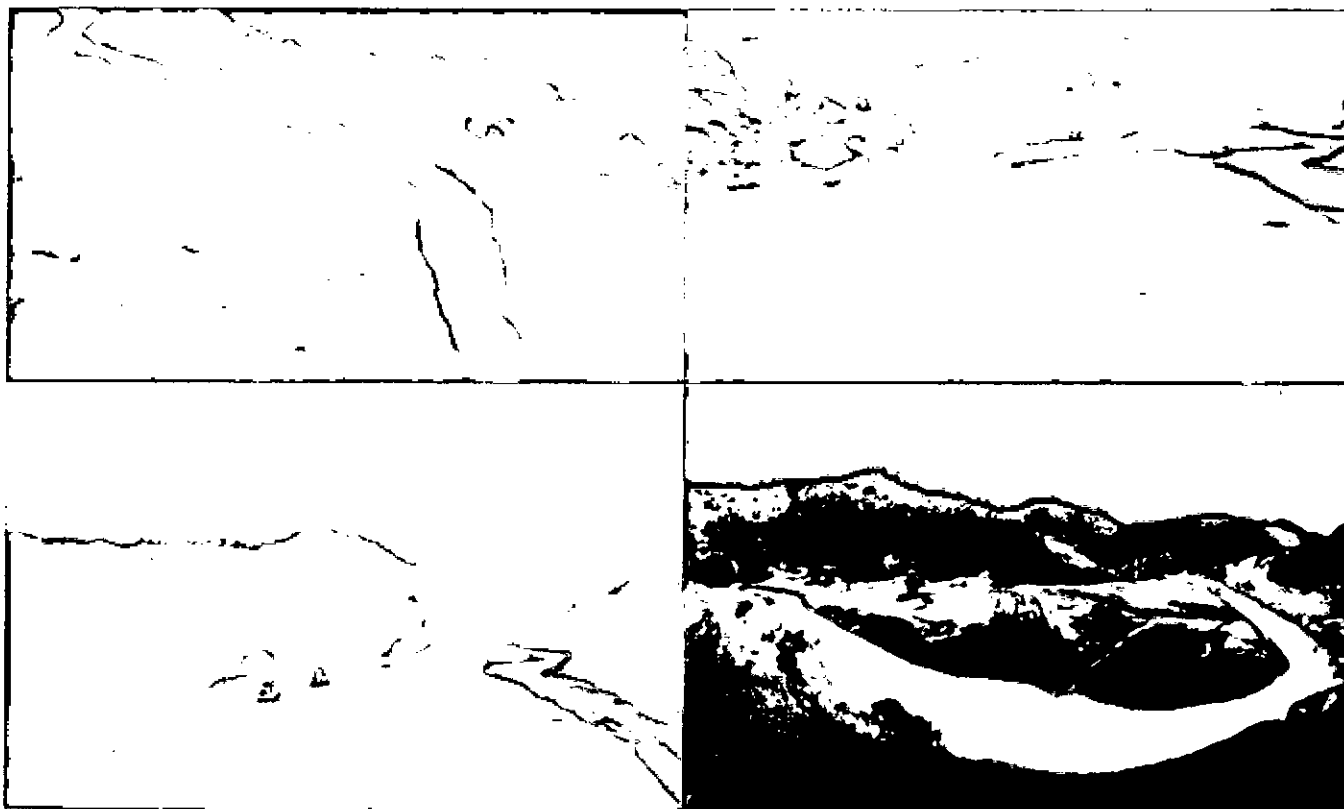


EM BRANCO

EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Concluído a reforma de 6 casas em Barra Longa e Gesteira• Continuação das obras de reconstrução da Praça e da Avenida Beira Rio em Barra Longa• Reforma de 6 currais, 4 porteiras e 4 mata burros• Iniciado a reconstrução de mais 3 residências de um total de 12, em execução 5 reconstruções• Concluído o enrocamento com pedras na Praça Manoel Lino Mol	<ul style="list-style-type: none">• Reforma de 4 casas e 5 comércios em Barra Longa• Reforma de 3 currais, 5 porteiras e 5 mata burros em Barra Longa e Gesteira• Início da recuperação de pavimentação no Centro em Barra Longa• Reforma de mais 28 quintais, lotes e pomares• Início da reconstrução de mais 2 residências de um total de 12
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 40% do calçamento do Bairro Morro Vermelho recuperado em Barra Longa• 92 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira• 53 quintais finalizados em Barra Longa	





EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS


Barra Longa

Reforma/reconstrução de Residências

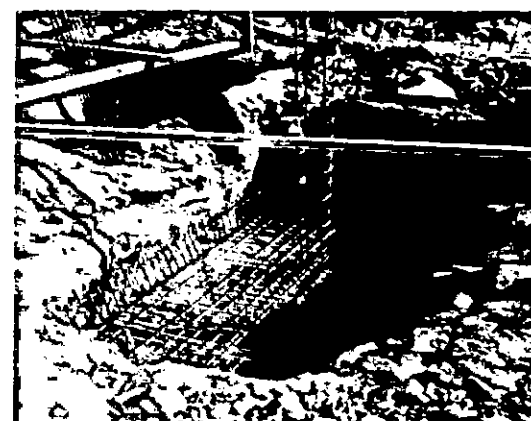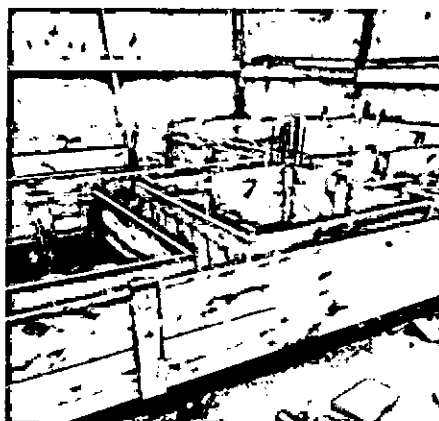

Últimas em execução











RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

Reforma de currais

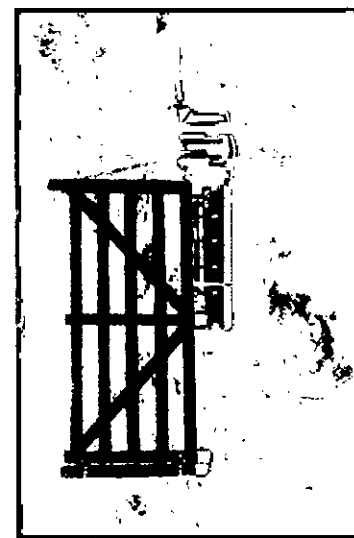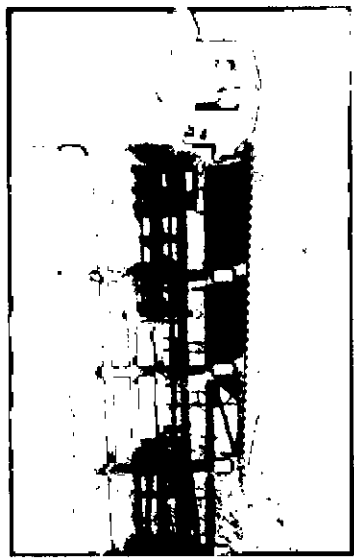

Concluídos



EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

Reforma de quintais



Concluídos /
em execução



EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Recuperação da pavimentação



Em execução




EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Reconstrução da Praça e Avenida Beira Rio

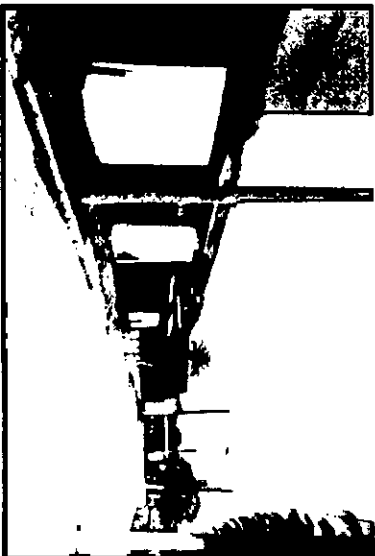

Em execução



EM BRANCO

EM BRANCO
