


MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO  
Documento - Tipo: COMB  
Nº. 02001. 018 892/2016-96  
Recebido em: 13/10/2016  
Assinatura: Camille

DIGITALIZADO NO IBAMA



Belo Horizonte, 11 de outubro de 2016

Destinado ao CIE  
Reformar

**AO I. COMITÊ INTERFEDERATIVO**

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO  
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

*SCEN Trecho 2 – Ed. Sede – Caixa Postal nº 09566  
Brasília/DF – CEP: 70818-900*

**REF.:** Relatório Mensal Referente aos Programas e Ações Previstos no TTAC em Cumprimento da Cláusula 192


Prezada Senhora Presidente do Comitê,

FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 25.135.507/0001-83, e com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“**FUNDAÇÃO**”) vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor o quanto segue.

Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do Termo de Transação e Ajuste de Conduta, firmado em 2 de março de 2016 (“**TTAC**”), a FUNDAÇÃO deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do TTAC.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a FUNDAÇÃO apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de outubro de 2016, contendo informações atualizadas sobre dos programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de setembro de 2016.

EM BRANCO



A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais.  
Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


Shirley M. Sanchez Dieckinger

FUNDAÇÃO RENOVA

EM BRANCO



reparar, restaurar, reconstruir




EM BRANCO



**Relatório mensal – Comitê interfederativo**  
*Termo de transação e ajustamento de conduta*

Setembro de 2016





EM BRANCO



# ESTRUTURA DO ACORDO

## Programas socioeconômicos

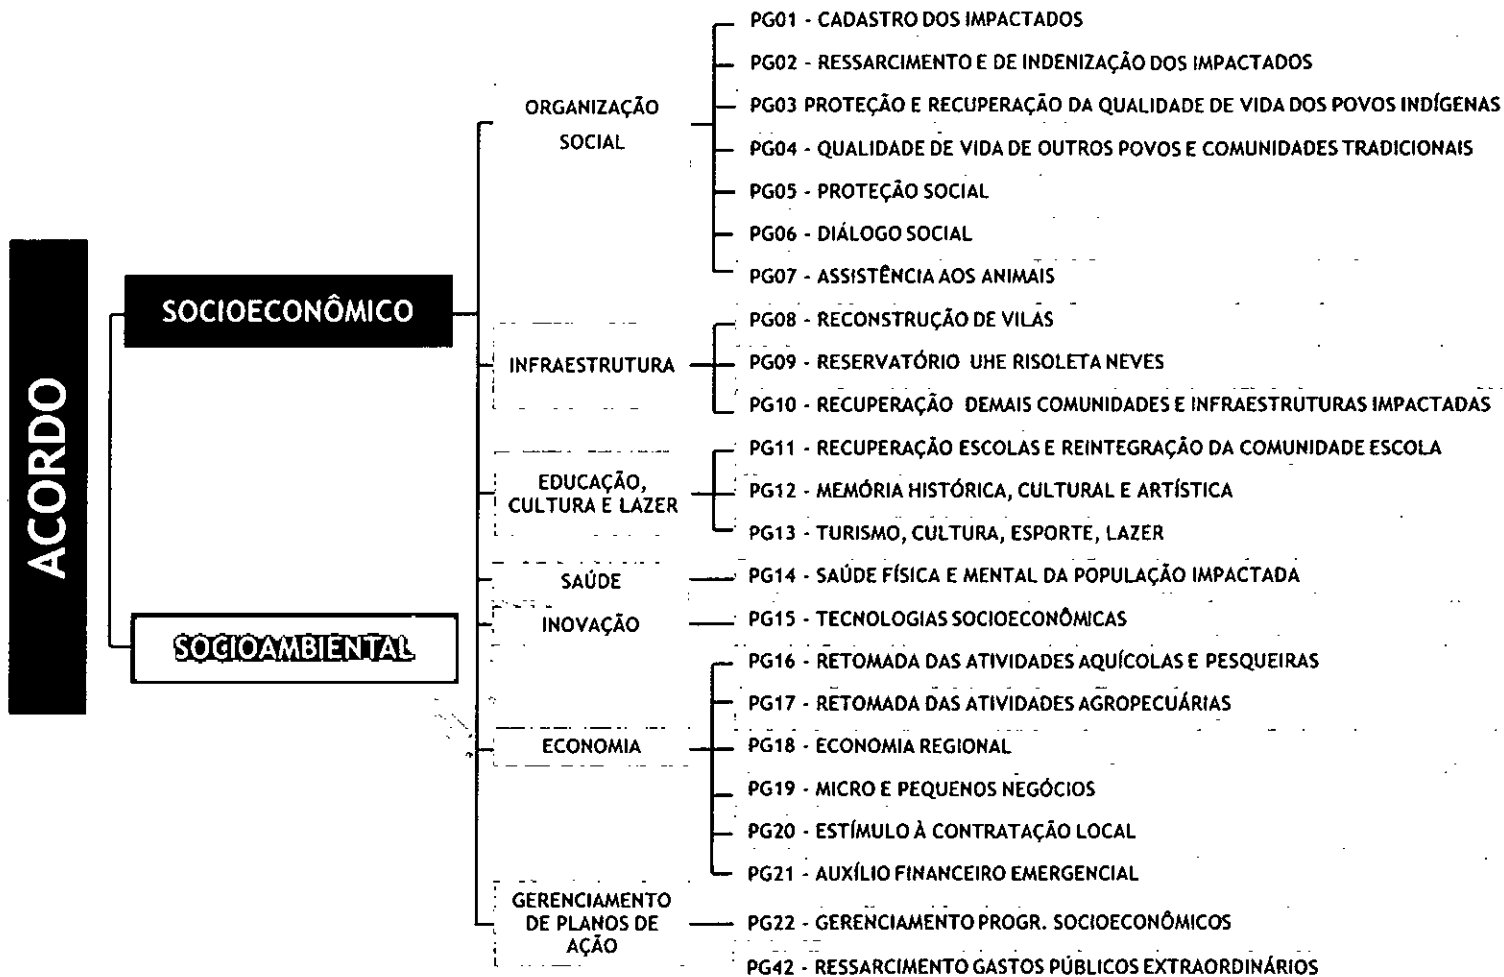


EM BRANCO



# LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 45,9	Realizado: 10,5		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)		nov/15	out/19	
Metas do Programa		set/16	abr/17	
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo			set/16	
Definição do Programa		jun/16	out/16	
PF7010 - Definição do Programa de levantamento e de cadastro dos impactados		jun/16	out/16	
Execução do Programa		nov/15	jun/19	
Projetos		nov/15	set/17	
PF0059 - Levantamento e cadastro dos Impactados e produção de informações para demais programas	23%	nov/15	set/17	
Execução do Projeto		nov/15	jul/17	
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov/15	jul/16	
Elaboração de relatório de impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos impactados.		jan/17	jul/17	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul/17	set/17	
Processos		jan/17	jun/19	
PF8010 - Processos de Atualização, revisão e correção do Cadastro Socioeconômico dos Impactados		jan/17	jun/19	
PF8011 - Processos de monitoramento dos Impactos Socioeconômicos dos municípios		jun/17	jun/19	
PF8012 - Processo de estudo de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares		jun/17	jun/19	
Encerramento do Programa		jun/19	out/19	
PF9010 - Encerramento do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (captura e formalização de benefícios)		jun/19	out/19	







## LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS

#### **Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):**

- Realização da 5ª reunião com CTOS em 03/10;
- Solicitação de dilação de prazos das etapas do processo do PG001 e estabelecimento de cronograma de trabalho, incluindo datas para envio de lotes de informação de cadastro integrado para validações da CTOS;
- Construção de cronograma integrado entre PG001 e PG002 (Programa de Indenização Mediada).

#### **Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:**


- Atividades suspensas até que seja contratada consultoria técnica especializada para prestar assessoria prévia aos impactados;

#### **Rio Doce à Linhares e Aracruz:**

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Início da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos.

#### **Base de dados e Documentação:**

- Consistência do banco de dados do cadastro emergencial de Barra Longa e Rio Doce.
- Ajuste de formulário no sistema de cadastro – SGS;
- Desenvolvimento da plataforma (SGS) com inserção das etapas do processo de cadastro para acompanhamento (ex.: aplicação do checklist de análise do cadastro, grid de acompanhamento das etapas do processo) – Em andamento
- Levantamento das solicitações de novos cadastros



EM BRANCO



## LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

### AÇÕES PRÓXIMO MÊS

#### **Reunião com Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):**

- Envio do primeiro lote de informações do Cadastro Integrado para análise da CTOS;
- 31 de outubro (6ª reunião), 03 de novembro (7ª reunião) e 02 de dezembro (8ª reunião), previstos.

#### **Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:**


- Previsão de Kick Off da Consultoria Técnica especializada para prestação de assessoria aos impactados

#### **Rio Doce à Linhares e Aracruz:**

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Continuidade da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos em todo o território.

#### **Base de dados e Documentação:**

- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros;
- Início do acompanhamento do processo de cadastro via SGS;
- Início das cargas do cadastro integrado no SGS;
- Início da entrega da cópia do formulário para os potenciais impactados.





EM BRANCO




# LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

LOCAIS	FAMÍLIAS	PESSOAS
Mariana e Barra Longa	942	2.810
Rio Doce	7.573	26.804
<b>TOTAL</b>	<b>8.515</b>	<b>29.614</b>

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016

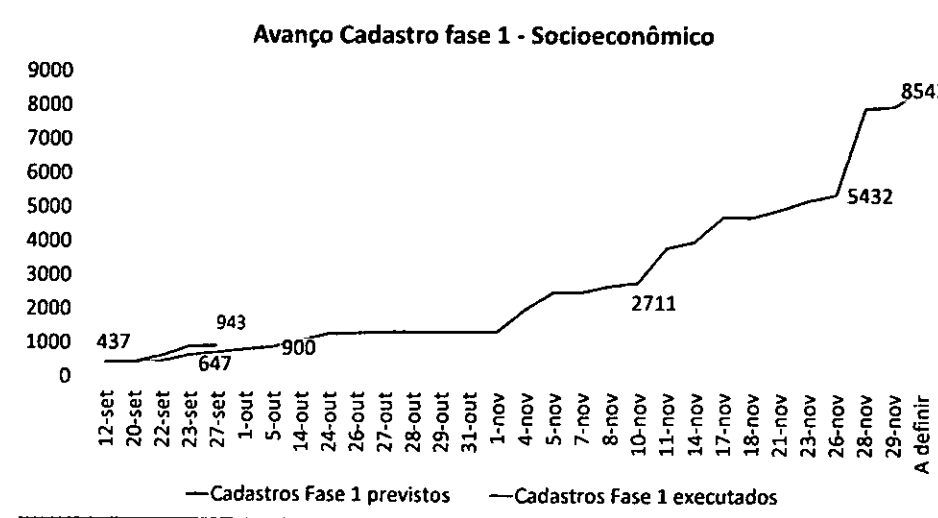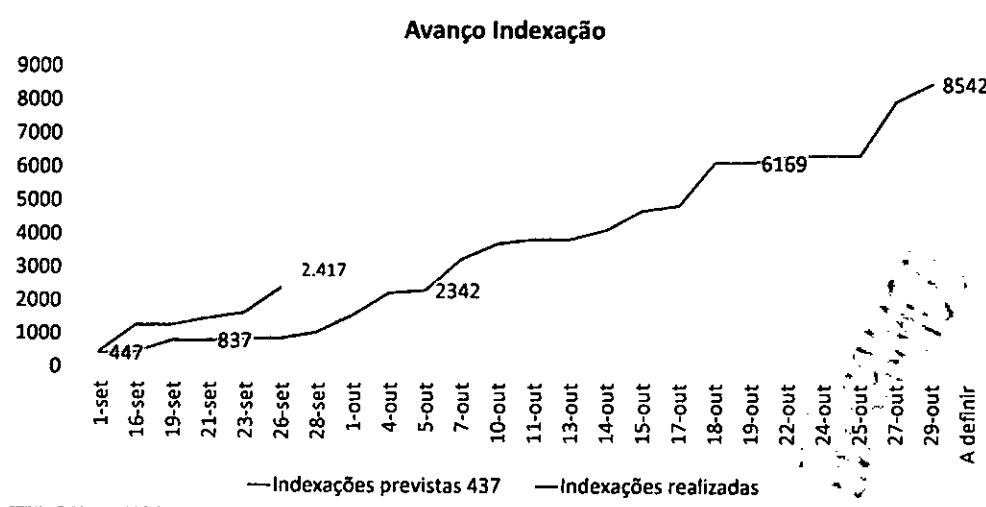

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 01/10/16



EM BRANCO




## LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

- Reuniões prévias com as comunidades para esclarecimentos sobre o cadastro integrado a ser implantado na área/ comunidade;
- Estas reunião são coordenadas pela equipe do PG001 Samarco, com apoio da Synergia




São José do Goiabal 06 e 08/09/2016

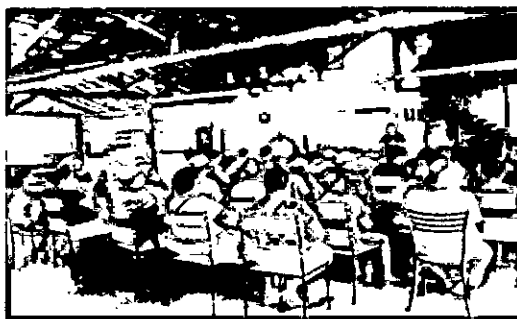


Caratinga 06/09/2016



Itueta 08/09/2016

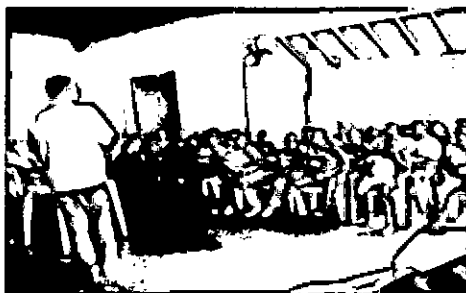


Tumiritinga 14/09/2016

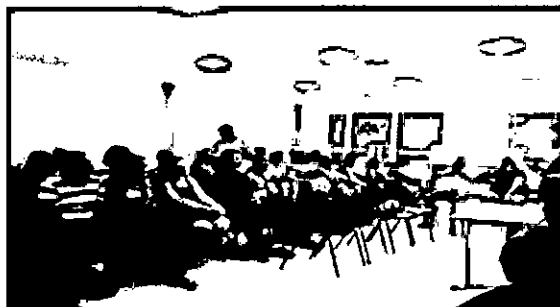

Colatina 12/09/2016




Marilândia 13/09/2016




EM BRANCO




# LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

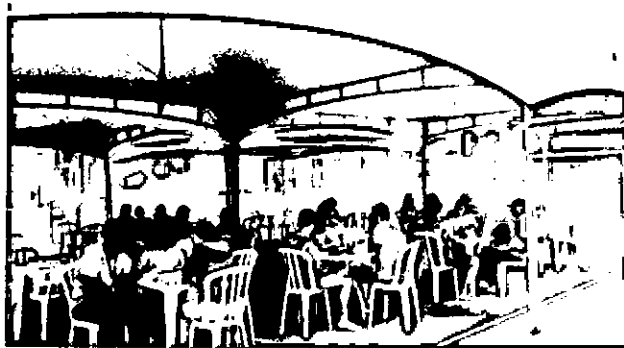


Plantão Social – Baixo Guandu-ES



Plantão Social – Baixo Guandu-ES

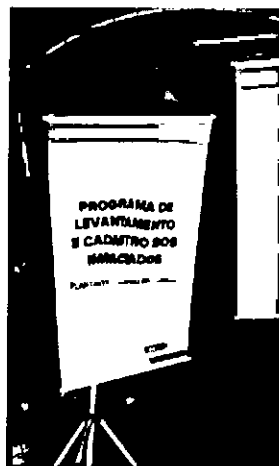



Plantão Social – Baixo Guandu-ES




Equipe filhas



Plantão Social – Baixo Guandu-ES



EM BRANCO



# Material de divulgação



# CADASTRO INTEGRADO.

A Fundação renova atua em parceria com o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente para promover o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental através da gestão integrada de licenciamento ambiental.

Para a obtenção do licenciamento ambiental, o interessado deve realizar o cadastro integrado, que é o primeiro passo para a obtenção do licenciamento ambiental. O cadastro integrado é realizado através do sistema de licenciamento ambiental (SLA) e é obrigatório para todos os empreendimentos que requerem licenciamento ambiental.

Para obter o cadastro integrado, o interessado deve acessar o sistema de licenciamento ambiental (SLA) e realizar o cadastro. O sistema de licenciamento ambiental (SLA) é o sistema de gestão integrada de licenciamento ambiental e é o primeiro passo para a obtenção do licenciamento ambiental.

## PARA FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE CADASTRO OU ESCLARECER DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:

- 0800 031 2303 - telefone@fundacao-renova.org
- <http://www.fundacao-renova.org/fale-conosco/>

## PARA FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE CADASTRO OU ESCLARECER DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:

- 0800 031 2303  
telefone@fundacao-renova.org
- [www.fundacao-renova.org/fale-conosco/](http://www.fundacao-renova.org/fale-conosco/)



# CADASTRO INTEGRADO.

## PARA FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE CADASTRO OU ESCLARECER DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:

- 0800 031 2303
- telefone@fundacao-renova.org
- [www.fundacao-renova.org/fale-conosco/](http://www.fundacao-renova.org/fale-conosco/)



## ETAPAS DO PROCESSO

### PASSO A PASSO



#### 1. Preparação

As empresas devem realizar a preparação do projeto de licenciamento ambiental (PLA) e o plano de controle ambiental (PCA) e enviar para a Fundação renova para análise.



#### 4. Análise

As informações fornecidas serão analisadas e a Fundação renova emitirá o parecer técnico.



#### 2. Verificação Inicial

A Fundação renova realizará a verificação inicial do projeto de licenciamento ambiental (PLA) e do plano de controle ambiental (PCA).




#### 5. Reparação

Em caso de necessidade, o interessado deverá realizar a reparação do projeto de licenciamento ambiental (PLA) e do plano de controle ambiental (PCA).



#### 3. Entrevista e Visita Técnica

A Fundação renova realizará a entrevista e a visita técnica ao empreendimento para verificar as informações fornecidas no projeto de licenciamento ambiental (PLA) e no plano de controle ambiental (PCA).




**EM BRANCO**




# RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 388,8	Realizado: 11,3		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38)		dez/15	jan/20	
<b>Metas do Programa</b>		jun/17	jul/17	
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)			jun/17	
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa			jul/17	
<b>Definição do Programa</b>		set/16	out/16	
PF7020 - Definição do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados		set/16	out/16	
<b>Execução do Programa</b>		dez/15	out/19	
<b>Projetos</b>		mar/16	out/17	
<b>PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS</b>		mar/16	out/17	
Planejamento da Execução do Projeto em Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares	100%	mar/16	jul/16	
Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas (excetuando-se Mariana e Barra Longa)		jun/16	out/16	
<b>Execução do Projeto</b>		mai/16	jul/17	
Implantar Centros de Negociação - Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares		mai/16	out/16	
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out/16	jan/17	
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out/16	jun/17	
Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out/16	jul/17	
<b>Encerramento do Projeto</b>		jul/17	out/17	
<b>Processos</b>		dez/15	out/19	
PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS		dez/15	jan/17	
PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações		jul/17	out/19	
<b>Encerramento do Programa</b>		out/19	jan/20	
PF9020 - Encerramento do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (captura e formalização de benefícios)		out/19	jan/20	



EM BRANCO



# RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

## AÇÕES REALIZADAS NO MÊS


- Realizada reunião de devolutiva de construção da matriz de danos com grupo de comerciantes de MG.
- Realizadas 9 audiências públicas para explicação do PIM em MG e ES a convite das defensorias públicas estaduais e da união.
- Validada a logística dos escritórios da fase 2 na CTOS.
- Atestados valores de eletrodomésticos e produtos junto ao CDL de Mariana.
- Revisados critérios de indenização agropecuária junto a Synergia, Icapex e Emater.
- Realizada reunião de construção de matriz de danos em Rio Doce.
- Concluídas obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1, Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce.
- Contratado e mobilizado efetivo do processo externo do PIM.
- Adquirido e instalado mobiliários dos escritórios da fase 1.
- Definidos imóveis para fase 2 dos escritórios de mediação.
- Realizado Workshop de simulação do processo PIM da danos de água.
- Aplicada Identidade visual nos escritórios do PIM, Fase 1.
- Homologado módulo indenizatório de DMA.

## AÇÕES PRÓXIMO MÊS

- Realizar reuniões devolutivas com a população impactada e o poder público sobre o formato final do programa após sugestões coletadas e avaliadas.
- Executar plano de comunicação para início da operação dos escritórios.
- Apresentar versão final da matriz de danos, protocolo de elegibilidade e matriz comprobatória para defensorias, CTOS e população.
- Executar plano de comunicação para início da operação dos escritórios.
- Finalizar obras de infraestrutura no escritório de Mariana;
- Treinar equipe da Fundação para atendimento nos escritórios de Danos Gerais.
- Locar imóveis da Fase 2.
- Finalizar desenvolvimento e homologar módulo indenizatório de DG.

## RESULTADOS

- Discutidas internamente e aprovadas 80% das sugestões de danos levantadas junto a população consultada.
- Concluídas obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce.
- Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios.
- Capacitada a equipe de atendimento danos de água.
- Testados os procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios.
- Revisadas as especificações no módulo indenizatório DMA e DG.
- Acompanhamento e suporte aos lançamentos de indenizações antecipadas no SGS.
- Implantação do módulo de agendamento DMA – SGS.



EM BRANCO



# PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

Orçamento (R\$MM)

Total: 61,7

Realizado: 8,0


Nome da tarefa

% Real.

Início

Término

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)		mar-16	dez-19
Metas do Programa		mar-16	out-19
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado	100%	abr-16	abr-16
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak	100%	jul-16	jul-16
Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		out-19	out-19
Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani	100%	jul-16	jul-16
Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)		out-19	out-19
Definição do Programa		jul-16	nov-18
PF7030 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas		jul-16	nov-18
Execução do Programa		mar-16	mai-19
Projetos		nov-16	mai-19
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak		nov-16	mai-19
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak		jan-17	jan-19
Encerramento do Projeto		fev-19	mai-19
Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)		nov-18	nov-18
Processos		mar-16	jan-19
Processos de Apoio Emergencial		mar-16	jan-19
Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		ago-16	ago-18
Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		mar-16	out-16
Tupiniquim e Guarani (Combos) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		mar-16	nov-16
Fornecimento Emergencial de Água - Krenak		ago-16	jan-19
Encerramento do Programa		out-19	dez-19
PF9030 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (captura e formalização de benefícios)		out-19	dez-19




**EM BRANCO**




# PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p><b>Geral:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião para definição dos papéis e responsabilidades da Funai e Sesai e, Samarco/Fundação Renova.</li><li>• Apresentação à Funai e Sesai do resultado das análises das águas dos rios e litoral marinho</li><li>• Continuidade do Programa de Qualidade</li></ul> <p><b>Krenak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das ações de assistência emergencial</li><li>• Manutenção das estradas para abastecimento de água</li><li>• Troca do depósito para guarda da água mineral</li></ul> <p><b>Comboios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das ações de assistência emergencial</li><li>• Reunião na Fibria para estudo do canal Caboclo Bernardo</li></ul> <p><b>Caieiras Velhas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das ações de assistência emergencial</li><li>• Diálogo com caciques e lideranças de pesca para pleito de aditivo para pescadores profissionais indígenas</li><li>• Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)</li></ul>	<p><b>Geral</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das ações de assistência emergencial para indígenas</li><li>• Manutenção auxílio financeiro</li><li>• Manutenção monitoramento de água</li><li>• Apresentação do Plano de Trabalho do Estudo de Componente Indígena à Funai</li></ul> <p><b>Krenak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção das estradas para abastecimento de água</li></ul> <p><b>Comboios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro</li><li>• Identificação do potencial de contaminação no rio Comboios por meio do canal Caboclo Bernardo</li></ul> <p><b>Caieiras Velhas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro</li></ul>
<b>RESULTADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R\$7.092) por família a 126 famílias, disponibilização de R\$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água</li><li>• Tupiniquim(TI Comboios): Auxílio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias</li><li>• Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R\$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R\$ 662.942,70, depositado em uma conta vinculada à associação indígena.</li></ul>	



EM BRANCO



# QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Orçamento (R\$MM)

Total: 0,5

Realizado: -

Nome da tarefa

% Real.

Início

Término

PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)

ago/16

jul/18

Metas do Programa

out/16

abr/18

Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)

out/16

Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas

jan/17

Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)

abr/18

Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)

abr/18

Definição do Programa

ago/16

abr/18

PF7040 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

ago/16

abr/18

Execução do Programa (a definir)

abr/18

abr/18


Encerramento do Programa

abr/18

jul/18




EM BRANCO




# QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS TRADICIONAIS

## Estudo vila de Santa Efigênia

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de reunião junto à FCP (13 de setembro) para apresentação de informações levantadas pela empresa em relação à localização e características da comunidade Quilombola de Santa Efigênia e dos pontos solicitados para revisão do TR.</li><li>• Contatos com a FCP solicitando posicionamento em relação ao novo TR.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tratativas com a FCP para liberação do TR revisado ou indicação de outras ações pertinentes para as tratativas da empresa em relação ao estudo inicialmente solicitado.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Liberação do Termo de Referência pela FCP (18 de maio).</li><li>• Definição junto à Fundação Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de Referência expedido.</li><li>• Protocolo do pedido formal de revisão do TR junto à FCP e CIF (5 de Agosto).</li><li>• Concordância da FCP com relação à necessidade de revisão do TR anteriormente expedido.</li></ul>	




**EM BRANCO**



# PROTEÇÃO SOCIAL

Orçamento (R\$MM) Total: 38,6 Realizado: -

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
Nome da Tarefa	% Real.	Início	Término
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)		abr-16	jun-19
Metas do Programa			
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social		abr-16	abr-19
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social	100%	abr-16	abr-16
Definição do Programa		abr-19	abr-19
PF7050 - Definição do Programa de Proteção Social		nov-16	jul-17
Execução do Programa		nov-16	jul-17
Processos		abr-16	abr-19
PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social		abr-16	abr-19
PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo)		abr-16	jul-17
Encerramento do Programa		jul-17	abr-19
PF9050 - Encerramento do Programa de Proteção Social (captura e formalização de benefícios)		abr-19	jun-19
		abr-19	jun-19




EM BRANCO



## PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Atendimento às famílias impactadas (Bento e Paracatu).</li><li>• Visitas domiciliares, grupos temáticos, atividade socioculturais</li><li>• Encaminhamento para rede pública: saúde, educação e assistência social (CREAS e Conselho Tutelar).</li><li>• Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos e professores).</li><li>• Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida.</li><li>• Reuniões de supervisão de casos com a equipe técnica do CRAS.</li><li>• Elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria em Proteção Social.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião rede de saúde, assistência social e educação, com Ministério Público de Minas Gerais.</li><li>• Abertura de contratação de consultoria para Programa de Proteção Social.</li><li>• Manter atendimentos às famílias impactadas.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica(CRAS) e encaminhamento para Proteção Especial (CREAS) – quando for o caso.</li><li>• Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial.</li><li>• Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território.</li></ul>	




EM BRANCO



# DIALOGO SOCIAL

Orçamento (R\$MM)	Total: 224,5	Realizado: 12,1			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
<b>PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72)</b>					
<b>Metas do Programa</b>					
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO				dez-16	abr-17
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria				dez-16	dez-16
<b>Definição do Programa</b>					
PF7060 - Definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social				abr-17	abr-17
<b>Execução do Programa</b>					
<b>Processos</b>					
<b>Marcos de Processo</b>					
PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional				set-16	out-16
PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo				set-16	out-16
PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento				nov-15	dez-30
PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO				nov-15	dez-30
PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional				nov-15	dez-30
PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo				out-16	mar-17
PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento				nov-15	jul-16
PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO				jul-16	mar-17
<b>Projetos</b>					
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO				mai-16	jan-17
Diagnóstico do processo de ouvidoria				nov-15	abr-17
Implantação e adequação do processo de ouvidoria				mai-16	abr-17
Encerramento do Projeto				jul-16	nov-16
				nov-16	abr-17
				abr-17	abr-17




EM BRANCO




## DIÁLOGO SOCIAL

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento		mai-16	fev-17
Marcos do Projeto		set-16	dez-16
Reestruturação da Gestão do Processo		mai-16	jul-16
Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo		mai-16	jan-17
Reestruturação do Sistema		mai-16	jan-17
Encerramento do Projeto		jan-17	fev-17
Encerramento do Programa		out-30	dez-30
PF9060 - Encerramento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (captura e formalização de benefícios)		out-30	dez-30




**EM BRANCO**



# DIÁLOGO SOCIAL

## Região I

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trecho I: 4 municípios (Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce): 46 reuniões 1697 participantes)</li><li>• Monitoramento de famílias impactadas na região de Mariana e Barra Longa.</li><li>• Mapeamento/Monitoramento de stakeholders.</li><li>• Mediação de conflitos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuidade da adaptação do Plano de Relacionamento com comunidades para o momento de transição.</li><li>• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios impactados.</li><li>• Manutenção do Mapeamento/Monitoramento stakeholders locais.</li><li>• Mediação de conflitos.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecimento e continuidade de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução.</li><li>• Instituída reunião de prestação de contas no município de Mariana para reportar o avanço dos Programas</li><li>• Fomento e facilitação do diálogo com as comunidades para a organização dos grupos em prol da realização de festividades vinculadas às suas manifestações culturais tradicionais: Festa de São Bento/Bento Rodrigues e Festa do Menino Jesus/Paracatu de Baixo</li><li>• Comunicação formal do início da funcionamento da Fundação Renova com participação do Presidente e Diretor em reuniões de Diálogo no território de Barra Longa.</li><li>• Trecho I, II e III: aprofundamento e debates de temas relacionados aos Programas: PG001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 014.</li><li>• Acumulado de reuniões: 364 com 11.810 participantes no trecho I.</li></ul>	



EM BRANCO



# DIÁLOGO SOCIAL

## Região I




Reunião com lideranças de Barra Longa com presença de Presidência e Diretoria da Fundação Renova



Reunião geral em Mariana - Status e prestação de contas das ações de reparação em andamento

Café com prosa –  
Diálogo Idosos




EM BRANCO



# DIÁLOGO SOCIAL

## Trecho Rio Doce

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio Doce: 53 reuniões (2162 participantes).</li><li>• Ampliação do diálogo com as comunidades impactadas nos municípios de MG e ES, por meio de reuniões e atendimentos individualizados/ visitas.</li><li>• Mapeamento/ Monitoramento de stakeholders.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuidade da ampliação do diálogo com comunidades para o momento de transição, disseminando a Fundação e seus diversos programas.</li><li>• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios impactados.</li><li>• Manutenção do Mapeamento/ Monitoramento dos públicos prioritários.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecimento e continuidade de ampliação do diálogo e relacionamento com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de tensão e/ ou conflito e espaços de resolução.</li><li>• Trechos II e III: aprofundamento do diálogo e estudos sobre temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006 e PG034.</li><li>• Comunicação formal do início do funcionamento da Fundação Renova com participação do Diretor em reuniões de Diálogo nos municípios do Espírito Santo.</li><li>• Acumulado de reuniões: 277 com 11.682 participantes nos trechos II e III.</li></ul>	



EM BRANCO





# DIÁLOGO SOCIAL

## Trecho Rio Doce

### Balanço das atividades realizadas

Estados	Reuniões	Participantes
Minas Gerais	45	2010
Espírito Santo	8	152

### Participantes Temas das reuniões setembro/ 2016

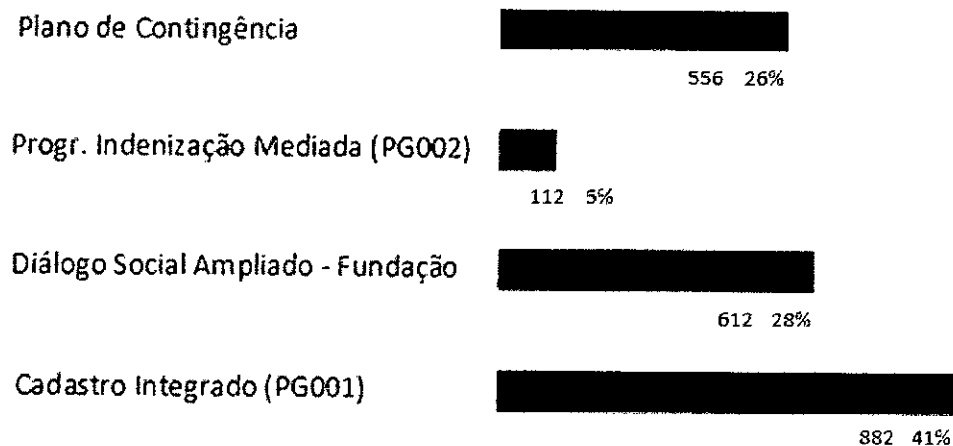

EM BRANCO



# DIÁLOGO SOCIAL

## Trecho Rio Doce



Reunião para construção de lista de danos (PG002) com grupo de pescadores de Galiléia, Conselheiro Pena, Itueta, Aimorés e Resplendor/ MG



Reunião para apresentação do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – Aimorés/ MG




Reunião para apresentação do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – Bugre/ MG



Reunião de diálogo com Associação de Pescadores, Povoação, Linhares/ ES



Reunião de devolutiva da lista de danos (PG002) com grupo de comerciantes de MG



EM BRANCO




# DIÁLOGO SOCIAL

## Canais de Relacionamento

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melhorias no módulo de manifestações do SGS</li><li>• Início da expansão dos postos de atendimento para região do Doce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuidade da expansão dos postos de atendimento para região do Doce</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Foram recebidas um total de 69.839 manifestações sendo 5.008 somente em setembro.</li></ul>	

IBAMA/PRES







EM BRANCO



# DIÁLOGO SOCIAL

## Canais de Relacionamento

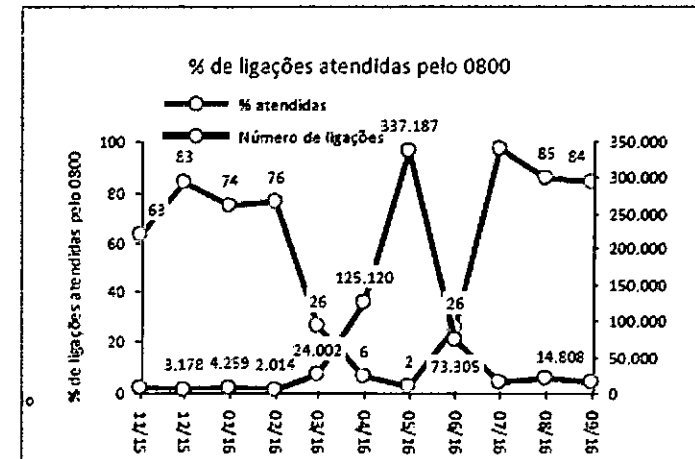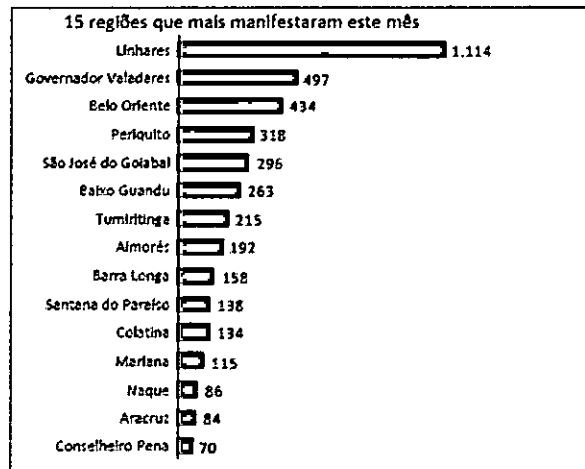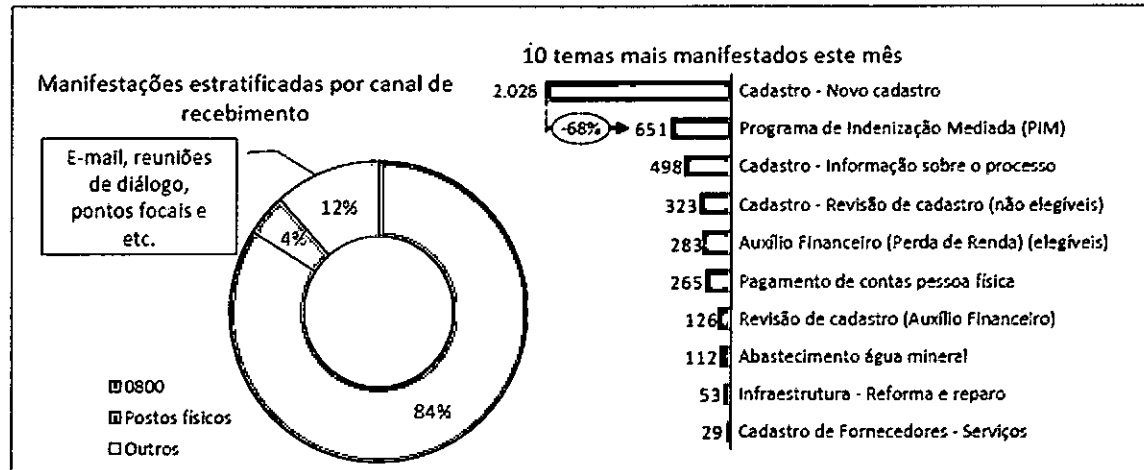


EM BRANCO



# ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

Orçamento (R\$MM)	Total: 16,4	Realizado: 12,1			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)				mar/16	jul/19
Metas do Programa				mai/19	mai/19
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais					mai/19
Definição do Programa				set/16	out/16
PF7070 - Definição do Programa de Assistência aos Animais				set/16	out/16
Execução do Programa				mar/16	mai/19
Processos				mar/16	mai/19
PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)				mar/16	mai/19
Encerramento do Programa				mai/19	jul/19
PF9070 - Encerramento do Programa de Assistência aos Animais (captura e formalização de benefícios)				mai/19	jul/19




EM BRANCO



## ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Vistas de pós adoção</li><li>• Evento de Adoção de Animais em Mariana - MG</li><li>• Resgate de animais em Bicas, Paracatu, Barra Longa e Bento Rodrigues</li><li>• Devolução de animais de pequeno e grande porte aos tutores</li><li>• Atendimentos de animais em campo</li><li>• Suspensão do processo de compra de animais de grande porte por decisão judicial.</li><li>• Transferência de animais de grande porte da Fazenda Sta. Tereza para Faz. Bom Retiro</li><li>• Conclusão de extensão de contrato da Faz. Bom Retiro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retomada da negociação de compra dos animais de grande porte junto a equipe de assessoria técnica dos proprietários rurais</li><li>• Acompanhamento de pós adoção</li><li>• Evento de adoção em Ouro Preto/MG</li><li>• Devolução animais de grande e pequeno porte aos proprietários</li><li>• Extensão do contrato de locação da Fazenda Bom Retiro até Janeiro/17.</li><li>• Atualização de cadastros de animais no IMA</li><li>• Transferir animais de propriedade rural para Fazenda Bom Retiro</li><li>• Novo contrato de assistência aos animais</li><li>• Castração de animais de pequeno porte</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 57 visitas de acompanhamento do pós adoção</li><li>• 13 adoções de animais de pequeno porte</li><li>• 55 animais devolvidos aos seus responsáveis</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 animais resgatados</li><li>• 280 animais sob guarda do programa</li></ul>



EM BRANCO




# RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Orçamento (R\$MM)

Total: 322,5

Realizado: 17,1

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)		nov/15	mar/22
<b>Metas do Programa</b>		mar/19	jun/19
Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas			mar/19
Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas)			jun/19
<b>Definição do Programa</b>		set/16	out/16
PF7080 - Definição do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira		set/16	out/16
<b>Execução do Programa</b>		nov/15	mar/22
<b>Projetos</b>		nov/15	jun/19
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues		nov/15	jun/19
<b>Marcos do Projeto</b>		out/16	ago/17
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov/15	mai/16
<b>Definição do Escopo</b>	10%	mai/16	ago/17
Projeto Conceitual das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)	15%	jun/16	abr/17
Projeto Conceitual da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos	5%	mai/16	ago/17
<b>Planejamento da Execução</b>		fev/17	nov/17
Planejamento da Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		fev/17	ago/17
Planejamento da Execução da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		mar/17	nov/17
<b>Execução do Projeto</b>		set/16	mar/19
Execução de supressão vegetal e outras atividades preliminares		set/16	fev/17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		ago/17	mai/18
Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		nov/17	mar/19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar/19	jun/19




EM BRANCO



# RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0047 - Reconstrução de Paracatú de Baixo</b>		nov/15	mai/19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov/15	ago/16
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	0%	set/16	ago/17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		abr/17	fev/18
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev/18	mar/19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar/19	mai/19
<b>PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira</b>		ago/16	abr/18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	20%	ago/16	abr/17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev/17	ago/17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		mai/17	jan/18
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		jan/18	abr/18
<b>PF0049 - Reconstrução da escola de Gesteira</b>		fev/16	fev/17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola	100%	fev/16	jul/16
Execução das obras de reconstrução da escola	43%	jul/16	nov/16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola		nov/16	fev/17
<b>Processos</b>		nov/15	mar/22
PF8080 - Processo de Aporte Financeiro para Assessoramento de IMPACTADOS		out/16	jul/17
PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	jun/19
PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	jun/19
PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	abr/18
PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar/19	mar/22
PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar/19	mar/22
PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		jan/18	jan/21
<b>Encerramento do Programa</b>		dez/21	mar/22
PF9080 - Encerramento do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira		dez/21	mar/22




EM BRANCO



## RECONSTRUÇÃO DE VILAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Iniciado processo de contratação de profissionais pela CÁRITAS.</li><li>• Pagamento de 50% à ARCELOR MITTAL de aquisição da área para reassentamento da Comunidade de Bento. Minutas das escrituras concluídas para assinatura e pagamento do restante.</li><li>• Concluída sondagem e topografia (geologia em andamento) e elaboração de vídeo para validação do Projeto Urbanístico pela Comunidade de Bento. Aguardando mobilização da CÁRITAS.</li><li>• Realizada primeira reunião com SUPRAM para discutir os procedimentos para avaliação dos cenários ambientais, para fins de regularização ambiental para reassentamento das vilas.</li><li>• Realizada votação pela Comunidade para escolha da área para reassentamento de Paracatu de Baixo.</li><li>• Concluído projeto urbanístico de Gesteira. Aguardando mobilização da CÁRITAS e negociação da área com proprietário.</li><li>• Concluída montagem das paredes de concreto PVC e laje pré-moldada da Escola de Gesteira.</li><li>• Em andamento paisagismo e drenagem pluvial da Praça.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conclusão da contratação de profissionais pela CÁRITAS, e início da mobilização para assessoria técnica aos atingidos, priorizando início do cadastro físico, socioeconômico e fundiário, bem como aprovações dos Projetos Urbanísticos</li><li>• Início da elaboração das tipologias das casas, baseadas nos levantamentos de expectativas das Comunidades</li><li>• Projeto básico e início da engenharia detalhada, para Loteamento de Bento Rodrigues</li><li>• Contratação dos estudos ambientais, negociações com proprietários para aquisições das áreas e início dos estudos técnicos para engenharia (topografia, sondagem e geotecnia), para Paracatu de Baixo</li><li>• Conclusão da negociação com proprietário para aquisição da área e dos estudos técnicos para engenharia (sondagem e geotecnia) para Gesteira</li><li>• Conclusão da construção da Escola de Gesteira.</li><li>• Em andamento urban., paisagismo e pavimentação da Praça</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Escolhido terreno da Lucila para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo com 65% dos votos e presença de 95% da Comunidade no processo de votação.</li></ul>	




EM BRANCO




# RECONSTRUÇÃO DE VILAS

## Construção da escola de Gesteira


---

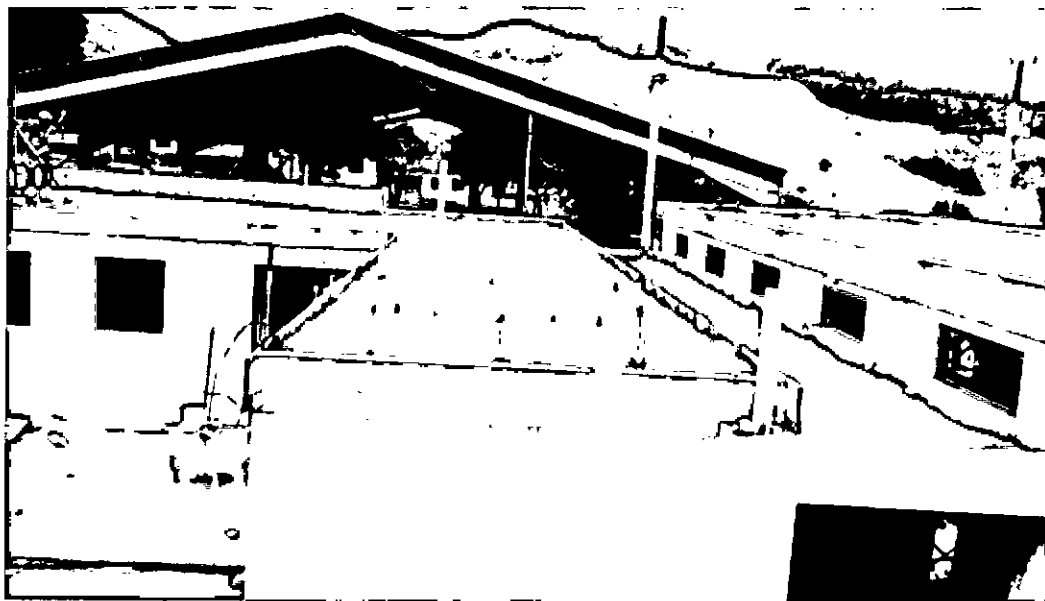

Concretagem da laje da Escola

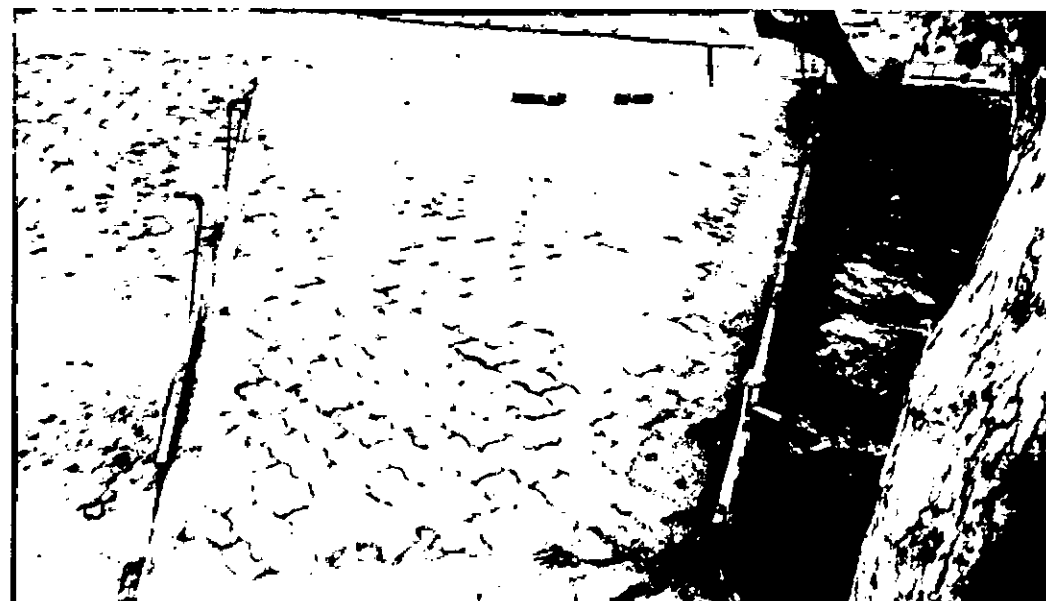

Início da Urbanização da Praça




EM BRANCO



# RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

Orçamento (R\$MM)	Total: 261,3	Realizado: 58,3			
Nome da tarefa			%Real	Início	Término
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81)				nov/15	out/18
Metas do Programa				abr/18	abr/18
Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta					abr/18
Meta do ACORDO)					
Definição do Programa				out/16	nov/16
PF7090 - Definição do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves				out/16	nov/16
Execução do Programa				nov/15	jul/18
Projetos				nov/15	jul/18
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)				nov/15	jul/18
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das			37%	nov/15	jun/17
condições operacionais da UHE Risoleta Neves					
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m				jun/17	abr/18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)			0%	abr/18	jul/18
Encerramento do Programa				jul/18	out/18
PF9090 - Encerramento do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (captura e formalização de benefícios)				jul/18	out/18




EM BRANCO



## RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Testes da Terratek para encapsulamento de rejeitos à jusante do setor 4.</li><li>• Início da construção do dique do Setor 8.</li><li>• Liberação para testes com novo gatilho de turbidez.</li><li>• Aquisição da Fazenda Floresta de baixo para construção de diques intermediários e caminhamento de tubulação.</li><li>• Escavação do Setor 5.</li><li>• Contratação da Piacentini para execução das barreiras metálicas.</li><li>• Definição do projeto executivo, metodologia executiva e plano de ataque do Barramento B.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Início da construção do Barramento Metálico B.</li><li>• Contratação da execução dos serviços de encapsulamento de sedimentos à jusante do dique 4A.</li><li>• Preparação da praça para início do encapsulamento à jusante do dique 4A.</li><li>• Construção da linha de recalque até o Setor 8.</li><li>• Início do bombeamento para o Setor 5.</li><li>• Recebimento da engenharia básica das bacias de sedimentação da Fazenda Floresta.</li><li>• Recebimento da engenharia básica dos diques intermediários da Fazenda Floresta.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dragagem de material para o Setor 1 e 4: 344.500 m<sup>3</sup></li><li>• Alívio do barramento da UHE Risoleta Neves.</li></ul>	



EM BRANCO



# RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES




IBAMA/PRESI  
Proc. 0934  
FLS. 594  
RUB

EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Orçamento (R\$MM)	Total: 293,1	Realizado: 180,9		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
<b>PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)</b>		nov-15	fev-19	
<b>Metas do Programa</b>		mar-16	ago-18	
Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura	100%	mar-16	mar-16	
Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do ACORDO)		ago-18	ago-18	
<b>Definição do Programa</b>		set-16	out-16	
PF7100 - Definição do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga		set-16	out-16	
<b>Execução do Programa</b>		nov-15	nov-18	
<b>Projetos</b>		nov-15	nov-18	
<b>PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa</b>		nov-15	jan-17	
Execução do Projeto	98%	nov-15	out-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out-16	jan-17	
<b>PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa</b>		nov-15	jun-17	
Execução do Projeto	89%	nov-15	mar-17	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mar-17	jun-17	
<b>PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho</b>		jan-16	ago-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	100%	mai-16	ago-16	
<b>PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa</b>		fev-16	nov-16	
Execução do Projeto	100%	fev-16	ago-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	18%	ago-16	nov-16	
<b>PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP</b>		jun-16	nov-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	62%	jun-16	nov-16	
<b>PF0037 - Reforma e Limpeza</b>		jan-16	dez-16	
Execução do Projeto	99%	jan-16	set-16	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-16	dez-16	




EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados</b>		nov-15	nov-16
Execução do Projeto	100%	nov-15	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	43%	ago-16	nov-16
<b>PF0042 - Reconstrução de pontes</b>		nov-15	nov-16
Execução do Projeto	100%	nov-15	jan-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	40%	ago-16	nov-16
<b>PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias</b>		fev-16	nov-16
Execução do Projeto	100%	fev-16	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	33%	ago-16	nov-16
<b>PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos</b>		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	85%	fev-16	out-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-16	jan-17
<b>PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço</b>		nov-15	nov-16
Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço	100%	nov-15	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	44%	ago-16	nov-16
<b>PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais</b>		jul-16	nov-18
Planejamento da Execução	85%	jul-16	dez-16
Execução do Projeto		dez-16	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago-18	nov-18
<b>PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados</b>		mai-16	abr-17
Execução do Projeto	50%	mai-16	jan-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	abr-17
<b>PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio</b>		jan-16	mar-17
Planejamento da Execução	100%	jan-16	jun-16
Execução do Projeto	81%	mai-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17








# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo</b>		mar/16	abr/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jun/16
Execução do Projeto	46%	ago/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan/17	abr/17
<b>PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira</b>		mar/16	mar/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	64%	abr/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
<b>PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira</b>		mar/16	out/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	13%	mai/16	jul/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul/17	out/17
<b>PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição</b>		abr/16	mar/18
Planejamento da Execução	100%	abr/16	ago/16
Execução do Projeto	14%	ago/16	dez/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/17	mar/18
<b>PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa</b>		mar/16	mar/17
Execução do Projeto	74%	mar/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
<b>PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa</b>		jul/16	mar/17
Execução do Projeto	49%	ago/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
<b>PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1</b>		jun/16	mar/17
Execução do Projeto	37%	jun/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17




EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol</b>		jan/17	jan/18
Avaliação de Alternativas		jan/17	abr/17
Definição do Escopo		abr/17	mai/17
Planejamento da Execução		mai/17	jul/17
Execução do Projeto		jul/17	out/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out/17	jan/18
<b>PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues</b>		ago/16	jan/18
Definição do Escopo	92%	ago/16	set/16
Planejamento da Execução		set/16	dez/16
Execução do Projeto		dez/16	set/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/17	jan/18
<b>PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo</b>		ago/16	mar/18
Avaliação de Alternativas	41%	ago/16	nov/16
Definição do Escopo		nov/16	jan/17
Planejamento da Execução		jan/17	mar/17
Execução do Projeto		mar/17	nov/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov/17	mar/18
<b>PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2</b>		jan/17	jan/18
Planejamento da Execução		jan/17	mar/17
Execução do Projeto		mar/17	set/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/17	jan/18
<b>Processos</b>		mai/16	out/17
<b>PF8100 - Processos de Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental</b>	28%	mai/16	out/17
<b>Encerramento do Programa</b>		nov/18	fev/19
<b>PF9100 - Encerramento do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga</b>		nov/18	fev/19




EM BRANCO



## RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Mariana


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpeza e reforma da fazenda de Mainart.</li><li>• Planejamento de execução do projeto (FEL3) – PF0038.</li><li>• Processo dos ritos de aprovação do PF0038.</li><li>• Definido fórum (Comitê de Reconstruções) para definição de diretrizes junto a equipe do Socioinstitucional e demais disciplinas sobre as reconstruções de propriedades e estruturas rurais.</li><li>• Transferência de 3 propriedades do escopo de reformas para o escopo de reconstrução.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atendimento de novas demandas enviadas pelo Sistema de Manifestações - SGS. Contrato 4600002403.</li><li>• Continuidade do Comitê de Reconstruções.</li><li>• Execução dos serviços de demolição e sondagem da propriedade do Sr. José Arlindo da Silva.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Concluídas as reformas em 23 propriedades rurais e 18 espaços públicos em distritos atingidos</li></ul>	




EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Mariana

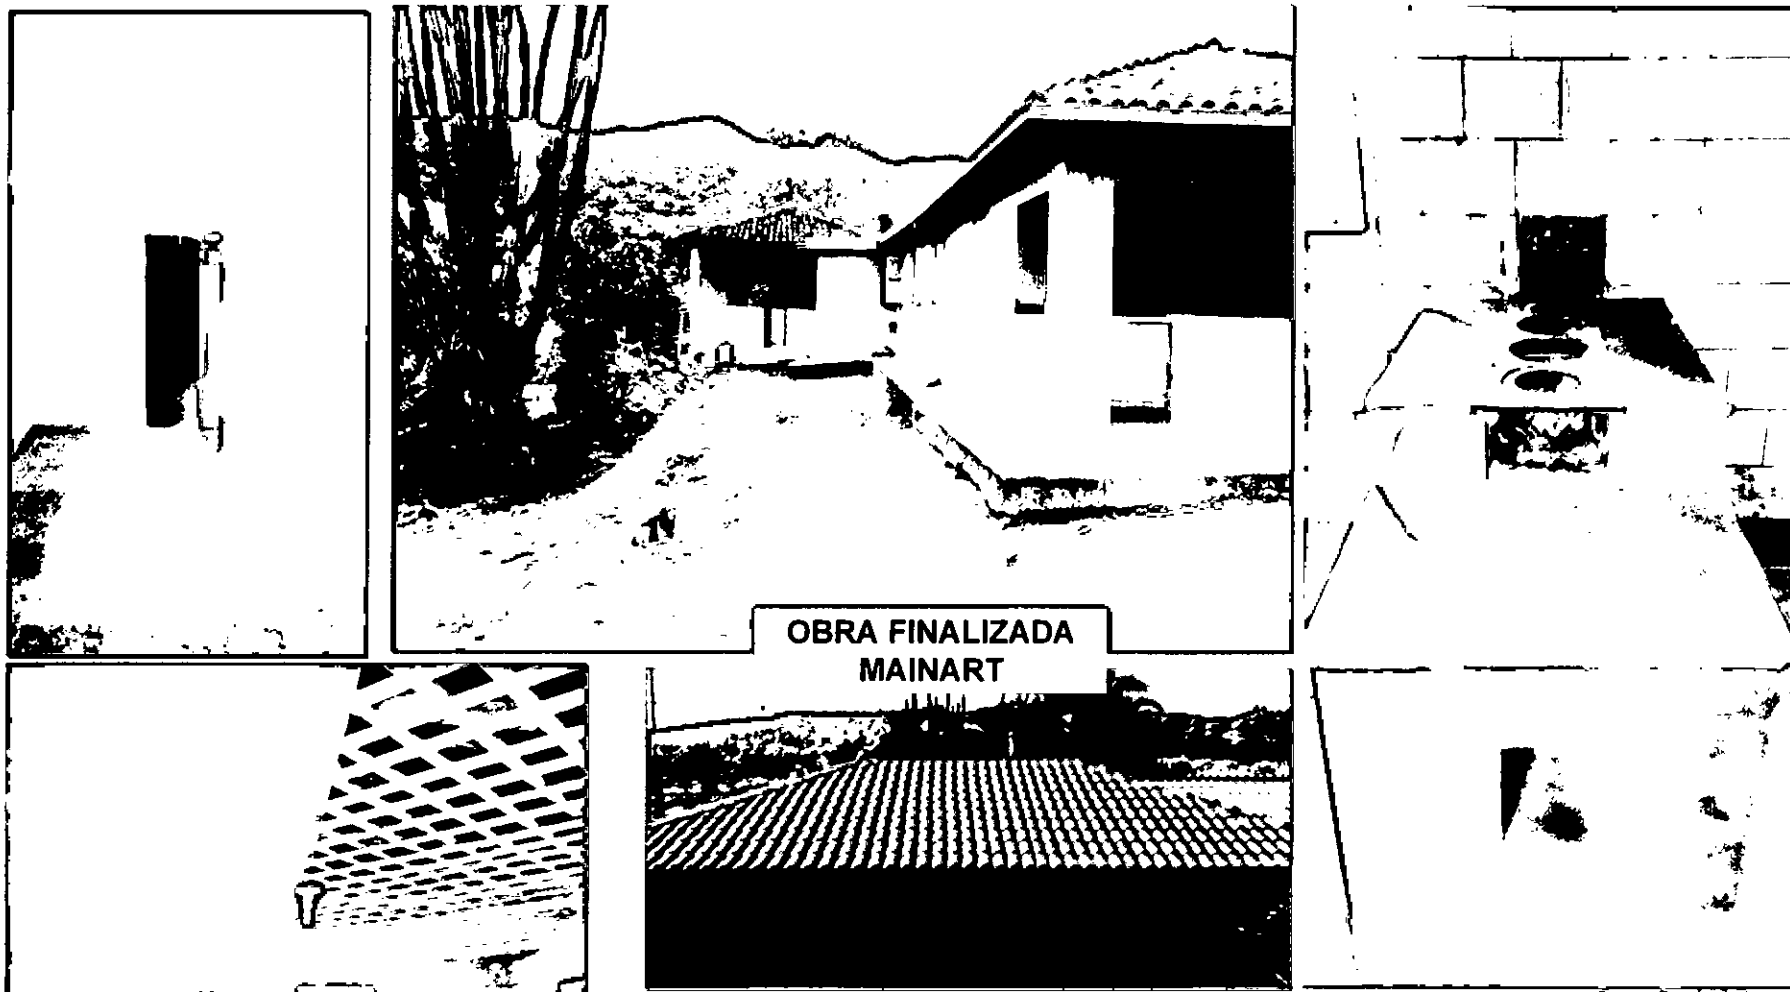

OBRA FINALIZADA  
MAINART




EM BRANCO



## RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

### Acessos/control de erosão

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenção e umectação das vias não pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa.</li><li>• Realizado 8,1 km de recolhimento de madeira em Gesteira - Trecho 2.</li><li>• Finalizado a recuperação do calçamento em Claudio Manuel.</li><li>• Recuperação de 55,5 km lineares de asfalto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recuperação de 3,5 km de asfalto do trecho de Águas Claras à Cláudio Manoel.</li><li>• Recuperação do calçamento em Campinas.</li><li>• Recolhimento de madeira no trecho 3 Bucão à Paracatu (8,6 km lineares).</li><li>• Manutenção de estradas não pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa.</li></ul>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Avanço de 37,2 km lineares de recolhimento de madeira - 45%.</li><li>• 100% do asfalto de Monsenhor Horta à Águas Claras recuperados.</li><li>• 100% do calçamento de Cláudio Manoel recuperado.</li><li>• Finalizado o recolhimento de madeira do trecho 2 - 12,5 km.</li></ul>	




EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

## Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental

Manutenção e aspersão nas vias não pavimentadas nos trechos de Ponte do Gama à Barra Longa.





EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

## Recuperação de estradas pavimentadas - Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta

Recuperação de 55,5 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca, Monsenhor Horta e Águas Claras danificados em função do trânsito intenso de veículos. Recuperação de 100% do calçamento em Cláudio Manoel.






EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

## Recolhimento de madeira

Atividade de recolhimento de madeira e material orgânico que estão acumulados nas bordas do rio.  
Em execução trecho 3 - Ponte Bucão X Paracatu.





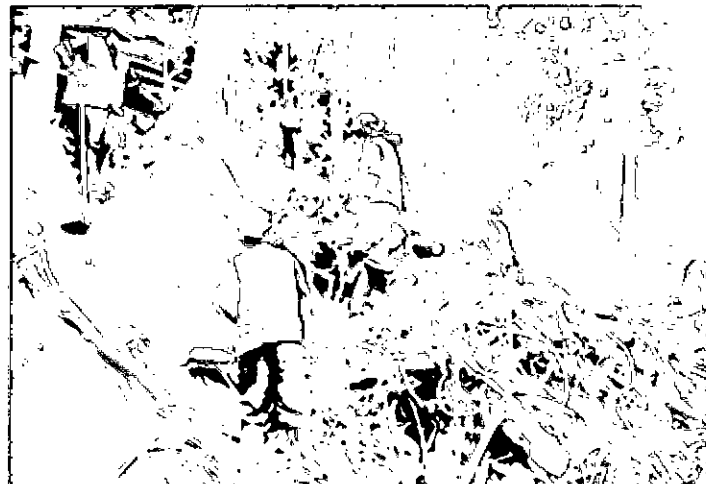


EM BRANCO



# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Está sendo realizada execução dos projetos de recuperações ambientais emitidos pela empresa Golder nas áreas prioritárias.

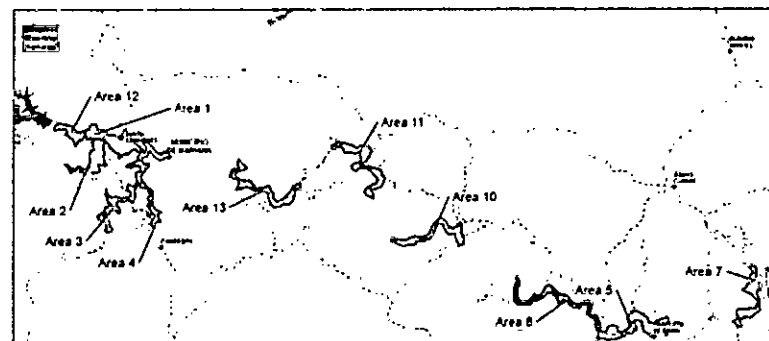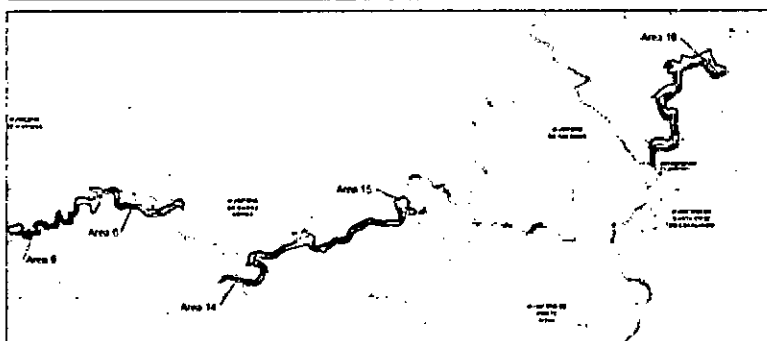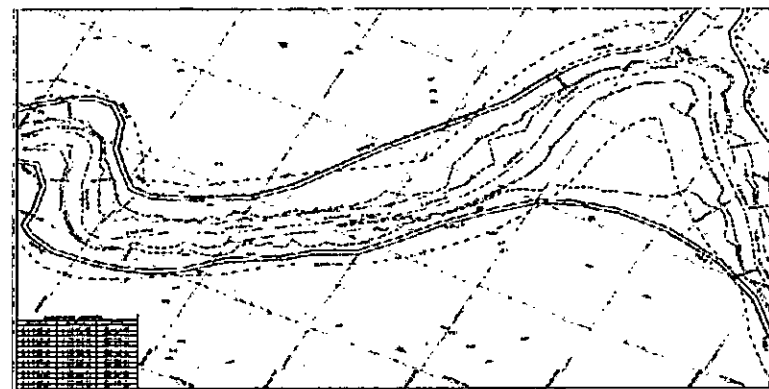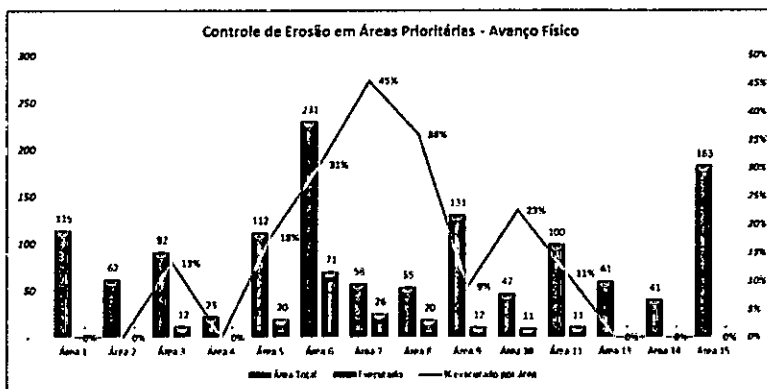

EM BRANCO





# RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

## Controle de erosão e dispositivos de drenagem

---

Mobilização e execução dos projetos de recuperação ambiental nas áreas prioritárias.

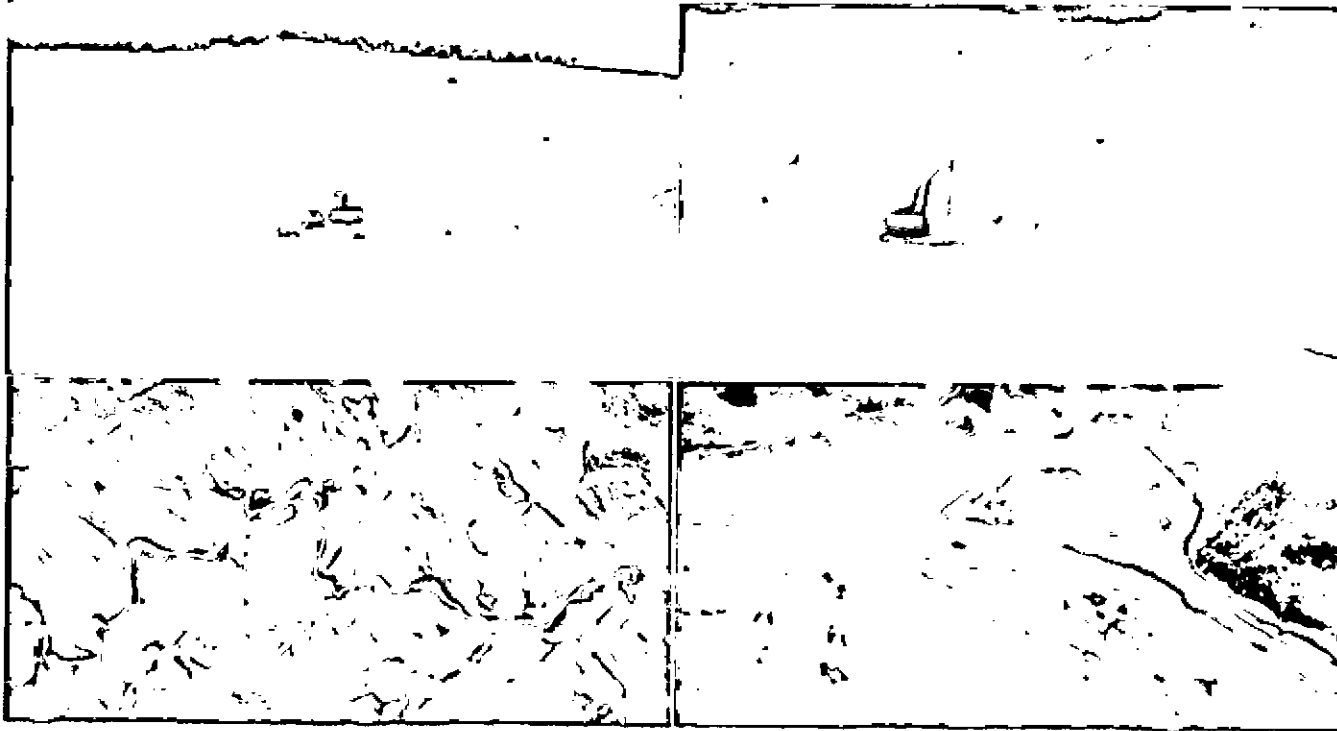

EM BRANCO



EM BRANCO
