





**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE**  
**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**  
**Unidade Setorial do Gabinete da Presidência - DF**




**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 17 dias do mês de abril de 2017, procedemos a abertura deste volume nº VI do processo de nº 02001.000974/2017-65, que se inicia com a página nº 843. Para constar subscrevo e assino.

**RUBENS BATISTA DOS SANTOS**  
Técnico Administrativo do(a) GABIN/SETORIAL/IBAMA





Belo Horizonte, 16 de novembro de 2016

**Ao I. COMITÊ INTERFEDERATIVO**  
A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO  
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - tipo: <u>et</u>
Nº. 02001. 020 <u>990</u> / 2016 - <u>93</u>
Recebido em: 16/11/2016
<i>Assinatura</i> Assinatura

SCEN Trecho 2 – Ed. Sede – Caixa Postal nº 09566  
Brasília/DF – CEP: 70818-900

Destinado ao CEF  
Reformar

**REF.:** Relatório Mensal Referente aos Programas e Ações Previstos no TTAC em Cumprimento da Cláusula 192

Prezada Senhora Presidente do Comitê,

**FUNDAÇÃO RENOVA**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 25.135.507/0001-83, e com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“**FUNDAÇÃO**”) vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor o quanto segue.


Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do *Termo de Transação e Ajuste de Conduta*, firmado em 2 de março de 2016 (“**TTAC**”), a **FUNDAÇÃO** deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do TTAC.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a **FUNDAÇÃO** apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de novembro de 2016, contendo informações atualizadas sobre dos programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de outubro de 2016.

EM BRANCO



reparar, restaurar, reconstruir




A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais.  
Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


Thiago Marchezzi Dallinger

FUNDAÇÃO RENOVA

EMBRANCO



FUNDAÇÃO  
**renova**  
reparar, restaurar, reconstruir




EM BRANCO



# **Relatório mensal – Comitê interfederativo**

*Termo de transação e ajustamento de conduta*

Outubro de 2016




EM BRANCO

# SUMÁRIO EXECUTIVO

## Segurança




### Taxa de acidentes registrados

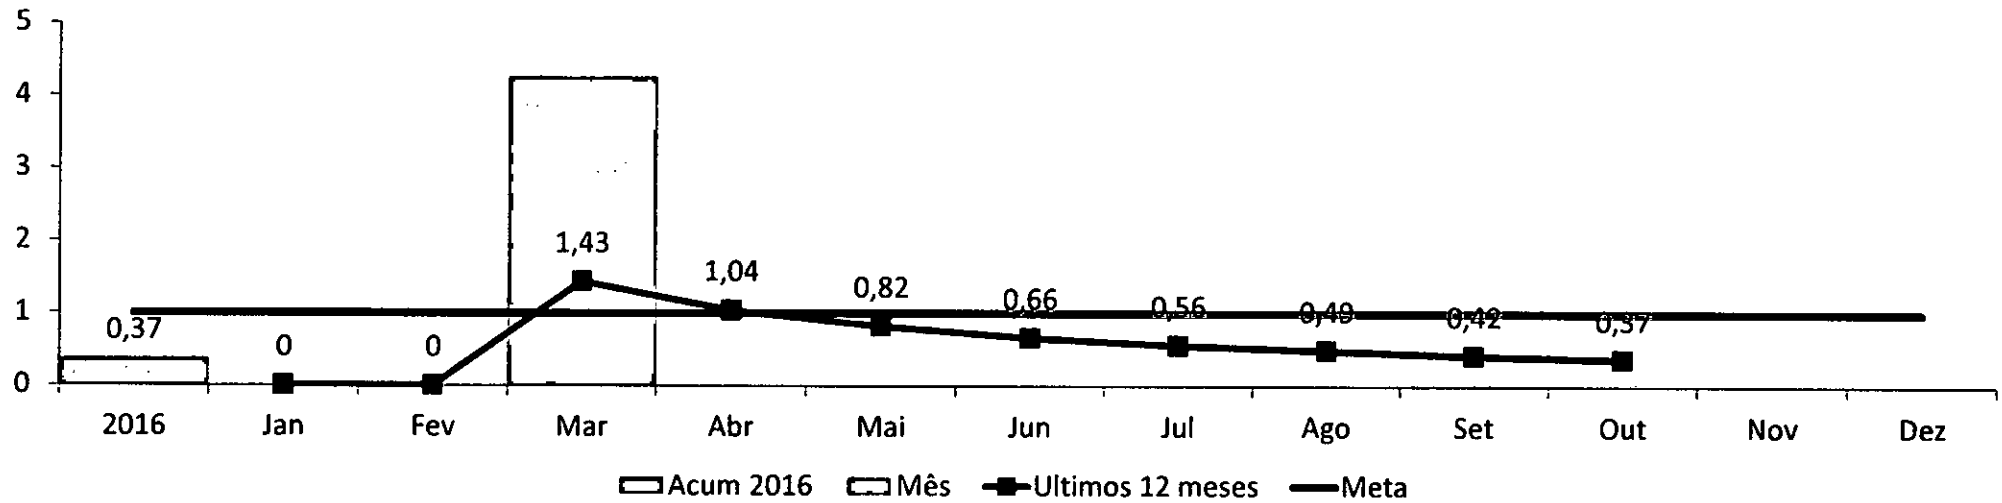

Horas trabalhadas / Efetivo	Empregados Fundação	Empregados Contratados	Horas Trabalhadas
Outubro	189	1.792	345.150
Total acumulado	-	-	2.727.669

- Nenhum registro de acidentes em outubro nas obras da Fundação (obras do PG9 e PG24 não estão sendo consideradas, pois estão sob responsabilidade da Samarco).



EMBRANCO

# SUMÁRIO EXECUTIVO

## Desembolso realizado/previsto



Visão por capítulo	Total <sup>1</sup>	Total 2017-2019 <sup>1</sup>	Realizado	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>
Programas socioeconômicos	2.587	1.474	590,6	853,8	818,7	463,1	192,3
Programas socioambientais	4.645	2.103	389,8	721,3	981,9	763,4	357,6
Ações emergenciais	199	43	150,4	94	26,5	16,6	0
Saldo medidas compensatórias	1.945	278	0	143,2	14,6	117,9	145,6
<b>Visão pela natureza</b>	<b>Total<sup>1</sup></b>	<b>Total 2017-2019<sup>1</sup></b>	<b>Realizado</b>	<b>2016<sup>1</sup></b>	<b>2017<sup>1</sup></b>	<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>2019<sup>1</sup></b>
Medidas reparatórias (2)	5.275	2.729	1121	1.522	1.402	871	456
Medidas compensatórias (3)	4.100	1.170	9	290	440	490	240
<b>Total</b>	<b>9.375</b>	<b>3.899</b>	<b>1.131</b>	<b>1.812</b>	<b>1.842</b>	<b>1.361</b>	<b>696</b>


### Comentários

- Valores previstos para os próximos anos estão sendo reavaliados pelo processo de elaboração do orçamento de 2017.

(1) Referência: Plano de 3 anos

(2) Inclui ações emergenciais

(3) Inclui saldo de medidas compensatórias




EM BRANCO

# SUMÁRIO EXECUTIVO

## Programas socioeconômicos



- Atividades de cadastro dos impactados suspensas em Mariana e Barra Longa aguardando início das atividades da consultoria técnica especializada contratada para prestar assessoria aos impactados. No trecho de Rio Doce à Linhares e Aracruz cadastro em andamento sendo iniciada a entrega dos formulários preenchidos aos impactados;
- Iniciado o atendimento para indenização de danos morais de água em Governador Valadares. Emitidos os primeiros cartões benefícios para este fim;
- Envio do Plano de Trabalho do Estudo de Componente Indígena nas terras indígenas dos Krenak, Comboios e Caieiras Velha 2 para aprovação da FUNAI. Manutenção das ações de assistência emergencial;
- Plano de Cheias/período chuvoso: 11 reuniões realizadas em Mariana e Barra Longa, contando com a presença de 420 moradores. Foram ainda realizadas 937 interlocuções face-a-face, nos quatro municípios, para mobilizar a população para os Simulados;
- Concluída aquisição da área da Lavoura junto à ARCELOR MITTAL, para reassentamento da Comunidade de Bento Rodrigues. Em andamento estudos de impacto ambiental e contratada empresa responsável pela engenharia básica e detalhada do loteamento. Iniciados estudos para engenharia (topografia e sondagem) no terreno para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo e iniciada elaboração do Projeto Urbanístico;
- Candonga: Definida a construção de mais uma barreira metálica dentro do reservatório ampliando a capacidade de retenção de sedimentos à montante em mais 2,8 milhões de m<sup>3</sup>. Dragados 508mil m<sup>3</sup> nos 400m até 08/11/2016;
- Entrega da praça Manoel Lino Mol em 30 de outubro de 2016, Barra Longa.




EM BRANCO

# SUMÁRIO EXECUTIVO

## Programas socioambientais



- Iniciadas as atividades de bioengenharia como parte da recuperação das calhas principais dos rios impactados;
- Disponibilizados dados no WebGis dos órgãos ambientais;
- Iniciadas as atividades de recuperação das primeiras 500 nascentes pelo instituto Terra, nas sub bacias dos rios Pancas, Santa Maria do Doce e Suaçui Grande;
- Iniciadas as atividades para avaliação de impactos à ictiofauna do rio Doce em atendimento à cláusula 164;
- Plano de trabalho para avaliação de impactos à fauna terrestre aprovado pela CT de Biodiversidade. A Fundação Renova está trabalhando nas revisões solicitadas para iniciar a execução do plano;
- Captações alternativas e melhorias nos sistemas de tratamento estão sendo realizadas no âmbito do Plano para o período chuvoso 2016/2017. Foram concluídas as adutoras da Lagoa Nova em Linhares e rio Santa Maria em Colatina. Perfurados poços profundos em São Vitor (1 poço), Cachoeira Escura (1 poço), Alpercata (2 poços) e Itueta (1 poço). Estas captações alternativas poderão ser validadas como definitivas após o término do estudo técnico de avaliação de oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, em atendimento a Deliberação nº16;
- Contratada a Witt O'Briens, especializada em emergências ambientais, para gestão do plano de ações para o período chuvoso;
- Iniciadas as atividades de gestão de riscos ambientais pela empresa Promanagement Analysis Assessoria;
- Recebida proposta de conteúdo mínimo para o Programa de Monitoramento Quali-quantitativo de Água e Sedimentos no rio Doce. A Fundação Renova está trabalhando no plano definitivo que será submetido à aprovação do CIF até dezembro/16;
- Finalizado o mapeamento dos pontos de irrigação através de sensoriamento remoto em atendimento à cláusula 180 do TTAC.




EM BRANCO

# ÍNDICE


## Socioeconômico



<b>Visão geral</b>	Visão geral – reparatório/compensatório .....	008
<b>Organização social</b>	PG01 – Levantamento e cadastro .....	010
	PG02 – Ressarcimento e indenização .....	012
	PG03 – Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas .....	015
	PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais .....	018
	PG05 – Proteção social .....	020
	PG06 – Diálogo social .....	022
	PG07 – Assistência aos animais .....	027
<b>Infraestrutura</b>	PG08 – Reconstrução de vilas .....	029
	PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves .....	033
	PG10 – Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas .....	039
<b>Educação, cultura e lazer</b>	PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar .....	045
	PG12 – Memória histórica, cultural e artística .....	047
	PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer .....	053
<b>Saúde</b>	PG14 – Saúde física e mental da população impactada .....	059
<b>Inovação</b>	PG15 – Tecnologias socioeconômicas .....	061
<b>Economia</b>	PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras .....	063
	PG17 – Retomada das atividades agropecuárias .....	065
	PG18 – Diversificação da economia regional .....	068
	PG19 – Micro e pequenos negócios .....	070
	PG20 – Estímulo à contratação local .....	073
	PG21 – Auxílio financeiro emergencial .....	075
<b>Gestão</b>	PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários .....	077
	PG22/41 – Gerenciamento programas .....	



EM BRANCO




# PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

## Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total*	Real.	2016*	2017*	2018*	2019*
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov/15	nov/16	jun/19	out/19	45,9	16,9	23,5	14,2	3,8	2,1
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	out/16	out/19	jan/20	244,7	11,7	117,3	97,6	6,7	21,4
PG003 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	mar/16	nov/18	mai/19	ago/19	61,7	9,4	19,9	25,6	14,6	1,1
PG004 - Outros povos e comunidades tradicionais	ago/16	jun/18	jun/18	set/18	0,5	0,0	0,1	0,4	0	0
PG005 - Proteção social	abr/16	jul/17	abr/19	jun/19	38,6	0,3	3,8	15,3	12,3	7,2
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov/15	nov/16	dez/30	dez/30	224,5	15,0	24,7	37,5	22,1	19,8
PG007 - Assistência aos Animais	nov/15	out/16	mai/19	ago/19	16,4	10,2	10,1	2,8	1,3	0,1
PG008 - Reconstrução de vilas	nov/15	out/16	mar/22	mar/22	322,5	19,8	26,1	56,3	191,3	38,7
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov/15	nov/16	jul/18	out/18	261,3	112,6	96,4	137,6	27,2	0
PG010 – Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	nov/15	out/16	nov/18	fev/19	293,1	197,4	220,2	59,2	7	0
PG011 – Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	jan/16	nov/16	mar/21	jun/21	9,7	0,3	0,9	1,9	2,3	2,2
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev/16	jul/17	mar/21	mai/21	34,8	6,6	14,6	11,4	3,2	2,5
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	abr/16	mar/17	mar/22	jun/22	18,3	0,0	1,6	6,4	5	2,5
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov/15	nov/16	nov/25	nov/25	162,6	15,7	23,8	41	40,1	26,7
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	mar/17	abr/17	mar/20	mai/20	10,2	0,1	0	0	6,3	2,9
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	nov/15	out/16	nov/22	fev/23	125,5	11,1	18,2	52,1	27,8	14,9
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	dez/15	abr/17	mar/20	jun/20	26,5	0,9	4,4	4,1	4	4
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov/15	out/16	jun/20	set/20	464,1	162,4	202,9	113,6	81,9	40,9
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun/16	dez/16	dez/17	dez/17	29,4	0,0	0	29,4	0	0
<b>Total medidas reparatórias</b>					<b>2.390</b>	<b>591</b>	<b>808</b>	<b>706</b>	<b>457</b>	<b>187</b>

(\*) Referência: Plano de 3 anos



EM BRANCO




# PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

## Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total*	Real.	Desembolso em R\$ MM			
		Definição	Execução	Encerr.			2016*	2017*	2018*	2019*
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	out/16	out/19	jan/20	144,1	0	44,3	99,9	0	0
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	abr/16	mar/17	mar/22	jun/22	0	0	0	0	0	0
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	dez/16	jul/17	dez/21	mar/22	7,6	0	0	0,1	1,1	1,1
PG018 - Diversificação da Economia Regional	set/16	nov/17	dez/30	dez/30	42,7	0	0,9	11,8	4,6	3,7
PG020 - Estímulo à Contratação Local	nov/15	mar/17	dez/30	dez-30	2,3	0	0,3	0,5	0,5	0,5
<b>Total medidas compensatórias</b>					<b>197</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>112</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

(\*) Referência: Plano de 3 anos




EMBRANCO



# PG01 – Levantamento e cadastro Masterplan



Orcamento (R\$MM)	Total: 45,9	Realizado: 16,9		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos Impactados (Cláusulas 19 à 30)		nov/15	out/19	
Metas do Programa		out/16	abr/17	
Cláusulas 19 e 24 - Término do cadastramento e levantamento das perdas materiais dos Impactados* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa		mar/17	mar/17	
Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa		abr/17	abr/17	
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo		out/16	out/16	
Definição do Programa		jun/16	nov/16	
PF7010 - Definição do Programa de levantamento e de cadastro dos impactados		jun/16	nov/16	
Execução do Programa		nov/15	jun/19	
Projetos		nov/15	set/17	
PF0059 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas	23%	nov/15	set/17	
Execução do Projeto		nov/15	ago/17	
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov/15	jul/16	
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)	35,40%	jun/16	mai/17	
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)	5%	ago/16	jul/17	
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		dez/16	ago/17	
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconômico		jan/17	jul/17	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul/17	set/17	
Processos		jan/17	jun/19	
PF8010 - Processos de Atualização, revisão e correção do Cadastro Socioeconômico dos Impactados		jan/17	jun/19	
PF8011 - Processos de monitoramento dos Impactos Socioeconômicos dos municípios		jun/17	jun/19	
Encerramento do Programa		jun/19	out/19	
PF9010 - Encerramento do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (captura e formalização de benefícios)		jun/19	out/19	



EM BRANCO



# PG01 – Levantamento e cadastro Acompanhamento



## PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Término do Cadastramento Socioeconômico - Exceção de Barra Longa e Mariana	23/dez	23/dez

## MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Famílias cadastradas emergencialmente (#)	NA	8515	NA
Pessoas cadastradas emergencialmente (#)	NA	29614	NA
Cadastros definitivos indexados (#) <sup>1</sup>	7451	7194	16000
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 (#) <sup>1</sup>	4627	5701	16000
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 (#) <sup>1</sup>	170	356	1250
Cadastros definitivos aprovados internamente (#) <sup>1</sup>	0	0	16000
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF (#) <sup>1</sup>	0	0	16000
Manifestações de solicitação de novo cadastro (#)	NA	12344	NA

## AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Aprovada em 01/11 pelo CIF solicitação de dilação de prazos das etapas do processo do PG1 e estabelecimento de cronograma de trabalho, incluindo datas para envio de lotes de informação de cadastro integrado.
- Construção de cronograma integrado entre PG1 e PG2 (Programa de Indenização Mediada).

### Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:

- Atividades suspensas até que seja contratada e mobilizada consultoria técnica especializada para prestar assessoria prévia aos impactados;
- Dia 25/10 parte da população de Barra Longa protocolou um ofício no Ministério Público (MP) em Ponte Nova solicitando a retomada das atividades, independente da contratação da assessoria técnica. No dia 02/11 foi requerida uma audiência com o MP por esse grupo para tratar do assunto.


### Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos. Início da entrega dos formulários preenchidos.

### Base de dados e Documentação:

- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros. Início das cargas do cadastro integrado no SGS (sistema de banco de dados da Fundação).

(1) Não inclui Barra Longa e Mariana




EM BRANCO



# PG02 – Ressarcimento e indenização Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 388,8	Realizado: 11,7		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38)		dez/15	jan/20	
Metas do Programa		jun/17	jul/17	
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)		jun/17	jun/17	
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa		jul/17	jul/17	
Definição do Programa		out/16	out/16	
PF7020 - Definição do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados		out/16	out/16	
Execução do Programa		dez/15	out/19	
Projetos		mar/16	out/17	
PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS		mar/16	out/17	
Execução do Projeto		mai/16	jul/17	
Implantar Centros de Negociação - Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares		mai/16	nov/16	
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out/16	jan/17	
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out/16	jun/17	
Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out/16	jul/17	
Encerramento do Projeto		jul/17	out/17	
Processos		dez/15	out/19	
PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS		dez/15	jan/17	
PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações		jul/17	out/19	
Encerramento do Programa		out/19	jan/20	
PF9020 - Encerramento do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (captura e formalização de benefícios)		out/19	jan/20	



EMBRANCO



# PG02 – Ressarcimento e indenização Acompanhamento



## PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Início dos Pagamentos de Indenizações em GV e Colatina (Danos de Água) - Fase 01	03/nov	10/nov
Início de Operação em Linhares e B. Guandu - Fase 01	27/out	17/nov
Início dos Pagamentos de Indenizações em B. Guandu- Fase 01	17/jan	17/jan
Início da Operação no Município de Rio Doce	04/nov	17/nov
Início dos Pagamentos de Indenizações no Município de Rio Doce	20/jan	20/jan
Início da Operação dos Escritórios da Fase 02	12/dez	12/dez
Início dos Pagamentos de indenizações dos Escritórios da Fase 02	15/fev	15/fev

## MÉTRICAS


Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Municípios com escritórios em operação	4	1	10

## AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Iniciado o atendimento de danos de água em Governador Valadares;
- Apresentado o formato final do programa para as prefeituras e OAB;
- Capacitada a equipe do 0800 para início de atendimento do PIM;
- Realizado plano de comunicação do programa, incluindo coletiva de imprensa, divulgação no site e panfletos;
- Emitidos os primeiros cartões benefícios de Dano Moral de Água;
- Decidido aumentar a quantidade de escritórios de Dano de Água de 4 para 12 escritórios;
- Realizado contratação e treinamento de 65 pessoas locais para trabalhar nos escritórios de Dano de Água;
- Realizado workshop técnico para mediadores que trabalharão nos escritórios de Danos Gerais;



EM BRANCO



# PG02 – Ressarcimento e indenização

## Fotos



Treinamento




Treinamento



Atendimento



Atendimento




EM BRANCO



# PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 61,7	Realizado: 9,4		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
<b>PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)</b>		mar/16	out/19	
<b>Metas do Programa</b>		mar/16	out/19	
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	100%	mar/16	mar/16	
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado	100%	abr/16	abr/16	
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak	100%	jul/16	jul/16	
Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		set/18	set/18	
Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guaraní	100%	mar/16	mar/16	
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guaraní	100%	mar/16	mar/16	
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guaraní	100%	jul/16	jul/16	
Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guaraní (depende do resultado do estudo)		set/18	set/18	
<b>Definição do Programa</b>		jul/16	nov/18	
PF7030 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas		jul/16	nov/18	
<b>Execução do Programa</b>		mar/16	mai/19	
<b>Projetos</b>		nov/16	mai/19	
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak		nov/16	mai/19	
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak		fev/17	fev/19	
Encerramento do Projeto		fev/19	mai/19	
Plano de Ação Permanente Krenak; Tupiniquim e Guaraní (a definir)		nov/18	nov/18	
<b>Processos</b>		mar/16	mai/19	
Processos de Apoio Emergencial		mar/16	mai/19	
<b>Encerramento do Programa</b>		mai/19	ago/19	
PF9030 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (captura e formalização de benefícios)		mai/19	ago/19	



EM BRANCO



# PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

### MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Meta

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Geral:

- Conclusão Plano de Trabalho para Estudo de Componente Indígena nas Terras indígenas Krenak, Comboios e Caieiras Velha 2
- Envio do Plano de Trabalho do Estudo de Componente Indígena para aprovação da FUNAI (22.11.16).

#### TI Krenak:


- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Manutenção das estradas para abastecimento de água
- Troca do depósito para guarda da água mineral
- Visita Técnica na terra indígena Krenak

#### TI Comboios:

- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Reunião de Avaliação do Acordo Comboios e Córrego do Ouro.

#### TI Caieiras Velhas:

- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)
- Reunião de Avaliação do Acordo Tupiniquim Guarani – Caieiras Velha 2
- Assinatura do Termo de Cumprimento ao TTAC - Tupiniquim Guarani – Caieiras Velha 2



EM BRANCO



# PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

## Fotos



Reunião Avaliação Tupiniquim e Guarani – Caieras Velha 2




Reunião Avaliação Comboios




Reunião Assinatura Acordo Tupiniquim e Guarani – Caieras Velha 2



Reunião Avaliação Comboios



EMBRANCO




# PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 0,5	Realizado: 0
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)			
<b>Metas do Programa</b>		ago/16	set/18
		dez/16	jun/18
Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)		dez/16	dez/16
Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas		mar/17	mar/17
Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		jun/18	jun/18
Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		jun/18	jun/18
<b>Definição do Programa</b>		ago/16	jun/18
PF7040 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais		ago/16	jun/18
<b>Execução do Programa (a definir)</b>		jun/18	jun/18
<b>Encerramento do Programa</b>		jun/18	set/18
PF9040 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (captura e formalização de benefícios)		jun/18	set/18



EMBRANCO



# PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

-		
---	--	--

### MÉTRICAS

Descrição

Planejado


Realizado

Meta

-			
---	--	--	--

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Contatos com a FCP solicitando posicionamento em relação ao novos TR .
- Retorno da FCP (11 de Outubro) em relação à vistoria a ser realizada em Novembro em três comunidades quilombolas:
  - Vila de Santa Efigênia em Mariana
  - Bernardos em Raul Soares
  - Degredo em Linhares



EMBRANCO




# PG05 – Proteção social

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 38,6	Realizado: 0,3
Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)</b>			
<b>Metas do Programa</b>			
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social	100%	abr/16	abr/16
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		abr/19	abr/19
<b>Definição do Programa</b>			
PF7050 - Definição do Programa de Proteção Social		nov/16	jul/17
<b>Execução do Programa</b>			
<b>Processos</b>			
PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social	39%	abr/16	jul/17
PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo)		jul/17	abr/19
<b>Encerramento do Programa</b>			
PF9050 - Encerramento do Programa de Proteção Social (captura e formalização de benefícios)		abr/19	jun/19



EMBRANCO



# PG05 – Proteção social

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão do Mapeamento de Famílias em situação de vulnerabilidade	30/dez	30/dez

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Acompanhamento das famílias referenciadas no CRAS;
- Realização de intervenções diretas com grupos focais: idoso e adolescentes;
- Encaminhamento de casos para rede pública: saúde, educação e assistência social;
- Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos e professores), sobretudo quanto ao tema hostilidade;
- Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida;
- Reuniões de supervisão de casos com a equipe técnica do CRAS;
- Reunião para estabelecimento de fluxo de encaminhamento de idosos para o serviço RECREIA VIDA;
- Finalização do escopo do Programa de Proteção Social;
- Reunião Inter setorial para discussão de fluxos e protocolos com MPMG/CAO-DH, Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação;
- Reunião de apresentação do Programa de Proteção Social para Secretaria Estadual de Assistência Social do Espírito Santo;
- Reunião de apresentação do Programa de Proteção Social para Câmara Técnica de Organização Social.



EM BRANCO




# PG06 – Diálogo social Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 224,5 Realizado: 15

Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72)</b>		nov/15	dez/30
<b>Metas do Programa</b>		dez/16	abr/17
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO		dez/16	dez/16
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria		abr/17	abr/17
<b>Definição do Programa</b>		out/16	nov/16
PF7060 - Definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social		out/16	nov/16
<b>Execução do Programa</b>		nov/15	dez/30
<b>Processos</b>		nov/15	dez/30
PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional		nov/15	jun/17
PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo		jul/16	mar/17
PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento		jul/16	jul/17
PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO		nov/15	abr/17
PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional		jun/17	dez/30
PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo		mar/17	dez/30
PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento		jul/17	dez/30
PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO		abr/17	dez/30
<b>Projetos</b>		mai/16	abr/17
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO		mai/16	abr/17
Diagnóstico do processo de ouvidoria		jul/16	nov/16
Implantação e adequação do processo de ouvidoria		nov/16	abr/17
Encerramento do Projeto		abr/17	abr/17
PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento		mai/16	mar/17
Reestruturação da Gestão do Processo	100%	mai/16	jul/16
Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo	16%	mai/16	fev/17
Reestruturação do Sistema	74%	mai/16	dez/16
Encerramento do Projeto		fev/17	mar/17
<b>Encerramento do Programa</b>		out/30	dez/30
PF9060 - Encerramento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (captura e formalização de benefícios)		out/30	dez/30



EMBRANCO



# PG06 – Diálogo social

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Diálogo - Contratação de fornecedor em MG - Suprimentos (Call Center 2017)	31/out	31/out
Ouvidoria - Emissão de relatório trimestral	04/nov	07/nov

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Manifestações registradas	NA	48.054	NA
Manifestações concluídas	NA	27.308	NA
Reuniões – trecho 1	NA	393	NA
Reuniões – trecho Rio Doce	NA	314	NA
Postos de atendimento	3	3	14

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Canais de Relacionamento :


- Postos de Atendimentos: 8 escritórios em fase final de contratação. 1 em análise de documentação.
- Foram registradas 8.890 manifestações no mês de outubro.
- Foram concluídas 4.904 manifestações no mês de outubro.

#### Ouvidoria:

- Foram registradas desde o dia do acidente 740 denúncias, sendo 80 no mês de outubro.

#### Comunicação:

- Rodada de visitas às redações dos principais veículos de imprensa nacional, de Minas Gerais e do Espírito Santo.
- Realização de entrevistas coletivas sobre o PIM nos municípios de Governador Valadares e Colatina.
- Realização de entrevistas coletivas sobre o anúncio da obra da adutora em Governador de Valadares.
- Elaboração e disseminação, para públicos diversos, de materiais sobre os principais programas e ações em andamento, como PIM, cadastro e Plano para o período chuvoso. Tais conteúdos suportaram e continuam suportando reuniões e eventos específicos sobre cada assunto.
- Início da atuação da Fundação Renova no Google Plus.



EMBRANCO

# PG06 – Diálogo social

## Acompanhamento




### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Diálogo – Trecho 1:

- 4 municípios de MG (Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Sta. Cruz do Esc.)
- Reuniões de diálogo: total de 29 reuniões em outubro, com 709 presenças.
  - Mariana: 15 reuniões e 361 presenças
  - Barra Longa: 13 reuniões e 306 presenças
  - Rio Doce/Santa Cruz: 1 reunião e 42 presenças
- Mapeamento/ Monitoramento de stakeholders.
- Plano de Cheias/período chuvoso: 11 reuniões realizadas em Mariana e Barra Longa, contando com a presença de 420 moradores (66% dos mobilizados). Foram ainda realizadas 937 interlocuções face-a-face, nos quatro municípios, para mobilizar a população para os Simulados, além de complementar e qualificar as informações fornecidas durante as Reuniões Coletivas no que se refere aos riscos para o período chuvoso.

#### Diálogo – Trecho Rio Doce:

- Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio Doce:
  - 42 reuniões (1496 participantes).
- Mapeamento/ Monitoramento de stakeholders.
- Atividades de análise territorial estratégica para apoio à implementação dos programas da Fundação Renova.
- Ampliação do diálogo com as comunidades impactadas nos municípios de MG e ES, por meio de reuniões e atendimentos individualizados/ visitas.



EMBRANCO




# PG06 – Diálogo social

## Fotos



### Diálogo Social – Trecho 1

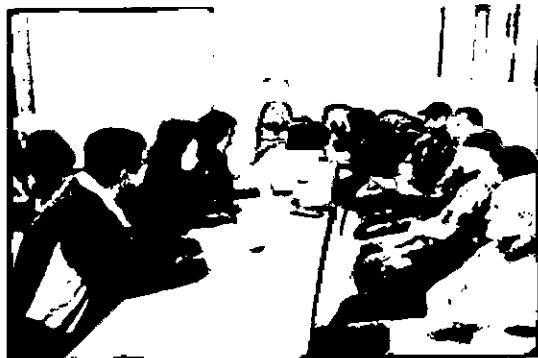

Reunião de diálogo com Comissão de Bento Rodrigues – Mariana/ MG (4/10)



Reunião de diálogo - Devolutiva levantamento de expectativas e preparativos para a Festa de NS Aparecida, com comunidade de Paracatu – Mariana/ MG (5/10)



Reunião de diálogo com moradores da comunidade de Pedras – Mariana/ MG (19/10) | Plano de Cheias




Reunião de diálogo com moradores da comunidade de Gesteira – Barra Longa/ MG (20/10) | Plano de Cheias



Reunião de diálogo com representantes do Poder Público local – Barra Longa/ MG (28/10) | Plano de Cheias



Reunião de diálogo com moradores da comunidade de Gesteira – Barra Longa/ MG (20/10) | Plano de Cheias



EMBRANCO



# PG06 – Diálogo social


## Fotos




### Diálogo Social – Trecho Rio Doce



Reunião de diálogo com grupo de pescadores – Aimorés/ MG

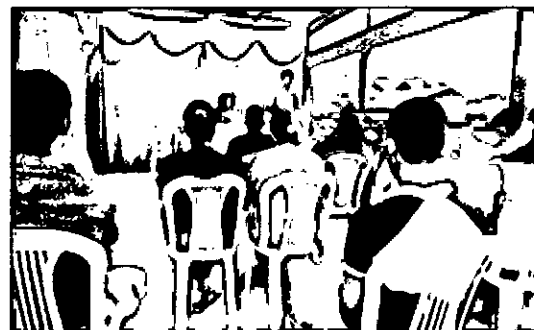

Reunião de diálogo sobre a Fundação e os Programas – Cachoeira Escura, Belo Oriente/ MG

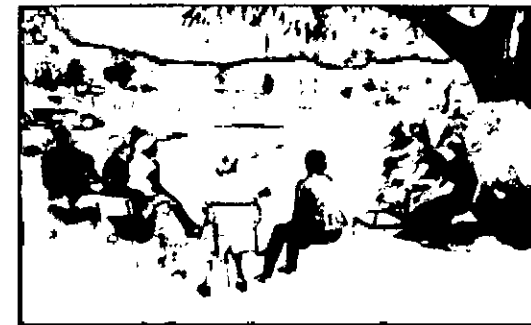


Reunião para apresentação do Plano de Contingência do período chuvoso – Rio Casca/ MG



Reunião de devolutiva sobre Matriz de Danos do PIM com grupo de comerciantes - ES



Reunião para apresentação do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – Aracruz/ ES



EMBRANCO




# PG07 – Assistência aos animais

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 16,4	Realizado: 10,2
Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)</b>			
Metas do Programa		mar/16	ago/19
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais		mai/19	mai/19
Definição do Programa		set/16	out/16
PF7070 - Definição do Programa de Assistência aos Animais		set/16	out/16
Execução do Programa		mar/16	mai/19
Processos		mar/16	mai/19
PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)		mar/16	mai/19
Encerramento do Programa		mai/19	ago/19
PF9070 - Encerramento do Programa de Assistência aos Animais (captura e formalização de benefícios)		mai/19	ago/19



EMBRANCO



# PG07 – Assistência aos animais

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Animais resgatados (#)	NA	955	NA
Animais destinados (#)	NA	530	NA

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Resgate de 06 animais em Barra Longa e Germano.
- Devolução de 02 animais de pequeno e grande porte aos tutores.
- Negociação de extensão de contrato da Faz. Bom Retiro.
- Atualização de cadastros de animais no IMA
- Transferência de animais de propriedade rural para Fazenda Bom Retiro.
- Conclusão de acompanhamento de pós adoção de 62 animais.



EMBRANCO




# PG08 – Reconstrução de vilas

## Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 322,5 Realizado: 19,8

Tarefa	% Real.	Início	Término
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)		nov/15	mar/22
<b>Metas do Programa</b>		mar/19	jun/19
Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas		mar/19	mar/19
Cláusula 77) - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas)		jun/19	jun/19
<b>Definição do Programa</b>		set/16	out/16
PF7080 - Definição do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira		set/16	out/16
<b>Execução do Programa</b>		nov/15	mar/22
<b>Projetos</b>		nov/15	mai/19
<b>PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues</b>		nov/15	mai/19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov/15	mai/16
Definição do Escopo		mai/16	ago/17
Planejamento da Execução		jan/17	dez/17
Execução do Projeto		set/16	mar/19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar/19	mai/19
<b>PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo</b>		nov/15	mai/19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov/15	ago/16
Definição do Escopo		set/16	ago/17
Planejamento da Execução		jan/17	dez/17
Execução do Projeto		jun/17	mar/19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar/19	mai/19
<b>PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira</b>		jun/16	mar/18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	12%	jun/16	out/17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev/17	nov/17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		jun/17	mar/18
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		dez/17	mar/18




EMBRANCO



# PG08 – Reconstrução de vilas Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
PF0049 - Reconstrução da escola de Gesteira		fev/16	jan/17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola	100%	fev/16	jul/16
Execução das obras de reconstrução da escola	55%	jul/16	nov/16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola		nov/16	jan/17
<b>Processos</b>		nov/15	mar/22
PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	jun/19
PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	jun/19
PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	abr/18
PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar/19	mar/22
PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar/18	mar/21
PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		mar/18	mar/21
<b>Encerramento do Programa</b>		dez/21	mar/22
PF9080 - Encerramento do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (captura e formalização de benefícios)		dez/21	mar/22



EMBRANCO



# PG08 – Reconstrução de vilas

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Levantamentos de campo na localidade de Nova Paracatú de Baixo	19/out	26/dez
Levantamentos de campo na localidade de Gesteira	18/ago	14/nov
Aprovação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade	30/set	26/nov
Aprovação do Projeto Urbanístico de Paracatu de Baixo junto à Comunidade	30/dez	30/dez
Aprovação do Projeto Urbanístico de Gesteira junto à Comunidade	03/nov	28/nov
Início do Cadastro de Campo em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo	20/out	03/jan
Conclusão da Execução da Escola	31/out	Concluído

### MÉTRICAS


Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Concluída mobilização de profissionais pela CÂRITAS, para assessoria técnica aos atingidos, priorizando início do cadastro físico, socioeconômico e fundiário, bem como aprovação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues.
- Contratada empresa responsável pela engenharia básica e detalhada do loteamento das novas vilas; mobilização em andamento (Leme Engenharia).
- Concluída aquisição da área da Lavoura junto à ARCELOR MITTAL, para reassentamento da Comunidade de Bento Rodrigues.
- Em andamento estudos de impacto ambiental no terreno para reassentamento de Bento Rodrigues (protocolos no IEF e IPHAN).
- Iniciados estudos para engenharia (topografia e sondagem) no terreno para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo.
- Realizado Levantamento de Expectativas para Casas e Vila junto à Comunidade de Paracatu de Baixo; iniciada elaboração do Projeto Urbanístico.
- Em andamento negociação com proprietário da área para reassentamento da Comunidade de Gesteira, para consolidação do Projeto Urbanístico.
- Em fase final de construção da Escola de Gesteira. Mobília, Revitalização da Praça e Quadra Poliesportiva a ser concluída até 18/11.
- Participação de 67% das famílias (96/143) no processo de levantamento de expectativas junto à Comunidade de Paracatu de Baixo; baixa aderência da comunidade (23%) no processo de validação. Novas rodadas serão programadas.



EMBRANCO




# PG08 – Reconstrução de vilas

## Fotos



Construção da escola de Gesteira



EMBRANCO



## PROGRAMA SOB RESPONSABILIDADE DA SAMARCO




O programa *PG09 – Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves* apresentado a seguir está sob responsabilidade e permanecerá sendo executado pela Samarco até a conclusão da primeira fase.

Dessa forma a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude das informações apresentadas.

A sua presença neste documento é apenas de caráter informativo.

A Fundação assumirá a responsabilidade pelo seu desenvolvimento a partir da conclusão da primeira fase do programa.



EMBRANCO




# PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 261,3	Realizado: 112,6		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81)		nov/15	out/18	
Metas do Programa		abr/18	abr/18	
Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)		abr/18	abr/18	
Definição do Programa		out/16	nov/16	
PF7090 - Definição do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves		out/16	nov/16	
Execução do Programa		nov/15	jul/18	
Projetos		nov/15	jul/18	
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)		nov/15	jul/18	
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	42%	nov/15	jun/17	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	0%	abr/18	jul/18	
Encerramento do Programa		jul/18	out/18	
PF9090 - Encerramento do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (captura e formalização de benefícios)		jul/18	out/18	



EMBRANCO



# PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da engenharia detalhada para bombeamento direto para Fazenda Floresta	03/out	11/nov
Conclusão da engenharia detalhada para disposição na pilha externa do Velho Soberbo	15/set	11/nov

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Volume dragado - trecho de 400m (mil m3)	445,8	480,9	1300
Barreira metálica B (à 5 km) (t)	215	185	685

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Concluídos a engenharia básica e os estudos de viabilidade para encapsulamento de sedimentos à jusante do Dique 4A. Em processo de contratação dos serviços de execução desta atividade. Capacidade estimada de armazenamento de 250 mil m<sup>3</sup>
- Alterada a engenharia do dique do Setor 8 com otimizações considerando a execução da Barreira Metálica C
- Em elaboração do estudo de remanso e investigações geotécnicas para engenharia da Barreira Metálica C
- Dragagem operando com novos gatilhos de turbidez
- Emitido o plano diretor da Fazenda Floresta
- Barreira Metálica B com 42,8% de avanço na cravação mantendo o prazo de termino para 17/12/2016
- Definida a construção de mais uma barreira metálica dentro do reservatório (Barreira C) ampliando a capacidade de retenção de sedimentos à montante em mais 2,8 milhões de m<sup>3</sup>
- 508mil m<sup>3</sup> dragados dos 400m em 08/11/2016




EMBRANCO



# PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

## Fotos



EMBRANCO

# PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves


Fotos




Barreira Metálica B




Setor 4A

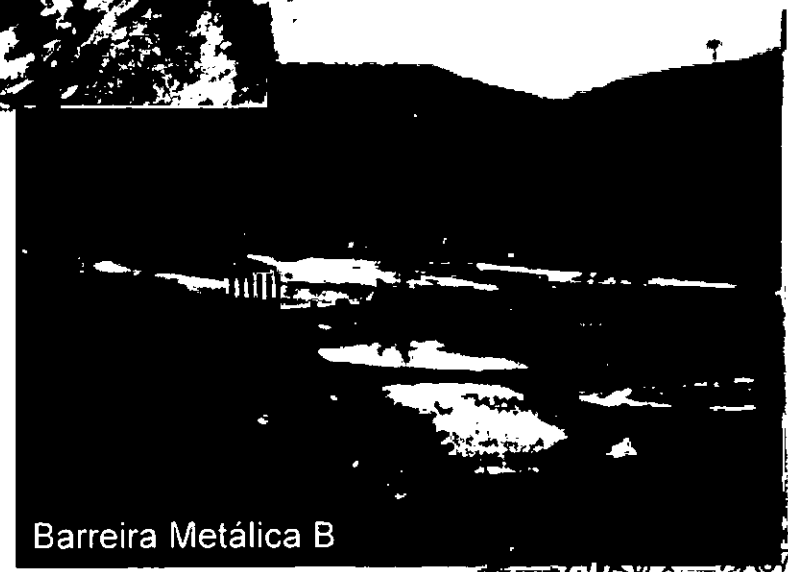


Barreira Metálica B



EMBRANCO



**PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves**  
**Fotos**



**Diagragem 400m**




EMBRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 293,1 Realizado: 197,4

Tarefa	% Real.	Início	Término
PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)		nov/15	fev/19
Metas do Programa		mar/16	ago/18
Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura	100%	mar/16	mar/16
Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das Infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do ACORDO)		ago/18	ago/18
Definição do Programa		set/16	out/16
PF7100 - Definição do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga		set/16	out/16
Execução do Programa		nov/15	nov/18
Projetos		nov/15	nov/18
PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa		nov/15	jan/17
Execução do Projeto	99%	nov/15	out/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out/16	jan/17
PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa		nov/15	jun/17
Execução do Projeto	92%	nov/15	mar/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mar/17	jun/17
PF0034 - Contêncões Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho	100%	jan/16	ago/16
Execução do Projeto	100%	jan/16	mai/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	100%	mai/16	ago/16
PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa		fev/16	nov/16
Execução do Projeto	100%	fev/16	ago/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	70%	ago/16	nov/16
PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP		jun/16	nov/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	73%	jun/16	nov/16
PF0037 - Reforma e Limpeza		jan/16	dez/16
Execução do Projeto	100%	jan/16	set/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/16	dez/16



EMBRANCO




# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados</b>		nov/15	nov/16
Execução do Projeto	100%	nov/15	jun/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	43%	ago/16	nov/16
<b>PF0042 - Reconstrução de pontes</b>		nov/15	nov/16
Execução do Projeto	100%	nov/15	jan/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	40%	ago/16	nov/16
<b>PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias</b>		fev/16	nov/16
Execução do Projeto	100%	fev/16	jun/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	33%	ago/16	nov/16
<b>PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos</b>		fev/16	jan/17
Execução do Projeto	85%	fev/16	out/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov/16	jan/17
<b>PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço</b>		nov/15	nov/16
Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço	100%	nov/15	ago/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	44%	ago/16	nov/16
<b>PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais</b>		jul/16	nov/18
Planejamento da Execução	85%	jul/16	dez/16
Execução do Projeto		dez/16	ago/18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago/18	nov/18
<b>PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados</b>		mai/16	abr/17
Execução do Projeto	81%	mai/16	jan/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan/17	abr/17
<b>PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Belra Rio</b>		jan/16	mar/17
Planejamento da Execução	100%	jan/16	jun/16
Execução do Projeto	97%	mai/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17




EM BRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas


## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo</b>		mar/16	abr/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jun/16
Execução do Projeto	79%	ago/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan/17	abr/17
<b>PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira</b>		mar/16	mar/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	69%	abr/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
<b>PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira</b>		mar/16	out/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	22%	mai/16	jul/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul/17	out/17
<b>PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição</b>		abr/16	mar/18
Planejamento da Execução	100%	abr/16	ago/16
Execução do Projeto	16%	ago/16	dez/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/17	mar/18
<b>PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa</b>		mar/16	mar/17
Execução do Projeto	81%	mar/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
<b>PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa</b>		jul/16	mar/17
Planejamento da Execução	100%	jul/16	jul/16
Execução do Projeto	95%	ago/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
<b>PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1</b>		jun/16	mar/17
Execução do Projeto	52%	jun/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17




EMBRANCO



# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol</b>		Jan/17	Jan/18
Avaliação de Alternativas		Jan/17	abr/17
Definição do Escopo		abr/17	mai/17
Planejamento da Execução		mai/17	Jul/17
Execução do Projeto		Jul/17	out/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out/17	Jan/18
<b>PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues</b>		ago/16	Jan/18
Definição do Escopo	93%	ago/16	set/16
Planejamento da Execução		set/16	dez/16
Execução do Projeto		dez/16	set/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/17	Jan/18
<b>PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo</b>		ago/16	mar/18
Avaliação de Alternativas	41%	ago/16	nov/16
Definição do Escopo		nov/16	Jan/17
Planejamento da Execução		Jan/17	mar/17
Execução do Projeto		mar/17	nov/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov/17	mar/18
<b>PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2</b>		Jan/17	Jan/18
Planejamento da Execução		Jan/17	mar/17
Execução do Projeto		mar/17	set/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/17	Jan/18
<b>Processos</b>		mai/16	out/17
<b>PF8100 - Processos de Manutenção de Vias, aspersão e controle ambiental</b>	37%	mai/16	out/17
<b>Encerramento do Programa</b>		nov/18	fev/19
<b>PF9100 - Encerramento do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (captura e formalização de benefícios)</b>		nov/18	fev/19



EMBRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Acompanhamento




### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da reforma de Residências em Barra Longa	31/out	20/dez
Conclusão das Obras de Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, BL e seus respectivos distritos afetados	02/jan	02/jan

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Casas reformadas em Barra Longa (#)	95	95	99
Comércios reformados em Barra Longa (#)	31	31	36
Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (km)	1,1	1,1	1,1
Material removido em Barra Longa (mil m3)	157	157	157
Cercamento de propriedade (acordo com MP) (km)	100	105	100
Propriedades rurais reformadas e limpas (#)	28	28	39
Estradas pavimentadas recuperadas (km)	107,5	100,3	107,5
Estradas não pavimentadas recuperadas (km)	110	110	110
Pontes reconstruídas (#)	7	7	7
Drenagens de estradas e vias recuperadas (#)	102	102	102
Bordas de rios e enrocamentos recuperados (#)	47	47	51
Recuperação da praça e alameda Beira Rio em Barra Longa (#)	2	0	2
Maciços estabilizados em Barra Longa (km)	0,8	0,8	1,2
Quintais e lotes reformados de Barra Longa (#)	70	72	188
Casas reconstruídas em Barra Longa (#)	11	0	13
Reconstrução do parque de exposição e campo dos rodoviários (#)	1	0	2
Currais reconstruídos em Barra Longa (#)	16	16	21
Mata burros reconstruídos em Barra Longa (#)	9	9	18
Pavimentação reconstruída em Barra Longa (km)	2,1	2,1	2,5
Madeira recolhida - fase 1 (km)	80,8	44,5	80,8
Pontes de cabo de aço reconstruídas (#)	9	9	9
Campos de futebol reconstruídos (#)	4	1	4



EMBRANCO



# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas


## Acompanhamento



### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Barra Longa

- 2 casas reformadas em outubro: devido à paralisação por parte de moradores, houve desvio na obra e a mesma encontra-se na fase de acabamento, conclusão prevista para 20/12
- 1 comércio reformado
- Trincas em Imóveis - Sendo realizados levantamentos, cronograma e orçamento.
- Resposta Ofício DER – manutenção contínua na estrada de terra conforme acordado anteriormente (27km entre Ponte Nova x Barra Longa)
- Entrega da praça Manoel Lino Mol em 30 de outubro.

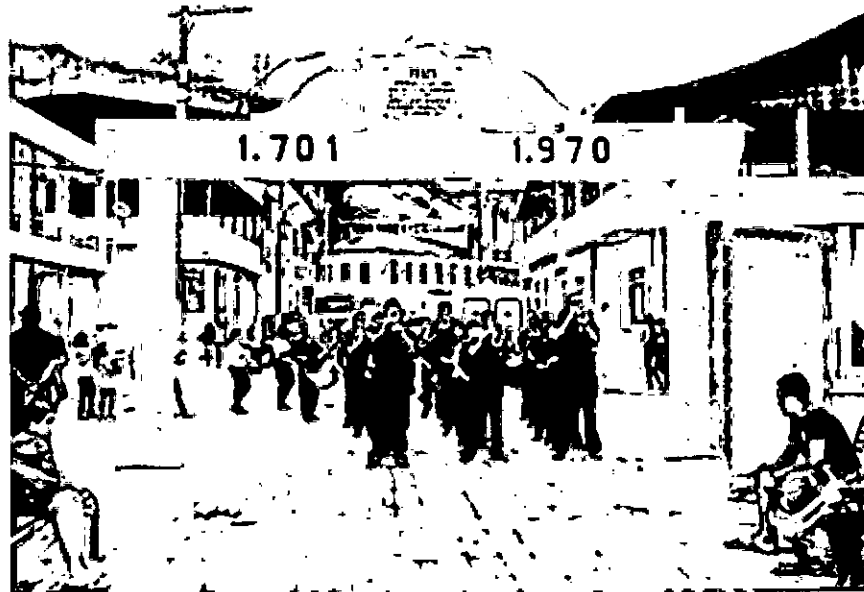

Praça Manoel Lino Mol


EMBRANCO



# PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 9,7	Realizado: 0,3		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
<b>PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 à 94)</b>				
<b>Metas do Programa</b>				
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira		fev/17	mar/19	
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu		fev/17	fev/17	
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues		mar/19	mar/19	
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa		mar/19	mar/19	
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa		dez/17	dez/17	
<b>Definição do Programa</b>				
PF7110 - Definição do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar		out/16	nov/16	
<b>Execução do Programa</b>				
<b>Projetos</b>				
PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira	0%	jan/16	jun/19	
Planejamento da Execução	0%	out/16	mai/17	
Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira		nov/16	dez/16	
Encerramento do Projeto		nov/16	fev/17	
PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu		fev/17	mai/17	
Planejamento da Execução		set/18	mai/19	
Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu		set/18	out/18	
Encerramento do Projeto		out/18	mar/19	
PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues		mar/19	mai/19	
Planejamento da Execução		ago/18	jun/19	
Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues		ago/18	set/18	
Encerramento do Projeto		set/18	mar/19	
PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa	0%	mar/19	jun/19	
Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010)		jan/16	mar/18	
Encerramento do Projeto		jan/16	mar/18	
<b>Processos</b>				
PF8110 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas	16%	jan/16	mar/21	
<b>Encerramento do Programa</b>				
PF9110 - Encerramento do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (captura e formalização de benefícios)		mar/21	jun/21	



EMBRANCO



# PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

### MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Meta

Alunos relocados em escolas temporárias




900

900

900

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Apoio para realização do projeto "Bento Rodrigues: Nossa história Nossa Vida" realizado pela Escola Municipal de Bento Rodrigues.
- Reunião com Diretora da Escola de Paracatu de Baixo para planejamento do imóvel cedido para a escola de tempo integral.
- 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e seguem o calendário regular de 2016



Modelo de calendário produzido para o Projeto "Bento Rodrigues Nossa História Nossa Vida"

## Convite


A Escola Municipal Bento Rodrigues tem o prazer de convidá-lo (a) para a exposição do "Projeto Bento Rodrigues: Nossa história, nossa vida". Trabalho resultante de um resgate das memórias do distrito feito pelos alunos, professores e equipe pedagógica da escola.

Local: Centro de Convenções  
Horário: 12h 30  
Data: 05 de novembro de 2016

"Ah, Bento Rodrigues! Quanta saudade!"



Arte do convite produzido para o Projeto "Bento Rodrigues Nossa História Nossa Vida"



EMBRANCO




# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 34,8	Realizado: 6,6
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95 à 100)			
Metas do Programa			
Cláusula 100 - Conclusão da recuperação dos bens materiais e imateriais		fev/16	mai/21
		set/19	set/19
Definição do Programa			
PF7120 - Definição do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística		mai/16	jul/17
Execução do Programa			
Processos			
PF8120 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais	40%	fev/16	jul/17
PF8121 - Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (3 anos para conclusão das ações referentes aos bens materiais e imateriais + 2 anos de monitoramento)		set/17	mar/21
Encerramento do Programa			
PF9120 - Encerramento do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (captura e formalização de benefícios)		mar/21	mai/21



EMBRANCO
