


# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 313,6 Realizado: 223,2

Tarefa	% Real.	Início	Término
PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)		nov-15	ago-18
Metas do Programa		mar-16	ago-18
Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do ACORDO)		ago-18	ago-18
Definição do Programa		set-16	out-16
Execução do Programa		nov-15	ago-18
Projetos		nov-15	ago-18
PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa		nov-15	mar-17
Execução do Projeto	99%	nov-15	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17
PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa		nov-15	mai-17
Execução do Projeto	90%	nov-15	fev-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		fev-17	mai-17
PF0177 - Recuperação do Hotel de Barra Longa		jan-17	jan-18
Execução do Projeto		jan-17	out-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out-17	jan-18
PF0034 - Contêncões Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho	100%	jan-16	ago-16
Execução do Projeto	100%	jan-16	mai-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	100%	mai-16	ago-16
PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa		fev-16	nov-16
Execução do Projeto	100%	fev-16	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	98%	ago-16	nov-16
PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP		jun-16	nov-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	73%	jun-16	nov-16
PF0037 - Reforma e Limpeza		jan-16	fev-17
Execução do Projeto	100%	jan-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-16	fev-17




EMBRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados</b>		nov-15	jan-17
Execução do Projeto	100%	nov-15	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	43%	ago-16	jan-17
<b>PF0042 - Reconstrução de pontes</b>		nov-15	jan-17
Execução do Projeto	100%	nov-15	jan-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	40%	ago-16	jan-17
<b>PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias</b>		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	100%	fev-16	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	33%	ago-16	jan-17
<b>PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos</b>		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	100%	fev-16	out-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-16	jan-17
<b>PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço</b>		nov-15	nov-16
Execução da Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço	100%	nov-15	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	44%	ago-16	nov-16
<b>PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais</b>		jul-16	ago-18
Planejamento da Execução	90%	jul-16	jan-17
Execução do Projeto	1%	jan-17	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jun-18	ago-18
<b>PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados</b>		mai-16	abr-17
Execução do Projeto	87%	mai-16	jan-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	abr-17
<b>PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio</b>		jan-16	mar-17
Planejamento da Execução	100%	jan-16	jun-16
Execução do Projeto	100%	mai-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17




EM BRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo</b>		mar-16	abr-17
Planejamento da Execução			
Execução do Projeto	100%	mar-16	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	97%	ago-16	dez-16
<b>PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira</b>		mar-16	ago-17
Planejamento da Execução			
Execução do Projeto	100%	mar-16	jul-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	72%	abr-16	mai-17
<b>PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira</b>		mar-16	out-17
Planejamento da Execução			
Execução do Projeto	100%	mar-16	jul-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31%	mai-16	jul-17
<b>PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição</b>		abr-16	jul-18
Planejamento da Execução			
Execução do Projeto	100%	abr-16	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	18%	ago-16	jul-18
<b>PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa</b>		mar-16	mar-17
Execução do Projeto			
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	86%	mar-16	dez-16
<b>PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa</b>		jul-16	mar-17
Planejamento da Execução			
Execução do Projeto	100%	jul-16	jul-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	99%	ago-16	dez-16
<b>PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1</b>		jun-16	mar-17
Execução do Projeto			
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	55%	jun-16	dez-16




EMBRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol</b>		jan-17	ago-18
Avaliação de Alternativas	40%	jan-17	abr-17
Definição do Escopo		abr-17	mai-17
Planejamento da Execução		mai-17	jul-17
Execução do Projeto	25%	jul-17	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mai-18	ago-18
<b>PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues</b>		ago-16	jan-18
Definição do Escopo	93%	ago-16	set-16
Planejamento da Execução		set-16	dez-16
Execução do Projeto		dez-16	set-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-17	jan-18
<b>PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo</b>		ago-16	mar-18
Avaliação de Alternativas	41%	ago-16	nov-16
Definição do Escopo		nov-16	jan-17
Planejamento da Execução		jan-17	mar-17
Execução do Projeto		mar-17	nov-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-17	mar-18
<b>PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2</b>		jan-17	jan-18
Planejamento da Execução		jan-17	mar-17
Execução do Projeto		mar-17	set-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-17	jan-18
<b>Processos</b>		mai-16	ago-18
PF8100 - Processos de Manutenção de vias e controle de emissão de particulados	38%	mai-16	ago-18
PF8101 - Processo de Reparação às edificações impactadas pelas obras de recuperação e reforma	1%	nov-16	dez-17
<b>Encerramento do Programa</b>		jun-18	ago-18
PF9100 - Encerramento do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (captura e formalização de benefícios)		jun-18	ago-18



EMBRANCO

# PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Acompanhamento




### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da reforma de residências em Barra Longa	31/out	20/dez
Conclusão das obras de recuperação de estradas pavimentadas em Mariana e BL	02/jan	02/jan
Conclusão das obras de reconstrução de pontes	26/jan	26/jan

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Casas reformadas em Barra Longa (#)	95	95	99
Comércios reformados em Barra Longa (#)	36	34	36
Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (km)	1,1	1,1	1,1
Material removido em Barra Longa (mil m3)	157	157	157
Cercamento de propriedades (acordo com MP) (km)	100	105	100
Propriedades rurais reformadas e limpas (#)	33	33	45
Estradas pavimentadas recuperadas (km)	80	80	80
Estradas não pavimentadas recuperadas (km)	110	110	110
Pontes reconstruídas (#)	7	7	7
Drenagens de estradas e vias recuperadas (#)	102	102	102
Bordas de rios e enrocamentos recuperados (#)	47	47	47
Recuperação da praça e alameda Beira Rio em Barra Longa (#)	2	2	2
Maçãos estabilizados em Barra Longa (km)	1,2	1,2	1,2
Quintais e lotes reformados de Barra Longa (#)	88	88	197
Casas reconstruídas em Barra Longa (#)	11	1	13
Reconstrução do parque de exposição e campo dos rodoviários (#)	1	0	2
Currais reconstruídos em Barra Longa (#)	16	16	21
Mata burros reconstruídos em Barra Longa (#)	13	13	18
Pavimentação reconstruída em Barra Longa (km)	2,5	2,5	2,5
Madeira recolhida fase1 e fase2 - (km)	80,8	44,5	80,8
Pontes de cabo de aço reconstruídas (#)	9	9	9
Campos de futebol reconstruídos (#)	3	3	



EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Acompanhamento



### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/16 E OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


#### Barra Longa

##### Entregas do mês

- Finalização da recuperação do Campo Barralenguense;
- Entrega de currais e quintais;
- Entrega de casas reformadas.

##### Próximas entregas

- Entrega da casa 199 – Boate Kiss;
- Entrega da casa 140;
- Término de algumas casas em fase de acabamento;
- Término de casa no Morro Vermelho.







EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Fotos



### Campo Barralenguense

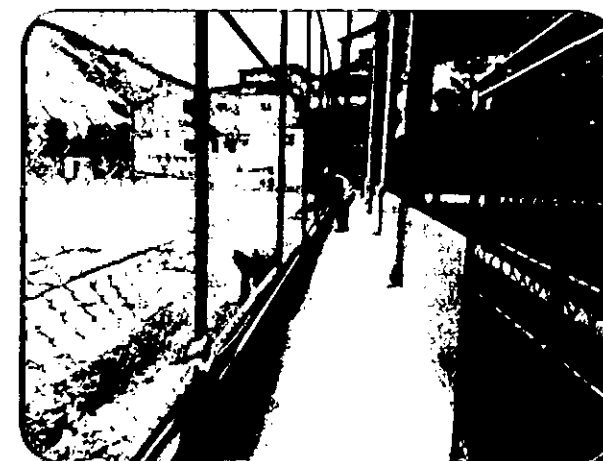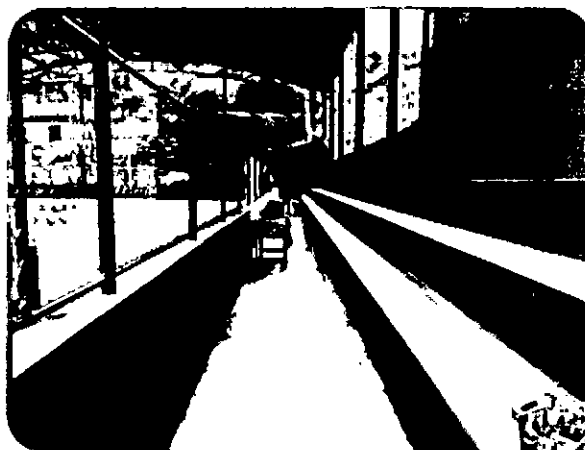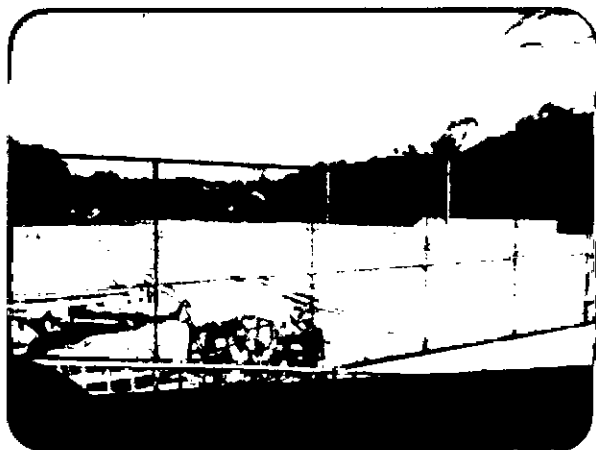


EM BRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Fotos



### Recuperação de currais e quintais



EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Fotos



### Recuperação de currais e quintais




EM BRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas


## Fotos



### Reforma e reconstrução de residências e comércios

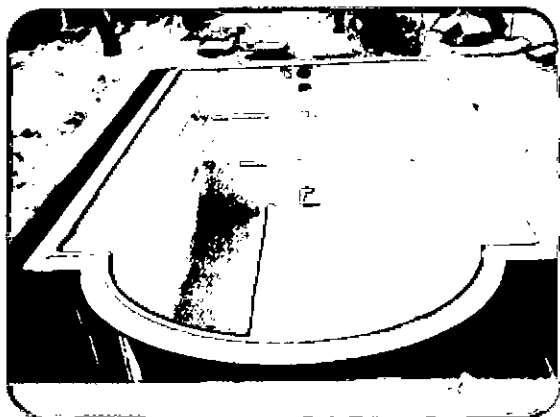

EM FASE DE CONCLUSÃO

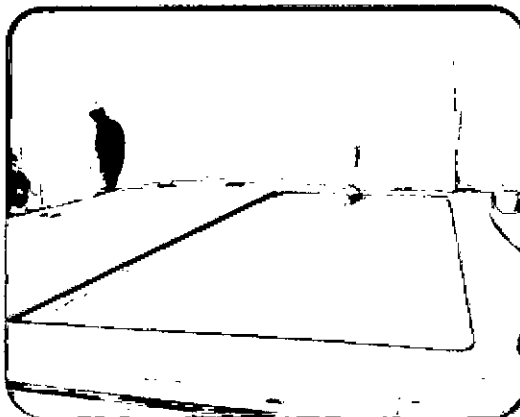


ÁGUA USADA PARA MANUTENÇÃO DA FIBRA.  
AGUARDANDO TRATAMENTO



EM FASE DE CONCLUSÃO



EM FASE DE CONCLUSÃO




EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Fotos



### Recuperação de acessos com asfalto



EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Acompanhamento



### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


#### Mariana

##### Entregas realizadas

- Foram realizadas sondagens das 3 primeiras casas que devem ser construídas (Arlindo, Márcio e Waldir);
- Realizadas a topografia das 3 casas;
- Construção de Curral Sr. José Celestino (Paracatu de Cima);
- Instalação de piso do Centro comunitário de Ponte do Gama;
- Entrega da reforma da casa de Maria da Conceição Ramos (Borba);
- Reconstrução de mata burro de acesso Paracatu de Cima x Ponte do Gama;
- Início de reconstrução do curral de Jadir Arantes (Ponte do Gama);
- Início da reconstrução do curral de José Conceição (Paracatu de Cima);
- Reforma do telhado do posto de saúde de Mariana (UBS);
- Desenvolvimento da Engenharia das 3 primeiras casas a serem reconstruídas;
- Entrega da "Academia Popular Comunitário" em Ponte do Gama;
- Entrega de parque comunitário em Ponte do Gama;
- Entrega de Piso da Capela em Ponte do Gama.
- Instalação de contêiner temporário para substituir paiol de Francisca Justina (Barretos);
- Calçamento em Campinas.

##### Próximas entregas:


- Entrega dos plátanos das 3 casas que devem ser reconstruídos;
- Liberação de licenças para construções das 3 casas;
- Entrega de curral Jadir Arantes (Ponte do Gama);
- Entrega de curral José Conceição (Paracatu de Cima).



EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas


## Fotos




Piso do Centro Comunitário




Curral José Celestino  
Paracatu de Cima

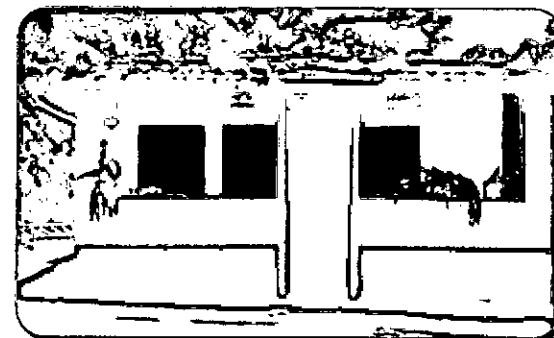

Reforma Maria da Conceição  
Ramos - Borba

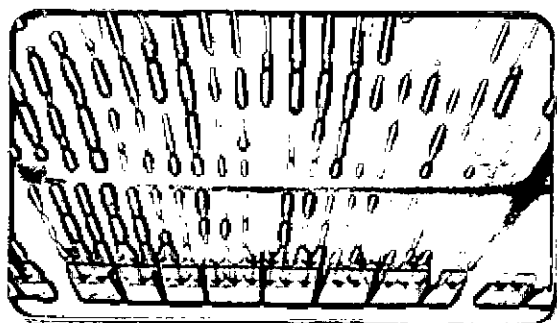


Reforma Posto de saúde de  
Mariana (UBS)

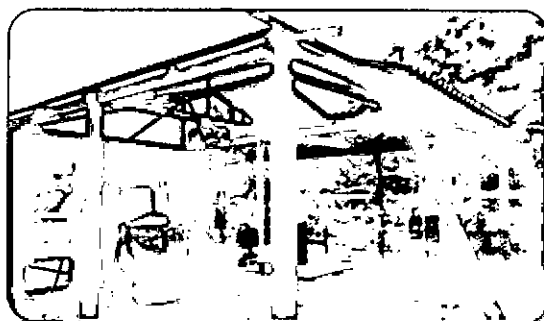

Curral Jardir Arantes  
Ponte do Gama



Entrega de Piso da Capela  
Ponte do Gama



EMBRANCO

# PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

## Fotos



Instalação de Container  
Francisca Justina - Barretos



Sondagem Waldir  
Paracatu de Baixo




Sondagem José Arlindo  
Paracatu de Cima



Sondagem Márcio  
Ponte do Gama



Calçamento em Campinas




EMBRANCO

# PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar Masterplan



Orcamento (R\$MM)	Total: 9	Realizado: 0,3			
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 à 94)					
<b>Metas do Programa</b>					
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira				fev-17	mar-19
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu				fev-17	fev-17
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues				mar-19	mar-19
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa				mar-19	mar-19
Cláusula 89 - Conclusão da Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa				fev-18	fev-18
<b>Definição do Programa</b>					
Execução do Programa				dez-16	fev-17
<b>Execução do Programa</b>					
<b>Projetos</b>					
PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira			0%	jan-16	mai-19
Execução da Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira				out-16	mai-17
Encerramento do Projeto				nov-16	fev-17
PF0084 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu				fev-17	mai-17
Execução da Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu				set-18	mai-19
Encerramento do Projeto				out-18	mar-19
PF0085 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues				mar-19	mai-19
Execução da Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues				ago-18	mai-19
Encerramento do Projeto				set-18	mar-19
PF0086 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa			0%	jan-16	mai-18
Execução da Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010)				jan-16	fev-18
Encerramento do Projeto				fev-18	mai-18
<b>Processos</b>					
PF8110 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas			16%	jan-16	mar-21
Encerramento do Programa				jan-16	mar-21
PF9110 - Encerramento do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (captura e formalização de benefícios)				mar-21	mai-21



EMBRANCO

# PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

### MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Total

Alunos relocados em escolas temporárias


900

900

900

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Elaboração do TR para contratação de consultoria em psicopedagogia em conjunto com as secretarias de educação de Mariana e Barra Longa.
- Apoio para realização das formaturas de Bento Rodrigues e Paracatu.
- Visita técnica com representantes da Prefeitura para definição de melhorias na infraestrutura da escola temporária de Paracatu.
- Visita técnica no imóvel identificado para alocar a escola temporária de Bento Rodrigues.
- Planejamento de atividades de férias para alunos de Bento Rodrigues e Paracatu.
- Entrega da escola Gustavo Capanema - Gesteira / Barra Longa.
- Realização da programação de férias "Conexão Férias" em Mariana e Barra Longa.
- Obras de melhoria da infraestrutura da escola temporária de Paracatu de Baixo.
- Adequações e preparação da nova escola temporária de Bento Rodrigues.
- Contratação de empresa para apoio psicopedagógico às escolas de Mariana e Barra Longa
- Permanência dos alunos de Bento Rodrigues e Paracatu nas respectivas escolas temporárias com manutenção dos vínculos originais de convivência.



EM BRANCO

# PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar

## Fotos



Formatura Educação Infantil Escola Municipal Bento Rodrigues



Formatura Educação Infantil Escola Municipal Paracatu de Baixo



Formatura Ensino Médio Escola Municipal Paracatu de baixo



Visita técnica com Sec. Obras escola temporária de Paracatu




Escola Municipal Gustavo Capanema – Gesteira/Barra Longa



inscreva-se. A. Vagas limitas.

Divulgação atividades de férias




EM BRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 30,0	Realizado: 10,5
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95 à 100)			
Metas do Programa		mar-20	mar-20
Cláusula 100 - Conclusão da recuperação dos bens materiais e imateriais		mar-20	mar-20
Definição do Programa		mai-16	jul-17
Execução do Programa		fev-16	dez-21
Processos		fev-16	dez-21
Marcos do Processo		set-16	set-16
PF8120 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais		40%	fev-16
PF8121 - Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais		out-16	mar-20
PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais		set-17	dez-21
Encerramento do Programa		dez-21	mar-22
PF9120 - Encerramento do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (captura e formalização de benefícios)		dez-21	mar-22



EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS			
Descrição	Planejado	Realizado	Total
Itens/fragmentos de origem sacra coletadas (#)	NA	2013	NA
Pessoas capacitadas para identificação de peças sacras (#)	NA	2005	NA

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Relativo aos bens artísticos e integrados dos templos e reserva técnica

- Elaboração do Plano de Trabalho referente ao contrato de restauração dos bens moveis/integrados e templos;
- Adequação da reserva técnica: layout, instalação de mobiliário, estúdio de fotografia, marcenaria e equipamentos do laboratório;
- Início dos trabalhos de compilação de dados do acervo e triagem;
- Levantamento cadastral e planialtimétrico das capelas de Paracatu e Gesteira e respectivo acervo;
- Início do inventário dos bens integrados das capelas de Paracatu e Gesteira;
- Início da pesquisa histórica.

#### Relativo ao trabalho de monitoramento dos templos, prospecção, curadoria e educação patrimonial

- Realização de curadoria de peças sacras que encontram-se na reserva técnica - Total de 58 peças inventariadas no período.
- Realização de 8 reuniões com as comunidades de Paracatu e Bento Rodrigues;
- Resgate de 58 peças realizadas por meio das atividades de monitoramento;
- Resgate de 13 peças realizadas por meio das atividades de prospecção;
- 376 capacitações técnicas aos diversos públicos (empresas terceirizadas, SAMARCO e comunidade).






EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



### Adequações da Reserva Técnica

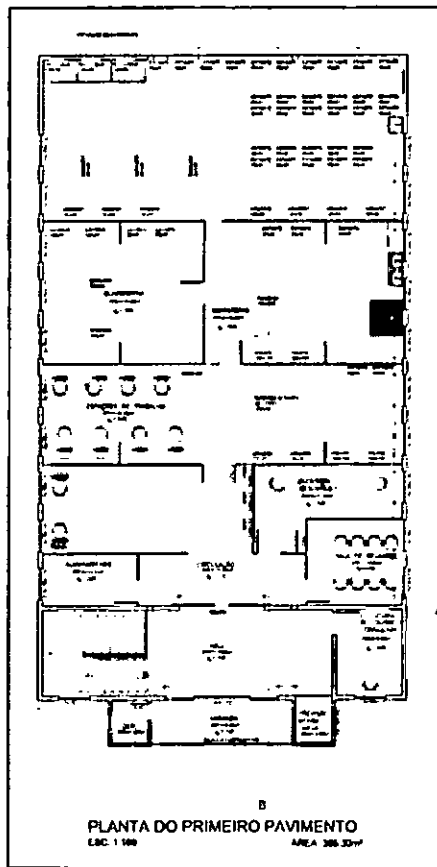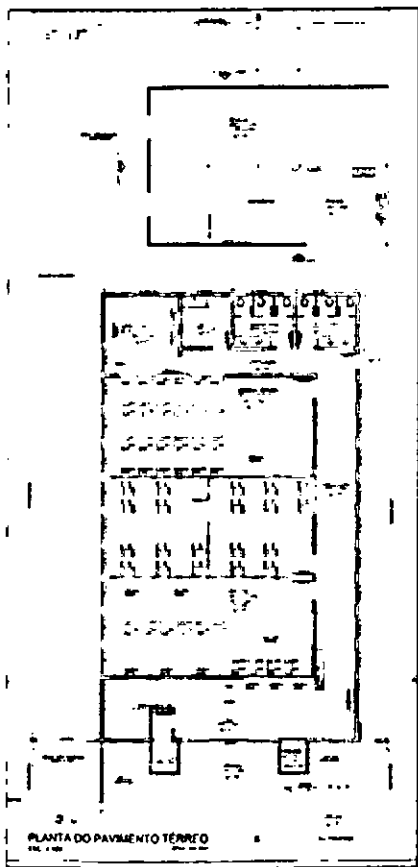





EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos




### Levantamentos de Inventários e Projetos / Serviços emergenciais

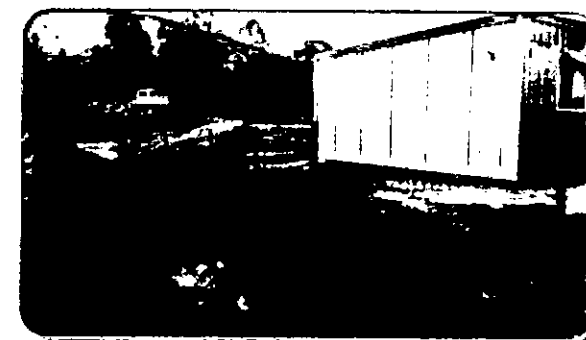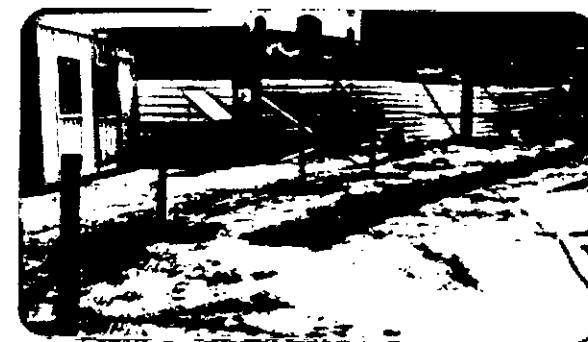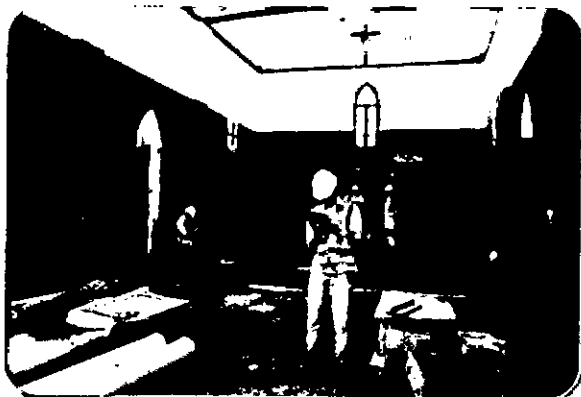




EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



### Capacitações técnicas realizadas com os diversos públicos

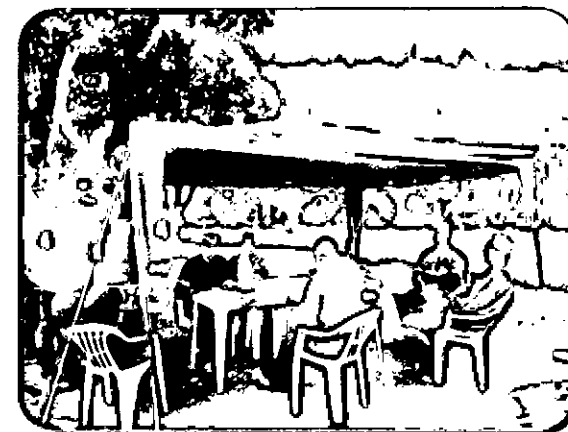



EM BRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



### Peças encontradas no monitoramento

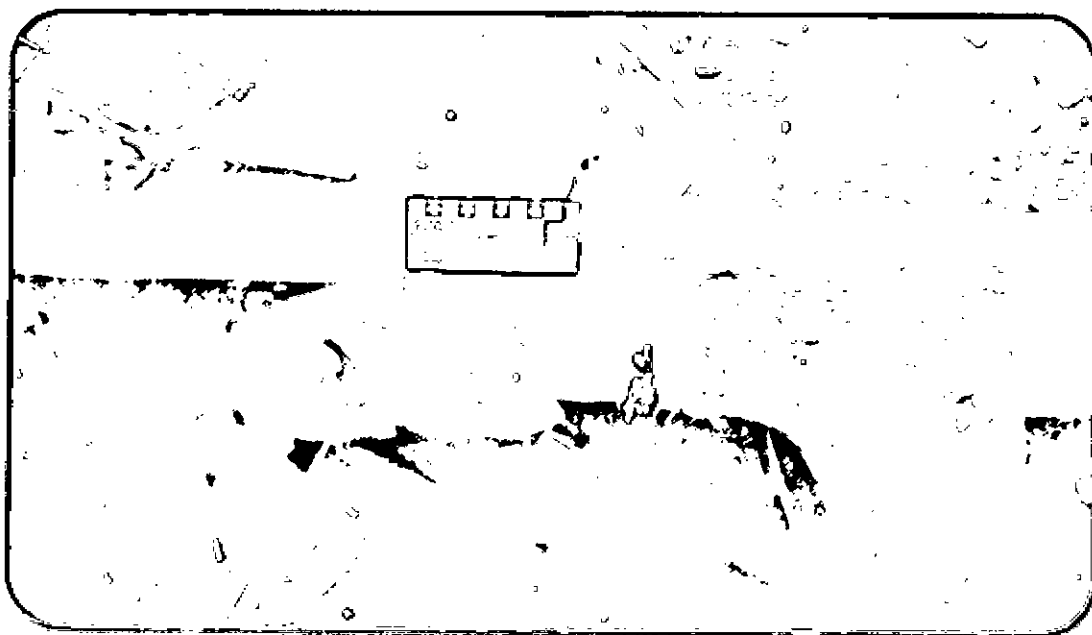


EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



Peças entregues pela comunidade



70  
DAMAI RESI  
Proc. 0924  
FLS. 105  
R  
RUB.

EMBRANCO

# PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 25,7	Realizado: 1,4	
Tarefa	% Real.	Início	Término	
<b>PG013-R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)</b>				
<b>Metas do Programa</b>		jan-17	dez-22	
Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer		jan-17	jan-17	
Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer		dez-22	dez-22	
<b>Definição do Programa</b>		set-16	fev-18	
<b>Execução do Programa</b>		jul-16	dez-22	
<b>Processos</b>		jul-16	dez-22	
<b>Marcos de Processo</b>		set-16	dez-18	
PF8130 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIF)		16%	jul-16	dez-18
PF8131 - Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)			jan-18	dez-22
<b>Encerramento do Programa</b>		dez-22	mar-23	
PF9130 - Encerramento do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (captura e formalização de benefícios)			dez-22	mar-23



EMBRANCO

# PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte, lazer	31/jan	31/jan

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Diagnóstico do Impacto e Inventários do Turismo: manutenção das atividades de realização da etapa diagnóstica.
- Apoio a eventos de fim de ano nas comunidades de Mariana, Regência e Povoação.



EMBRANCO

# PG14 – Saúde física e mental da população impactada

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 138,5	Realizado: 19,2
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG014-R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 106 à 112)			
Metas do Programa		nov-15	nov-25
		dez-21	nov-25
Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental		dez-21	dez-21
Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico		nov-25	nov-25
Definição do Programa		jan-17	mar-17
Execução do Programa		nov-15	nov-25
Processos		nov-15	nov-25
Marcos do Processo		set-16	abr-17
Término da reforma da UBS de Bento Rodrigues / Paracatu		jan-17	jan-17
Contratação Consultoria Especializada em Saúde Pública e Saúde Mental		set-16	set-16
Reunião entre diretorias Fundação e Instituições Parceiras		dez-16	dez-16
Definição do Plano de Trabalho e Parcerias institucionais para execução do estudo epidemiológico		jan-17	jan-17
Contratação do Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas		abr-17	abr-17
PF8140 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS (36 meses)	27%	nov-15	dez-21
PF8141 - Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas (Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva - 10 anos antes e após o EVENTO)		nov-15	nov-25
Encerramento do Programa		ago-25	nov-25
PF9140 - Encerramento do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (captura e formalização de benefícios)		ago-25	nov-25



EMBRANCO

# PG14 – Saúde física e mental da população impactada

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Definição do Plano de Trabalho e Parcerias institucionais para execução do estudo epidemiológico	30/jan	30/jan

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Ações realizadas do plano de ação de Mariana e Barra Longa	23	23	27

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Saúde Mariana:

- Reforma no imóvel que será a Unidade Básica de Saúde provisória das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu – em andamento – previsão de entrega: 13 de Janeiro de 2017.

#### Saúde Barra Longa:

- Gestão das demandas acordadas com a Secretaria de Saúde e MP;
- Apoio técnico na gestão da saúde municipal através de consultorias especializadas em saúde coletiva e mental – em andamento.
  - ✓ Projeto de Apoio à Gestão – Concluído o Relatório Diagnóstico de Saúde município de Barra Longa/MG.
  - ✓ Projeto de Saúde Mental, Álcool e outras - Concluídos o Protocolo de Atenção em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e o Painel de Indicadores e Metas em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas.
  - ✓ No período de 28/11/16 a 09/12/16 foram realizados cinco cursos/oficinas de treinamento para as equipes de saúde envolvidas com o tema da saúde mental, álcool e outras drogas no município de Barra Longa-MG.

#### Estudo epidemiológico e toxicológico:

- Instituições acadêmicas, profissionais de renome internacional na área e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) estão sendo considerados para engajamento na condução do Estudo.



EMBRANCO

# PG15 – Tecnologias socioeconômicas Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 7,6	Realizado: 0	% Real.	Início	Término
Tarefa						
PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)						
Metas do Programa					ago-17	ago-17
Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF					ago-17	ago-17
Definição do Programa					fev-17	jul-17
Execução do Programa					jul-17	nov-24
Processos					jul-17	nov-24
Marcos de Processos					jul-17	mai-18
PF8150 - Processo de monitoramento das linhas de Pesquisa					dez-17	nov-24
Encerramento do Programa					nov-24	fev-25
PF9150 - Encerramento do Programa de Apoio à Pesquisa (captura e formalização de benefícios)					nov-24	fev-25



EMBRANCO

# PG15 – Tecnologias socioeconômicas

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Contatos com a Fapemig para construção de minuta de entendimento para cooperação em pesquisa junto à instituição e Fapes;
- Contatos com Imaflora para entendimentos sobre processos de certificação de terceira parte para atendimento à deliberação do CIF;
- Mapeamento interno junto aos programa da Fundação Renova de oportunidades e demandas para pesquisas em inovação.



EMBRANCO

# PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 49,1	Realizado: 0,2		
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123)					
Metas do Programa				dez-17	dez-17
Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa)				dez-17	dez-17
Definição do Programa				jan-17	jan-18
Execução do Programa				jan-18	dez-19
Processos				jan-18	dez-19
PF8160 - Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica)				7%	dez-19
Encerramento do Programa				dez-19	mar-20
PF9160 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (captura e formalização de benefícios)					mar-20



EM BRANCO

# PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras

## Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias			
Descrição	Planejado	Tendência	
-			
MÉTRICAS			
Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			
AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manutenção dos cartões de auxílio financeiro distribuídos para pescadores que perderam temporariamente suas fontes de renda.</li> <li>• Construção do Termo de Referência.</li> <li>• Foram feitas reuniões área socioambiental e jurídico para aprofundamento das demandas e riscos que interferem na modelagem do Programa e precisam ser considerados no desenho do TR.</li> <li>• Realização de reunião com Câmara Técnica de Economia e Inovação para apresentação do desenho do TR e encaminhamentos (19/12)</li> <li>• Articulação para realização de workshops técnicos (previstos para janeiro) em MG e no ES, com representantes da CTEI (Mapa, Indi, etc.) além de indicações de instituições especializadas (Sebrae, FEAM, Laqua/UFMG, IEF, Epamig, Emater, etc.)</li> </ul>			



EMBRANCO

# PG17 – Retomada das atividades agropecuárias

## Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 184 Realizado: 16,3

Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PG017-R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128)</b>			
<b>Metas do Programa</b>		dez-15	mar-26
		out-17	dez-25
Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo		out-17	out-17
Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem		nov-20	nov-20
Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades		dez-25	dez-25
<b>Definição do Programa</b>		set-16	out-16
<b>Execução do Programa</b>		dez-15	dez-25
<b>Projetos</b>		dez-15	mar-22
<b>PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas</b>		abr-16	mai-17
Execução do cercamento das demais propriedades afetadas	91%	abr-16	fev-17
Encerramento do Projeto	0%	fev-17	mai-17
<b>PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)</b>		dez-15	jan-18
Planejamento da Execução	100%	dez-15	abr-16
Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	52%	jan-16	out-17
Encerramento do Projeto		out-17	jan-18
<b>PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a;b;i)</b>		jun-16	fev-20
Planejamento da Execução	84%	jun-16	fev-17
Execução da Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais		fev-17	nov-19
Encerramento do Projeto		nov-19	fev-20
<b>PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)</b>		ago-16	mar-22
Avaliação de Alternativas, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (URTs)	35%	ago-16	jul-17
Definição do Escopo		jul-17	out-17
Planejamento da Execução		out-17	mar-18
Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda		mar-18	dez-21
Encerramento do Projeto		dez-21	mar-22




EM BRANCO

# PG17 – Retomada das atividades agropecuárias

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)</b>		mai-16	jan-21
Avaliação de Alternativas	27%	mai-16	mai-17
Definição do Escopo		mai-17	set-17
Planejamento da Execução		set-17	jan-18
Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas		jan-18	nov-20
Encerramento do Projeto		nov-20	jan-21
<b>PF0172 - Restabelecimento de poços de peixe em propriedades rurais</b>		jul-16	fev-20
Planejamento da Execução (Determinar data de início e fim)	33%	jul-16	ago-17
Execução do Restabelecimento de poços de peixe em propriedades rurais		set-17	nov-19
Encerramento do Projeto		nov-19	fev-20
<b>Processos</b>		jan-16	dez-25
PF8170 - Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)		jan-16	nov-20
PF8171 - Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)		out-16	dez-25
PF8172 - Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa)		out-18	out-23
<b>Encerramento do Programa</b>		dez-25	mar-26
PF9170 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (captura e formalização de benefícios)		dez-25	mar-26



EM BRANCO

# PG17 – Retomada das atividades agropecuárias

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão do cercamento das demais propriedades afetadas	10/fev	10/fev

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Cercamentos recuperados (km)	133,74	135	135
Produção de forragem substitutiva (t/mês)	246	246	NA
Plantio realizado (ha)	170	170	170
Fornecimento de alimentação animal (t)	NA	11245	11245

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Assinatura de contrato para assistência/parceria técnica entre EMATER e Fundação Renova
- Solicitação de aditivo no contrato da Manserv - distribuição de silagem;
- Visita técnica à possíveis fornecedores de silagem;
- Atendimento ao Plano de Ação – Risco de Cheias;
- Continuação na execução de plantios substitutivos nas propriedades rurais conforme planejamento;
- Atividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de formicida e herbicida);
- Corte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio realizado já está em ponto de corte;
- Plantio de pomares e hortaliças;
- Continuação da entrega de silagem aos produtores de Mariana a Santa Cruz do Escalvado.
- Realizados 170 plantios para alimentação animal em 98 propriedades das 102 elegíveis.
- Realizados 27 pomares / hortas em 21 propriedades das 36 elegíveis.
- Construção de 234 km de cerca;
- Entrega de silagem aos produtores no mês de Dez/16 - 638,4 ton.




EM BRANCO

# PG18 – Diversificação da economia regional

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 63,3	Realizado: 0
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131)			
Metas do Programa		dez-16	out-30
		jun-17	jun-17
Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas		jun-17	jun-17
Definição do Programa		dez-16	jul-17
Execução do Programa		dez-16	out-30
Processos		dez-16	out-30
PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana		dez-16	jul-17
PF8181 - Estudos de Mercado do Programa de Recuperação e Diversificação da Economia		nov-17	jun-26
PF8180 - Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)		set-17	out-30
Encerramento do Programa		jul-30	out-30
PF9180 - Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		jul-30	out-30



EM BRANCO

# PG18 – Diversificação da economia regional

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Contratação do diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas	15/dez	04/jan

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- A CT de 20/12 deu o "de acordo" para o programa ter foco em Mariana (Mariana 2030). Iniciada revisão do Mariana 2030, com datas acordadas junto à prefeitura da revisão ser refeita até 29/02.




EM BRANCO

# PG19 – Micro e pequenos negócios Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 21,3	Realizado: 0,9		
Tarefa		% Real.	Início	Término	
PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)					
Metas do Programa			jul-16	jul-20	
			set-19	abr-20	
Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDAÇÃO)			set-19	set-19	
Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais			abr-20	abr-20	
Definição do Programa			mar-17	abr-17	
Execução do Programa			jul-16	abr-20	
Processos			jul-16	abr-20	
PF8190 - Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação		22%	jul-16	mai-17	
PF8191 - Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação			abr-17	set-19	
PF8192 - Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após Formalização do Programa)			abr-17	abr-20	
Encerramento do Programa			abr-20	jul-20	
PF9190 - Encerramento do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (captura e formalização de benefícios)			abr-20	jul-20	



EM BRANCO

# PG19 – Micro e pequenos negócios Acompanhamento



## PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Contratação do estudo de recuperação de micro e pequenos negócios	05/dez	05/dez


## MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Processos concluídos em Mariana (#)	191	175	191
Processos concluídos em Barra Longa (#)	94	77	94*

## AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Início dos novos processos provenientes de manifestações que foram incluídos seguindo os critérios estabelecidos;
- Continuação da execução das ações emergenciais do planejamento realizado para Barra Longa/Candongua e Mariana/Paracatú;
- Finalização do primeiro processo de pagamento de boletos da associação de pescadores de regência;
- Finalização de um processo de pagamento de boletos dos areiros;
- Continuação do processo de compra da "Danceteria e Barzinho" localizada em Barra Longa;
- Dentro das ações de fomento a pequenos negócios e junto ao programa de turismo foi apoiado o evento de réveillon de Regência e Povoação;
- Em Barra Longa, o atendimento ao comércio e empresários locais passou a ser junto com o centro de atendimento;
- Planejamento de uma ação na qual a equipe de campo irá verificar, em Barra Longa inicialmente, o funcionamento dos micro e pequenos negócios após a recuperação emergencial.

\* Total foi reduzido de 96 para 94 após revisão das demandas.




EM BRANCO

# PG19 – Micro e pequenos negócios Fotos




## Acompanhamento das ações emergenciais

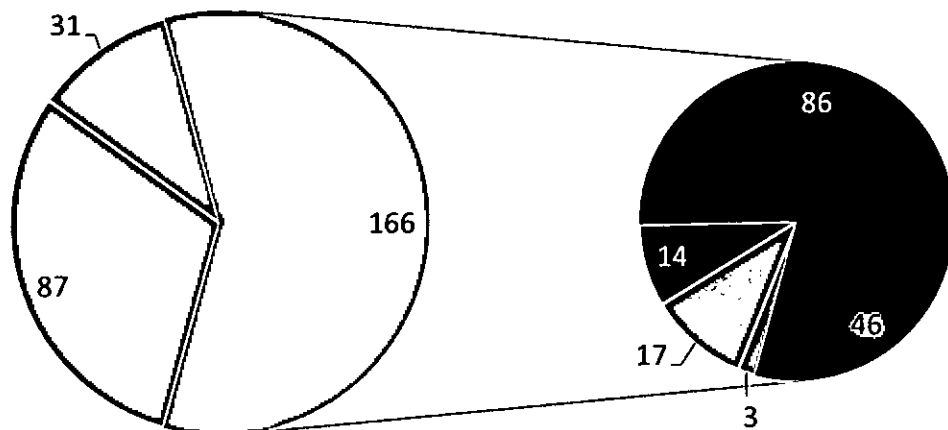


- Comércios atingidos indiretamente-Mariana
- Comércios atingidos indiretamente-Barra Longa
- Comércios ainda não iniciados-Barra Longa
- Comércios com processo em curso-Mariana
- Comércios com processo em curso-Barra longa
- Comércios com processos finalizados-Mariana
- Comércios com processos finalizados-Barra Longa

## Desembolso Global

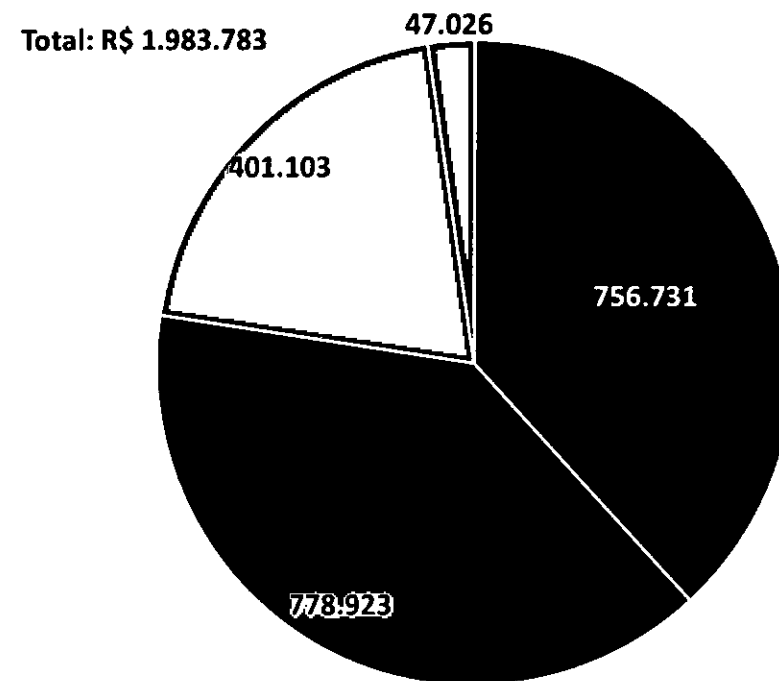

- Desembolso com EQPTOS Barra Longa/Candonga
- Desembolso com BOLETOS Barra Longa/Candonga
- Desembolso com EQPTOS Mariana/Paracatu
- Desembolso com BOLETOS Mariana/Paracatu




EM BRANCO

# PG20 – Estímulo à contratação local

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 1,5	Realizado: 0			
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)					
Metas do Programa					
Cláusula 136 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações executadas pela Samarco)				set-16	set-16
Definição do Programa					
Execução do Programa				dez-16	mai-17
Processos					
Marcos de Processo				jun-16	jun-21
Proc. Emerg. Contratação - Implementação Sistemas de Controle de Utilização de MOD local				out-16	jan-18
Proc. Estrut. Contratação - Elaboração do Plano de trabalho segmentado por município (Base no Diagnóstico)				out-16	out-16
PF8200 - Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)			100%	jan-18	jan-18
PF8201 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)				jun-16	out-16
Encerramento do Programa				set-16	jun-21
PF9200 - Encerramento do Programa de Estímulo à Contratação Local (captura e formalização de benefícios)				abr-21	jun-21
				abr-21	jun-21



EM BRANCO

# PG20 – Estímulo à contratação local

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Contratação de estudo de prospecção de mercado e diagnóstico da oferta de serviços, produtos e mão de obra	14/nov	15/dez
Execução do diagnóstico da oferta de serviços, produtos e mão de obra	13/fev	13/fev

### MÉTRICAS


Descrição	Planejado	Realizado	Total
Contratação de mão-de-obra local (%)	NA	61	NA

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Contratação da DVF consultoria para avaliação dos potenciais de desenvolvimento de mercado e de contratação local;
- Proposta do SENAI para viabilizar cursos de civil para o obras do reassentamento.

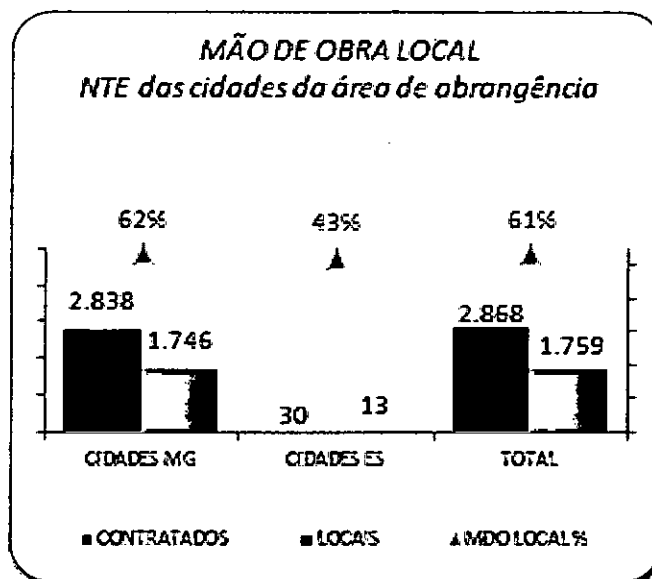

Dados coletados até 06/01/2017




EM BRANCO

# PG21 – Auxílio financeiro emergencial

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 491,5	Realizado: 186,4
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137, a 140)			
Metas do Programa		nov-15	set-20
Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal		jun-20	jun-20
Definição do Programa		jan-17	fev-17
Execução do Programa		nov-15	jun-20
Processos		nov-15	jun-20
PF8210 - Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)	18%	nov-15	jun-20
Encerramento do Programa		jun-20	set-20
PF9210 - Encerramento do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (captura e formalização de benefícios)		jun-20	set-20



EM BRANCO

# PG21 – Auxílio financeiro emergencial

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Cartões entregues (#)	NA	7939	NA
Indenizações antecipadas 10 mil (#)	NA	35	NA
Indenizações antecipadas 20 mil (#)	NA	347	NA

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Número total de beneficiários ao Auxílio Financeiro Emergencial : 7.939
- Reavaliação dos 2981 casos de cartões nos quais foram inicialmente negados o pleito de Auxílio Financeiro de Elegibilidade. As avaliações com os resultado foram enviados ao CIF para verificação e análise
- Atendimento, via cartão de Auxilio Financeiro, de demanda judicial onde ficou designado o pagamento de verba referente a conta de luz de moradores de Mariana e Barra longa deslocados de suas residências em novembro 2015.
- Finalizado o processo de concorrência da empresa responsável pela entrega de cartões tendo como ganhadora a empresa In-Haus.
- Em fase final de concorrência para contratação de empresa que atuará no processo de reavaliação de elegibilidade de todos os já cadastrados e os que foram cadastrados junto ao Cadastro Integrado.
- Em fase final de concorrência para contratação da empresa responsável pela administradora de cartões em 2017.
- Suporte para equipe do PIM na emissão de cartões e disponibilização de créditos para atendimento a demandar do PGR-001.




EM BRANCO

# PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 42,4	Realizado: 0,4
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)			
Metas do Programa		jun-16	dez-19
Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES		dez-19	dez-19
Definição do Programa		jun-16	dez-16
Execução do Programa		nov-16	dez-19
Processos		nov-16	dez-19
PF8420 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES		nov-16	dez-19
Encerramento do Programa		out-19	dez-19
PF9420 - Encerramento do Programa de Ressarcimento dos gastos públicos (captura e formalização de benefícios)		out-19	dez-19



EMBRANCO

# PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Ficou acertado na CT de 20/12 que a Ernst & Young entrará em contato com as prefeituras para levantamento dos gastos públicos, após reunião de definição de critérios.




EM BRANCO

# PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

## Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM			
		Definição	Exec.	Encerr.	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
PG023 / PG025 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1	dez/15	jul/17	dez/25	mar/26	992,1	173,4	279,6	539,1
PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	nov/15	set/16	abr/20	jul/20	942,6	326,2	85,4	531
PG028 - Conservação da biodiversidade	jun/16	dez/20	fev/22	mai/22	34,5	0,5	3,8	30,2
PG030 - Fauna e flora terrestre	ago/16	mar/17	mar/22	mai/22	2,3	0,0	2,3	
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan/16	out/17	dez/20	abr/21	122,3	24,4	18,2	79,7
PG037 - Gestão de riscos ambientais	out/16	mar/17	mar/17	jun/17	0,2	0,0	0,2	
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	216,3	82,9	29,4	104
PG039 - Unidades de conservação	ago/16	ago/17	jan/22	mai/22	2,6	0,0	2,6	
PG022/PG041 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	mar/16	nov/16	dez/30	dez/30	584,5	9,1	99,3	476,1
<b>Total medidas reparatorias</b>					<b>2897,5</b>	<b>616,6</b>	<b>520,8</b>	<b>1760,1</b>



EM BRANCO

# PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

## Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
PG026 / PG027 – Recuperação de APPs / Recuperação de nascentes	set/16	jun/17	mar/26	mar/26	1283,3	1,3	18,2	1263,8
PG029 - Recuperação da fauna silvestre	ago/17	mar/18	dez/21	mar/22	0,3	0,0	0,3	
PG031 - Coleta e tratamento de esgoto	dez/15	nov/16	dez/18	mar/19	450,0	0,0	200	250
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan/16	out/17	dez/20	abr/21	64,4	3,4	1,2	59,8
PG034 - Educação ambiental	fev/16	nov/16	mar/22	out/26	41,4	9,0	9,9	22,5
PG035 - Informação para a população	jun/16	nov/16	dez/26	dez/26	19,2	0,0	1,9	17,3
PG036 - Comunic. nacional/internacional	jun/16	nov/16	jan/27	jan/27	5,2	0,3	0,6	4,3
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	9,2	0,0	8	1,2
PG039 - Unidades de conservação	ago/16	ago/17	jan/22	mai/22	0,2	0,0	0,2	
PG040 - CAR e PRAs	nov/15	out/16	mar/26	mai/26	5,0	0,0	1,2	3,8
<b>Total medidas compensatórias</b>					<b>1878,1</b>	<b>13,9</b>	<b>241,5</b>	<b>1622,7</b>



EM BRANCO


# PG23/PG25 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1

## Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 992,1 Realizado: 173,4

Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PG023-R/PG025-R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160)</b>			
<b>Metas do Programa</b>		dez-15	mar-26
		jul-16	mar-20
Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica	100%	jul-16	jul-16
Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeira		mar-20	mar-20
Cláusula 158 - Revegetação inicial (800 ha)	100%	jul-16	jul-16
Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1		mar-20	mar-20
Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1		dez-17	dez-17
<b>Definição do Programa</b>		fev-16	jul-17
<b>Execução do Programa</b>		dez-15	dez-25
<b>Projetos</b>		dez-15	nov-22
<b>PF0019 - Revegetação Inicial (emergencial)</b>		dez-15	jul-16
Execução da Revegetação Inicial (800 ha)	100%	dez-15	jul-16
<b>PF0020 - Reabilitação dos Tributários</b>		dez-15	ago-17
Execução de recuperação ambiental dos tributários	80%	dez-15	mai-17
Encerramento do Projeto		mai-17	ago-17




EM BRANCO

# PG23/PG25 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal / PF0146 - Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens		jun-16	mar-18
Planejamento da execução		jun-16	fev-17
Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias	80%	jun-16	jul-16
Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal	68,30%	jul-16	fev-17
Execução do Projeto		jul-16	dez-17
Execução de controle da calha principal (Incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017) - Áreas Prioritárias	36,35%	jul-16	mar-17
Marcos de Controle de Erosão		jan-17	mar-17
Controle de Erosão - Área 04	0%	out-16	jan-17
Controle de Erosão - Área 05	61,40%	out-16	fev-17
Controle de Erosão - Área 06	70,70%	out-16	mar-17
Controle de Erosão - Área 07	64,80%	out-16	jan-17
Controle de Erosão - Área 08	72,80%	out-16	fev-17
Controle de Erosão - Área 09	44,30%	out-16	mar-17
Controle de Erosão - Área 10	67,90%	out-16	jan-17
Controle de Erosão - Área 11	49,90%	out-16	fev-17
Controle de Erosão - Área 13	21,60%	out-16	mar-17
Controle de Erosão - Área 14	0,00%	out-16	jan-17
Controle de Erosão - Área 15A	40,60%	out-16	mar-17
Controle de Erosão - Área 15B	35,20%	out-16	mar-17
Controle de Erosão - Área 03	46%	jul-16	fev-17
Execução de controle da calha principal - Áreas Não Prioritárias		jul-16	dez-17
Encerramento do Projeto		dez-17	mar-18
PF0169 - Recuperação de áreas degradadas		ago-16	jan-21
Execução da Revegetação em APP - 2000 ha		mar-17	mar-20
Encerramento do Projeto		mar-20	mai-20



EM BRANCO

# PG23/PG25 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
PF0133 - UHE Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)		jan-17	nov-22
Avaliação de Alternativas		jan-17	abr-17
Definição do Escopo		abr-17	out-17
Planejamento da Execução		out-17	abr-18
Execução do manejo de rejeitos da UHE Risoleta Neves (em paralelo com eventual dragagem adicional para liberação dos 400m)		abr-18	ago-22
Encerramento do Projeto		ago-22	nov-22
<b>Processos</b>		jan-17	dez-25
PF8232 - Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (800 ha)		jan-17	dez-17
PF8230 - Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)		jan-19	dez-25
PF8231 - Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais		jun-17	dez-21
<b>Encerramento do Programa</b>		dez-25	mar-26
PF9230 - Encerramento do Programa de manejo dos rejeitos (captura e formalização de benefícios)		dez-25	mar-26



EM BRANCO
