


MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Tipo: CT
Nº. 02001. 002 623/2017-99
Recebido em: 15/2/2017
Assinatura



DIGITALIZADO NO IBAMA



FUNDAÇÃO RENOVAR

SEQ1335/2017/GJU

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2017.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

REF.: *Relatório Mensal referente aos Programas e Ações previstos no TTAC em cumprimento à Cláusula 192*

Prezada Senhora,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, propor o quanto segue.


Nos termos da Cláusula 192¹ do Termo de Transação e Ajuste de Conduta firmado em 2 de março de 2016 (“TTAC”), a FUNDAÇÃO deve apresentar, até o 10º (décimo) dia útil de cada mês,

¹ CLÁUSULA 192: Um relatório do andamento de todos esses PROGRAMAS deverá ser enviado mensalmente, no décimo dia útil de cada mês, ao COMITÊ INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os relatórios devem ser individualizados por PROGRAMA, caso possível, contendo metas e indicadores para cada uma das medidas adotadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Além dos relatórios mensais, deverá ser emitido um relatório anual, até o dia 20 de janeiro de cada ano, o qual terá que ser submetido à validação pela AUDITORIA INDEPENDENTE.

EMBRANCO



FUNDAÇÃO RENOVA

um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do referido Termo.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a FUNDAÇÃO apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de fevereiro de 2017 (Doc. 01), contendo informações atualizadas sobre os programas e ações previstos no TTAC executados até o final do mês de janeiro de 2017.


Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


FUNDAÇÃO RENOVA
CARLOS ANSELMO CENACHI
GERENTE DE GOVERNANÇA DE PROGRAMAS

EMBRANCO



FUNDAÇÃO
renova

reparar, restaurar, reconstruir




EMBRANCO



Relatório mensal – Comitê interfederativo

Termo de transação e ajustamento de conduta

Janeiro de 2017




EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Segurança



Taxa de acidentes registrados (acidentes/milhão de horas trabalhadas)

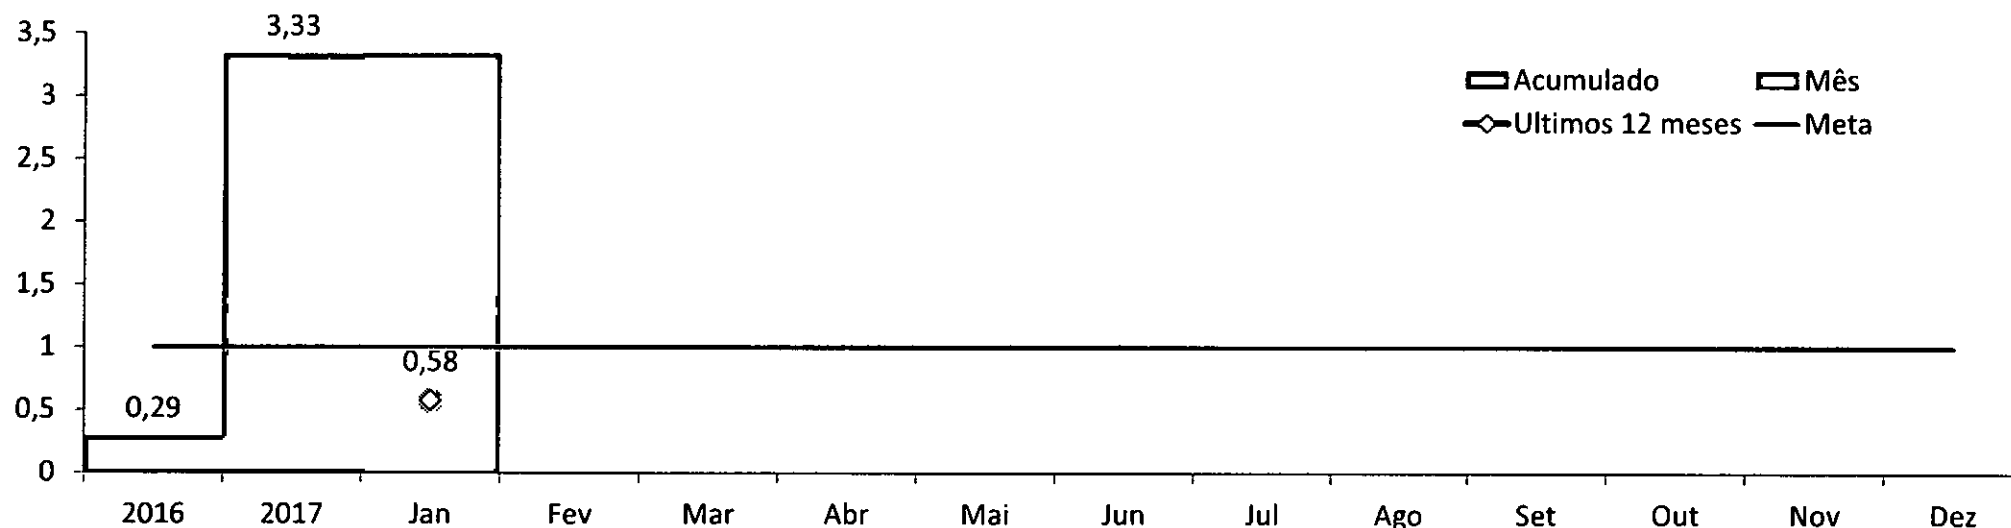

	Empregados Fundação/cedidos	Empregados contratados	Horas trabalhadas
Janeiro	375	1.687	300.321
Acumulado 2017	-	-	3,33

No dia 06 de Janeiro, foi registrado um acidente de trânsito com caminhão na entrega de blocos de pedra, na estrada de Acaiaca para barra Longa, com um contratado da empresa fornecedora, resultando na morte do motorista. A empresa fornecedora está prestando toda ajuda a família. Uma investigação está sendo conduzida pelas autoridades com apoio da Fundação Renova.



EM BRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Desembolso realizado/previsto




CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM			
	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais	194,70	159,45	19,50	17,40
Programas socioeconômicos	2.966,10	742,40	1.112,40	1.164,50
Programas socioambientais	4.775,70	683,08	762,30	3.382,80
Saldo medidas compensatórias	1.536,90	-	-	1.536,90
Total	9.473,40	1.584,93	1.894,20	6.101,60

CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM			
	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas reparatórias	5.642,20	1.558,91	1.312,50	2.873,00
Medidas compensatórias ¹	3.831,20	26,02	581,70	3.228,60
Total	9.473,40	1.584,93	1.894,20	6.101,60

Comentários

- Valores previstos para os próximos anos reavaliados pelo processo de orçamento de 2017.

(1) Inclui saldo de medidas compensatórias




EMBRANCO

ÍNDICE

Socioeconômico



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	007
Organização social	PG01 – Levantamento e cadastro	009
	PG02 – Ressarcimento e indenização	013
	PG03 – Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	015
	PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	018
	PG05 – Proteção social	020
	PG06 – Diálogo social	022
	PG07 – Assistência aos animais	027
Infraestrutura	PG08 – Reconstrução de vilas	029
	PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	034
	PG10 – Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas	041
Educação, cultura e lazer	PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	057
	PG12 – Memória histórica, cultural e artística	060
	PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer	067
Saúde	PG14 – Saúde física e mental da população impactada	069
Inovação	PG15 – Tecnologias socioeconômicas	071
Economia	PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	073
	PG17 – Retomada das atividades agropecuárias	075
	PG18 – Diversificação da economia regional	078
	PG19 – Micro e pequenos negócios	080
	PG20 – Estímulo à contratação local	083
	PG21 – Auxílio financeiro emergencial	083
Gestão	PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários	085
	PG22/41 – Gerenciamento programas	




EMBRANCO

ÍNDICE

Socioambiental



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	090
Gestão rejeitos e qualidade água	PG23/PG25 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1	092
	PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios.....	103
Restauração florestal	PG26/PG27 – Recuperação de APPs / Recuperação de nascentes	108
Conservação da biodiversidade	PG28 – Conservação da biodiversidade	111
	PG29 – Recuperação da fauna silvestre	113
	PG30 – Fauna e flora terrestre	115
Segurança hídrica e qualidade água	PG31 – Coleta e tratamento de esgoto	117
	PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água	119
Educação, comunicação e informação	PG33 – Educação ambiental	122
	PG34 – Emergência ambiental	125
	PG35 – Informação para a população	128
	PG36 – Comunicação nacional/internacional	131
Preservação e segurança ambiental	PG37 – Gestão de riscos ambientais	133
	PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce	135
Gestão e uso sustentável da terra	PG39 – Unidades de conservação	139
	PG40 – CAR e PRAs	141
Gestão	PG22/41 – Gerenciamento programas	140




EMBRANCO

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais					195,10	159,85	19,50	17,40
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov/15	mar/17	jun/19	out/19	37,50	24,30	9,90	3,30
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	jan/17	jan/20	abr/20	228,50	20,69	177,70	32,80
PG003 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	mar/16	dez/18	jul/19	dez/19	92,50	13,82	40,10	39,80
PG004 - Outros povos e comunidades tradicionais	ago/16	abr/18	fev/19	mai/19	1,50	0,01	1,50	
PG005 - Proteção social	abr/16	jul/17	abr/19	jun/19	3,30	0,30	1,10	1,90
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	213,00	20,55	27,90	165,90
PG007 - Assistência aos Animais	nov/15	nov/16	dez/19	mar/20	22,00	12,04	3,30	6,90
PG008 - Reconstrução de vilas	nov/15	out/16	mar/22	mar/22	305,50	25,86	68,70	211,70
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov/15	nov/16	jul/18	out/18	341,00	138,52	164,90	64,30
PG010 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	nov/15	out/16	ago/18	ago/18	313,60	225,14	55,40	35,00
PG011 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	jan/16	mar/17	mar/21	mai/21	9,00	0,30	2,70	6,00
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev/16	dez/17	dez/21	mar/22	30,00	11,10	8,50	11,00
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	jul/16	fev/18	dez/22	mar/23	25,70	1,62	2,50	21,80
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov/15	abr/17	nov/25	nov/25	138,50	19,33	16,20	103,10
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	jul/16	jan/18	dez/19	mar/20	49,10	0,23	2,60	46,30
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	dez/15	out/16	dez/25	mar/26	184,00	17,13	24,40	143,30
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	jul/16	mai/17	mai/20	ago/20	21,30	0,96	0,80	19,60
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov/15	jan/17	ago/20	nov/20	491,50	199,43	164,30	140,80
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun/16	dez/16	dez/19	dez/19	42,40	0,40		42,00
Total medidas reparatórias					2.745,00	891,58	792,00	1.112,90




EMBRANCO

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM			
		Definição	Exec.	Encerr.	Total	Realizado	2017	Após 2017
							Orçado	Projetado
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	jan/17	jan/20	abr/20	343,60	10,32	336,60	
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	fev/17	jul/17	nov/24	fev/25	7,60	0,00	0,10	7,50
PG018 - Diversificação da Economia Regional	jan/17	set/17	out/30	out/30	63,30	0,05	3,10	60,20
PG020 - Estímulo à Contratação Local	jun/16	mai/17	jun/21	jun/21	1,50	0,00	0,30	1,20
Total medidas compensatórias					416,00	10,36	340,10	68,90




EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 37,5	Realizado: 24,3
Tarefa	% Real	Início	Término
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)			
Definição do Programa		nov-15	out-19
Execução do Programa		jun-16	mar-17
Projetos		nov-15	jun-19
PF0173 - Levantamento e Cadastro - Campanha 1 - Rio Doce		nov-15	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov-15	set-17
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		nov-15	jul-16
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		ago-16	fev-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		set-16	mar-17
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconômico		dez-16	abr-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	jul-17
PF0174 - Levantamento e Cadastro - Campanha 2 - Rio Doce (a definir)		jul-17	set-17
PF0175 - Levantamento e Cadastro - Mariana		mar-17	mar-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov-15	set-17
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		nov-15	jul-16
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		jul-16	mai-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		fev-17	ago-17
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconômico		abr-17	set-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	jul-17
PF0176 - Levantamento e Cadastro - Barra Longa		jul-17	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov-15	set-17
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		nov-15	jul-16
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		jun-16	fev-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		ago-16	mar-17
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconômico		jan-17	mai-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	jul-17
Processos		jul-17	set-17
PF8010 - Processos de atualização, revisão e correção do Cadastro Socioeconômico dos Impactados		fev-17	jun-19
PF8011 - Processos de monitoramento socioeconômico dos municípios		fev-17	jun-19
Encerramento do Programa		jun-17	jun-19
		jun-19	out-19



EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Término do Cadastramento Socioeconômico - Exceção de Barra Longa e Mariana	23/12/2016	30/03/2017
Cadastro Mariana - Início do cadastro dos impactados (depende da consultoria para apoio às comunidades)	01/02/2016	01/02/2016


MÉTRICAS - RIO DOCE

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Famílias cadastradas emergencialmente (#)	NA	8.515	8.515
Pessoas cadastradas emergencialmente (#)	NA	29.614	29.614
Cadastros definitivos indexados (#) ¹	15.268	15.268	15.268
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 (#) ¹	15.268	14.125	15.268
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 (#) ¹	1.648	1.538	1.650
Cadastros definitivos que concluíram consistência (#) ¹	15.268	11.865	15.268
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF (#) ¹	6.464	1.933	15.268

MÉTRICAS - BARRA LONGA

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Famílias cadastradas emergencialmente (#)	NA	436	436
Pessoas cadastradas emergencialmente (#)	NA	1.245	1.245
Cadastros definitivos indexados (#) ³	645	617	645
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 (#) ³	645	535	645
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 (#) ³	303	393	420
Cadastros definitivos que concluíram consistência (#) ³	309	106	645
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF (#) ³	0	21	645

- (1) Não inclui Barra Longa e Mariana. Valores Planejados e Totais sendo revisados.
- (2) Prazos serão estimados, conforme processo de mobilização da Cáritas.
- (3) Valores Planejados e Totais sendo revisados.
- (4) Valor de 15.268 validado como total final de indexações – fase 1 do Rio Doce



EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) / Comitê Interfederativo (CIF):

- Realização da 8ª reunião com CTOS em 17/01/17;
- Envio do Lote 004 de informações do Cadastro Integrado para CTOS/CIF no dia 20/01/17;

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:


- Mariana: Reunião realizada no dia 11/01 com 11 pessoas que formalizaram o desejo de conhecer o cadastro. O MP do município foi informado oficialmente sobre essa agenda. No dia 13/01 foi realizada reunião com Comissão de Atingidos, Assessoria técnica Cáritas e MP de Mariana para apresentação do cadastro. Nessa agenda foram divididos em grupos para conhecer o formulário no tablet. Ao final, foi solicitado a estruturação de uma agenda de trabalho para discutir tecnicamente a metodologia utilizada para o cadastramento;
- Barra Longa: Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico, levantamentos de danos, entrega dos formulários preenchidos.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos;
- Entrega dos formulários preenchidos.

Base de dados e Documentação:

- Consolidação dos protocolos de consistência;
- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros.



EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro

Fotos




Aplicação de Cadastro -
Furnitanga -
20/01/2017




Mobilização para Cadastro Amores
15/01/2017



Aplicação de Cadastro Fase 1 Periquito
21/01/2017



Entrega de Cadastro Ipaba
12/01/2017




EMBRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 572,1 Realizado: 31

Tarefa	% Real	Início	Término
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos Impactados (Cláusulas 31 à 38)			
Definição do Programa		dez-15	abr-20
Execução do Programa		dez-15	jan-20
Projetos		mar-16	mar-18
PF0060 - Ressarcimento e Indenização dos IMPACTADOS		mar-16	mar-18
Planejamento da Execução		mar-16	out-16
Planejamento da Execução do Projeto em Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Babo Guaudú, Linhares, Mariana e Barra Longa - Fase 01	100%	mar-16	jul-16
Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas (Periquito, Gallélia, Resplendor, Ipatinga e São José do Goiabal) - Fase 02	100%	jun-16	out-16
Execução do Projeto		mai-16	dez-17
01 Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Babo Guandú, Linhares, Mariana e Barra Longa - Fase	97,94%	mai-16	jan-17
Implantar Centros de Negociação - Periquito, Gallélia, Resplendor, Ipatinga e São José do Goiabal - Fase 02	6%	out-16	mar-17
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa) - Danos Gerais		jan-17	out-17
Mariana		mar-17	out-17
Barra Longa		jan-17	jun-17
Rio Doce MG		fev-17	set-17
Rio Doce ES		jan-17	set-17
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada - Danos de Água		out-16	set-17
Rio Doce MG		out-16	set-17
Rio Doce ES		nov-16	set-17
Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		fev-17	dez-17
Mariana		mai-17	dez-17
Barra Longa		fev-17	jul-17
Rio Doce MG		mar-17	out-17
Rio Doce ES		mar-17	out-17
Efetuar Pagamentos de Indenizações - Danos de Água		nov-16	out-17
Rio Doce MG		nov-16	out-17
Rio Doce ES		nov-16	out-17
Encerramento do Projeto		dez-17	mar-18
Processos		dez-15	jan-20
PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de Indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS		dez-15	jan-17
PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações		out-17	jan-20
Encerramento do Programa		jan-20	abr-20




EM BRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias			
Descrição	Planejado	Tendência	
Início dos pagamentos de indenizações em B. Gandu – fase 1	17/01/2017	15/05/2017	
Início da operação dos escritórios da Fase 2	12/12/2016	20/02/2017	
Início dos Pagamentos de Indenizações em Barra Longa- Fase 01	22/02/2017	20/03/2017	
Início dos Pagamentos de Indenizações em Linhares - Fase 01	22/02/2017	20/03/2017	
MÉTRICAS			
Descrição	Planejado	Realizado	Total
AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES			
<ul style="list-style-type: none"> Atendimento acumulado em janeiro de 2017: 54.815 beneficiários com propostas geradas, sendo 35.849 Governador Valadares e 18.966 em Colatina; Propostas de acordos aceitas, acumulado em janeiro 2017: 30.862 beneficiários, sendo 20.710 Governador Valadares e 10.152 em Colatina; Pagamento indenizatório por Dano Moral da Água , acumulado em janeiro de 2017: 7.939 Beneficiários sendo, 4.755 em Governador Valadares e 3.184 em Colatina; Início das negociações definitivas das indenizações de Danos Gerais em Barra Longa e Linhares. Antecipação do pagamento das indenizações de Danos Gerais em Linhares R\$ 410.000 e Governador Valadares R\$ 1.140.000 (areeiros). 			




EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 92,5 Realizado: 13,8

Tarefa	% Real	Início	Término
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)		mar-16	dez-19
Definição do Programa		jul-16	dez-18
Execução do Programa		mar-16	jul-19
Projetos		mar-17	jul-19
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak		mar-17	jul-19
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak		mai-17	abr-19
Encerramento do Projeto		abr-19	jul-19
Plano de Ação Permanente Krenak; Tupiniquim e Guaraní (a definir)		dez-18	dez-18
(Início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)		dez-18	dez-18
Processos		mar-16	mai-19
PF8030 - Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	8%	ago-16	mai-19
PF8031 - Tupiniquim e Guaraní (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	88%	mar-16	mai-19
PF8032 - Tupiniquim e Guaraní (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	79%	mar-16	mai-19
PF8033 - Fornecimento Emergencial de Água - Krenak	7%	ago-16	fev-19
Encerramento do Programa		out-19	dez-19



EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

-		
---	--	--

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Total

-			
---	--	--	--

AÇÕES REALIZADAS NO JANEIRO 2017/ OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Geral:

- Foram acordadas ações com Funai e Sesai sobre componente saúde a serem incrementadas no plano de trabalho da Polifônicas (saúde mental e atenção primária)
- Programada visita da equipe técnica da Sesai (saúde e saneamento) para DSEI MG/ES para levantamento do perfil epidemiológico e sistema de abastecimento de água (TI Krenak, TI Comboios, TI Caieiras Velha)
- Manutenção das ações de assistência emergencial do acordo para cumprimento do TTAC

TI Krenak:


- Manutenção das vias de acesso às aldeias
- Aditivo de contrato, com Megaton, para abastecimento de água nas aldeias
- Acompanhamento técnico das obras na terra indígena

TI Comboios:

- Acompanhamento dos repasses acordados com lideranças indígenas
- Reunião de diálogo sobre os resultados do monitoramento hídrico
- Reuniões de diálogo sobre plano de cheias para a TI Comboios
- Membros da Equipe de Saúde do DSEI apresentaram cenário epidemiológico para fomento do diálogo entre FR e indígenas
- Criação de grupos de trabalho (plano de cheias, saúde indígena, qualidade da água e questões hídricas, e qualidade de vida indígena)
- Monitoramento e diálogo social na Terra Indígena Comboios

TI Caieiras Velhas:


- Acompanhamento dos repasses acordados com lideranças indígenas
- Encontro para socialização dos achados técnicos e engajamento social sobre monitoramento hídrico
- Reunião de esclarecimento a APECI sobre o pleito de aditivo ao acordo emergencial



EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas


Fotos

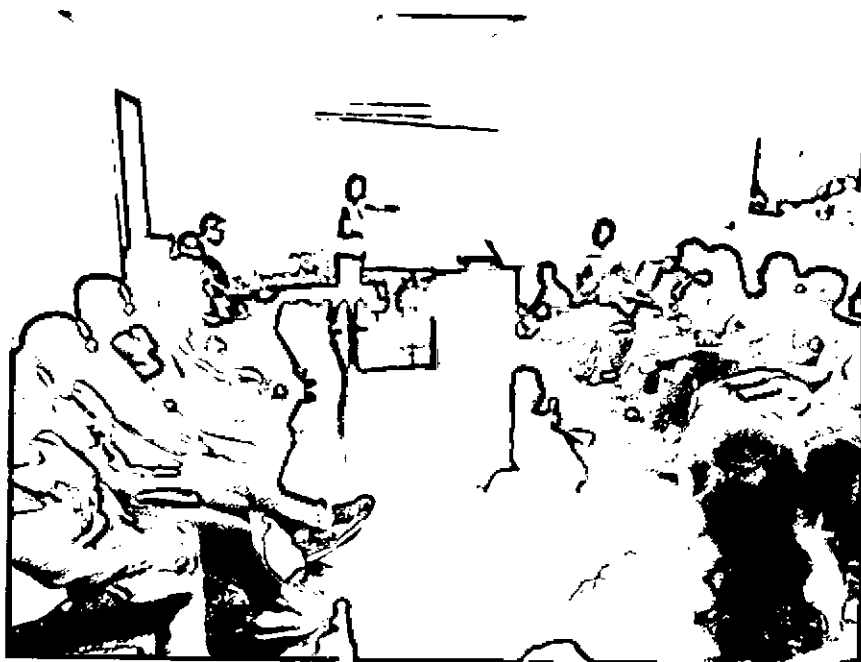

Apresentação do Monitoramento Hídrico - TI Caieiras Velha



Manutenção de acesso TI Krenak



EM BRANCO


PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 1,5 Realizado: 0

Tarefa	% Real	Início	Término
PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)		ago-16	mai-19
Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)		jan-17	jan-17
Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas		abr-17	abr-17
Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		fev-18	fev-18
Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		fev-18	fev-18
Definição do Programa		ago-16	abr-18
Execução do Programa (a definir)		fev-18	fev-19
Encerramento do Programa		fev-19	mai-19



EM BRANCO

PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Contratação de Estudo sobre os Quilombolas	13/04/2017	13/04/2017

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Liberação do Termo de Referência pela Fundação Cultural Palmares para estudo de impacto e definição de PBA para a comunidade Quilombola de Degredo (ES);
- Recebimento de ofício de registro da Fundação Cultural Palmares informando só haver, até o momento, uma comunidade quilombola atingida ao longo da área de impacto.
- Solicitação de reunião ao MPF para discussão da continuidade do processo de validação do reconhecimento dos garimpeiros faiscadores como tradicionais pela Comissão Estadual dos Povos Tradicionais de MG.
- Encaminhamento do processo de contratação de Consultoria para realização do Estudo de Impacto para a Comunidade Quilombola de Degredo (ES);




EM BRANCO

PG05 – Proteção social Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 3,3 Realizado: 0,3			
Tarefa	% Real	Início	Término
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)			
Definição do Programa		nov-16	jul-17
Execução do Programa		abr-16	abr-19
Processos		abr-16	abr-19
PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social	39%	abr-16	jul-17
PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo)		jul-17	abr-19
Encerramento do Programa		abr-19	jun-19




EM BRANCO

PG05 – Proteção social

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias			
Descrição	Planejado	Tendência	
Conclusão da elaboração do Plano de Qualificação	03/fev	03/fev	
MÉTRICAS			
Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			
AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES			
<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento das ações demandadas à Fundação pela equipe do CRAS (Mariana); • Realização de reuniões de alinhamento com equipe do CRAS e RECRIA (Mariana); • Encaminhamento de casos para rede pública: saúde, educação e assistência social (Mariana); • Discussão sobre o projeto de Hortas Verticais com grupo de idosos • Validação final do Termo de Referência para contratação da Consultoria para o programa de Proteção Social, em acordo com discussões da CTOS. 			



EM BRANCO


PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 213 Realizado: 20,5

Tarefa	% Real	Início	Término
PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72)		nov-15	dez-30
Definição do Programa		out-16	jan-17
Execução do Programa		nov-15	dez-30
Processos		nov-15	dez-30
PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional		ago-16	jun-17
PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo		jul-16	mai-17
PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento		jul-16	jul-17
PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO		nov-15	dez-17
PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional		jun-17	dez-30
PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo		mai-17	dez-30
PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento		jul-17	dez-30
PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO		dez-17	dez-30
Projetos		mai-16	dez-17
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO		mai-16	dez-17
Planejamento - Diagnóstico do processo de ouvidoria		ago-16	jun-17
Execução - Implantação e adequação do processo de ouvidoria		set-16	dez-17
Encerramento do Projeto		dez-17	dez-17
PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento		mai-16	mai-17
Execução do Projeto		mai-16	abr-17
Reestruturação da Gestão do Processo	100%	mai-16	jul-16
Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo	16%	mai-16	abr-17
Reestruturação do Sistema	74%	mai-16	abr-17
Encerramento do Projeto		abr-17	mai-17
Encerramento do Programa		out-30	dez-30



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Pilar Ouvidoria - Contratação Função Ouvidor (Fundação)	30/out	15/jan

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Manifestações registradas	NA	76.396	NA
Manifestações concluídas	NA	54.425	NA
Reuniões – trecho Mariana à Santa Cruz	NA	509	NA
Reuniões – trecho Rio Doce	NA	414	NA
Postos de atendimento	14	12	14


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Canais de Relacionamento:

- Postos de atendimentos: 12 escritórios em operação;
- Foram registradas 11.448 manifestações no mês de janeiro;

Diálogo Social – Região 1:

- Reuniões de diálogo: total de 38 reuniões em janeiro/17, com 1.555 presenças. Acumulado de reuniões no Região 1: 509 reuniões e 16.187 presenças.
- Monitoramento das Famílias: até o presente momento, 51 famílias já foram visitadas em Barra Longa, Rio Doce e Sta. Cruz do Esc. O trabalho tem com finalidade analisar a atual condição de renda de um conjunto de famílias não assistidas pelo Auxílio Financeiro.
- Ampliação do diálogo individualizado e do relacionamento com as comunidades impactadas, que permitem definir temas prioritários, antecipar cenários de tensão e/ ou conflito e instituir espaços de resolução.
- Diálogo social abordando principalmente temas relacionados aos programas: PG 016, 001, 002, 012, 005, 010, e 017.
- Discussão sobre a proposta de Assessoria Técnica aos impactados de Barra longa, Rio Doce e Sta. Cruz do Esc. pela empresa AEDAS.
- Aprovação por unanimidade do projeto urbanístico conceitual de Bento Rodrigues e conclusão da auto delimitação do terreno que abrigará a Comunidade de Paracatu de Baixo.
- Apoio ao trabalho das demais frentes, como para mediação e coleta de assinaturas do termo de finalização das obras residenciais, levantamento e cadastro dos impactados e Programa de Indenização Mediada (PIM).



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social


Acompanhamento – Comunicação social



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Diálogo Social – Região 2 e 3:

- Reuniões de diálogo: total de 27 reuniões em janeiro, com 510 presenças. Acumulado de reuniões nos Regiões 2 e 3: 414 reuniões, totalizando 15.360 presenças.
- Atividades de análise territorial estratégica para apoio à implementação dos programas da Fundação Renova.
- Ampliação e monitoramento do diálogo com as comunidades impactadas ,grupos específicos, setores do Poder Público e entidades (sociais, religiosas, educacionais, de saúde, etc.).
- Continuidade de ampliação do diálogo e do relacionamento com as comunidades impactadas, que permitem análises dos contextos locais, definição de temas prioritários, antecipação de cenários e construção de soluções.
- Diálogo social abordando temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006.
- Definição de estratégias de diálogo para apoio à entrada de Programas nos territórios.



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Diálogo Social – Região 1



*Reunião com o Poder Público
Mariana/MG (12/01)*



*Reunião com Lideranças
Bento Rodrigues – Mariana/MG (24/01)*



*Reunião Temática (Reassentamento)
Paracatu – Mariana/MG (25/01)*




*Reunião com Comunidade
Distrito Sede - Barra Longa/MG (23/01)*



*Reunião com Poder Público
Barra Longa/MG (25/01)*



*Reunião com Comunidade
Santana do Deserte – Rio Doce/MG (26/01)*



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Diálogo Social – Região 2 e 3



*Reunião de Diálogo - CRAS
Periquito/MG (16/01)*



*Reunião de Diálogo – Associados APERDOCE
Resplendor/MG (19/01)*



*R. de Diálogo (Lideranças e Poder Público)
Regência, Povoação - Linhares/ES (19/01)*




*Reunião de Diálogo
Comunidade de Rosário II- Baixo Guandu/ES (24/01)*



*Reunião de Diálogo
Naque/MG (26 /01)*



*R. de Diálogo – Assoc. Pescadores de
Colatina
Colatina/ES (31/01)*




EM BRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 22	Realizado: 12		
Tarefa		% Real	Início	Término
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)			nov-15	mar-20
Definição do Programa			set-16	nov-16
Execução do Programa			nov-15	dez-19
Processos			nov-15	dez-19
PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)			nov-15	dez-19
Encerramento do Programa			dez-19	mar-20



EMBRANCO
EMBRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Renovação de Contratos de Parcerias com ONG's	20/01/2017	20/01/2017

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Animais resgatados, animais nascidos e atendidos (#)	NA	1030	NA

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Resgate de 7 animais de grande porte (prontamente devolvidos ao responsável);
- Recolhimento de 2 animais de grande porte;
- Recolhimento de 3 animais adotados;
- Adoção de 1 animal de pequeno porte;
- Esterilização de 40 animais de companhia (cães e gatos);
- Acompanhamento de pós adoção de 29 animais;
- 11 atendimentos aos animais em propriedades;
- Manutenção do programa de visitas dos responsáveis dos animais às fazendas.
- Restituição de 9 animais aos tutores (2 de pequeno porte e 7 de grande porte)
- Medicina preventiva em 72 animais de grande porte (55 animais desverminados e 17 protocolos de controle de ectoparasitas)
- Medicina preventiva em 10 animais de pequeno porte (desverminação e vacinação)




EM BRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 305,5 Realizado: 25,8

Tarefa	% Real	Início	Término
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)		nov-15	mar-22
Definição do Programa		set-16	out-16
Execução do Programa		nov-15	mar-22
Projetos		nov-15	mai-19
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues		nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov-15	mai-16
Definição do Escopo		mai-16	nov-17
Projeto Detalhado das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)	26%	mai-16	jun-17
Projeto Detalhado da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos	5%	mai-16	nov-17
Planejamento da Execução		abr-17	mar-18
Planejamento da Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		abr-17	ago-17
Planejamento da Execução da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		out-17	mar-18
Execução do Projeto		ago-17	mar-19
Execução de supressão vegetal		ago-17	set-17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (terrapienagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		set-17	jul-18
Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		abr-18	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar-19	mai-19
PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo		nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov-15	set-16
Definição do Escopo		set-16	mar-18
Projeto Detalhado das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)	7%	set-16	ago-17
Projeto Detalhado da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		set-17	mar-18
Planejamento da Execução		jun-17	nov-18
Planejamento da Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		jun-17	nov-17
Planejamento da Execução da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		ago-18	nov-18




EM BRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas Masterplan



Tarefa	% Real	Início	Término
Execução do Projeto		nov-17	mar-19
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		nov-17	ago-18
Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		abr-18	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar-19	mai-19
PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira		jun-16	mai-18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	12%	jun-16	ago-17
Projeto Conceitual das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		jun-16	ago-17
Projeto Conceitual da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		jun-17	ago-17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev-17	ago-17
Planejamento da Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		mai-17	ago-17
Planejamento da Execução da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		fev-17	ago-17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		ago-17	mai-18
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		ago-17	jan-18
Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		out-17	mai-18
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		fev-18	mai-18
PF0049 - Reconstrução da escola, quadra e praça de Gesteira		fev-16	jan-17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola	100%	fev-16	jul-16
Execução das obras de reconstrução da escola	100%	jul-16	dez-16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola		dez-16	jan-17
Processos		nov-15	mar-22
PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	ago-18
PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		mai-18	mai-21
Encerramento do Programa		dez-21	mar-22



EM BRANCO

PG008 – Reconstrução de Vilas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão do Projeto Detalhado de Urbanismo do Novo Bento Rodrigues	27/jan	27/jan
Aprovação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade	30/set	31/jan
Aprovação do Projeto Urbanístico de Paracatu de Baixo junto à Comunidade	30/dez	30/abr
Aprovação do Projeto Urbanístico de Gesteira junto à Comunidade	03/nov	-

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Aprovado o Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade;
- Em andamento os projetos básicos de Bento Rodrigues;
- Concluídos os projetos básicos de ETA e ETE de Bento Rodrigues;
- Protocolada a consulta prévia do projeto de Bento Rodrigues junto a Prefeitura de Mariana;
- Em andamento Estudos de Impacto Ambiental nos terrenos escolhidos para reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo;
- Concluídos estudos geológicos de Paracatu de Baixo;
- Apresentado Projeto Preliminar Urbanístico de Paracatu de Baixo à Comissão de Moradores;
- Aprovado pelo Conselho Curador a aquisição de terrenos em Paracatu de Baixo;
- Em andamento processo de negociação para aquisição de terreno em Gesteira.



EM BRANCO

PG008 – Reconstrução de Vilas


Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Próximas ações:

- Elaboração dos projetos básicos de Bento Rodrigues;
- Continuidade do processo de aprovação do loteamento de Bento Rodrigues junto a Prefeitura de Mariana;
- Início do processo de contratação da infraestrutura de Bento Rodrigues;
- Prosseguimento dos Estudos de Impacto Ambiental no terreno escolhido de Paracatu de Baixo;
- Entrada no processo de licenciamento de Bento Rodrigues junto ao órgão ambiental;
- Aprovação do projeto urbanístico de Paracatu de Baixo junto à comunidade;
- Aquisição dos terrenos em Paracatu de Baixo;
- Aquisição do terreno em Gesteira;
- Alinhamento e discussão com as comunidades sobre os projetos individuais de casas;




EM BRANCO

PG008 – Reconstrução de Vilas

Fotos



Aprovação do Projeto Urbanístico – Bento Rodrigues



EM BRANCO

PROGRAMA SOB RESPONSABILIDADE DA SAMARCO




O programa *PG09 – Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves* apresentado a seguir está sob responsabilidade e permanecerá sendo executado pela Samarco até a conclusão da primeira fase.

Dessa forma a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude das informações apresentadas.

A sua presença neste documento é apenas de caráter informativo.

A Fundação assumirá a responsabilidade pelo seu desenvolvimento a partir da conclusão da primeira fase do programa.




EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 341	Realizado: 138,5
Tarefa	% Real	Início	Término
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81)		nov-15	out-18
Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)		abr-18	abr-18
Cláusulas 80 e 150 P3 - Dragagem do Reservatório da UHE Risoleta Neves - 400m iniciais		dez-16	dez-16
Definição do Programa		out-16	nov-16
Execução do Programa		nov-15	jul-18
Projetos		nov-15	jul-18
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)		nov-15	jul-18
Execução do Projeto		nov-15	abr-18
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	55%	nov-15	jun-17
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m		jun-17	abr-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	0%	abr-18	jul-18
Encerramento do Programa		jul-18	out-18



EM BRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

Conclusão da preparação da área para disposição confinada em Geobag

31/jan

03/fev

MÉTRICAS

Descrição (Ref. 31/01)

Planejado

Realizado

Total

Volume dragado - trecho de 400m (mil m3)

808

645

1.576

Barreira metálica B (à 5 km) (t)

790

667

790

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Concluída da engenharia para bombeamento direto para Fazenda Floresta
 Concluída da engenharia para disposição na pilha externa do Velho Soberbo

Setor 4:


- Continuação da adequação da área à jusante para disposição dos bags e início dos drenos e reforço de fundação
- Concretagem do vertedor em andamento

Setor 8:

- Iniciada a dragagem para este setor no dia 06/01
- Instaladas ventosas

Barreira B:

- Concluído o fechamento do rio pela margem direita para viabilizar a conclusão da cravação
- Rio passando pelo trecho central do barramento através do desvio realizado
- Previsão da conclusão do barramento dia 04/03



EM BRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Barreira C:

- Estudo de remando apresentado e aprovado pela Aliança
- Em andamento a campanha de sondagem
- Projeto conceitual do barramento em elaboração

Fazenda Floresta:

- Emitido o arranjo geral da área
- Processo de desaguamento sendo avaliado
- Concluída a engenharia executiva da pilha A e em andamento a engenharia da pilha B
- Iniciada a marcação topográfica do acesso principal e bacias de decantação

Dragagem:

- Aporte nos 400m até o dia 11/01 era de 0,276hm³
- Volume diário removido ampliado devido ao início da utilização do Setor 8



EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves Mapa Geral



EM BRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Mapa Geral – Fazenda Floresta




EM BRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Fotos



Setor 4

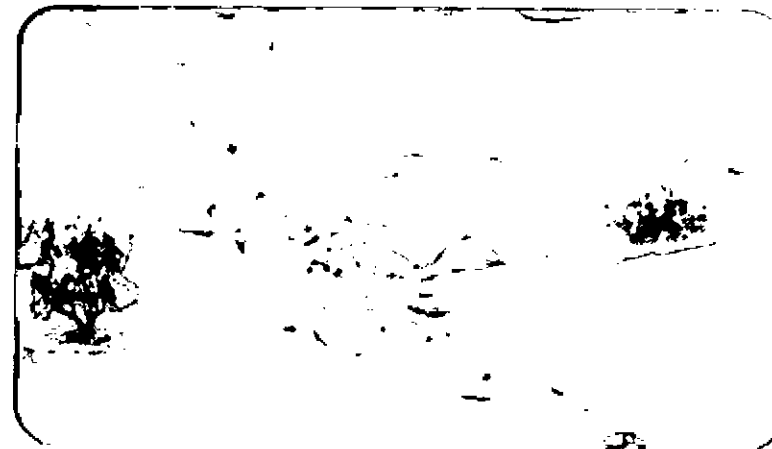

Fazenda Floresta



Setor 8



Barreira B



EM BRANCO


PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 313,6 Realizado: 225,1

Tarefa	% Real	Início	Término
PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)		nov-15	ago-18
Definição do Programa		set-16	out-16
Execução do Programa		nov-15	ago-18
Projetos		nov-15	ago-18
PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa		nov-15	mai-17
Execução do Projeto	99%	nov-15	mar-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mar-17	mai-17
PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa		nov-15	mai-17
Execução do Projeto	98%	nov-15	fev-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		fev-17	mai-17
PF0177 - Recuperação do Hotel de Barra Longa		jan-17	mar-18
Execução do Projeto		jan-17	out-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out-17	mar-18
PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho	100%	jan-16	ago-16
Execução do Projeto	100%	jan-16	mai-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	100%	mai-16	ago-16
PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa		fev-16	mar-17
Execução do Projeto	100%	fev-16	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	42%	ago-16	mar-17
PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP		jun-16	nov-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	73%	jun-16	nov-16
PF0037 - Reforma e Limpeza		jan-16	fev-18
Execução do Projeto - ETAPA 1	100%	jan-16	dez-16
Execução do Projeto - ETAPA 2	50%	dez-16	jun-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-16	fev-18
PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados		nov-15	fev-17
Execução do Projeto	100%	nov-15	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	43%	ago-16	fev-17




EMBRANCO

PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Masterplan



Tarefa	% Real	Início	Término
PF0042 - Reconstrução de pontes		nov-15	jan-17
Execução do Projeto	100%	nov-15	jan-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	40%	ago-16	jan-17
PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	100%	fev-16	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	33%	ago-16	jan-17
PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	100%	fev-16	out-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-16	jan-17
PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço		nov-15	nov-16
Execução da Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço	100%	nov-15	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	44%	ago-16	nov-16
PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais		jul-16	ago-18
Planejamento da Execução	90%	jul-16	jan-17
Execução do Projeto	2%	jan-17	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jun-18	ago-18
PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados		nov-15	ago-17
Execução do Projeto	87%	nov-15	mai-17
Mariana	100%	nov-15	dez-16
Barra Longa		nov-15	mai-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mai-17	ago-17
PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio		jan-16	mar-17
Planejamento da Execução	100%	jan-16	jun-16
Execução do Projeto	100%	mai-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	9%	dez-16	mar-17
PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo		mar-16	abr-17
Planejamento da Execução	100%	mar-16	jun-16
Execução do Projeto	99%	ago-16	jan-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	abr-17




EM BRANCO

PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas Masterplan



Tarefa	% Real	Início	Término
PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira		mar-16	ago-17
Planejamento da Execução	100%	mar-16	jul-16
Execução do Projeto	72%	abr-16	mai-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mai-17	ago-17
PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira		mar-16	dez-17
Planejamento da Execução	100%	mar-16	jul-16
Execução do Projeto	42%	mai-16	out-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out-17	dez-17
PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição		abr-16	jul-18
Planejamento da Execução	100%	abr-16	ago-16
Execução do Projeto	18%	ago-16	jul-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mai-18	jul-18
PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa		mar-16	nov-17
Execução do Projeto	92%	mar-16	ago-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago-17	nov-17
PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa		jul-16	mar-17
Planejamento da Execução	100%	jul-16	jul-16
Execução do Projeto	99%	ago-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17
PF0150 - Recolhimento de Madeira - Fase 1		jun-16	mai-17
Execução do Projeto	60%	jun-16	fev-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		fev-17	mai-17
PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol		jan-17	ago-18
Avaliação de Alternativas	80%	jan-17	abr-17
Definição do Escopo		abr-17	mai-17
Planejamento da Execução		mai-17	jul-17
Execução do Projeto	25%	jul-17	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		mai-18	ago-18




EM BRANCO

PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas Masterplan



Tarefa	% Real	Início	Término
PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues		ago-16	jan-18
Definição do Escopo	93%	ago-16	set-16
Planejamento da Execução		set-16	jan-17
Execução do Projeto		jan-17	set-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-17	jan-18
PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo		ago-16	mar-18
Avaliação de Alternativas	41%	ago-16	nov-16
Definição do Escopo		nov-16	jan-17
Planejamento da Execução		jan-17	mar-17
Execução do Projeto		mar-17	nov-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-17	mar-18
PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2		jan-17	jan-18
Planejamento da Execução		jan-17	mar-17
Execução do Projeto		mar-17	set-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-17	jan-18
Processos		mai-16	ago-18
PF8100 - Processos de Manutenção de vias e controle de emissão de particulados	38%	mai-16	ago-18
PF8101 - Processo de Reparação às edificações impactadas pelas obras de recuperação e reforma	1%	nov-16	dez-17
Encerramento do Programa		jun-18	ago-18



EMBRANCO

PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Acompanhamento




PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da reforma de Residências em Barra Longa	31/out	15/fev
Conclusão da recuperação de comércios e instituições em Barra Longa	09/fev	15/fev
Conclusão das Obras de Reconstrução de pontes	26/jan	26/jan

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Casas reformadas em Barra Longa (#)	95	95	99
Comércios reformados em Barra Longa (#)	36	34	36
Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (km)	1,1	1,1	1,1
Material removido em Barra Longa (mil m3)	157	157	157
Cercamento de propriedades (acordo com MP) (km)	100	105	100
Propriedades rurais reformadas e limpas (#)	33	33	45
Estradas pavimentadas recuperadas (km)	80	80	80
Estradas não pavimentadas recuperadas (km)	110	110	110
Pontes reconstruídas (#)	7	7	7
Drenagens de estradas e vias recuperadas (#)	102	102	102
Bordas de rios e enrocamentos recuperados (#)	47	47	47
Recuperação da praça e alameda Beira Rio em Barra Longa (#)	2	2	2
Maçãos estabilizados em Barra Longa (km)	1,2	1,2	1,2
Quintais e lotes reformados de Barra Longa (#)	94	94	199
Casas reconstruídas em Barra Longa (#)	11	2	13
Reconstrução do parque de exposição e campo dos rodoviários (#)	1	0	2
Currais reconstruídos em Barra Longa (#)	17	17	21
Mata burros reconstruídos em Barra Longa (#)	13	13	18
Pavimentação reconstruída em Barra Longa (km)	2,5	2,5	2,5
Madeira recolhida fase1 e fase2 - (km)	80,8	44,5	80,8
Pontes de cabo de aço reconstruídas (#)	9	9	9
Campos de futebol reconstruídos (#)	3	3	



EM BRANCO

PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/16 E OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


Barra Longa

Entregas do mês

- Entrega de currais e quintais;
- Entrega de casas reformadas;
- Recuperação de acessos para comunidade – emergências causadas por chuvas;

Próximas entregas

- Entrega da casa 199 – Boate Kiss;
- Entrega da casa 140;
- Término de casa no Morro Vermelho.



EM BRANCO
