





MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

92 Estabelecimentos mapeados, sendo 62 impactados diretamente pelo acidente

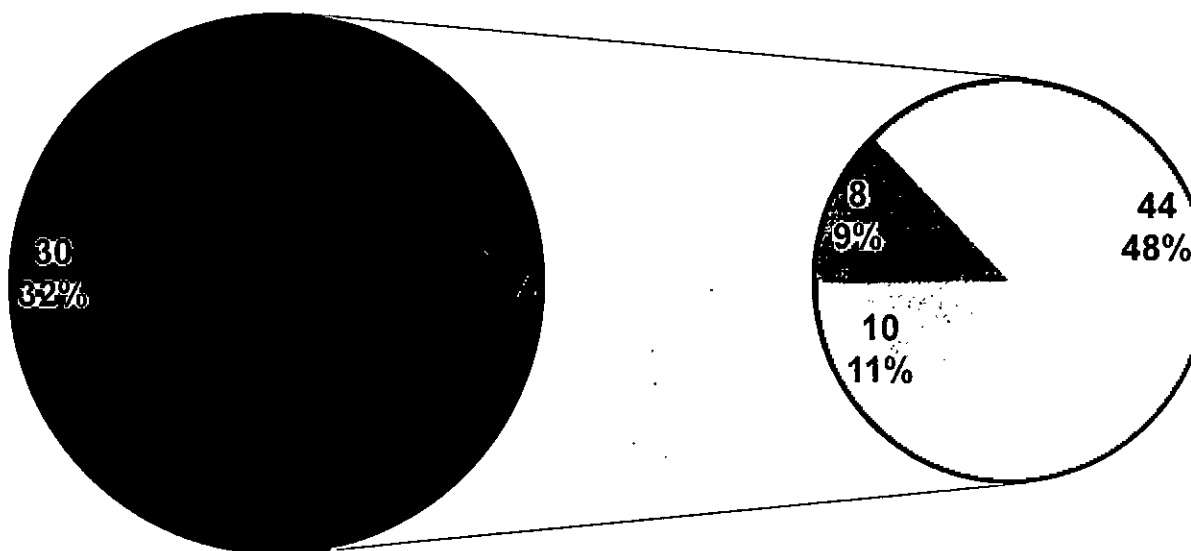

- Atingidos indiretamente
- ▣ Estabelecimentos com processos mapeados
- ▣ Estabelecimentos com processos de compra (RC) em aberto
- ▣ Estabelecimentos com processos finalizados



EM BRANCO



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

ORÇ. (R\$MM)	Total: 2,3	Realizado: 0
---------------------	------------	--------------

ESCOPO

A Fundação deverá elaborar e executar programa de priorização de contratação local visando estimular uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
136	Início do Programa de Estímulo à Contratação Local	<input checked="" type="checkbox"/>	28/set/16
135a	Estudo de prospecção de potenciais empreend., negócios e mercados	<input type="checkbox"/>	
135b	Estratégia de priorização de compras locais	<input checked="" type="checkbox"/>	
136	Manutenção do Programa de Estímulo à Contratação Local	<input type="checkbox"/>	01/set/14

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	ago-16	----
Execução do programa	Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	Processo	----	----	----	----	ago-16	----
	Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)	Processo	----	----	----	----	dez-30	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	dez-30	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Em andamento




EM BRANCO



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Reporte dos primeiros indicadores de forma global;• Reunião com os comércios de Mariana;• Definição do escopo da equipe de trabalho após o PDV;• Criação do plano de ações para o próximo mês• Reunião com a ACIAM/CDL de Mariana para verificação de expectativas e criação de agenda para discussões com empreendedores locais existentes;• Compilação dos dados dos formulários recebidos dos fornecedores e contratos – Em andamento;	<ul style="list-style-type: none">• Definir periodicidade de envio dos indicadores;• Definir critério de contratação local;• Definir pontos focais das áreas após o termino do PDV;• Inserir registro de e-mail dos fornecedores cadastrados sem contato;• Atualizar dados dos contratos (NTE, Gestor e fiscais);• Criar cronograma para desenvolvimento da ferramenta de TI para controle de terceiros
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Medição da Mão de Obra local contratada nas regiões atingidas:• 1320 trabalhadores locais das cidades impactadas (64 %)• 850 trabalhadores fora das regiões impactadas (36%)	




EM BRANCO




ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL


FORNECEDORES LOCAIS DE SERVIÇOS
Empresas dos estados Impactados





FORNECEDORES LOCAIS DE SERVIÇOS
Empresas das regiões Impactadas

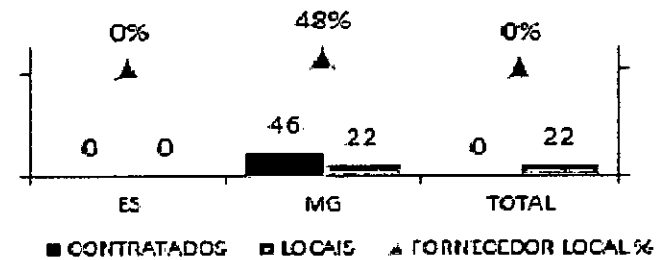

MÃO DE OBRA LOCAL
NIE dos estados Impactados

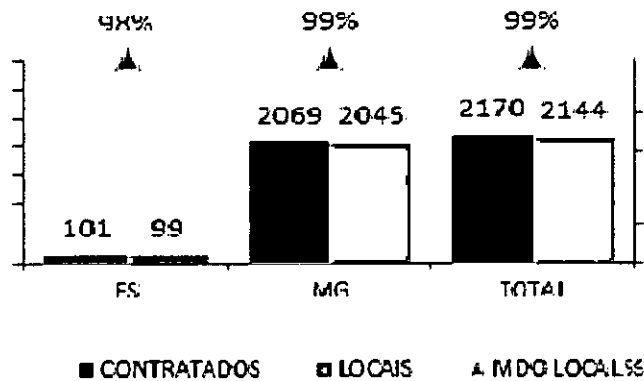

MÃO DE OBRA LOCAL
NTE das regiões Impactadas

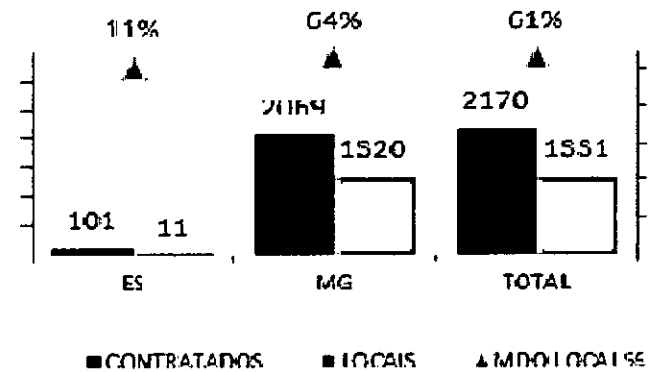

EM BRANCO



AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL


ORÇ. (R\$MM)	Total: 464,1	Realizado: 124,4
---------------------	--------------	------------------

ESCOPO		
Caberá à Fundação desenvolver um programa de auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas		
CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
139	Entrega dos cartões de auxílio financeiro emergencial aos impactados	<input checked="" type="checkbox"/>
140	Concessão do auxílio financeiro mensal	<input checked="" type="checkbox"/> 02/mar/21

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	set-16	----
Execução do programa	Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)	Processo	----	----	----	----	set-18	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	abr-21	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada




EM BRANCO



AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da confecção e entrega de cartões aos ribeirinhos identificados como elegíveis ao programa.• Entrega de cartões para os comerciantes de Regência identificados como elegíveis ao programa.• Entrega do último lote de cartões da última campanha de cadastramento emergencial.• Deliberação do CIF dos critérios de inelegibilidade no programa, conforme cláusulas 137 e 138.• Deliberação do CIF para listagem nominal das denúncias de fraude.• Deliberação do CIF para listagem nominal dos lavadores de peixe e outros trabalhadores de apoio à pesca artesanal, conforme Decreto nº 8.425 de 2015.• Aguardando recomendações da Câmara Técnica sobre contratação de Auditoria.• Recebimento do banco final do cadastro emergencial que será migrado para o cadastro integrado.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção do gerenciamento dos cartões aos ribeirinhos identificados como elegíveis ao programa.• Consolidar as recomendações do CIF sobre os fluxos de saída do programa, inclusões, Auditoria e dar os devidos encaminhamentos.• Migração da base de dados para o sistema SGS.• Acompanhamento do novo mapeamento para Cadastro Integrado que será realizado entre agosto e outubro.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Elegíveis: 7.930• Cartões confeccionados: 8.020• Cartões entregues: 7.264	



EM BRANCO



RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS

ORÇ. (R\$MM) Total: 29,4 Realizado: 0

ESCOPO

A Fundação deverá ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, devidamente atualizados


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
141	Ressarcimento dos Compromitentes	<input type="checkbox"/>

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	jan-17	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	dez-17	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada




EM BRANCO



ESTRUTURA DO ACORDO

Programas socioeconômicos

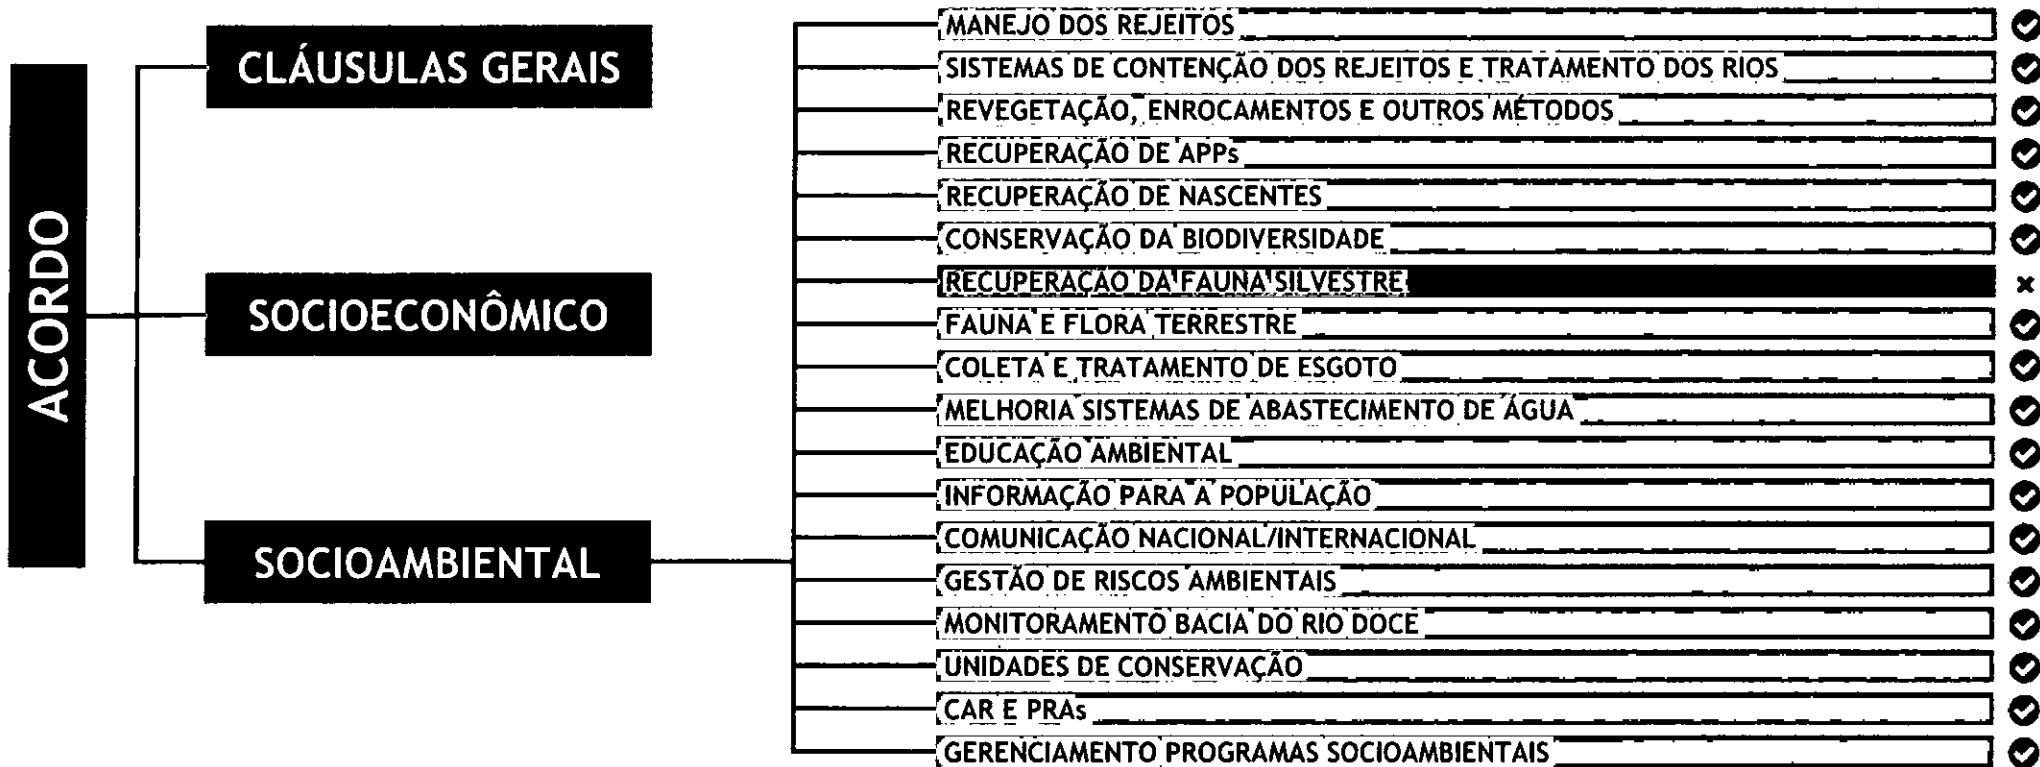

Programa Iniciado

Programa não iniciado



EM BRANCO



MANEJO DOS REJEITOS

ORÇ. (R\$MM)	Total: 1487	Realizado: 0
---------------------	-------------	--------------

ESCOPO

Caberá à Fundação realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1, considerando a linha de base anterior ao evento e alterações posteriores.
Especificamente quanto ao Reservatório da UHE Risoleta Neves, a dragagem deve ser concluída até dezembro/2016.


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
150 § 2º	Estudos de identificação/avaliação de impacto dos rejeitos e marcos dos projetos	<input type="checkbox"/> 29/jul/16
151 § Único	Recuperação das áreas impactadas e disposição do rejeito	<input type="checkbox"/>

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	fev-16	----
Execução do programa	UHE Risoleta Neves – fase 2	FEL1	----	dez-17	fev-18	abr-18	abr-20	abr-20
	Limpeza de Bento Rodrigues	Execução ³	----	----	----	----	fev-17	abr-17
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	mar-24	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto; (3) Projeto iniciado em 01/08

Iniciada
 Não iniciada
 Concluída
 Financiada




EM BRANCO



MANEJO DOS REJEITOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Foram realizados dois Workshops para discutir resultados do estudo biogeoquímico.• Foi entregue em 29/07 documento único com os estudos biogeoquímico, geomorfológico e orientações para manejo dos rejeitos.• De forma complementar neste mesmo documento também foram encaminhadas as análises de água/sedimento, bem como qualidade do ar.• Contratação de empresas para executar o Peer Review dos estudos biogeoquímico e geomorfológico.	<ul style="list-style-type: none">• Avaliar as sugestões e críticas das empresas contratadas para o Peer Review;• Definir Termo de Referência para análise de risco em áreas do estudo biogeoquímico que apresentaram ultrapassagem para os Valores de Investigação (VI), segundo CONAMA 420/2009.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Resultado final do estudo biogeoquímico entregue aos órgãos reguladores;• Resultado final do estudo geomorfológico entregue aos órgãos reguladores;• Cronograma das ações de manejo de rejeito entregue aos órgãos reguladores.	





SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

ORÇ. (R\$MM) Total: 462,9 Realizado: 45,4

ESCOPO

Caberá à Fundação construir e operar estruturas emergenciais de contenção de sedimentos e/ou sistemas de tratamento in situ da área contida entre a Barragem de Fundão até a UHE Risoleta Neves, com conclusão até 31 de dezembro de 2016.


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
154	Construção das estruturas emergenciais p/ contenção de sedimentos	31/dez/16
155	Estudos para adoção de melhores técnicas de contenção de rejeitos	31/ago/16
156 e 157	Implementação das técnicas para contenção de rejeitos/trat. de água	02/mar/19
157	Redução da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 NTU	02/mar/19

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	jul-16	---
Execução do programa	Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo	FEL2	78,2%	mai-16	set-16	set-16	mai-17	nov-19
	Dique S4	FEL3	66,7%	---	---	ago-16	dez-16	jan-17
	Fundão Eixo 1 - Fase 1	Execução	33,1%	---	---	jul-16	dez-16	jan-17
	Nova Barragem Santarém	Execução	21,5%	---	---	jul-16	dez-16	jan-17
	Alteamento do Dique S3 - Fase 1	Encerramento	100,0%	---	---	fev-16	abr-16	jul-16

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

■ Iniciada ■ Não iniciada □ Concluída



EM BRANCO






SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Execução do programa	Nova Barragem Santarém	Execução	21,5%	---	---	jul-16	dez-16	jan-17
	Alteamento do Dique S3 - Fase 1	Encerramento	100,0%	---	---	fev-16	abr-16	jul-16
	Alteamento do Dique S3 - Fase 2	Execução	18,3%	---	---	jul-16	out-16	nov-16
	Dragagem dique S3	Execução	0%	---	---	abr-16	mar-17	abr-17
	Manejo de águas superficiais	FEL3	---	mai-16	jun-16	ago-16	dez-16	fev-17
	Fundão Eixo 1 - Fase 2	FEL1	---	---	dez-16	mar-17	nov-19	dez-19
	Ações emergenciais de contenção de rejeito	Processo	---	---	---	---	mai-16	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	dez-19	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto




EM BRANCO



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Barragens

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• <u>Nova Barragem de Santarém</u>: Concluído o dreno de fundo e iniciado o aterro do maciço (atualmente na El. 730m). Em andamento a montagem da galeria pré-moldada do extravasor operacional• <u>Eixo 1 – Fase 1</u>: Limpeza da fundação sendo finalizada.• <u>Alteamento do dique S3</u>: Em andamento a limpeza de fundação.• <u>Dragagem Dique S3</u>: Contratada a empresa que realizará a dragagem do reservatório.	<ul style="list-style-type: none">• <u>Nova Barragem de Santarém</u>: conclusão do extravasor operacional, execução do aterro do maciço da barragem até elevação 735 m.• <u>Eixo 1 – Fase 1</u>: Início do aterro do maciço.• <u>Alteamento do dique S3</u>: Início do lançamento de blocos.• <u>Dragagem Dique S3</u>: Conclusão da importação e instalação da draga.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Realizada limpeza de aproximadamente 160 mil m3 de fundação em Santarém, 523 mil m3 no Eixo 1 de Fundão e 12 mil na região do dique S3.• Lançamento de aproximadamente 30 mil m3 de aterro compactado em Nova Santarém.• Número de trabalhadores nas obras das barragens: 1.635	



EM BRANCO



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Barragens



Visão Geral – Dique S3




Extravasor operacional –
Nova Barragem Santarém



Visão Geral – Nova Barragem
Santarém



Visão Geral – Eixo 1 – Fase 1



EM BRANCO


10



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Diques do Gualaxo

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Realizada reunião na SUPRAM e protocolada toda a documentação para solicitação de liberação ambiental para execução dos diques na SUPRAM/SEMAD• Contratada empresa para os serviços de sondagem e campanha de sondagem em andamento• Em andamento o processo de contratação de materiais para construção dos diques e de serviços para construção dos diques• Contratado testes em escala piloto com a tecnologia FLOTFLUX em suas instalações no Rio de Janeiro	<ul style="list-style-type: none">• Conclusão do processo de contratação de materiais para construção dos diques• Conclusão do processo de contratação de serviços para construção dos diques• Início da execução dos diques• Conclusão do licenciamento ambiental• Conclusão da negociação com os proprietários na região dos diques 2 e 3• Realização de testes em escala piloto da tecnologia FLOTFLUX
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo• Redução da turbidez à jusante do Rio Gualaxo• Ampliação das estruturas de contenção à montante do Rio do Carmo	



EM BRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

ORÇ. (R\$MM)

Total: 400,4


Realizado: 26,8

ESCOPO

Caberá à Fundação efetuar a revegetação inicial, emergencial e temporária, por gramíneas e leguminosas, visando a diminuição da erosão laminar e eólica, com extensão total de 800 ha (oitocentos hectares) e conclusão até o último dia útil de junho de 2016, de acordo com o Plano de Recuperação Ambiental aprovado pelos órgãos ambientais. Deverá, também, recuperar 2.000 ha (dois mil hectares) na área ambiental 1 nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de acordo com o programa aprovado pelos órgãos ambientais

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
158	Revegetação inicial (800 ha)	<input type="checkbox"/>	30/jun/16
159	Recuperação de 2.000 ha	<input type="checkbox"/>	02/mar/20
159	Manutenção das áreas recuperadas	<input checked="" type="checkbox"/>	02/mar/26
160	Regularização/control de erosão dos rios Gualaxo, Carmo e Doce	<input checked="" type="checkbox"/>	29/dez/17

Iniciada Não iniciada Concluída




EM BRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	fev-16	----
Execução do programa	Revegetação Emergencial	Execução	100,0%	----	----	----	jul-16	----
	Tributários	Execução	60,9%	jan-16	jan-16	set-16	fev-17	mar-17
	Recuperação das margens dos Rios (Gualaxo e Carmo)	FEL1	15,3%	out-16	out-16	nov-16	dez-17	fev-18
	Regevetação 2000ha	Shaping	----	----	dez-16	mar-17	mar-20	abr-20
	Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)	Processo	----	----	----	----	mar-26	----
	Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais	Processo	----	----	----	----	dez-23	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	mar-24	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto




EM BRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Entregue em 01/07 o relatório parcial de revegetação dos 800ha• Entregue em 29/07 o relatório final de revegetação dos 800ha• Recuperação de 39 tributários• Contratação da engenharia de reconformação da calha principal dos rios e controle de erosão• Início do monitoramento de turbidez dos tributários	<ul style="list-style-type: none">• Início das obras de reconformação da calha principal dos rios• Início do processo de manutenção da revegetação dos 800ha
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Relatório final de revegetação dos 800ha protocolado junto aos órgãos ambientais	




EM BRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Plantio emergencial

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Entrega do relatório final do programa de revegetação inicial emergencial. Este relatório foi protocolado no dia 29 de julho de 2016, conforme combinado com os órgãos ambientais. O total revegetado foi de 835,22 hectares.	<ul style="list-style-type: none">Sequencia dos serviços de manutenção da revegetação com a empresa atual até que se conclua o processo de contratação da nova empresa.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">Revegetação/plantio de 835,22 ha	




EM BRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Plantio emergencial




EM BRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Recuperação dos tributários

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p>Início da recuperação dos seguintes tributários:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gualaxo: 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 33, 34, 36, 47A, 56B• Carmo: 02 e 06 <p>Conclusão dos seguintes tributários:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gualaxo: 1A, 1B, 02, 03, 05, 20, 21A, 21B, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 35, 37A, 38, 39, 40A, 42, 42A, 46, 47, 47B, 48, 49, 49A, 49B, 49C, 49D, 49F, 49G, 50, 51, 52, 53, 56• Carmo: 09 e 10	<ul style="list-style-type: none">• Concluir a revisão dos contratos de prestação de serviço em andamento;• Fazer a atualização para o SEMAD dos tributários mapeados, totalizando 101 tributários. Sendo: (95 com acesso + 6 sem acesso);• Manter o monitoramento da água do tributários, com medições diárias em 10 tributários de regiões diferentes, 5 concluído e 5 em obra. Colher duas amostras, uma a montante da região afetada e uma a jusante;
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo (margens dos tributários)• Redução da turbidez a jusante do Rio Gualaxo	



EM BRANCO




REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Recuperação dos tributários



TG 02, Área antes da recuperação

TG 02, depois da recuperação



EM BRANCO




REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Recuperação dos tributários



TG 03, Área antes da recuperação

TG 03, Depois da recuperação



EM BRANCO

REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Recuperação dos tributários



TG 05, Área antes da recuperação

TG 05, depois da recuperação

EM BRANCO






REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Calha principal dos rios

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Conclusão dos estudos de caracterização do material depositado nas margens dos rios;• Definição das 16 áreas iniciais de recuperação;• Contratação da engenharia detalhada da recuperação.	<ul style="list-style-type: none">• Início da engenharia detalhada das recuperações;• Contratação das empresas para recuperação;• Definição das equipes de supervisão de campo (Samarco).
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Recuperação das áreas impactadas nas margens dos rios• Redução da turbidez a jusante do Rio Gualaxo	



EM BRANCO




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DE APPs

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Aprovação da proposta técnica-comercial do IBIO contemplando a recuperação de APPs de nascentes, pelo Subcomitê Socioambiental.	<ul style="list-style-type: none">Submissão da proposta do IBIO para aprovação do Board.
RESULTADOS	



EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DE NASCENTES


ORÇ. (R\$MM)	Total: 80	Realizado: 0
---------------------	-----------	--------------

ESCOPO		
Caberá à Fundação, a título compensatório, recuperar 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), com a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura deste acordo, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce		
CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
163	Recuperação de cinco mil nascentes	<input checked="" type="checkbox"/> 02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	mar-17	----
Execução do programa	Processo de produção de mudas e monitoramento da efetividade da recuperação de Nascentes	Processo	----	----	----	----	mar-26	----
	Reabilitação de 500 nascentes	Processo	----	----	----	----	mar-17	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	mar-26	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Aprovação da proposta técnica-comercial do IBIO contemplando a recuperação de APPs de nascentes, pelo Subcomitê Socioambiental.	<ul style="list-style-type: none">Submissão da proposta do IBIO para aprovação do Board.
RESULTADOS	



EM BRANCO





CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ORÇ. (R\$MM)

Total: 36


Realizado: 0

ESCOPO

A Fundação deverá elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática impactada da bacia hidrográfica do Rio Doce, incluindo: a) estudo populacional da ictiofauna de água doce da calha e tributários do Rio Doce na área ambiental 1, o qual deverá ser apresentado até o último dia útil de dezembro de 2016, conforme orientação do ICMBIO; b) processo de avaliação do estado de conservação das espécies de peixes nativas da Bacia do Rio Doce na área ambiental 1, o qual deverá ser apresentado até o último dia útil de dezembro de 2016, conforme orientação do ICMBIO; c) medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da Bacia do Rio Doce na área ambiental 1, conforme resultados dos estudos indicados na letra b acima, as quais deverão ser apresentadas até o último dia útil de dezembro de 2016, conforme orientação do ICMBIO.

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
164 a	Estudo populacional da ictiofauna	<input type="checkbox"/>	30/dez/16
164 b	Avaliação da conservação das espécies de peixes nativas	<input type="checkbox"/>	30/dez/16
164 c	Medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática	<input type="checkbox"/>	30/dez/16
165 Inc Ia	Proposta de estudo para avaliação da qual. da água	<input type="checkbox"/>	30/jun/16
165 Inc Ia	Proposta de estudo para avaliação da ecotoxicidade da água	<input type="checkbox"/>	30/jun/16
165 Inc Ib	Descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna	<input type="checkbox"/>	30/jun/16
165 Inc IIa	Avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica	<input type="checkbox"/>	31/mai/17
165 Inc IIb	Avaliação do habitat de fundo marinho	<input checked="" type="checkbox"/>	31/mai/17
165 § 1º	Integração medidas de monitor. e parâmetros dos estudos da cláus. 165	<input type="checkbox"/>	
165 Inc III	Implementação e execução das medidas de monitoramento	<input type="checkbox"/>	30/jun/21
166	Apresentação das ações de contingência de monitor. da fauna aquática	<input type="checkbox"/>	31/jul/17
166	Manutenção do monitoramento da fauna aquática	<input type="checkbox"/>	02/mar/21

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada



EM BRANCO




CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	jul-17	---
Execução do programa	Processo de Monitoramento e Execução das ações de Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática	Processo	---	---	---	---	ago-21	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	out-21	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada
 Não iniciada
 Concluída
 Encerrada



EM BRANCO




CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Protocolado o plano de Conservação da Biodiversidade Aquática no ICMBio no dia 30/06/2016.	<ul style="list-style-type: none">Aguardar posicionamento do ICMBio quanto a proposta apresentada. Caso seja necessário, revisões serão feitas.
RESULTADOS	

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada



EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

ORÇ. (R\$MM)	Total: 29,3	Realizado: 0
---------------------	-------------	--------------

ESCOPO

Caberá à Fundação, a título compensatório, efetuar a construção e o aparelhamento de 2 (dois) Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS), de acordo com Termo de Referência a ser emitido pelo IBAMA e a respectiva lista de equipamentos, na área ambiental 2, sendo uma unidade em Minas Gerais e outra no Espírito Santo, em áreas livres e desimpedidas para edificação indicadas pelo IBAMA;


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
167 § 1º	Construção e o aparelhamento de duas CETAS	<input type="checkbox"/>	02/mar/18
167 § 2º	Disposição de recursos para a manutenção operacional dos CETAS	<input type="checkbox"/>	01/mar/21

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	mar-18	---
Execução do programa	Construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG	Shaping	---	---	---	---	mar-20	---
	Construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em ES	Shaping	---	---	---	---	mar-20	---
	Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Processo	---	---	---	---	mar-23	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	mar-23	---

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

■ Iniciada ■ Não iniciada □ Concluída ■ Encerrada



EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Definição, em reunião com representantes da Samarco e acionistas, que esse programa será iniciado pela Fundação.	
RESULTADOS	

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

Iniciada Não iniciada Concluída



EM BRANCO



FAUNA E FLORA TERRESTRE

ORÇ. (R\$MM)

Total: 7

Realizado: 0

ESCOPO

A Fundação deverá apresentar, até o último dia útil de dezembro de 2016, um estudo para identificação e caracterização do impacto do evento, na área ambiental 1, sobre as espécies terrestres ameaçadas de extinção. Até o último dia útil de dezembro de 2016 deverá ser apresentado um plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
168	Estudo do impacto sobre espécies terrestres ameaçadas de extinção	<input checked="" type="checkbox"/>	30/dez/16
168 § 1º	Plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre	<input type="checkbox"/>	30/dez/16
168 § 2º	Início da execução do plano de ação p/ conservação da fauna e flora	<input type="checkbox"/>	

PROJETOS E PROCESSOS


Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	dez-16	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	mai-22	----

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

Iniciada

Não iniciada

Concluída




EM BRANCO



FAUNA E FLORA TERRESTRE

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Foi definido que o órgão responsável por esse programa será o IBAMA.	<ul style="list-style-type: none">Reunião com IBAMA, IEMA e ICMBio para definição de escopo do programa.
RESULTADOS	



EM BRANCO



COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

ORÇ. (R\$MM)	Total: 500	Realizado: 0
---------------------	------------	--------------


ESCOPO

A Fundação prestará auxílio financeiro aos municípios da área ambiental 2 para custeio na elaboração de planos básicos de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais.

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
169 § 3º	Definição dos municípios contemplados e da respectiva verba <input checked="" type="checkbox"/>	

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	out-16	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	fev-19	----



(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa


Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada

EM BRANCO



COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Terceiro encontro com as prefeituras da Bacia do Rio Doce para definir critérios de priorização dos municípios.	<ul style="list-style-type: none">• Apresentar proposta de necessidade de diagnóstico dos sistemas de tratamento de esgoto dos municípios para o CIF.
RESULTADOS	



EM BRANCO



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ORÇ. (R\$MM) Total: 163,9 Realizado: 0,6

ESCOPO

Nos Municípios que tiveram localidades cuja operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada, a Fundação deverá construir sistemas alternativos de captação e melhoria das estações de tratamento de água para todas para as referidas localidades desses municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em 30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto naquele rio, em relação aos níveis anteriores ao evento


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
171 § 1º	Levantamentos de campo, estudos de concepção e projetos básicos	02/mar/18
171 § 1º	Realização das obras dos sistemas de abastecimento de água	01/mar/21

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	ago-16	---
Execução do programa	Adutora Governador Valadares	FEL3	20,2%	---	jun-16	fev-17	set-18	nov-18
	Adutora Lagoa Nova	FEL3	100,0%	---	---	jun-16	out-16	dez-16
	Adutora Santa Maria	Execução	31,2%	---	---	---	dez-16	jan-17
	Adutora Pancas	FEL3	39,4%	---	---	ago-16	dez-16	fev-17
	Adutora Rio Guandú	FEL3	44,7%	---	---	set-16	dez-16	fev-17
	Adutora Córrego Barroso	Execução	6,3%	---	---	---	dez-16	fev-17
	Nova Estação de Tratamento de água de Galileia-MG	Execução ³	0%	---	---	jan-16	fev-17	abr-17

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

■ Iniciada ■ Não iniciada ■ Concluída ■ Encerrada



EM BRANCO




MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Execução do programa	Perfuração de Poço em Alpercata ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em Cachoeira Escura ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em Ipaba ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em Pedra Corrida ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em São Tomé do Rio Doce ³	FEL3	----	----	----	set-16	mar-17	abr-17
	Perfuração de Poço em Itueta ³	FEL3	----	----	----	set-16	mar-17	abr-17
	Perfuração de Poço em Marilândia ³	FEL3	----	----	----	set-16	mar-17	abr-17
	Perfuração de Poço em Mascarenhas ³	FEL3	----	----	----	set-16	mar-17	abr-17
	Perfuração de Poço em Santo Antonio do Rio Doce ³	FEL3	----	----	----	set-16	mar-17	abr-17
	Perfuração de Poço em Regencia ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em São Vitor ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em Senhora da Penha ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em Tumiritinga ³	Execução	----	----	----	jun-16	out-16	dez-16
	Perfuração de Poço em Barreto ³	FEL3	----	----	----	fev-17	jul-17	set-17
	Perfuração de Poço em Gesteira ³	FEL3	----	----	----	fev-17	jul-17	set-17
	Perfuração de Poço em Camargos ³	FEL3	----	----	----	fev-17	jul-17	set-17
	Perfuração de Poço em Pedras ³	FEL3	----	----	----	fev-17	jul-17	set-17
	Perfuração de Poço em Paracatu de Baixo ³	FEL3	----	----	----	fev-17	jul-17	set-17
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	abr-21	----

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

(3) Aguardando assinatura de termo de compromisso dos municípios ara início das perfurações. Cronograma pode ser impactado.

Iniciada
 Não iniciada
 Concluída
 Encerrada








MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p>COLATINA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adutora do Rio Santa Maria: Continuação do detalhamento de Engenharia da Estação de Bombeamento• Adutora do Rio Pancas: Continuação do detalhamento de Engenharia <p>LINHARES</p> <ul style="list-style-type: none">• Engenharia detalhada concluída, pacotes de construção contratados e obra iniciada <p>BAIXO GUANDU</p> <ul style="list-style-type: none">• Continuação do detalhamento de Engenharia <p>RESPLENDOR</p> <ul style="list-style-type: none">• Iniciada a reavaliação do manancial Córrego Barroso que pode levar a outras fontes alternativas caso não seja suficiente <p>GOVERNADOR VALADARES</p> <ul style="list-style-type: none">• Contratada a topografia e sondagem à trado da rota de tubulação	<p>COLATINA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adutora do Rio Santa Maria: início da contratação da construção da estação de bombeamento• Adutora do Rio Pancas: término da engenharia detalhada <p>LINHARES</p> <ul style="list-style-type: none">• Continuação da obra <p>BAIXO GUANDU</p> <ul style="list-style-type: none">• Término do detalhamento de Engenharia <p>RESPLENDOR</p> <ul style="list-style-type: none">• Definição da melhor solução hídrica para Resplendor, de acordo com demanda do CIF. <p>GOVERNADOR VALADARES</p> <ul style="list-style-type: none">• Execução da topografia e sondagem• Reunião com município/SAAE para início do processo de licenciamento
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• LINHARES – Iniciada a obra da adutora em 29/07	




EM BRANCO



MELHORIA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

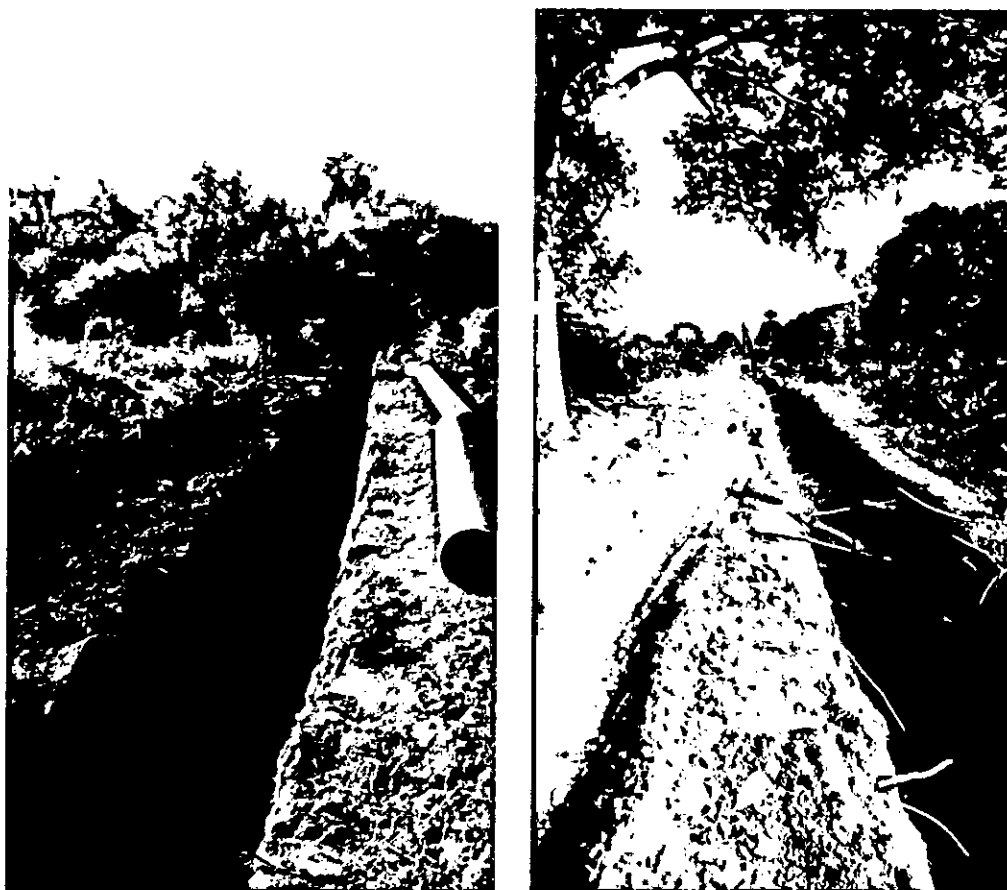

Andamento das obras da adutora de Linhares



EM BRANCO



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ORÇ. (R\$MM)

Total: 34,6

Realizado: 9,7

ESCOPO

A Fundação deverá implantar medidas de educação ambiental, em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na área ambiental 1

O programa de educação ambiental deverá abranger, além dos demais conteúdos previstos em lei, informações referentes às emergências ambientais;

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
173 § 1º	Estudos para avaliar inclusão das cidades SC Escalvado e Rio Doce	■	02/set/16
173 § 2º	Diagnóstico das necessidades específicas das ações sist. emerg./alerta	■	02/set/16
173	Medidas de incremento da estrutura de apoio sist. emergência e alerta	■	02/mar/17
173	Manutenção da estrutura de apoio sist. emergência e alerta	■	02/mar/22
172 § 1º	Início da implantação das medidas de educação ambiental	□	29/ago/16
172 § 1º	Implantação de medidas de educação ambiental	□	29/ago/26



(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

■ Iniciada ■ Não iniciada □ Concluída ■ Encerrada

EMBRANCO




EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência	Execução	78,0%	---	---	---	jan-17	fev-17
	Instalação de sirenes de emergência - Fase 1	Execução	51,1%	---	---	---	set-16	out-16
	Reestruturação da brigada para atendimento a emergência de barragens	FEL3	---	---	---	ago-16	mar-17	abr-17
	Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce	FEL3	---	---	---	---	ago-16	out-16
	Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência	Processo	---	---	---	---	set-21	---
	Processo de Execução de Senso Populacional e Simulados Reais nas comunidades de Mariana e Barra Longa para plena atuação e resposta às situações de emergência	Processo	---	---	---	---	mar-21	---
	Processo de Manutenção e Apoio à Defesa Civil	Processo	---	---	---	---	fev-22	---
	Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental	Processo	---	---	---	---	jul-26	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	out-26	---

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

■ Iniciada ■ Não iniciada □ Concluída ■ Encerrada




EM BRANCO



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Realização de Workshop interno junto representantes dos programas socioeconômicos e socioambientais para identificação de sinergias dos mesmos com o Programa de Educação Ambiental• Definição do estrutura preliminar do PEA para discussão com as partes interessadas pertinentes.	<ul style="list-style-type: none">• Realização de reuniões de compartilhamento e escuta sobre a estrutura preliminar do PEA junto a grupos de comunidade, escolas e poder público.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Escopo preliminar definido para mensuração de oportunidades para o programa de educação ambiental.	




EMBRANCO



EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Sistemas de emergência / Defesa civil

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Reunião com defesa civil estadual e federal para dimensionamento das defesas civis a jusante das barragens• Kick Off com a fornecedora dos equipamentos de sirene e liberação para fabricação dos equipamentos.• Instalação de abrigos para as sirenes fixas• Aquisição de terreno para montagem das sirenes remotas• Liberação para fabricação de 17 eletrocentros das sirenes remotas	<ul style="list-style-type: none">• Instalação de 17 eletrocentros para as sirenes remotas.• Instalação das sirenes fixas e remotas – previsão de entrega 30/08• Estudo de reestruturação das defesas civis – prazo 02/SET• Planejamento/realização de simulados reais - AGO/16
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Proposta técnica e comercial para contratação do estudo de reestruturação das defesas civis – contratação em andamento.• 8 Abrigos instalados	



EM BRANCO



INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO

ORÇ. (R\$MM)

Total: 12,8

Realizado: 0

ESCOPO

A Fundação deverá implantar um centro de informações técnicas da área ambiental 1, o qual concentrará informações ambientais relativas a essa área. Deverão ser criadas e mantidas, ainda, 2 (duas) bases físicas regionais em Minas Gerais e 2 (duas) no Espírito Santo, em municípios não coincidentes com aquele que sediará o centro de informações técnicas, os com infraestrutura e equipamentos adequados a serem definidos pela Fundação, validados pelo Comitê Interfederativo, permanentemente interligadas ao centro de informações técnicas e localizadas no interior da área ambiental 1, destinados a comunicar e informar à população quanto aos aspectos ambientais.


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
174	Implantação de um centro de informações técnicas	<input checked="" type="checkbox"/> 30/dez/16
174 § 1º	Criação de bases regionais	<input checked="" type="checkbox"/> 30/dez/16
174 § 2º	Manutenção do centro de informação	<input type="checkbox"/> 02/mar/26
174 § 2º	Manutenção das bases físicas	<input type="checkbox"/> 02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	Centros de Informação técnica	Shaping	---	---	---	---	dez-16	jan-17
	Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais	Processo	---	---	---	---	dez-30	---
	Manutenção das estruturas implantadas	Processo	---	---	---	---	dez-30	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	dez-30	---

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

Iniciada Não iniciada Concluída




EM BRANCO



INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Definida que as instalações servirão de base regional também para outros programas.	<ul style="list-style-type: none">Definição das instalações necessárias para informação para a população.
RESULTADOS	



EM BRANCO



COMUNICAÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL

ORÇ. (R\$MM)	Total: 5,2	Realizado: 0,1
---------------------	------------	----------------

ESCOPO

A Fundação deverá apresentar, até julho de 2016, para apreciação e aprovação dos órgãos ambientais, um programa de comunicação regional, nacional e internacional, por meio de sítio eletrônico em no mínimo três idiomas – inglês, português e espanhol - abrangendo as ações e programas desenvolvidos por força deste Acordo, o qual será mantido por 10 (dez) anos contados da assinatura deste Acordo

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
175	Apresentação de um Programa de Comunicação <input type="checkbox"/>	31/jul/16
175	Manutenção do Programa de Comunicação <input checked="" type="checkbox"/>	02/mar/26

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	set-16	----
Execução do programa	Comunicação - Plataforma digital	Execução	----	----	----	----	set-16	nov-16
	Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico	Processo	----	----	----	----	dez-30	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	dez-30	----

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada




EM BRANCO



COMUNICAÇÃO NACIONAL/INTERNACIONAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Construção do website da Fundação, em alinhamento com as contribuições do CIF• Plano de comunicação para o lançamento da Fundação• Definição dos procedimentos de comunicação da Fundação• Desenvolvimento do Manual de Marca e da papelaria da Fundação	<ul style="list-style-type: none">• Lançamento do website da Fundação
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Plano de comunicação para o lançamento da Fundação	



EM BRANCO
