



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

AÇÕES PRÓXIMO MÊS

4ª Reunião (09/08) com Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) – À confirmar:

- Follow up das ações realizadas e retorno da CT sobre o banco de dados apresentado, bem como o formulário integrado ajustado.

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:


- Realização do cadastro socioeconômico e levantamento dos danos integrado no município de Barra Longa (Gesteira, Sede e Barreiros) com base no cadastro emergencial;
- Organização de estrutura de entrevistadores para atendimento das famílias que optarem por iniciar o cadastro no município de Mariana.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Mobilização da equipe Synergia para as frentes de trabalho no Rio Doce;
- Elaboração do plano de trabalho detalhado;
- Implementação das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Início do agendamento para realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos.

Base de dados e Documentação:

- Análise técnica de consistência do cadastro emergencial do Rio Doce;
- Realização do DE/PARA do banco emergencial do Rio Doce com base no formulário integrado;
- Checklist para atendimento as solicitações de cadastro realizadas pelos Canais de Relacionamento.



EMBRANCO




LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

LOCAIS	FAMÍLIAS	PESSOAS
Mariana e Barra Longa	942	2.810
Rio Doce	7.573	26.804
TOTAL	8.515	29.614

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016

COMUNIDADE DE GESTEIRA – BARRA LONGA						
FASE	DESCRIÇÃO	CADASTROS PREVISTOS	AGENDAMENTO REALIZADO	CADASTROS REALIZADOS	RECUSAS	CADASTROS A REALIZAR
1	Cadastro Socioeconômico	56	49	49	2	5*
2	Cadastro Físico	49**	38	29	0	20**
OBS.:	<p>* Casos a tratar: 1 morador de São Paulo, 1 morador de Contagem, 1 morador não identificado, 1 morador de Ponte Nova que não é mais dono da propriedade, 1 cadastro será realizado na casa do impactado.</p> <p>** A confirmar com a realização da fase 1 do cadastro.</p>					

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 02/08/16



EMBRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS




Plantão do cadastro socioeconômico em Gesteira




Plantão do cadastro socioeconômico em Gesteira



Plantão do cadastro físico em Gesteira

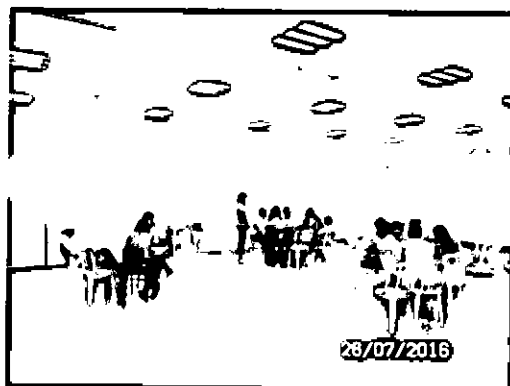


Plantão do cadastro das famílias de Gesteira realizado no Centro de Convenções de Mariana

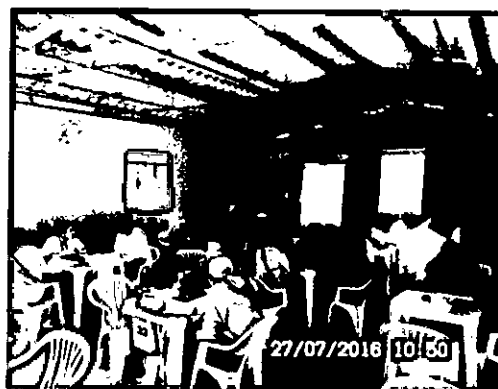

Plantão do cadastro socioeconômico em Gesteira



Aplicação do cadastro físico em Gesteira



EMBRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS


BARRA LONGA SEDE						
FASE	DESCRIÇÃO	CADASTROS PREVISTOS	AGENDAMENTO	CADASTROS REALIZADOS	RECUSAS	CADASTROS A REALIZAR
1	Cadastro Socioeconômico	366	83	60	0	306
2	Cadastro Físico	366*	0	0	0	366*

OBS.:* A confirmar com a realização da fase 1 do cadastro.


INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 02/08/16



Plantão de cadastro socioeconômico em Barra Longa, 01/08/16

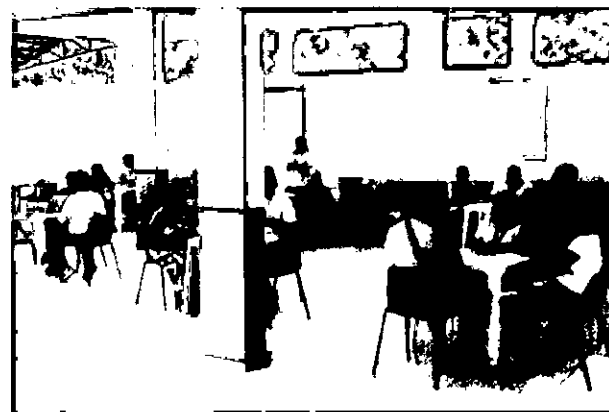

Plantão de cadastro socioeconômico em Barra Longa, 01/08/16



EMBRANCO



6



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

ORÇ. (R\$MM)	Total: 373	Realizado: 10,8
---------------------	------------	-----------------

ESCOPO

A Fundação deverá elaborar e executar um Programa de Ressarcimento e de Indenizações, por meio de negociação coordenada, destinada a reparar e indenizar os impactados, que comprovem prejuízos e danos ou demonstrem a impossibilidade de fazê-lo. O programa deverá priorizar a reparação dos impactados residentes nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, Mascarenhas, Regência e Povoação

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
38	Elaboração do Programa de Negociação Coordenada	02/mar/17
31 e 38	Pagamento das indenizações	03/jun/17

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	PIM Fase 1 - Ressarcimento e indenização dos impactados	Execução	8,0%	---	---	set-16	jun-17	jul-17
	Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS	Processo	---	---	---	---	jan-17	---
	Execução dos Eventuais Atendimentos Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até dez/16 e demais negociações	Processo	---	---	---	---	set-19	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	out-19	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada
 Não iniciada
 Concluída
 Encerrada



EM BRANCO




RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Apresentação do programa em câmara técnica e reunião extraordinária do CIF;• Início da submissão da matriz de danos aos entes técnicos (CDL, Embrapa, Sinduscon e outros)• Reuniões com defensorias estaduais para apresentação do programa;• Início das contratações de mão-de-obra, obras civis, TI, serviços, método de pagamento e toda infra estrutura operacional dos escritórios.• Reestruturação da equipe para atender a fase de implementação do programa;• Elaboração de matriz de riscos do programa bem como ações mitigadoras;• Homologado módulo de registro de indenizações antecipadas;• Correlacionando os dados do cadastro com os formulários de danos (Faleck).• Elaborado FAQ para equipe de atendimento.	<ul style="list-style-type: none">• Validar o programa e lista de danos bem como os critérios de indenização junto à entidades públicas, técnicas e famílias impactadas;• Validar logística de funcionamento dos escritórios com câmara técnica;• Iniciar obras de adequação dos escritórios ao longo das áreas impactadas (acessibilidade, layout, TI, etc);• Contratar mão-de-obra terceirizada para atendimento nos escritórios• Concluir processo seletivo de Mão de Obra interno;• Testar plataforma de TI do programa e canal de atendimento;• Finalizar procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios• Finalizar mapeamento de interfaces do programa com demais programas do acordo• Iniciar contratação dos imóveis da fase 2 do PIM• Realizar workshop de processo do PIM;• Realizar seminário de riscos;• Homologar módulo indenizatório;• Treinar equipe de atendimento (0800) no módulo de agendamento;• Treinar equipes dos escritórios no módulo indenizatório.• Finalizar processo seletivo do PIM.

RESULTADOS

- Lista de danos e matriz de danos aprovada internamente;
- Verba para contratações de mão-de-obra, obras civis, TI, serviços, método de pagamento e toda infra estrutura operacional dos escritórios liberada;
- Validação pelo CIF do cronograma de diálogo com entidades públicas, técnicas e famílias impactadas;
- Desenvolvido o módulo de indenização antecipada;
- Realizado treinamento com as equipes de Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Colatina no módulo de indenização antecipada;



EMBRANCO

12000



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

ORÇ. (R\$MM)

Total: 58,2

Realizado: 5,3

ESCOPO

-As seguintes ações deverão ser desenvolvidas pela Fundação em relação ao povo Krenak, no Estado de Minas Gerais:

I. Manutenção das medidas de apoio emergencial previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A.;

II. Monitoramento contínuo das situações, previstas no acordo de 16/11/2015

-As seguintes ações deverão ser desenvolvidas pela Fundação em relação aos povos Tupiniquim e Guarani localizados na região da Foz do Rio Doce:

I. Implementação de medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participação da FUNAI;

II. Monitoramento contínuo das medidas de apoio emergencial;

-Ações que deverão ser desenvolvidas pela Fundação em relação aos povos Krenak, Tupiniquim e Guarani:

III. Contratação de consultoria independente, conforme Termo de Referência a ser apresentado pela FUNAI, para elaboração de estudo circunstanciado dos impactos socioambientais e socioeconômicos do evento sobre os Krenak, Tupiniquim e os Guarani;


IV. Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo previsto;

V. Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente;

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
43 § 1º	Início das medidas emergenciais não iniciadas - Krenak	<input type="checkbox"/>	
43 Inc. I, II e § 1º	Manutenção/monitoramento das medidas do acordo Vale/Krenak	<input checked="" type="checkbox"/>	
43 Inc III & § 2º	Entrega do Termo de Referência pela FUNAI	<input type="checkbox"/>	01/abr/16
43 Inc III e § 2º	Contratação de estudo dos impactos sobre os Krenak	<input type="checkbox"/>	01/jul/16
43 Inc IV	Detalhamento do Plano de Ação Permanente - Krenak	<input type="checkbox"/>	
43 Inc IV § 4º	Execução do Plano de Ação Permanente - Krenak	<input type="checkbox"/>	
44 Inc I	Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani	<input type="checkbox"/>	22/mar/16
44 Inc I	Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	<input type="checkbox"/>	
44 Inc II	Execução e monit. medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	<input type="checkbox"/>	01/jul/16
44 Inc III e § 3º	Contratação de estudo dos impactos sobre os Tupiniquim e Guarani	<input type="checkbox"/>	01/jul/16
44 Inc IV	Detalhamento de Plano de Ação Permanente Tupiniquim e Guarani	<input type="checkbox"/>	
44 Inc V e § 4º	Execução do Plano de Ação Permanente Tupiniquim e Guarani	<input type="checkbox"/>	

(1) Fase atual e seu avanço físico; (2) Fase aplicável para definição do programa

Iniciada Não iniciada Concluída Em andamento




EM BRANCO



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	out-18	---
Execução do programa	Estrutura de abastecimento de água Krenak	Execução	3,5%	---	---	jul-16	mai-18	dez-18
	Apoio Financeiro - Krenak	Processo	---	---	---	---	jul-18	---
	Apoio Financeiro - Tupiniquim e Guarani	Processo	---	---	---	---	abr-17	---
	Fornecimento Emergencial de Água Krenak	Processo	---	---	---	---	mai-18	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	jan-19	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto




EMBRANCO



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p>Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">• Conclusão contratação consultoria antropológica• Início profissional Samarco em Resplendor <p>Krenak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial• Manutenção das estradas para abastecimento de água• Conclusão análise dos poços de água• Reunião para apresentação da equipe de diálogo para Funai/regional• Licitação fornecedor ração animal <p>Comboios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Repactuação das parcelas do acordo emergencial• Conclusão das análises hídricas do rio Comboios, Canal Cabloco Bernardo e poços Córrego do Ouro e Comboios <p>Caieiras Velhas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Assinatura de Acordo Emergencial• Início do pagamento de auxílio financeiro• Monitoramento dos recursos hídricos(Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)	<p>Geral</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial para indígenas• Manutenção auxílio financeiro• Manutenção monitoramento de água <p>Krenak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das estradas para abastecimento de água• Licitação para recuperação dos poços <p>Caieiras Velhas</p> <ul style="list-style-type: none">• Licitação para recuperação dos poços
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R\$7.092) por família a 126 famílias, disponibilização de R\$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água• Tupiniquim(TI Comboios): Auxílio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias• Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R\$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R\$ 662.942,70, depositado em uma conta vinculada à associação indígena.	



EMBRANCO

1000000000



QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

ORÇ. (R\$MM)	Total: 0,5	Realizado: 0
---------------------	------------	--------------

ESCOPO

- I. Início de tratativas com as comunidades, com a participação da FCP, para identificação da necessidade de adoção de medidas de apoio emergencial, como decorrência do evento;
- II. Execução das ações emergenciais pactuadas com as comunidades e Monitoramento contínuo das medidas de apoio emergencial, caso estas venham a ser implantadas na forma o inciso anterior;
- III. Contratação de consultoria independente, conforme Termo de Referência a ser apresentado pela FCP, para elaboração de estudo circunstanciado dos impactos socioambientais e socioeconômicos do evento sobre às comunidades;
- IV. Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III;
- V. Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente;


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO	DATA FIM
46 § 1º	Adoção de medidas emergenciais - Quilombolas	<input type="checkbox"/>
46 § 2º	Entrega do Termo de Referência pela FCP	<input type="checkbox"/> 01/abr/16
46 § 2º	Contratação de Estudo sobre os Quilombolas	<input type="checkbox"/> 01/jul/16
46 § 3º	Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas	<input type="checkbox"/>
46 § 3º	Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas	<input type="checkbox"/>

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	fev-17	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	mar-17	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

■ Iniciada ■ Não iniciada □ Concluída




EMBRANCO



QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS TRADICIONAIS

Estudo vila de Santa Efigênia

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Reunião com Fundação Cultural Palmares para apontamento da necessidade de revisão do TR.	<ul style="list-style-type: none">• Protocolo do ofício de solicitação formal de revisão do Termo de Referência e de uma agenda de trabalho junto à Fundação Cultural Palmares para revisão do escopo do Termo.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Liberação do Termo de Referência pela FCP (protocolo em 18 de maio)• Definição junto à Fundação Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de Referência expedido.	



EM BRANCO



PROTEÇÃO SOCIAL

ORÇ. (R\$MM)

Total: 38,6

Realizado: 0

ESCOPO

A Fundação deverá elaborar, desenvolver e executar um programa para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico


CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
58	Início do Programa de Proteção Social	<input type="checkbox"/>	01/abr/16
58	Execução do Programa de Proteção Social	<input checked="" type="checkbox"/>	01/abr/19

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	mai-17	----
Execução do programa	Execução de ações socioassistenciais emergenciais	Processo	----	----	----	----	jun-17	----
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	mai-19	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada




EMBRANCO



PROTEÇÃO SOCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Atendimento às famílias de Bento, Paracatu• visitas domiciliares, grupos temáticos, atividade socioculturais• Encaminhamento para rede pública: saúde, educação e assistência social (CREAS e Conselho Tutelar)• Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos e professores)• Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida• Reuniões com a equipe técnica para o acompanhamento das atividades.	<ul style="list-style-type: none">• Reunião com equipe de Proteção Social de Aracruz• Executar o plano de transição de Mariana• Reunião com equipe técnica Mariana apresentar transição de proteção
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica(CRAS)• Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial• Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território	



EMBRANCO

2.10.2



DIÁLOGO SOCIAL

ORÇ. (R\$MM)

Total: 199,9

Realizado: 5,6

ESCOPO

Deverão ser criados canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em espaços fixos ou itinerantes, se necessário, devendo ser previstas as seguintes ações:

- a) instituição de mesa de diálogo e negociação permanente;
- b) construção e manutenção do sítio virtual específico na internet para divulgação das informações relacionadas ao evento;
- c) criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades, tanto espaços fixos quanto móveis;
- d) implementação do mecanismo de ouvidorias para monitoramento das ações do plano de reparação; e
- e) central 0800 de atendimento à população

Além das medidas acima, as seguintes ações devem ser implementadas:

- a) criação de um manual de "perguntas e respostas", o qual deverá estar disponível aos líderes comunitários e deverá esclarecer sobre os processos de moradia temporária, auxílio financeiro, indenização e outros;
- b) divulgação em redes sociais sobre iniciativas da Fundação, esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e
- c) relacionamento com a imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação.

Deverá ser criada uma Ouvidoria, com a indicação de um Ouvidor, cujo nome e dados para contato devem ser amplamente divulgados nos canais institucionais

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
63	Realização de painéis temáticos periódicos	<input type="checkbox"/>	
63 § Único	Eventos anuais de prestação de contas da Fundação	<input type="checkbox"/>	
64a	Instituição de mesa de diálogo e negociação permanente	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
64b	Construção e manutenção de site na internet	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
64c	Criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
64e	Central 0800 de atendimento à população	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
67a	Manual de perguntas e respostas	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
67b	Divulgação em redes sociais de iniciativas da Fundação	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
67c	Relacionamento com a imprensa e disponibilização de releases	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
65	Desenvolvimento de plataforma interativa	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
64d e 68	Criação de Ouvidoria	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
70	Canais de atendimento adequados aos grupos vulneráveis	<input type="checkbox"/>	31/mai/16
71	Manutenção dos canais de diálogo	<input checked="" type="checkbox"/>	03/mar/31
72	Reporte trimestral da Ouvidoria	<input type="checkbox"/>	29/ago/16

Iniciada
 Não iniciada
 Concluída
 Em andamento




EMBRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	set-16	----
Execução do programa	Adequação de ouvidoria	FEL3	----	----	----	ago-16	abr-17	mai-17
	Processo emergencial de comunicação institucional	Processo	----	----	----	----	nov-16	----
	Processo emergencial de participação e diálogo	Processo	----	----	----	----	mar-17	----
	Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO	Processo	----	----	----	----	abr-17	----
	Processo de comunicação institucional	Processo	----	----	----	----	dez-30	----
	Processo de participação e diálogo	Processo	----	----	----	----	dez-30	----
	Processo de canais de relacionamento	Processo	----	----	----	----	dez-30	----
	Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	Processo	----	----	----	----	dez-30	----
Encerramento do programa	Processo emergencial de canais de relacionamento	Processo	----	----	----	----	out-16	----
	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	dez-31	----

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto




EMBRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Trecho I: 4 municípios (Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escavado e Rio Doce): 36 reuniões (934 participantes)• Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio Doce: 30 reuniões (371 participantes)• Monitoramento de famílias impactadas na região de Mariana e Barra Longa• Mapeamento/Monitoramento de stakeholders• Mediação de conflitos• Atendimento a 317 manifestações nos Postos Físicos de Atendimento (PFA) Mariana, Barra Longa e Sta do Escavado.• Estruturação do Grupo de Gestão do PG006• Elaboração do escopo de contratação de empresa especializada para avaliação do processo de Ombuds	<ul style="list-style-type: none">• Continuidade da adaptação do plano de Relacionamento com comunidades para o momento de transição• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios impactados• Atualização do Mapeamento/Monitoramento stakeholders locais• Mediação de conflitos• Implantação dos PFAs adicionais do Rio Doce• Contratação da empresa ACCESS para avaliação do processo de Ombuds e início do trabalho
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Estabelecimento de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução.• Acumulado de reuniões:• 258 com 8.554 participantes no trecho I• 189 com 7.710 participantes nos trecho II e III• Capacidade de atendimento de 100% das ligações no 0800	



EM BRANCO




DIÁLOGO SOCIAL



Trabalho de Levantamento de Expectativas com a Comunidade de Gesteira – Barra Longa – para programa Reassentamento



Trabalho de Auto-delimitação com a Comunidade de Paracatu – Mariana – para programa Reassentamento



EMBRANCO



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

ORÇ. (R\$MM)

Total: 16,4

Realizado: 10,1

ESCOPO

A Fundação deverá desenvolver um programa para assistência aos animais extraviados e desalojados, incluindo os animais domésticos, tais como cães e gatos, sendo voltado especificamente para Mariana e Barra Longa

CLAUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
74a	Resgate dos animais	<input type="checkbox"/>	02/mar/18
74b	Implementação de CRAs - Centros de Recolhimento Animal	<input type="checkbox"/>	02/mar/18
74c	Provisão de alimentação aos animais na propriedades de origem	<input checked="" type="checkbox"/>	02/mar/18
74d	Provisão de assistência médica veterinária	<input checked="" type="checkbox"/>	02/mar/18
74e	Cadastro dos animais acolhidos nos CRAs	<input type="checkbox"/>	02/mar/18
74f	Promoção de evento de adoção para animais	<input type="checkbox"/>	02/mar/18
74g	Destinação dos animais não adotados para um santuário	<input type="checkbox"/>	02/mar/18
75	Manutenção do Programa de Assistência aos Animais	<input checked="" type="checkbox"/>	02/mar/18

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)	Processo	---	---	---	---	mai-19	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	mai-19	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada




EMBRANCO



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Vistas de pós adoção• Conclusão da mudança dos animais de pequeno porte para CATA no distrito de Camargos – Mariana MG• Adaptações de infraestrutura CATA• Desmobilização do Galpão de Animais• Resgate de animais em Bento Rodrigues• Vacinação de filhotes de cães• Adoções de animais de pequeno porte• Manutenção do isolamento de animais na Fazenda Bom Retiro para acompanhamento do IMA• Devolução de animais de pequeno porte aos tutores• Atendimentos de animais em campo	<ul style="list-style-type: none">• Avaliação de animais• Avaliação e formação de valor de animais de grande porte• Negociação de compra dos animais de grande porte junto aos proprietários rurais• Acompanhamento do pós adoção• Transferência de animais de grande porte adquiridos para Fazenda Ponta Ubu Agropecuária• Participação de evento de adoção em Juiz de Fora MG• Devolução animais de grande e pequeno porte aos proprietários
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 79 visitas de acompanhamento do pós adoção• 5 animais de pequeno porte devolvidos aos responsáveis• 5 adoções de animais de pequeno porte• 1 animal retornou de adoção (devoluções)• 7 animais atendidos em propriedades rurais (atendimento externo)• 2 animais resgatados	



EM BRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

ORÇ. (R\$MM)


Total: 310,6

Realizado: 12,9

ESCOPO

O presente programa deve prever ações para a recuperação e reconstrução das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira atingidas pelo evento

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
78	Início do Programa de Reconstrução das Vilas	<input type="checkbox"/>	17/mar/16
77a	Reconstrução da vila	<input checked="" type="checkbox"/>	17/mar/19
77j	Disponibilização de moradia temporária	<input checked="" type="checkbox"/>	15/jun/19



Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada


EM BRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	Reassentamento de Bento Rodrigues	FEL2	6,9%	mai-16	ago-17	dez-17	mar-19	abr-19
	Reassentamento de Paracatú de Baixo	FEL1	80,0%	ago-16	ago-17	fev-18	mar-19	abr-19
	Reassentamento da área afetada em Gesteira	FEL2	7,7%	jun-16	mar-17	jul-17	dez-17	fev-18
	Reassentamento da escola de Gesteira	Execução	7,8%	mar-16	jun-16	jul-16	out-16	dez-16
	Disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)	Processo	---	---	---	---	jun-19	---
	Disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)	Processo	---	---	---	---	jun-19	---
	Disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)	Processo	---	---	---	---	mar-18	---
	Acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 24 meses após construção das vilas)	Processo	---	---	---	---	mar-21	---
	Acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 24 meses após construção das vilas)	Processo	---	---	---	---	fev-21	---
	Acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 24 meses após construção das vilas)	Processo	---	---	---	---	dez-19	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	mar-21	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto




EMBRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Iniciada elaboração do projeto urbanístico das casas e vila de Bento Rodrigues, baseado nas expectativas da Comunidade• Recebida proposta da CÁRITAS para assessoria técnica aos atingidos, selecionada pelo MPMG; necessária contratação para início do cadastro em Mariana• Em andamento estudos técnicos para definição de acesso às alternativas de terrenos de Paracatu de Baixo• Iniciados Estudos no Terreno, Cadastro/ Inventário de Bens, Levantamento de Expectativas para Casas e Vila para comunidade de Gesteira• Início da construção da Escola de Gesteira	<ul style="list-style-type: none">• Prosseguimento do projeto urbanístico das casas e vila, bem como estudos do local, para Comunidade de Bento Rodrigues• Votação para escolha do local para reassentamento dos atingidos de Paracatu de Baixo• Conclusão dos Estudos do Terreno, Cadastro / Inventário de Bens, Levantamento de Expectativas para Casas e Vila para comunidade de Gesteira, para Início da elaboração do projeto urbanístico• Construção da fundação e montagem das paredes em Concreto PVC da Escola de Gesteira
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Presença de 87% das famílias no processo de Delimitação dos Terrenos da Comunidade de Paracatu de Baixo	






EM BRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Levantamento e cadastro dos impactados – Gesteira


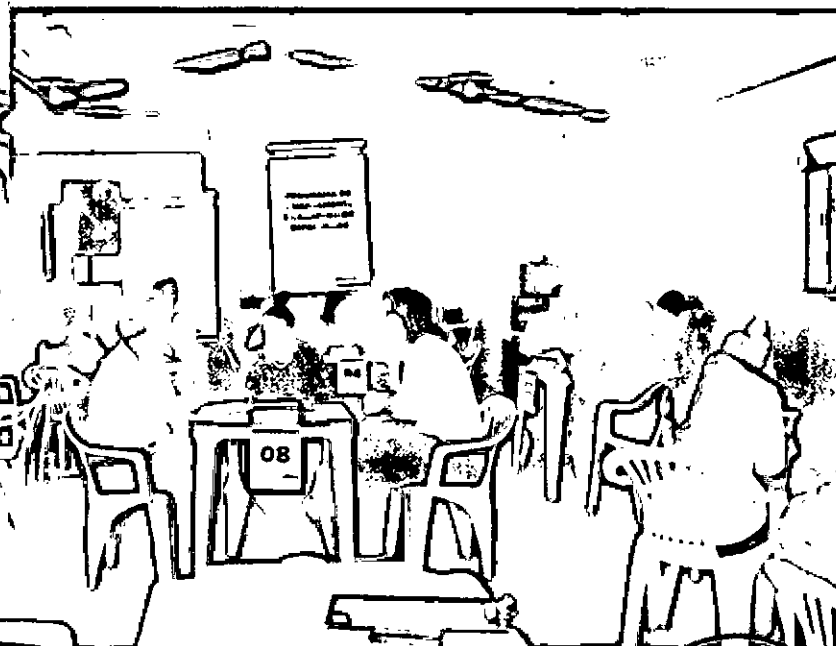
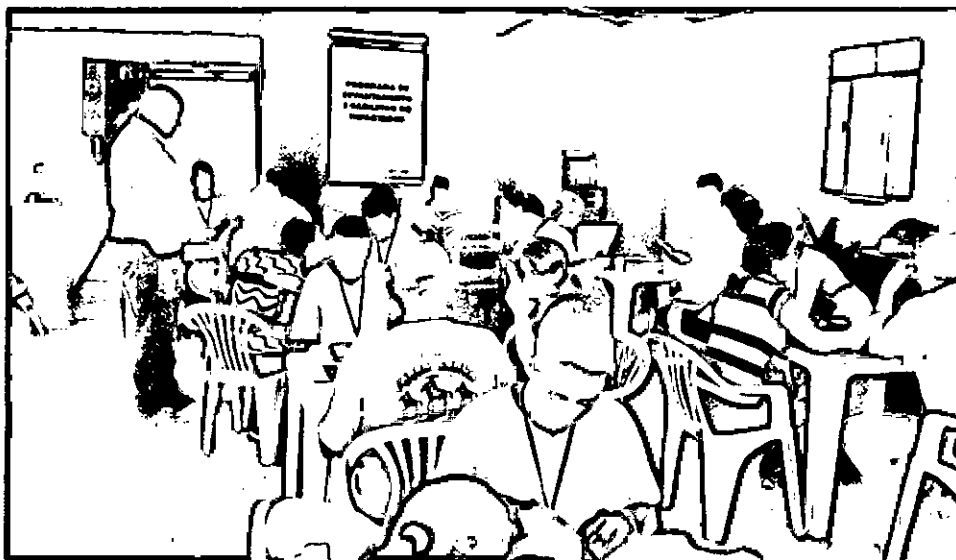


EMBRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Início do levantamento de expectativas – Gesteira





EMBRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Construção da escola de Gesteira

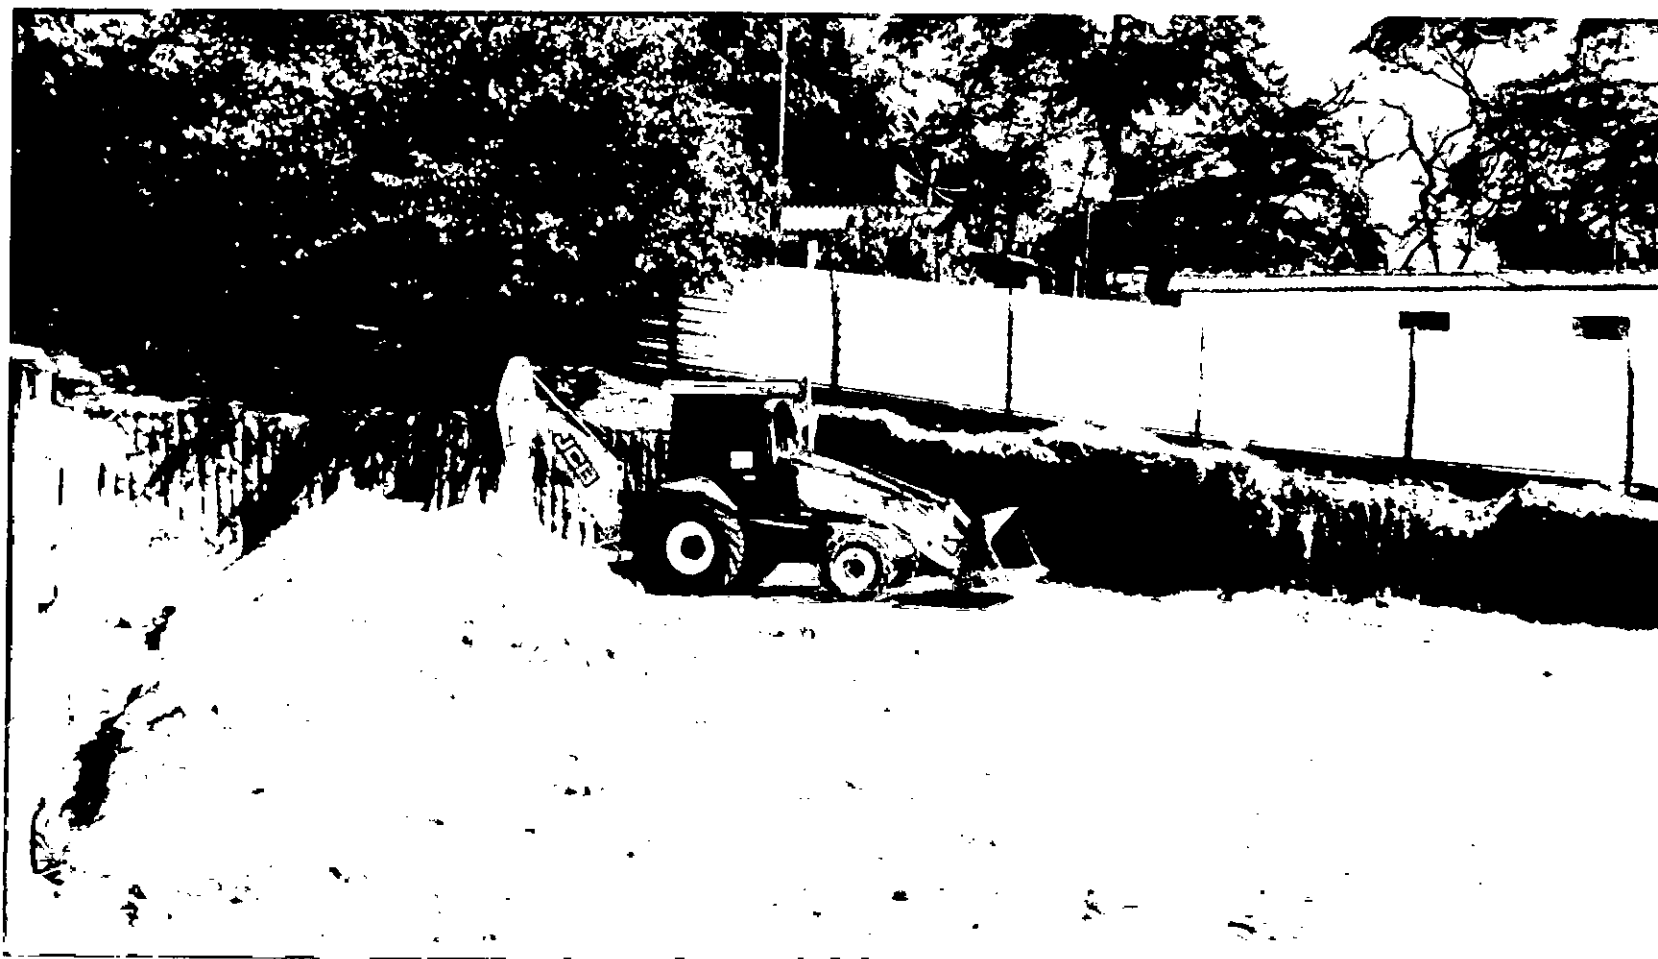

EMBRANCO



RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

ORÇ. (R\$MM)	Total: 239,8	Realizado: 29,2
---------------------	--------------	-----------------


ESCOPO

A Fundação deverá desenvolver um programa para tratar das ações necessárias ao desassoreamento do Reservatório da UHE Risoleta Neves e à recuperação das condições de operação da UHE Risoleta Neves

CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
80	Recuperação da UHE Risoleta Neves	<input checked="" type="checkbox"/>	31/dez/16
81	Manutenção do Programa UHE Risoleta Neves até retomada operação	<input type="checkbox"/>	?

PROJETOS E PROCESSOS

Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	----	----	----	----	----	nov-16	----
Execução do programa	UHE Risoleta Neves – fase 1	Execução	16,0%	ago-16	dez-15	out-16	jul-17	mai-18
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	----	----	----	----	----	jun-18	----



(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto


Iniciada Não iniciada Concluída Encerrada

EM BRANCO



RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Início da dragagem nos 400m próximos à UHE;• Continuidade no recebimento dos materiais para construção das barreiras metálicas;• Início das atividades no depósito do Setor 8 (Velho Soberbo);• Levantamento topográfico da região da Fazenda Floresta;• Concluído o comissionamento e entrada em operação da draga B50.	<ul style="list-style-type: none">• Conclusão da contratação dos serviços de execução das barreiras metálicas;• Andamento no alteamento do dique 4A (EL 330);• Conclusão da engenharia do depósito do Velho Soberbo;• Início da construção do depósito do Velho Soberbo.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Dragagem de material para o Setor 4A• Início da montagem da segunda draga de 20"	




EMBRANCO



RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES

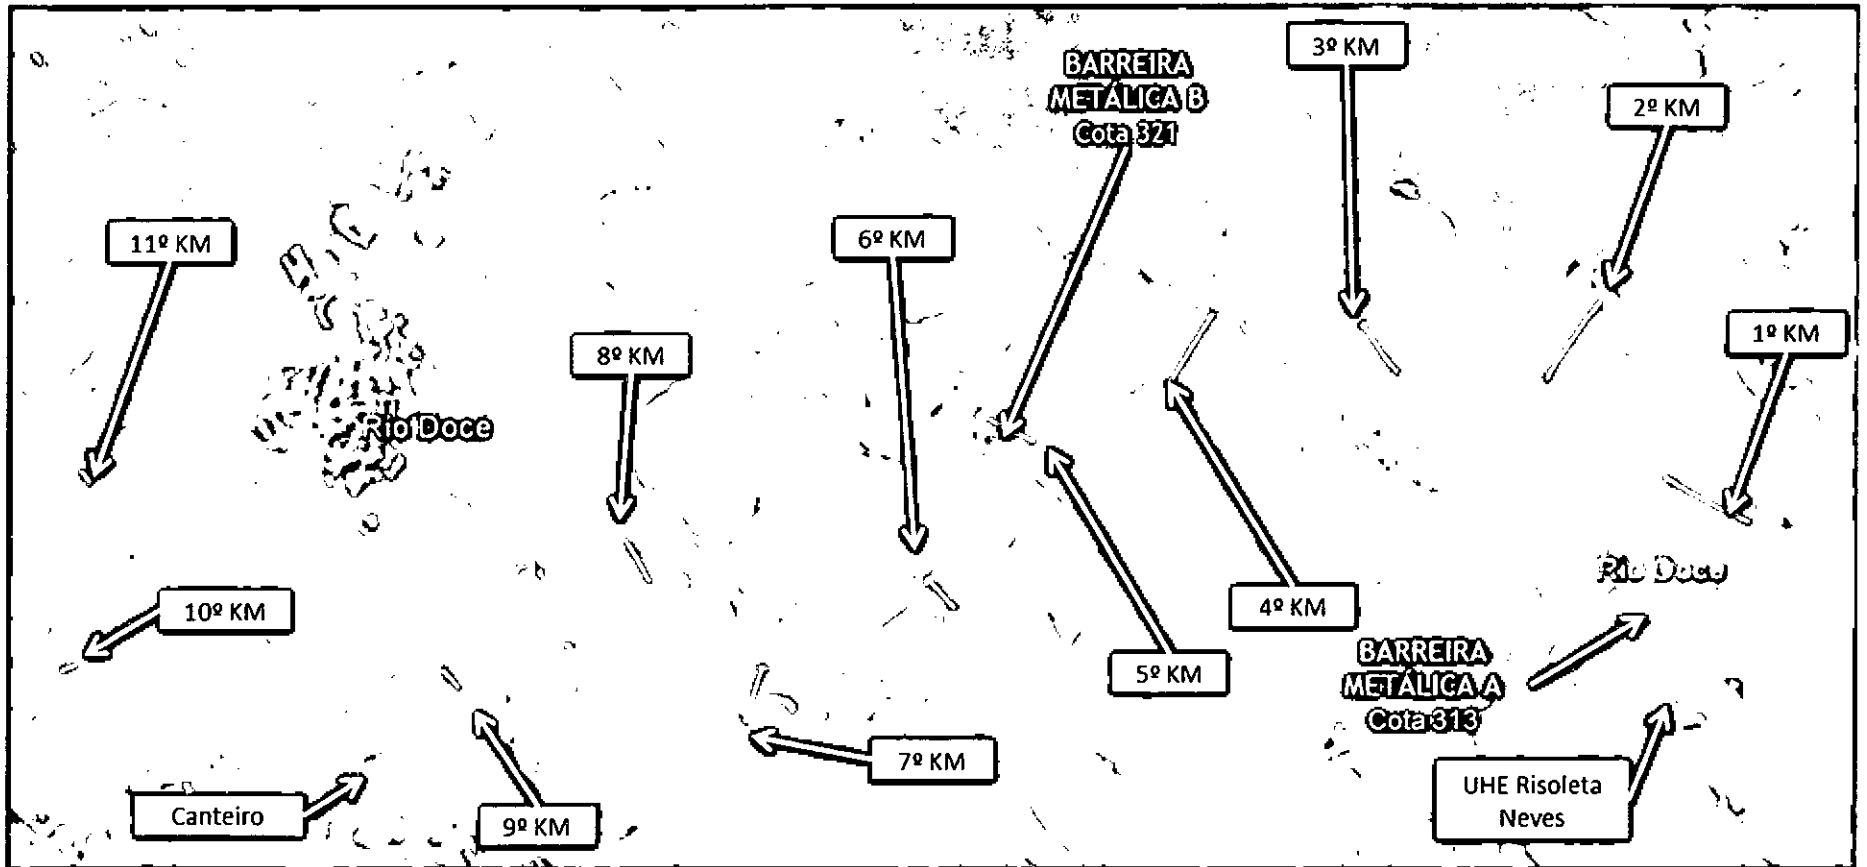

Mapa de referência



EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS


ORÇ. (R\$MM)	Total: 293,4	Realizado: 150,1
---------------------	--------------	------------------

ESCOPO			
A Fundação deverá providenciar a recuperação ou reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento. Caso sejam identificadas outras comunidades e/ou infraestruturas impactadas em outra localidade como decorrência do evento, esse programa também será estendido a elas			
CLÁUSULA	ENTREGAS PREVISTAS NO ACORDO		DATA FIM
88	Início do Programa de Recup. das Outras Comunidades e Infraestr.		17/mar/16
84a	Recuperação das comunidades e suas infraestruturas		15/set/18

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase¹	Avanço²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Definição do programa	Projeto para definição do programa	---	---	---	---	---	set-16	---
Execução do programa	Obras de recuperação de Residências em Barra Longa	Execução	94,0%	---	---	---	ago-16	nov-16
	Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa	Execução	64,0%	---	---	---	mar-17	jun-17
	Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho	Encerramento	99,0%	---	---	---	mai-16	ago-16
	Obras de Remoção de material em Barra Longa	Execução	90,0%	---	---	---	ago-16	nov-16
	Cercamento de propriedade acordo com MP	Encerramento	30,0%	---	---	---	mar-16	nov-16
	Reforma e Limpeza	Execução	99,0%	---	---	---	set-16	out-16
	Reconstrução de propriedades rurais	FEL3	62,0%	---	---	dez-16	ago-18	set-18
	Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados	Execução	35,0%	---	---	mai-16	jan-17	fev-17

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto

Iniciada
 Não iniciada
 Concluída
 Encerrada




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Execução do programa	Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados	Encerramento	8,0%	---	---	---	jun-16	nov-16
	Reconstrução de pontes	Encerramento	6,0%	---	---	---	abr-16	nov-16
	Recuperação de drenagens de estradas e vias	Encerramento	6,0%	---	---	---	jun-16	nov-16
	Recuperação de bordas de rios e enrocamentos	Execução	85,0%	---	---	---	out-16	jan-17
	Reconstrução da Praça e rua Beira Rio	Execução	38,0%	---	---	jun-16	dez-16	mar-17
	Sistema de Estabilização de Maciços_Rio do Carmo	Execução	12,0%	---	---	jun-16	dez-16	abr-17
	Ref. de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira	Execução	5,0%	---	---	jul-16	dez-16	fev-17
	Reconstrução de Casas Barra Longa / Gesteira	Execução	2,0%	---	---	jul-16	jul-17	ago-17
	Reconstrução do Parque de exposição	Execução	1,0%	---	---	ago-16	dez-17	mar-18
	Reconstrução de currais em Barra Longa	Execução	54,0%	---	---	---	dez-16	fev-17
	Reconstrução de pavimentação em Barra Longa	Execução	3,0%	---	---	jul-16	dez-16	abr-17
	Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens	Execução	32,0%	---	---	---	jul-17	nov-17

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

PROJETOS E PROCESSOS								
Etapa	Descrição	Fase ¹	Avanço ²	FEL1	FEL2	FEL3	Exec.	Encer.
Execução do programa	Recolhimento de Madeiras -Etapa 1	Execução	18,0%	jun-16	jun-16	jun-16	dez-16	jan-17
	Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço	Encerramento	7,0%	dez-15	dez-15	dez-15	abr-16	nov-16
	Reconstrução de Campos de Futebol.	Shaping	---	abr-17	mai-17	jul-17	out-17	jan-18
	Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues.	FEL2	30,0%	---	set-16	dez-16	set-17	jan-18
	Estabilização de maciço em Campinas	Shaping	---	nov-16	jan-17	mar-17	nov-17	mar-18
	Recolhimento de madeiras - Etapa 2	Shaping	---	---	---	mar-17	set-17	jan-18
	Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental	Processo	---	---	---	---	out-17	---
Encerramento do programa	Projeto para encerramento do programa	---	---	---	---	---	nov-18	---

(1) Fase atual do projeto; (2) Avanço da fase atual do projeto



EMBRANCO







RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Mariana

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza e reforma em 01 espaço público • Finalizada limpeza e reforma em 1 propriedade rural. • Finalizada a reforma / recuperação em todos os mata – burros. • Finalizada a reforma da Fazenda Asa Branca (abrigo de animais). 	<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento de novas demandas enviadas pelo Sistema de Manifestações - SGS. • Dar continuidade da reforma da Fazenda de Mainart (moradia provisória). • Dar continuidade do processo de definição de diretrizes junto a equipe do Socioeconômico sobre as reconstruções de propriedades rurais.

RESULTADOS

- Reformas concluídas em 23 propriedades rurais e 17 espaços públicos em distritos atingidos

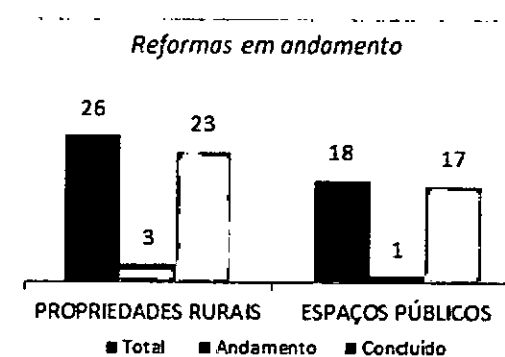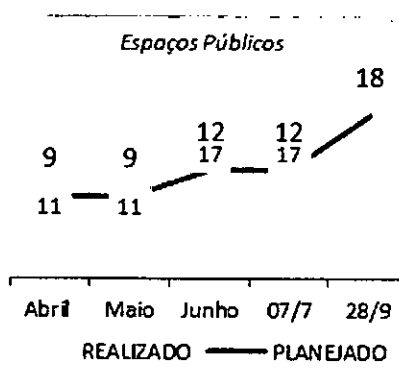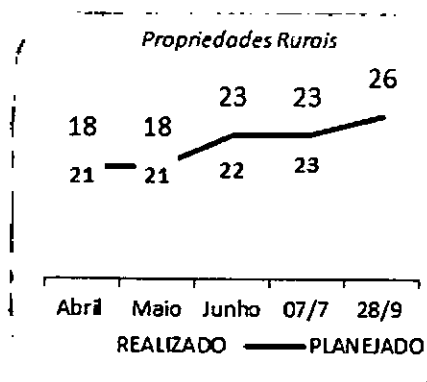

EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Mariana



Obra em andamento - MAINART




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Acessos/control de erosão

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Manutenção de estradas não pavimentadas entre Ponte do Gama e Gesteira.• Execução da Fase 2 (3 und.) de abertura de acessos à sirenes.• Recuperação de 17km do asfalto de Barra Longa até Acaiaca• Controle de erosões de 2 propriedades rurais.• Recolhimento de Madeira realizada em Barra Longa a Gesteira.• Recuperação de 0,5km de calçamento em Claudio Manuel.• Liberação de 10 hec de controle de erosão nas propriedades ao longo do rio Gualaxo.	<ul style="list-style-type: none">• Abertura do acesso para instalação de 3 sirenes.• Recuperação de 8km do asfalto em Monsenhor Horta• Recuperação de 0,5km de calçamento em Claudio Manuel.• Realizar controle de erosão em 2 propriedades rurais.• Recolhimento de Madeira em Gesteira.• Manutenção de estradas não pavimentadas entre Ponte do Gama e Gesteira.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 100% da construção de pontes de cabos de aço mapeadas foram concluídas• 100% de abertura de acessos para sirenes da "Fase 1"• 100% dos dispositivos de drenagens mapeados foram reestabelecidos• 100% abertura e acabamento final das estradas não pavimentadas.	




EMBRANCO





RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS


Ponte Do Gama

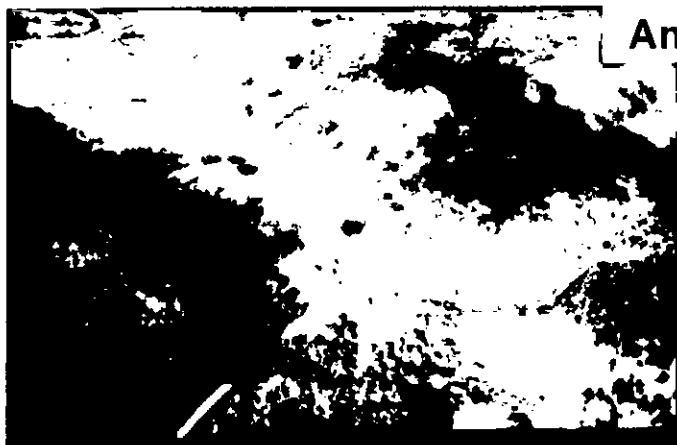

Antes

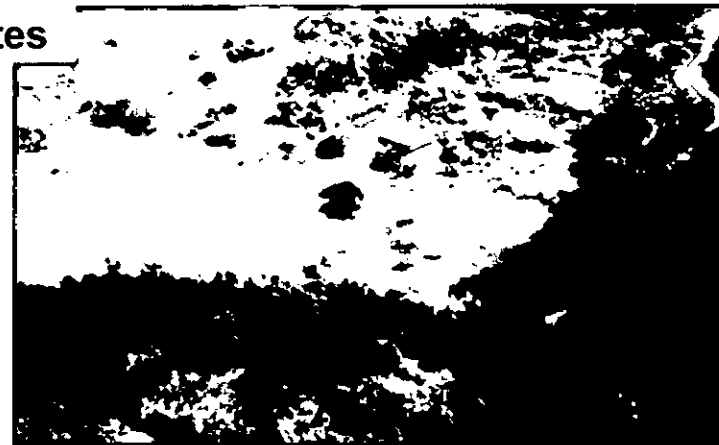

Depois





EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Foz Gualaxo – Paracatu

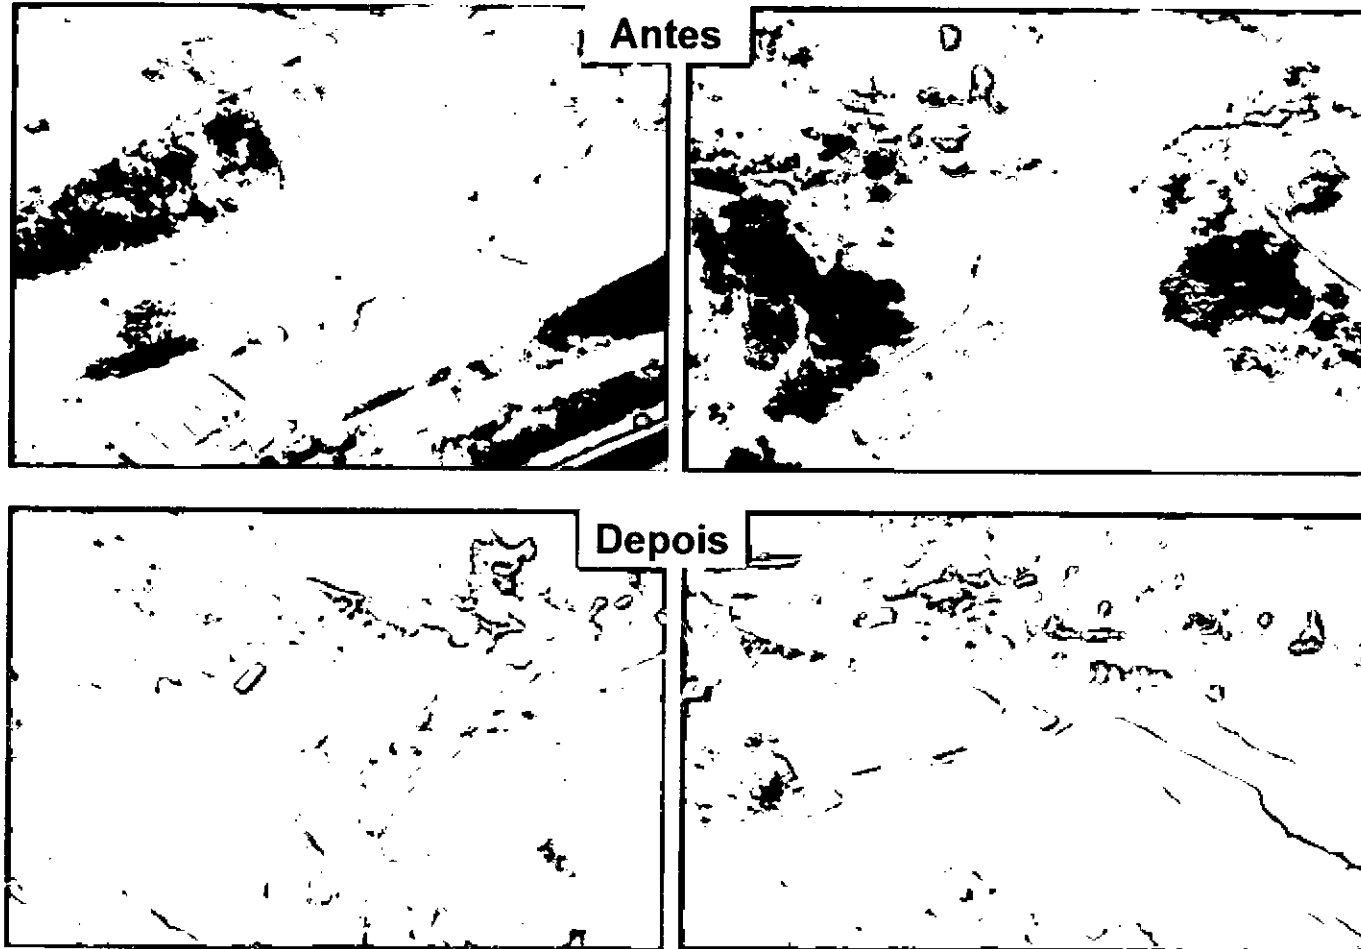

EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS


Estrada Paracatu



Antes



Depois






EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Cachoeira Pedras

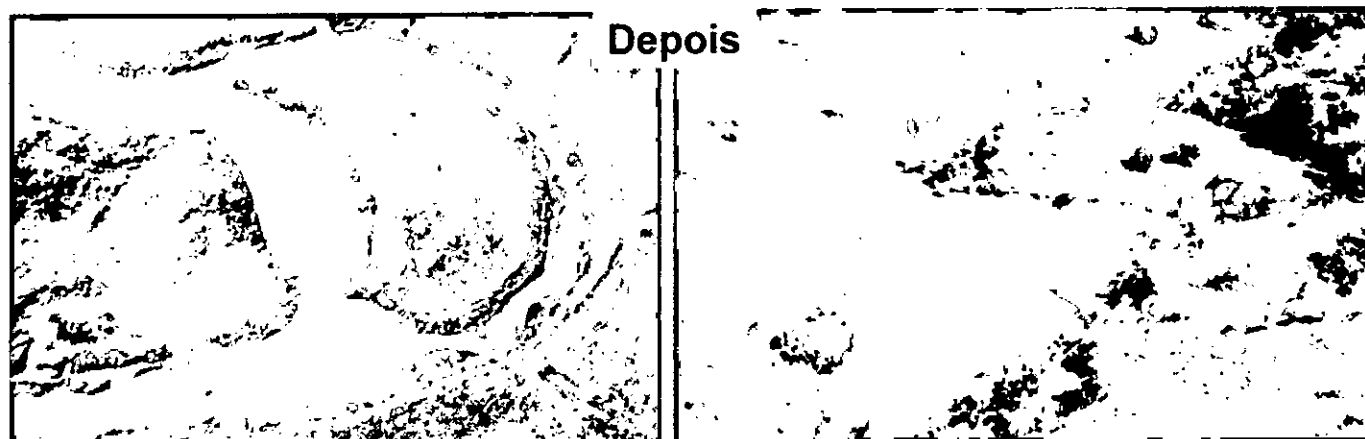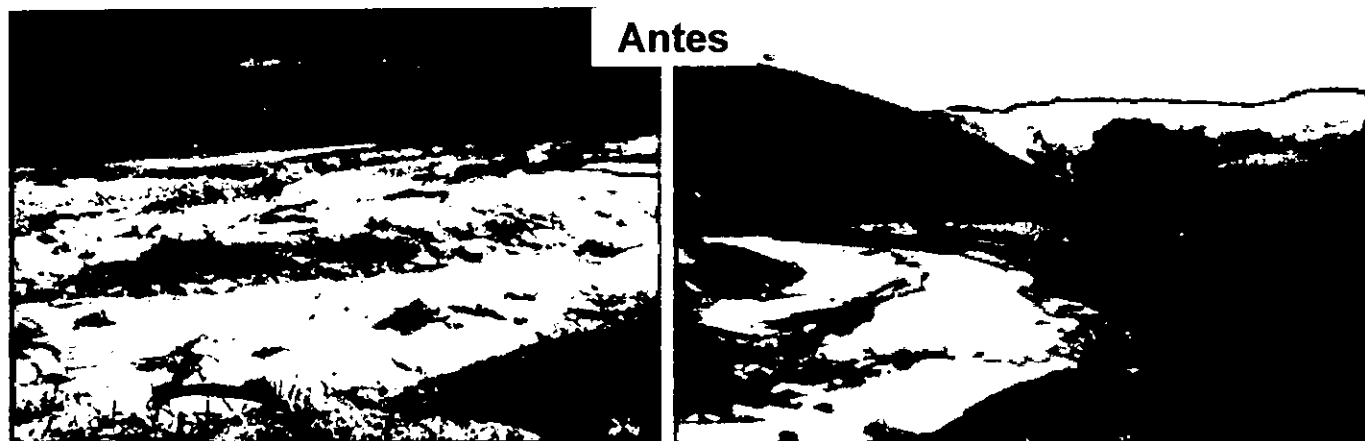

EMBRANCO





RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

PF0146

PF0146 - Controle de erosão e dispositivos de drenagem

O objetivo desta atividade é realizar o controle das erosões provenientes de chuvas e ausência de vegetação no solo, evitando o carreamento de rejeito para os rios afetados.

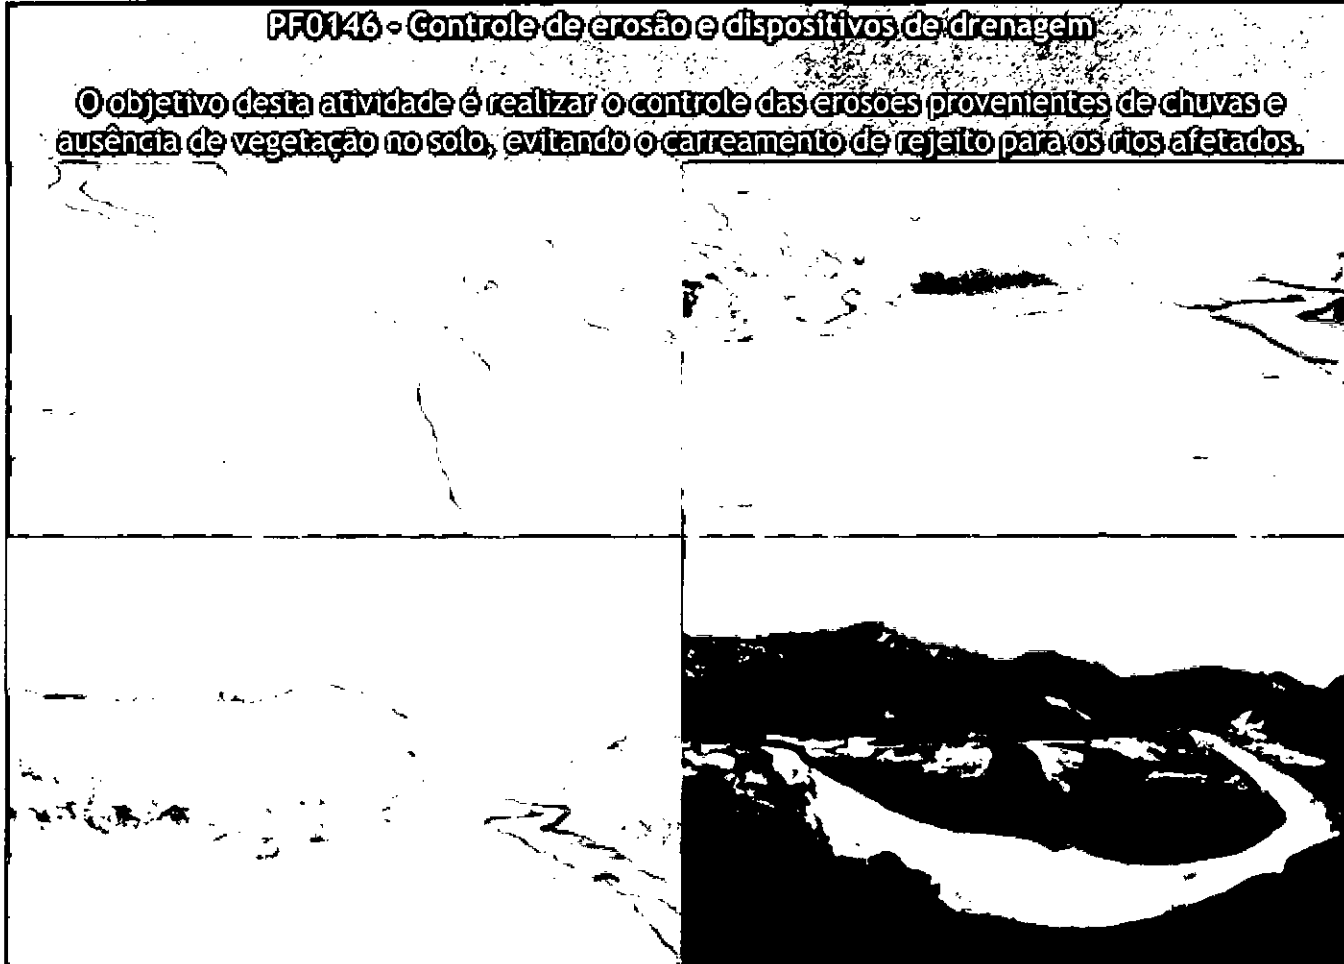


EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0039

PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas: Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta

Recuperação de 27,2 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta danificados em função do trânsito intenso de veículos. Recuperação do pavimento em Cláudio Manoel.




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0040

PF0040 - Manutenção de estradas não pavimentadas

Realizando sistema de escoamento de águas pluviais, limpeza de material das bordas e acabamento final com cascalho nas estradas. Manutenção das estradas de Ponte do Gama a Gesteira em atendimento a manifestações da comunidade.




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0044

PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos.
Gesteira
Recuperação de bordas do rio e enrocamentos para evitar que o rio cause erosões de taludes. Atividades paralisadas e aguardando liberação.




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS PF0150

PF0150 - Recolhimento de Madeira

Atividade de recolhimento de madeira e material orgânico que estão acumulados nas bordas do rio.
Em execução em Gesteira.




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Concluído a reforma de 8 casas em Barra Longa e Gesteira• Continuação das obras de reconstrução da Praça e da Avenida Beira Rio em Barra Longa• Reforma de 6 currais, 4 porteiras e 4 mata burros• Iniciado a reconstrução de 2 residências de um total de 12	<ul style="list-style-type: none">• Reforma de 7 casas e 5 comércios em Barra Longa• Reforma de 2 currais, 5 porteiras e 5 mata burros em Barra Longa e Gesteira• Início da recuperação de pavimentação no Bairro Morro Vermelho e Centro, em Barra Longa• Reforma de mais 20 quintais, lotes e pomares• Início da reconstrução de mais 4 residências de um total de 12
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 100% de asfalto recuperado em Barra Longa• 88 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira• 12 currais e 4 mata burros reformados em Barra Longa• 38 quintais finalizados em Barra Longa	



EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Reforma de Residências



Concluído



EMBRANCO






RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Reforma de currais



Em execução



EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Reforma de quintais



Concluído



EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Recuperação da pavimentação



Em execução





EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Reconstrução da Praça e Avenida Beira Rio

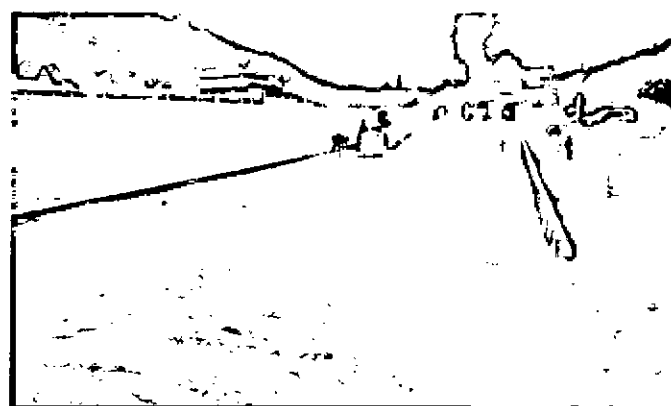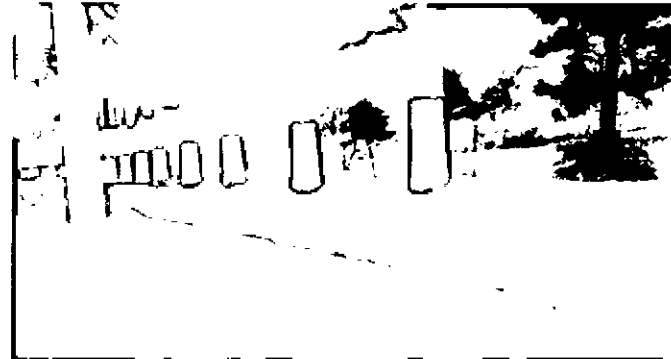


Em execução



EMBRANCO



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Serviço de Apoio Ao Comitê Interfederativo



DESP. ENC. ABERT. 02001.001551/2016-81 CIF/IBAMA

Brasília, 21 de dezembro de 2016


Ao Arquivo Setorial da GABIN/SETORIAL

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo nº 02001.004155/2016-14. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo para o Unidade Setorial do Gabinete da Presidência - Df.

Atenciosamente,


ANTONIO CELSO JUNQUEIRA BORGES
Secretário Executivo da CIF/IBAMA

EM BRANCO



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2016, procedemos ao encerramento deste volume nº II do processo de nº 02001.004155/2016-14, contendo 200 folhas. Abrindo-se em seguida o volume nº III. Assim sendo subscrevo e assino.

NEDIR CAMILO DE OLIVEIRA FERREIRA
Chefe de Gabinete Substituta do(a) Gabinete da Presidência/IBAMA

EM BRANCO
