




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Concluído a reforma de 3 casas em Barra Longa e Gesteira.• Continuação das obras de reconstrução da Praça e da Avenida Beira Rio em Barra Longa.• Reforma de 2 currais, 3 porteiras e 2 mata burros.• Iniciado a reconstrução de mais 3 residências de um total de 13, em execução 9 reconstruções.• Concluído o enrocamento na propriedade do Facão.	<ul style="list-style-type: none">• Reforma de 2 casas e 2 comércios em Barra Longa.• Reforma de 3 currais e 2 mata burros em Barra Longa e Gesteira.• Início da recuperação de pavimentação e na 1º de Janeiro.• Reforma de mais 12 quintais, lotes e pomares.• Início da reconstrução de mais 3 residências de um total de 13.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 100% do calçamento do Bairro Morro Vermelho recuperado em Barra Longa.• 93 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira.• 55 quintais finalizados em Barra Longa.• 30 comércios reformados em Barra Longa.• 12 currais e 9 mata burros reformados e entregues em Barra Longa e Gesteira.	





EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

Reforma/reconstrução de residências

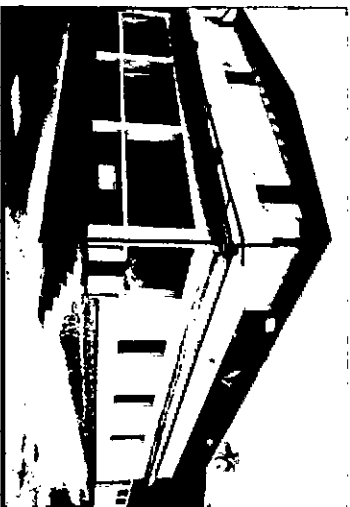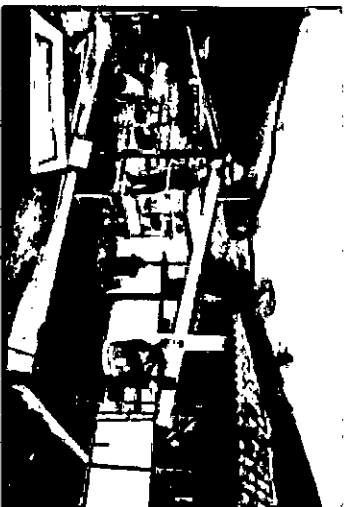

Últimas em
execução







EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Barra Longa

Reforma quintais e lotes

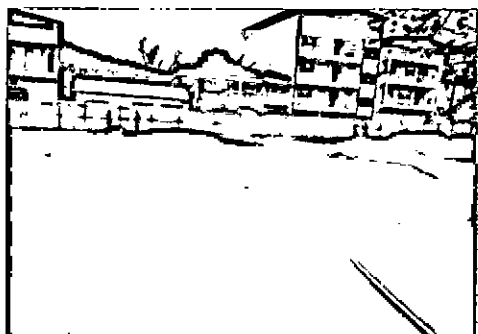

em execução



EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

Reconstrução da Praça e Avenida Beira Rio



em execução




EM DRANKU



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Barra Longa

Alteamento do campo dos Rodoviários - Parque de Exposição

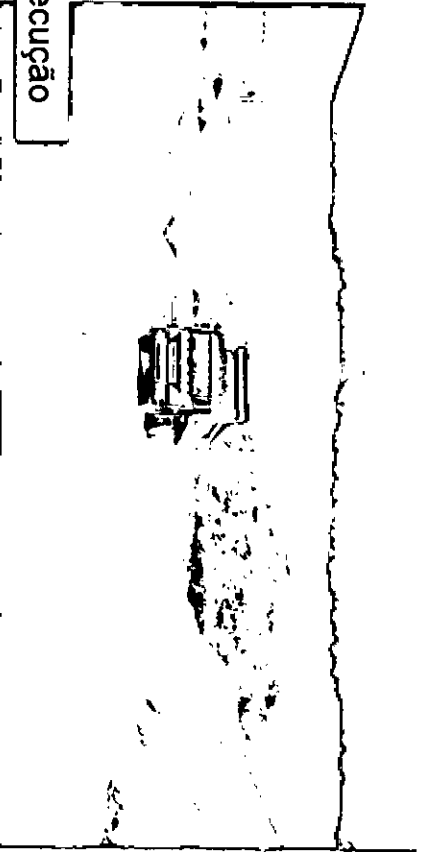

em execução

em execução


IBAMA/PRESI
Proc. 0974
FLS. 610
RUB.

EM BRANCO



RECUPERAÇÃO ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

Orçamento (R\$MM)	Total: 9,7	Realizado: 0,2		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG011-R Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 à 94)		jan-16	jun-21	
Metas do Programa		jan-17	mar-19	
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira		jan-17	jan-17	
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu		mar-19	mar-19	
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues		mar-19	mar-19	
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa		dez-17	dez-17	
Definição do Programa		set-16	out-16	
PF7110 - Definição do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar		set-16	out-16	
Execução do Programa		jan-16	mar-21	
Projetos		jan-16	mai-19	
PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira		ago-16	abr-17	
Planejamento da Execução		ago-16	nov-16	
Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira		nov-16	jan-17	
Encerramento do Projeto		jan-17	abr-17	
PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu		jun-18	mai-19	
Planejamento da Execução		jun-18	out-18	
Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu		out-18	mar-19	
Encerramento do Projeto		mar-19	mai-19	
PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues		mai-18	mai-19	
Planejamento da Execução		mai-18	set-18	
Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues		set-18	mar-19	
Encerramento do Projeto		mar-19	mai-19	
PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa		jan-16	mar-18	
Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010)		jan-16	dez-17	
Encerramento do Projeto		dez-17	mar-18	
Processos		jan-16	mar-21	
PF8110 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas		jan-16	mar-21	
Encerramento do Programa		mar-21	jun-21	
PF9110 - Encerramento do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (captura e formalização de benefícios)		mar-21	jun-21	




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Reuniões com secretaria municipal de Mariana e pais de alunos de Bento Rodrigues para avaliação conjunta da solicitação de mudança do local da escola.• Visita aos 3 lugares sugeridos para mudança da escola de Bento Rodrigues.• Entrega do imóvel para segundo turno da escola de Paracatu.• Entrega de material didático e pedagógico para escolas de Bento Rodrigues e Paracatu.• Visitas de monitoramento à escola José Epifânio em Barra Longa.• Reunião de compartilhamento de informações com a diretora da Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto.	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração conjunta com as secretarias municipais de educação e equipes pedagógicas das escolas de termo de referência para contratação de serviços de reforço ao apoio psicopedagógico.• Definição sobre a transferência da escola de Bento Rodrigues.• Acompanhamento com a comunidade das obras da Escola Municipal Gustavo Capanema - Gesteira.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e seguem o calendário regular de 2016.• Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifânio Gonçalves e E. M. José de Vasconcelos.• Melhoria da acessibilidade nas escolas.• Maior integração da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares.• Entrega de imóvel para realização de atividades de segundo turno da Escola de Paracatu.	



EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR



Reunião da Escola de Bento Rodrigues com pais e alunos



Visita a locais pretendidos para mudança da escola de Bento



Materiais para escolas de Bento Rodrigues e Paracatu




Reunião com a Superintendente Regional de Ensino – Ouro Preto



Visita da comunidade às obras da Escola de Gesteira



Monitoramento na escola José Epifânio – Barra Longa




EM BRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA

Orçamento (R\$MM)	Total: 34,8	Realizado: 5,8			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95 à 100)				fev/16	out/22
Metas do Programa				fev/21	fev/21
Cláusula 100 - Conclusão da recuperação dos bens materiais e imateriais					fev/21
Definição do Programa				mai/16	ago/17
PF7120 - Definição do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística				mai/16	ago/17
Execução do Programa				fev/16	jul/22
Processos				fev/16	jul/22
PF8120 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais			40%	fev/16	jul/17
PF8121 - Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (3 anos para conclusão das ações referentes aos bens materiais e imateriais + 2 anos de monitoramento)				jul/17	jul/22
Encerramento do Programa				jul/22	out/22
PF9120 - Encerramento do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (captura e formalização de benefícios)				jul/22	out/22




EM BRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Realização de curadoria das peças sacras que encontram-se na reserva técnica da Samarco - Total de 67 peças inventariadas no mês.• Realização de reuniões com as comunidades de Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos bens imateriais.• Resgate de 67 peças realizadas por meio de prospecção, monitoramento e atividades no interior das igrejas.• 153 capacitações técnicas aos diversos públicos.	<ul style="list-style-type: none">• Continuidade nas atividades de monitoramento das capelas de Bento, Paracatu e Gesteira.• Resgate superficial e capacitação técnica no âmbito da temática arqueológica.• Continuidade nas reuniões com as comunidades de Gesteira, Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos bens imateriais.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Coleta de aproximadamente 1925 peças sacras.• 1548 capacitações no âmbito da temática arqueológica.	



EM BRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA

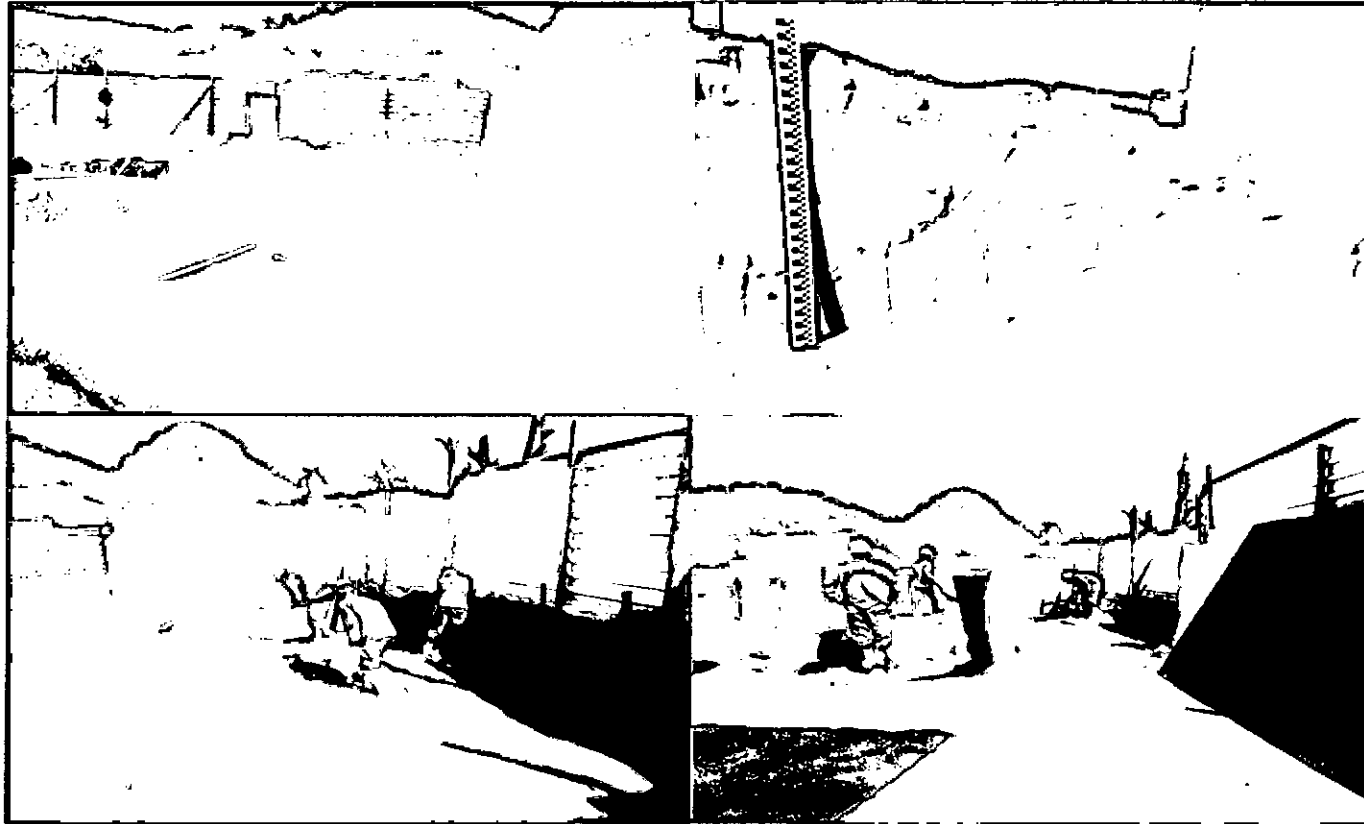


Resgate arqueológico na Capela de Paracatu




EM BRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA

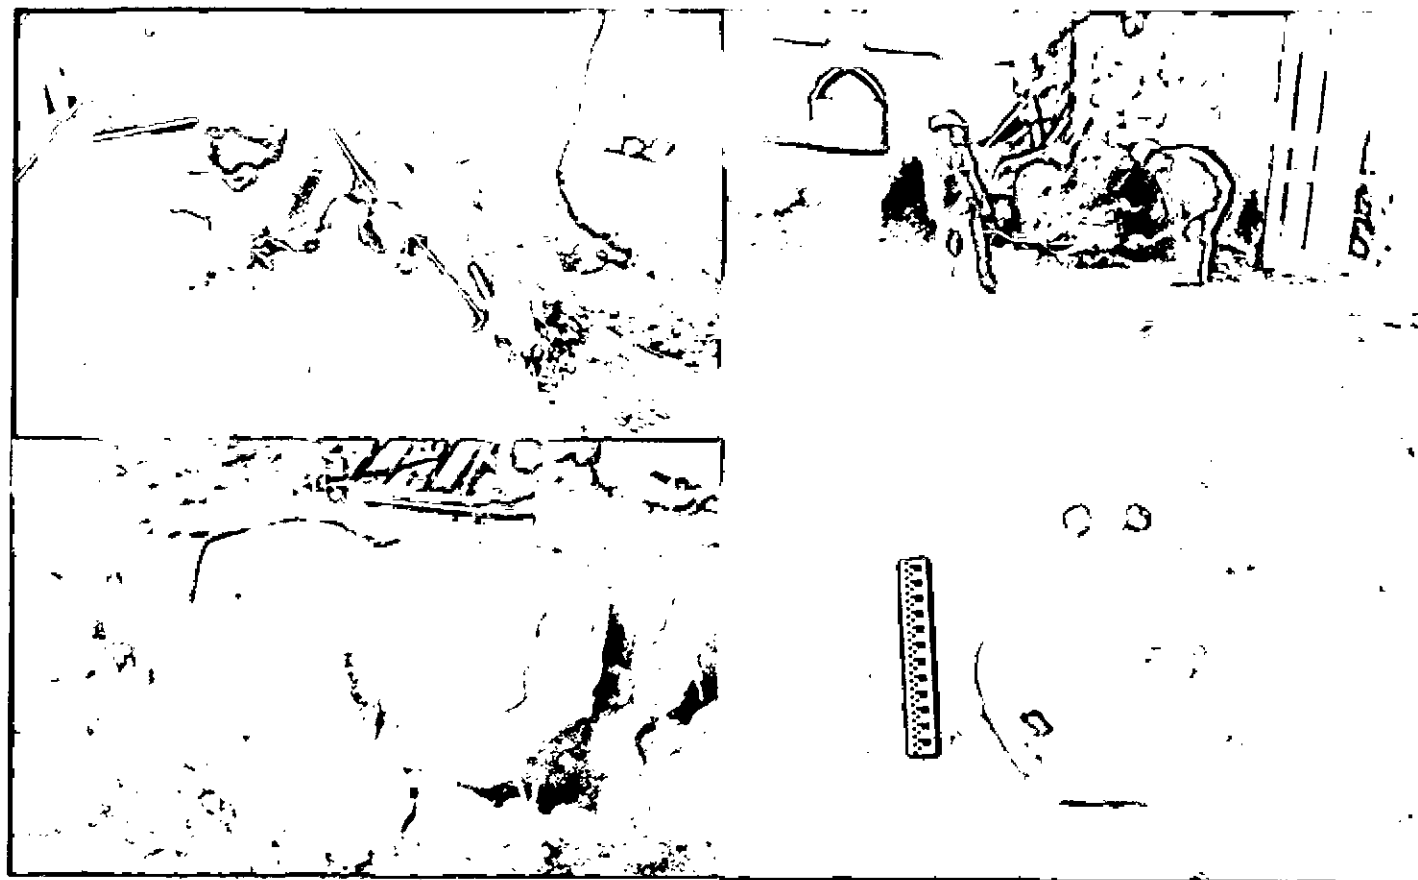

Resgate arqueológico na Capela de Gesteira




EMBRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA



Resgate arqueológico na Capela de Bento Rodrigues




EM BRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA



Capacitações técnicas realizadas com os diversos públicos




EM BRANCO



MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA



Atividade de prospecção nas áreas impactadas




EM BRANCO



TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

Orçamento (R\$MM)	Total: 18,3	Realizado: -			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG013-R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)				jul-16	mai-22
Metas do Programa				mar-17	mar-22
Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer				mar-17	mar-17
Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer				mar-22	mar-22
Definição do Programa				set-16	mar-17
PF7130 - Definição do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer				set-16	mar-17
Execução do Programa				jul-16	mar-22
Processos				jul-16	mar-22
PF8130 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIF)				jul-16	abr-17
PF8131 - Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)				abr-17	mar-22
Encerramento do Programa				mar-22	mai-22
PF9130 - Encerramento do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (captura e formalização de benefícios)				mar-22	mai-22




EM BRANCO



TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER





AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Conclusão do processo de contratação de empresas para realização do diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer e contratação<ul style="list-style-type: none">- Fornecedor 1: Expressão Socioambiental (MG).- Fornecedor 2: Futura (ES).• Realização do apoio ao evento turístico (Iron Biker 2016) em Mariana pelo forte efeito indutor da economia junto ao município. A prova ciclística foi realizada nos dias 16, 17 e 18 de setembro.	<ul style="list-style-type: none">• Reunião inicial para alinhamentos e estabelecimentos de prioridades junto ao(s) fornecedor(es) selecionado(s).• Debates e conclusões sobre abordagens metodológicas.• Início dos trabalhos em campo conforme metodologia e prioridade estabelecidas.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Definição dos fornecedores para execução do diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer.• Movimentação da economia de Mariana por meio de evento esportivo e turístico, além do reforço ao resgate da imagem turística e cultural do município.	



EM BRANCO



TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER

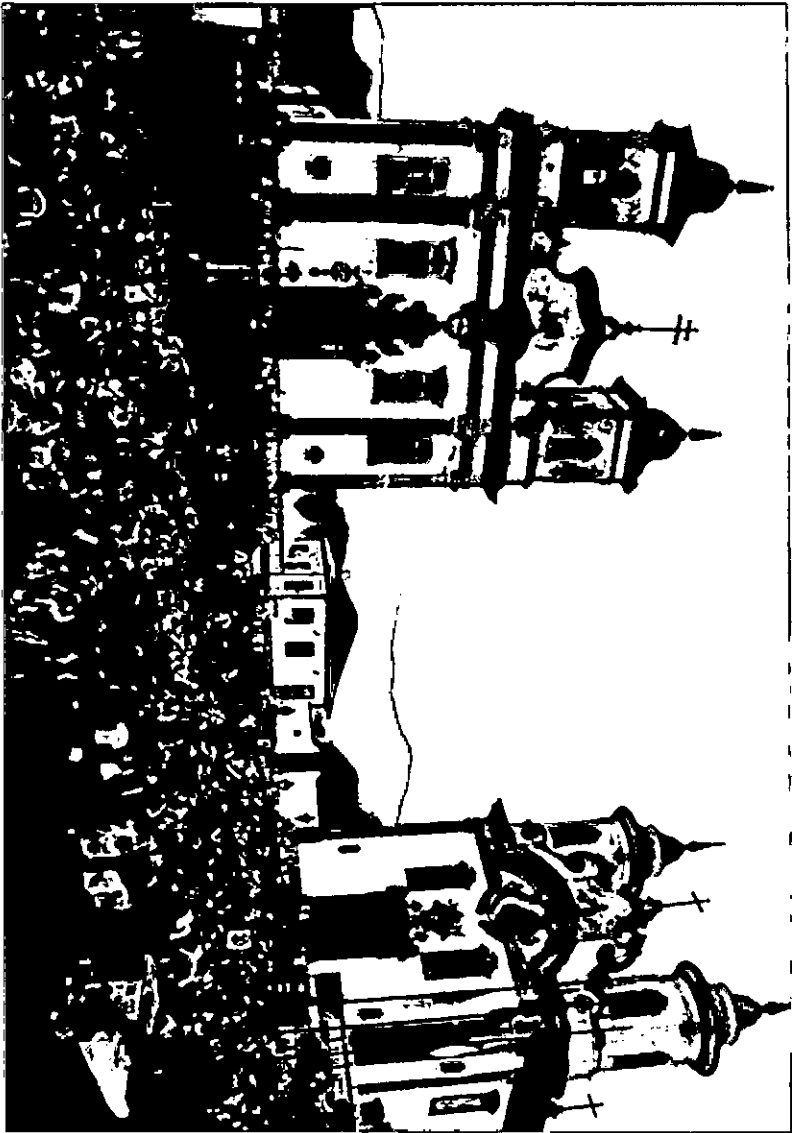


EM BRANCO



SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA

Orçamento (R\$MM)	Total: 162,6	Realizado: 14,5		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG014-R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 106 à 112)		nov-15	nov-25	
Metas do Programa		mar-19	nov-25	
Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental		mar-19	mar-19	
Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico		nov-25	nov-25	
Definição do Programa		set-16	out-16	
PF7140 - Definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada		set-16	out-16	
Execução do Programa		nov-15	nov-25	
Processos		nov-15	nov-25	
Marcos do Processo		dez-16	mar-17	
Mariana - Plano de Ação para as demandas da política de Assistência Social de Mariana (Disponibilização de Mão-de-Obra, insumos e equipamentos)		dez-16	dez-16	
Definição do Plano de Trabalho e Parcerias institucionais para execução do estudo epidemiológico		dez-16	dez-16	
Contratação do Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas		mar-17	mar-17	
PF8140 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS (36 meses)		nov-15	mar-19	
PF8141 - Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas (Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva - 10 anos antes e após o EVENTO)		jun-16	nov-25	
Encerramento do Programa		ago-25	nov-25	
PF9140 - Encerramento do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (captura e formalização de benefícios)		ago-25	nov-25	




EM BRANCO



SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p>Saúde/Ação Social Mariana:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestão dos planos acordados com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social.• Gerenciamento e tratativa do sistema SGS (Sistema de Gerenciamento de Stakeholders). <p>Saúde Barra Longa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gestão das demandas acordadas com a Secretaria de Saúde e MP.• Resposta às manifestações no SGS. <p>Estudo epidemiológico e toxicológico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apresentação do primeiro draft dos Termos de Referência (ToR) do Estudo Epidemiológico e Toxicológico para avaliação interna.• Envio do Memorando de Entendimento (MoU) para apreciação da Fiocruz.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento dos planos de ação de saúde.• Reunião institucional entre Fundação Renova e Fiocruz para avanço no estabelecimento da parceria institucional.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social de Mariana e de Saúde de Barra Longa.• 309 ações levantadas: 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolução). O avanço na conclusão das ações dependem da entrega da unidade provisória de saúde, postergada para dezembro/16.	




EM BRANCO



TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS

Orçamento (R\$MM)	Total: 7,6	Realizado: -	% Real.	Início	Término
Nome da tarefa					
PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)				out/16	mar/22
Metas do Programa				jul/17	jul/17
Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIF					jul/17
Definição do Programa				out/16	jul/17
PF7150 - Definição do Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória				out/16	jul/17
Execução do Programa				abr/18	dez/21
Processos				abr/18	dez/21
Marcos de Processos				abr/18	abr/18
Processo de monitoramento das linhas de Pesquisa				abr/18	dez/21
Encerramento do Programa				dez/21	mar/22
PF9150 - Encerramento do Programa de Apoio à Pesquisa (captura e formalização de benefícios)				dez/21	mar/22

RECEBUE




EM BRANCO



TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Continuação da Fase de Definição (conclusão estimada para Mar/17).	<ul style="list-style-type: none">• Continuação da Fase de Definição (conclusão estimada para Mar/17).
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Realizada a 1ª reunião da Câmara Técnica.	



EM BRANCO




RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS

Orçamento (R\$MM)

Total: 10,2

Realizado: 0,1

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123)		mar-17	mai-20
Metas do Programa		abr-17	abr-17
Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa)		abr-17	abr-17
Definição do Programa		mar-17	abr-17
PF7160 - Definição do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras		mar-17	abr-17
Execução do Programa		mar-18	mar-20
Processos		mar-18	mar-20
PF8160 - Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica)		mar-18	mar-20
Encerramento do Programa		mar-20	mai-20
PF9160 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (captura e formalização de benefícios)		mar-20	mai-20




EM BRANCO



RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Manutenção dos cartões de auxílio financeiro distribuídos para pescadores que perderam temporariamente suas fontes de renda.• Construção do Termo de Referência.• Foram feitas reuniões área socioambiental e jurídico para aprofundamento das demandas e riscos que interferem na modelagem do Programa e precisam ser considerados no desenho do TR.	<ul style="list-style-type: none">• Finalização do TR.• Avaliação das áreas (jurídico, socioambiental, meio ambiente, etc.).• Encaminhamento do TR à área de suprimentos para início de processo de contratação.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 4.785 cartões entregues para pescadores.• Finalizada discussão sobre os principais parâmetros a serem mapeados/pesquisados pela equipe de cadastro e que necessitam retorno ao campo.	




EM BRANCO



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Orçamento (R\$MM)	Total: 125,5	Realizado: 7,8		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG017-R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128)		nov-15	mai-22	
Metas do Programa		out-17	fev-22	
Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo		out-17	out-17	
Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem		ago-20	ago-20	
Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades		fev-22	fev-22	
Definição do Programa		set-16	out-16	
PF7170 - Definição do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias		set-16	out-16	
Execução do Programa		nov-15	fev-22	
Projetos		dez-15	mai-20	
PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas		abr-16	mai-17	
Execução do cercamento das demais propriedades afetadas	72%	abr-16	fev-17	
Encerramento do Projeto		fev-17	mai-17	
PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)		dez-15	jan-18	
Planejamento da Execução	100%	dez-15	abr-16	
Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	45%	jan-16	out-17	
Encerramento do Projeto		out-17	jan-18	
PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a;b;l)		jun-16	fev-20	
Planejamento da Execução	35%	jun-16	fev-17	
Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais		fev-17	nov-19	
Encerramento do Projeto		nov-19	fev-20	
PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)		jun-16	mai-20	
Avaliação de Alternativas	38%	jun-16	jan-17	
Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (URTs)		jan-17	jan-18	




EM BRANCO



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
Planejamento da Execução		jan/18	jun/18
Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda		jun/18	fev/20
Encerramento do Projeto		fev/20	mai/20
PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)		jun/16	mai/20
Avaliação de Alternativas	21%	jun/16	jan/17
Definição do Escopo		jan/17	jan/18
Planejamento da Execução		jan/18	jun/18
Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas		jun/18	fev/20
Encerramento do Projeto		fev/20	mai/20
Processos		nov/15	fev/22
PF8170 - Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)		nov/15	ago/20
PF8171 - Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)		fev/16	fev/22
PF8172 - Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa)		fev/20	jan/21
Encerramento do Programa		fev/22	mai/22
PF9170 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (captura e formalização de benefícios)		fev/22	mai/22




EM BRANCO



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS




AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Abertura de mais silos com volumoso construídos nas propriedades rurais, com o objetivo de reduzir a aquisição de silagem na época de estiagem.• Atividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de formicida e herbicida).• Corte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio realizado já está em ponto de corte.• Plantio de pomares e hortaliças.• Continuação da entrega de silagem aos produtores de Fundão a Santa Cruz do Escalvado.• Reunião de kick off com a JM – novo contrato de cercamento.• Início das atividades de cercamento do novo contrato.• Visita / reunião com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) para conhecer as propostas de parcerias.• Análise dos riscos para definição das ações mitigatórias.• Definição de escopo para contratação de serviço de perfuração de poços artesianos.	<ul style="list-style-type: none">• Solicitação de aditivo nos contratos de plantio – Agroflor e Século XXI.• Definição do escopo para a contratação de serviços de recuperação do solo.• Definição do escopo para a contratação das obras de benfeitorias na área rural (curral, galinheiro e etc).• Definição de escopo para serviço de cercamento das APPs.• Continuação do fornecimento de silagem animal aos produtores impactados.• Definição de novas áreas nas propriedades impactadas para realização de novos plantios.• Dar continuidade as atividades de manutenção em plantios realizados e execução dos novos plantios pré-definidos.• Finalização dos acordos de parceria técnica com as instituições de fomento à pesquisa e extensão rural.• Início da aplicação das ferramentas de diagnóstico ambiental/econômico nas propriedades rurais (ISA e ZAP) que irão suportar as ações previstas no PG017.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Realizados 139 plantios para alimentação animal em 86 propriedades das 102 elegíveis.• Realizados 20 pomares / hortas em 19 propriedades das 36 elegíveis.• Construção de 192 km de cerca.• Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 5.233 t até dia 26 de setembro.	



EM BRANCO



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

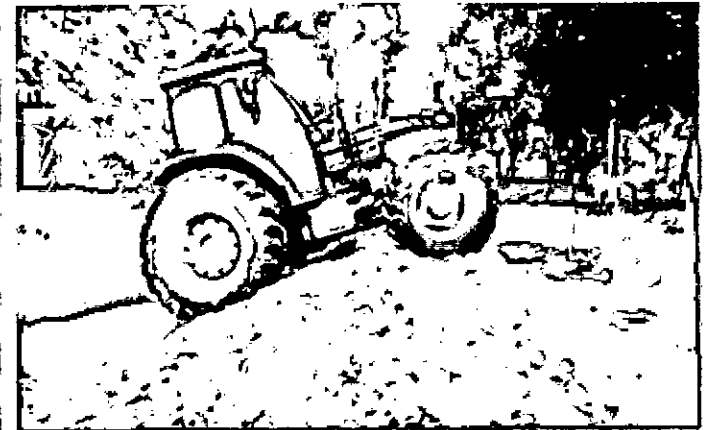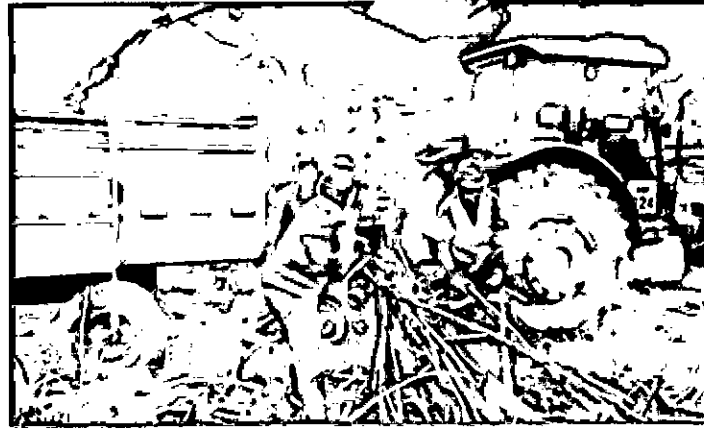


EM BRANCO



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL

Orçamento (R\$MM)	Total: 42,7	Realizado: -			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131)				set/16	dez/30
Metas do Programa				ago/17	ago/17
Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas					ago/17
Definição do Programa				set/16	out/17
PF7180 - Definição do Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria				set/16	out/17
Execução do Programa				out/17	dez/30
Processos				out/17	dez/30
PF8180 - Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)				out/17	dez/30
Encerramento do Programa				out/30	dez/30
PF9180 - Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)				out/30	dez/30




EM BRANCO



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Novas interações com a Prefeitura de Mariana por meio da diretoria e outros representantes da Fundação Renova.• Discussão sobre estudos e necessidade de avanços para fomento à instalação de indústrias na região.	<ul style="list-style-type: none">• Definição de estrutura funcional para transição e execução do Programa.• Apresentação da proposta do Programa na Câmara Técnica de Inovação e Economia.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Nivelamento da evolução dos trabalhos e desafios futuros junto à Prefeitura de Mariana.	

IBAMA/PRESI




EM BRANCO



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 26,5	Realizado: 0,8		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)		dez-15	jun-20	
Metas do Programa		ago-18	mar-20	
Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDAÇÃO)		ago-18	ago-18	
Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais		mar-20	mar-20	
Definição do Programa		out-16	mar-17	
PF7190 - Definição do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo		out-16	mar-17	
Execução do Programa		dez-15	mar-20	
Processos		dez-15	mar-20	
PF8190 - Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação		dez-15	mar-17	
PF8191 - Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação		mar-17	jul-18	
PF8192 - Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após Formalização do Programa)		mar-17	mar-20	
Encerramento do Programa		mar-20	jun-20	
PF9190 - Encerramento do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (captura e formalização de benefícios)		mar-20	jun-20	




EM BRANCO



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Tratativa dos processos que foram incluídos seguindo os critérios estabelecidos.• Estudo das situações dos comerciantes impactados indiretos em Barra Longa conforme diretriz do comitê.• Continuação da execução das ações do planejamento realizado para Barra Longa/Candongá;• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência.	<ul style="list-style-type: none">• Continuação da tratativa dos processos que foram incluídos seguindo os critérios estabelecidos.• Continuação da execução das ações do planejamento realizado para Barra Longa/Candongá.• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Barra Longa: 94 processos mapeados (35 autônomos, 59 comércios, 77 processos concluídos).• Mariana: 181 processos mapeados (122 autônomos, 15 comércios, 44 produtores rurais, 175 processos concluídos).	



EM BRANCO



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

Orçamento (R\$MM)

Total: 2,3

Realizado: -

Nome da tarefa

% Real.

Início

Término

PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)

nov-15

dez-30

Metas do Programa

fev-17

fev-17

Definição do Programa

out-16

mar-17

PF7200 - Definição do Programa de Estímulo à Contratação Local

out-16

mar-17

Execução do Programa

nov-15

dez-30

Processos

nov-15

dez-30

PF8200 - Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)

nov-15

fev-17

PF8201 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)

fev-17

dez-30

Encerramento do Programa


out-30

dez-30

PF9200 - Encerramento do Programa de Estímulo à Contratação Local (captura e formalização de benefícios)

out-30

dez-30




EM BRANCO



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Fechamento do escopo de contratação do diagnóstico.• Criação da requisição de compra com todas as aprovações.• Envio da cotação para o mercado.• Reunião de priorização com o suprimentos sobre a contratação do diagnóstico.• Levantamento e reporte dos indicadores de Julho/16.	<ul style="list-style-type: none">• Contratar o diagnóstico.• Priorizar projeto de TI para controle de terceiros.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Contração de mão-de-obra local: 1.276 de 1.759 (73%) contratados• Contratação de fornecedores local: 1076/1522 (71%) empresas	




EM BRANCO




ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA LOCAL

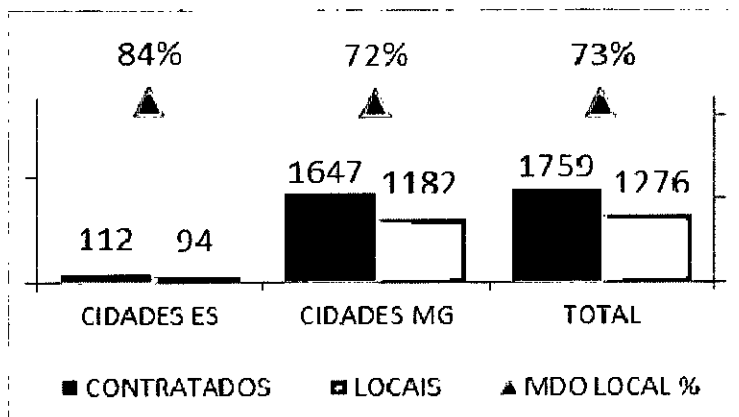


* NTE contratados para os municípios da área de abrangência


FORNECEDORES LOCAIS*

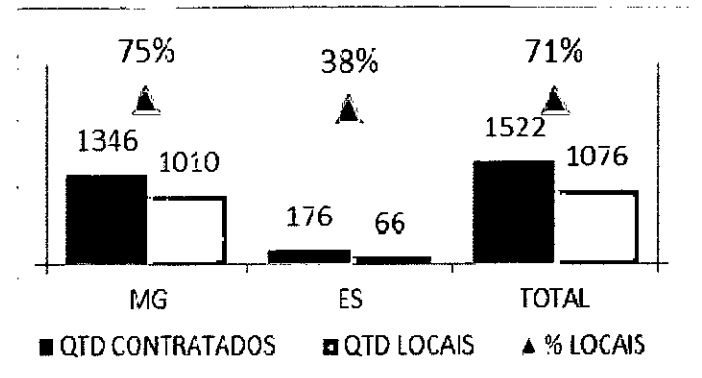

VALOR LOCAL (R\$ milhões)*

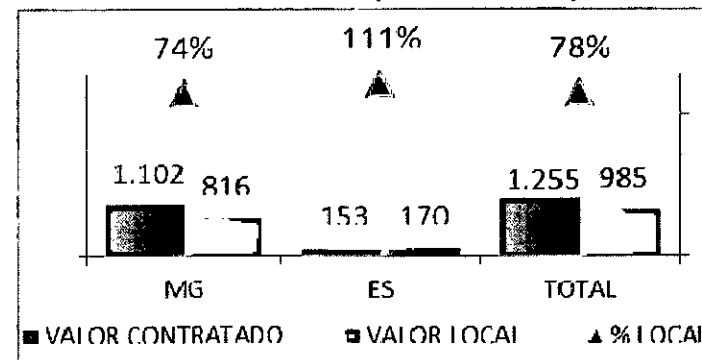

* Contratos ativos com empresas nos municípios da área de abrangência




EM BRANCO



AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

Orçamento (R\$MM)	Total: 464,1	Realizado: 149,7		
Nome da tarefa		% Real.	Início	Término
PG021-3 - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140)			nov-15	set-20
Metas do Programa			jun-20	jun-20
Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal			jun-20	jun-20
Definição do Programa			set-16	out-16
PF7210 - Definição do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS			set-16	out-16
Execução do Programa			nov-15	jun-20
Processos			nov-15	jun-20
PF8210 - Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)			nov-15	jun-20
Encerramento do Programa			jun-20	set-20
PF9210 - Encerramento do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (captura e formalização de benefícios)			jun-20	set-20



EM BRANCO



AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS


- Manutenção da confecção e entrega de cartões aos ribeirinhos identificados como elegíveis ao programa.
- Levantamento de casos de duplicidade no cadastro de beneficiários na empresa administradora de cartões.
- Levantamento de inconsistências relacionadas à concessão de cartões quanto a legitimidade de dependentes.
- Levantamento de informações para o Programa de Indenização Mediada.
- Disponibilização da base de dados financeiros do PGR-21 no SGS para histórico e Fluxo de Financeiro.
- Abastecimento do Dashboard Analítico para dados históricos de assistência humanitária realizada pelo PGR-21 no SGS.
- Revisão nos documentos que comprovam o recebimento de cartões para suporte jurídico e registro no PGR-21.
- Treinamento e mobilização da empresa contratada para distribuição de cartões aos ribeirinhos.
- Atendimento à empresa Deloitte, contratada pela Vale/BHP para auditar o Programa de Auxílio Financeiro.

AÇÕES PRÓXIMO MÊS

- Levantamento dos riscos relacionados ao Programa de Auxílio Financeiro
- Manutenção do gerenciamento dos cartões aos ribeirinhos identificados como elegíveis ao programa.
- Resolver todos os entraves identificados na migração da base de dados (elegibilidade, status dos cartões, etc) para o sistema SGS.
- Acompanhamento do novo mapeamento para Cadastro Integrado que será realizado entre agosto e outubro.
- Aguardando decisão sobre a concessão de cartões para grupos listagens nominais entregues ao CIF.
- Pagamento de indenizações 10 e 20k via cartões.
- Aprovação pelo setor Jurídico do novo contrato, formulado pela equipe do PGR-21, para atuação em 2017 da administradora de cartões de Auxílio Financeiro.
- Execução dos casos acordados nas reuniões decorrentes dos 105 casos avaliados a pedido do MPMG.

RESULTADOS

- Elegíveis: 8.034; cartões confeccionados: 8.040 e cartões entregues: 7811



EM BRANCO




AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL

Cadastros efetuados (titulares e dependentes)	Barra Longa	Mariana	Rio Doce			Total
			Total	MG	ES	
1. Elegíveis	270	355	7409	3847	3562	8034
1.1 Cartões confeccionados	257	313	7470	3871	3599	8040
1.1.1 Cartões entregues	257	312	7242	3757	3485	7811
1.1.1.1 Pessoas assistidas (titulares e dependentes)	774	846	17115	9426	7689	18735
1.1.1.2 Salários pagos*	270	354	7242	3757	3485	7866
1.1.1.3 Indenizações antecipadas 10 mil**	4	15				19
1.1.1.4 Indenizações antecipadas 20 mil**	63	277				340
1.2 Próximos Lotes(cartões em confecção)	0	2	16	8	8	18
2. Em avaliação	0	71	42	0	42	113
3. Não elegíveis	144	86	2649	1597	1052	2879

* Em Mariana e Barra Longa o cartão auxílio da família pode ter aporte de mais salários, conforme o número de rendas independentes afetadas dentro do núcleo familiar atendido por um único cartão. Ao longo do Rio Doce, cada impactado recebeu um cartão, não existindo essa acumulação.

** Em Mariana e Barra Longa foram pagas indenizações antecipadas de R\$ 10 e 20 mil quando houve impacto nos imóveis de uso eventual e habitual, respectivamente.



EM BRANCO



RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 29,4	Realizado: -		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)		jun/16	dez/17	
Metas do Programa		dez/17	dez/17	
Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES			dez/17	
Definição do Programa		jun/16	dez/16	
PF7220 - Definição do Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e formalização junto ao CIF		jun/16	dez/16	
Execução do Programa		jan/17	dez/17	
Processos		jan/17	dez/17	
PF8420 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES		jan/17	dez/17	
Encerramento do Programa		out/17	dez/17	
PF9420 - Encerramento do Programa de Ressarcimento dos gastos públicos (captura e formalização de benefícios)		out/17	dez/17	

10/10/17


EM BRANCO



RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">Avaliação e validação do desenho do Programa, incluindo procedimento específico para o tema.	<ul style="list-style-type: none">Reuniões internas para alinhamento sobre o Programa, avaliação de riscos e definições estratégicas condução das ações.Encaminhamento à Câmara Técnica de Economia para apreciação, considerações e ajustes conclusivos.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">Validação do Jurídico da Fundação sobre procedimento do Programa.	

EMBRANCO



ESTRUTURA DO ACORDO

Programas socioambientais

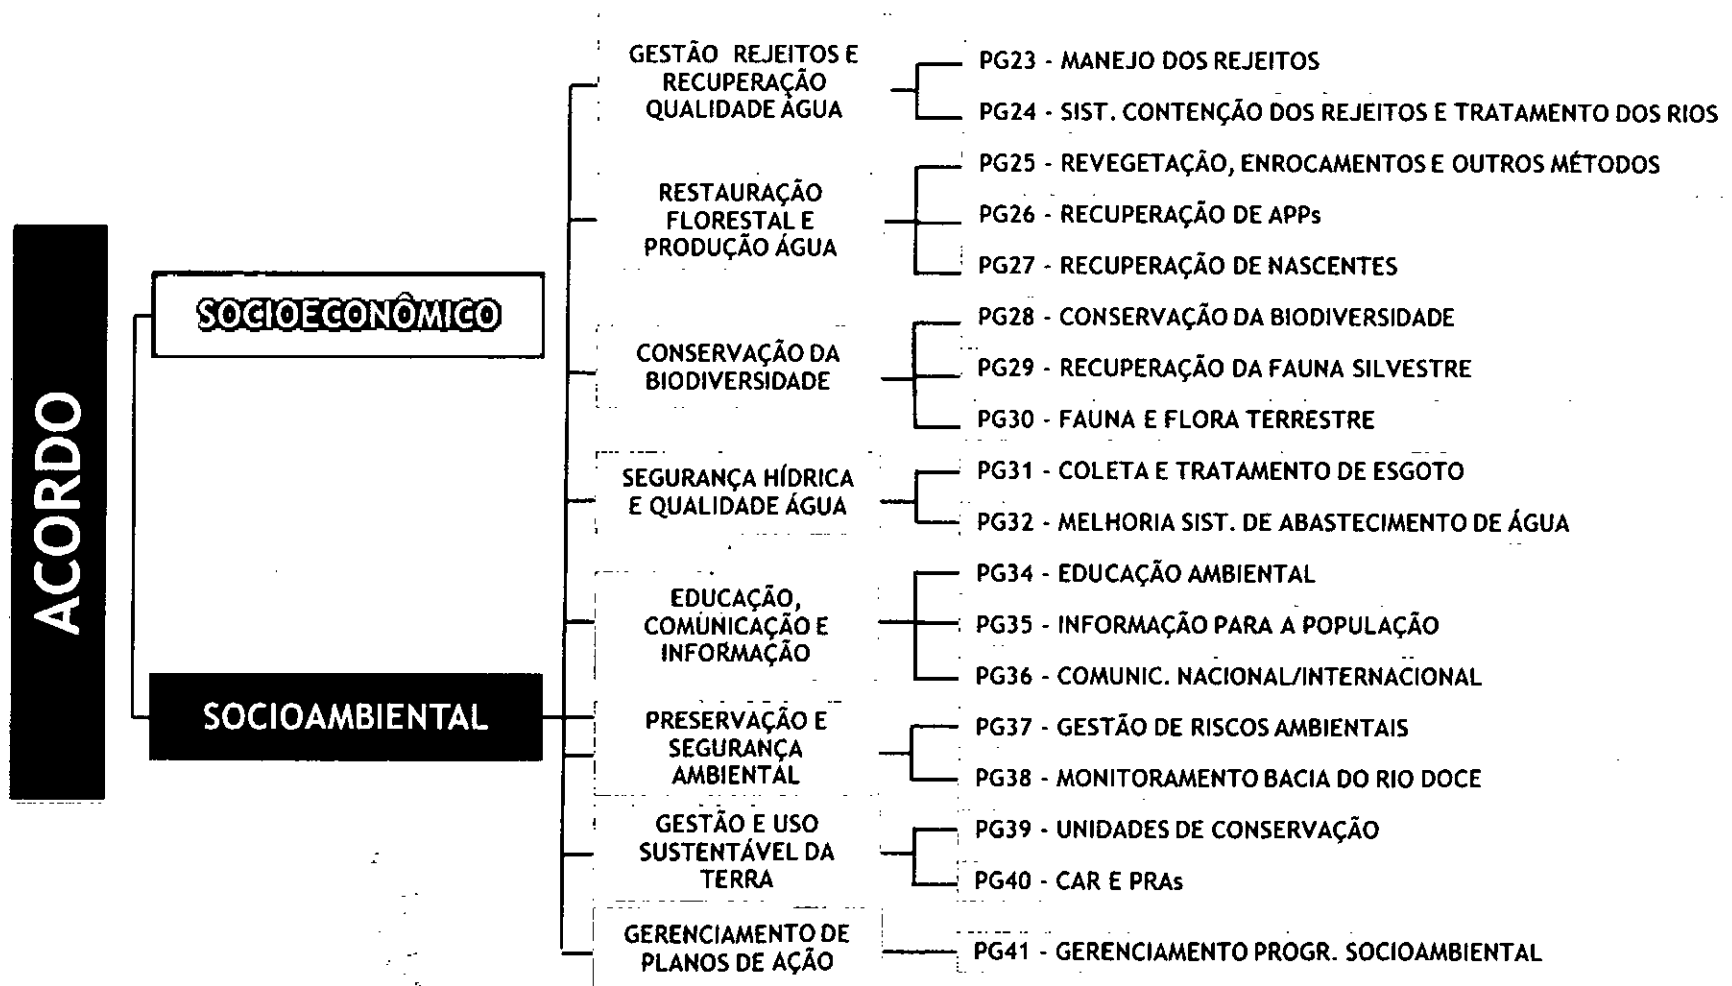

EMBRANCO



MANEJO DOS REJEITOS, REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 1.022,6*	Realizado: 119,7*		
Nome da tarefa		% Real.	Início	Término
PG023-R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160)			dez/15	jan/27
Metas do Programa			jul/16	mar/20
Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica		100%		jul/16
Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeira				mar/20
Cláusula 158 - Revegetação inicial (800 ha)		100%		jul/16
Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1				mar/20
Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1				dez/17
Definição do Programa			fev/16	mar/17
PF7230 - Definição do Programa de manejo dos rejeitos / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1			fev/16	mar/17
Execução do Programa			dez/15	out/26
Projetos			dez/15	nov/22
PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues			ago/16	mar/17
Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição)		100%	ago/16	ago/16
Execução da Limpeza de Bento Rodrigues			set/16	dez/16
Encerramento do Projeto			dez/16	mar/17
PF0020 - Reabilitação dos Tributários			dez/15	set/17
Encerramento do Projeto			jun/17	set/17
PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias) / PF0146 - Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens			jun/16	jan/18
Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias		17,80%	jun/16	jul/16
Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal		8,30%	jul/16	mar/17
Execução de recuperação ambiental da calha principal (Incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017)			jul/16	out/17
Encerramento do Projeto			out/17	jan/18

*Desembolso unificado dos PG23 e PG25


דוגמאות



MANEJO DOS REJEITOS, REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0169 - Recuperação de áreas degradadas		ago/16	jan/21
Revegetação em APP - 2000 ha		nov/17	mar/20
Encerramento do Projeto		mar/20	mai/20
PF0133 - UHE Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)		jan/17	nov/22
Avaliação de Alternativas		jan/17	abr/17
Definição do Escopo		abr/17	out/17
Planejamento da Execução		out/17	abr/18
Execução do manejo de rejeitos da UHE Risoleta Neves (em paralelo com eventual dragagem adicional para liberação dos 400m)		abr/18	ago/22
Encerramento do Projeto		ago/22	nov/22
Processos		dez/15	out/26
PF8230 - Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)		nov/17	out/26
PF8231 - Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais		dez/15	dez/23
Encerramento do Programa		out/26	jan/27
PF9230 - Encerramento do Programa de manejo dos rejeitos (captura e formalização de benefícios)		out/26	jan/27


EMBRANCO



MANEJO DOS REJEITOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Memorando técnico do método Tessier validado.• Termo de Referência de Análise de Risco à Saúde Humana e Ecológico em elaboração.• Workshop do Estudo Geoquímico com participação de diversos órgãos ambientais e MPMG.• Mobilizadas as máquinas e equipamentos para a remoção de 1 milhão de m³ de rejeitos de Bento Rodrigues. Aguardando a liberação do MPMG para iniciar as atividades.	<ul style="list-style-type: none">• Entrega do Termo de Referência da Análise de Risco à Saúde Humana e Ecológico validado junto aos órgãos ambientais.• Entrega dos encaminhamentos oriundos do Workshop com os órgãos ambientais.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Finalizada a remoção de rejeitos nas comunidades da área urbana de Barra Longa e distrito de Gesteira.• Feedback e encaminhamentos técnicos dos órgãos ambientais a respeito do estudo geoquímico.	

EMBRANCO



REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Recebido outorga para atuação e início das atividades de reconformação nas calhas dos rios principais.• Recebido relatório de testes piloto de mix solo x rejeitos.• Entregue projeto de reconformação das áreas 3, 10 e 15.• Início da mobilização de equipamentos e bioengenharia para obras de reconformação.• Realizado workshop com órgãos ambientais sobre as atividades de tributários e reconformação das calhas dos rios.• Contratação de empresa para elaboração de projetos de 7 áreas de empréstimo.	<ul style="list-style-type: none">• Atividade nas 12 frentes de trabalho para reconformação de calhas dos rios e controle de erosão.• Início dos testes piloto de revegetação em 4 propriedades rurais.• Término de obras de drenagem em 9 áreas do estudo geomorfológico.• Contratação de projetos das áreas não prioritárias. <p style="text-align: center;">12/08/2011</p>
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 56 tributários concluídos –(fase 1 do total de 101 tributários).• Alinhamento com órgãos ambientais das soluções a serem implementadas nas obras de reconformação.	


EMBRANCO



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 650,8	Realizado: 104,7		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG024-R - Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157)		nov/15	mai/20	
Metas do Programa		ago/16	mar/19	
Cláusula 155 - Estudo para adoção de melhores técnicas de contenção de rejeitos	100%		ago/16	
Cláusula 154 - Construção das estruturas emergenciais para contenção de sedimentos - Primeiro período chuvoso			jan/17	
Cláusula 157 - Redução da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 NTU (inclui ações em outros programas)			mar/19	
Definição do Programa		mar/16	set/16	
PF7240 - Definição do Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados		mar/16	set/16	
Execução do Programa		nov/15	fev/20	
Projetos		nov/15	fev/20	
PF0018 - Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo (Projeto em HOLD)		abr/16	jul/17	
PF0056 - Fundão Eixo 1 - Fase 1	46%	mar/16	mar/17	
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16	
Execução do Projeto	44%	mar/16	dez/16	
Encerramento do Projeto		dez/16	mar/17	
PF0132 - Fundão Eixo 1 - Fase 2 (EL.860)		nov/16	fev/20	
Definição do Escopo		nov/16	dez/16	
Planejamento da Execução		jan/17	fev/17	
Execução do Projeto		abr/17	nov/19	
Encerramento do Projeto		nov/19	fev/20	
PF0057 - Nova Barragem Santarém	51%	mar/16	mar/17	
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16	
Execução do Projeto	49%	abr/16	dez/16	
Encerramento do Projeto		dez/16	mar/17	

EMBRANCO



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0065 - Alçamento do Dique S3 - Fase 2	29%	mar/16	fev/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Encerramento do Projeto		nov/16	fev/17
PF0130 - Dragagem dique S3	NI	out/16	jun/17
Execução do Projeto		out/16	mar/17
Encerramento do Projeto		mar/17	jun/17
PF0055 - Dique S4	15%	jul/16	fev/17
Planejamento da Execução	98,50%	jul/16	set/16
Execução do Projeto	9%	set/16	jan/17
Encerramento do Projeto		jan/17	fev/17
Processos		fev/17	dez/19
PF8240 - Processo de Operação/Manutenção nas bacias de sedimentação do Gualaxo (clarificação de água/remoção de rejeitos) - incluindo descomissionamento dos Diques		fev/17	dez/19
Encerramento do Programa		fev/20	mai/20
PF9240 - Encerramento do Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ (captura e formalização de benefícios)		fev/20	mai/20

EMBRANCO



SIST. DE CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS

Barragens

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Nova Barragem de Santarém: Concluído o extravasor operacional, a escavação do extravasor de emergência, a montagem das bombas, a construção da pré-ensecadeira e as obras civis para instalação da comporta de desvio da tulipa. Em andamento as atividades do aterro do maciço e as obras civis do extravasor de emergência.• Eixo 1 – Fase 1: Em fase final a execução da escavação obrigatória. Em andamento escavação do canal extravasor, lançamento de material argiloso (aterro), construção do tapete drenante e filtro vertical.• Alçamento do dique S3: Concluída a limpeza de fundação. Em andamento o transporte e lançamento de blocos.• Dragagem Dique S3: Draga está sendo transportada para Germano, com previsão de chegada no dia 07/10.	<ul style="list-style-type: none">• Nova Barragem de Santarém: Início da montagem do extravasor de emergência e continuidade das atividades de aterro.• Eixo 1 – Fase 1: conclusão da escavação obrigatória. A execução das atividades de aterro desta barragem seguirão até o final do mês de outubro. A partir da elevação atingida no final deste mês, deverá ser feita uma proteção da barragem e da ensecadeira, a fim de proteger o que for construído destas estruturas contra os efeitos de um possível galgamento.• Alçamento do dique S3: Continuidade do transporte e lançamento de blocos.• Dragagem Dique S3: Início da operação de dragagem.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Realizada limpeza de aproximadamente 104 mil m³ de fundação em Santarém, 759 mil m³ no Eixo 1 de Fundão e 53 mil m³ na região do Dique S3.• Lançamento de aproximadamente 223 mil m³ de aterro compactado em Nova Santarém e 30 mil m³ no Eixo 1.• Número de trabalhadores nas obras das barragens: 3.011.	

COMMITTEE
