





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial do Gabinete da Presidência - DF



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 06 dias do mês de abril de 2017, procedemos a abertura deste volume nº V do processo de nº 02001.000974/2017-65, que se inicia com a página nº 696. Para constar subscrevo e assino.

RUBENS BATISTA DOS SANTOS
Técnico Administrativo do(a) GABIN/SETORIAL/IBAMA



MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Tipo: *Carta*
Nº. 02001. 019 *072/2016-11*
Recebido em: 14/10/2016
[Assinatura]
Assinatura

DIGITALIZADO NO IBAMA



Belo Horizonte, 14 de outubro de 2016

*Destinado ao CJ
Reformar.*



AO COMITÊ INTERFEDERATIVO

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

**PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO E DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA)**

*SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
Brasília – DF – CEP: 70818-900*

**REF.: Informações adicionais – Relatório Mensal referente aos Programas e Ações
previstos no TTAC, em Cumprimento ao disposto na Cláusula 192**


Prezada Senhora Presidente do Comitê Interfederativo,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“**FUNDAÇÃO**”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Rua Paraíba, nº 1.122, Conjunto 1301, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-918, vem, respeitosamente, expor o quanto segue.

Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do Termo de Transação e Ajuste de Conduta, firmado em 2 de março de 2016 (“**TTAC**”), a **FUNDAÇÃO** deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do **TTAC**.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do **TTAC**, a **FUNDAÇÃO** apresentou, perante este I. Comitê, no dia 13 de outubro de 2016, relatório

EM BRANCO



mensal de acompanhamento relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante de protocolo anexo (Documento Anexo I).


O documento apresentado foi revisto e atualizado, razão pela qual submetemos para apreciação de V.Sas nova versão do relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de outubro de 2016, contendo informações atualizadas sobre os programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de setembro de 2016 (Documento Anexo II).

Adicionalmente, ressaltamos que o relatório ora apresentado foi desenvolvido com base nas melhores informações e definições disponíveis no momento de sua concepção, sendo natural, portanto, que eventualmente sejam encontradas incertezas e indefinições típicas da fase em que as ações de cada um dos programas do TTAC se encontram. Dessa forma, é possível e esperado que haja a necessidade da realização de ajustes e adequações decorrentes da descoberta de situações de fato distintas das que atualmente se tem conhecimento.

A Fundação Renova é a responsável pela condução dos programas e projetos estabelecidos no TTAC. No entanto, com fundamento nas Cláusula 205 e Cláusula 235, Parágrafo Único do TTAC, informamos que o PG09 – Programa de Recuperação da UHE Risoleta Neves Fase 1 (Cláusulas 79-81) e PG24 – Programa de Contenção de Sedimentos (Cláusulas 154-157) ficarão sob responsabilidade da Samarco Mineração S.A. até o mês de março de 2017, e, após referida data, serão absorvidos pela FUNDAÇÃO.

Sendo assim, em relação aos programas indicado acima, a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude de qualquer informação apresentada neste documento, bem como por qualquer omissão, perdas ou danos, independentemente de sua natureza, decorrentes do uso das informações disponibilizadas.

EM BRANCO



A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA


LEANDRO RIBEIRO LEMOS PELIZ

OAB/DF Nº 35.932

EM BRANCO

CÓPIA

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO	
Documento - Tipo:	10001
Nº. 02001. 018	84/2016-96
Recebido em:	13/10/2016
Assinatura	<i>[assinatura]</i>



Belo Horizonte, 11 de outubro de 2016

Ao I. COMITÊ INTERFEDERATIVO

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2 – Ed. Sede – Caixa Postal nº 09566
Brasília/DF – CEP: 70818-900

REF.: Relatório Mensal Referente aos Programas e Ações Previstos no TTAC em Cumprimento da Cláusula 192

Prezada Senhora Presidente do Comitê,

FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 25.135.507/0001-83, e com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor o quanto segue.

Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do Termo de Transação e Ajuste de Conduta, firmado em 2 de março de 2016 ("TTAC"), a FUNDAÇÃO deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do TTAC.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a FUNDAÇÃO apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de outubro de 2016, contendo informações atualizadas sobre dos programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de setembro de 2016.

EM BRANCO

EM BRANCO



reparar, restaurar, reconstruir




EM BRANCO



Relatório mensal – Comitê interfederativo
Termo de transação e ajustamento de conduta

Setembro de 2016




EM BRANCO



ÍNDICE

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS		PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS	
PG01 - LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS.....	005	PG23 - MANEJO DOS REJEITOS.....	089
PG02 - RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS.....	012	PG24 - SIST. CONTENÇÃO DOS REJEITOS E TRATAMENTO DOS RIOS.....	135
PG03 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENA.....	014	PG25 - REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS.....	089
PG04 - QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.....	016	PG26 - RECUPERAÇÃO DE APPS.....	093
PG05 - PROTEÇÃO SOCIAL.....	018	PG27 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES.....	093
PG06 - DIÁLOGO SOCIAL.....	020	PG28 - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.....	096
PG07 - ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS.....	029	PG29 - RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE.....	098
PG08 - RECONSTRUÇÃO DE VILAS.....	031	PG30 - FAUNA E FLORA TERRESTRE.....	100
PG09 - RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO UHE RISOLETA NEVES.....	132	PG31 - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO.....	102
PG10 - RECUPERAÇÃO DE MAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS.....	035	PG32 - MELHORIA SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	104
PG11 - RECUPERAÇÃO ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR.....	053	PG34 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL.....	108
PG12 - MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA.....	056	PG35 - INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO.....	116
PG13 - TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER.....	063	PG36 - COMUNIC. NACIONAL/INTERNACIONAL.....	118
PG14 - SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA.....	066	PG37 - GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS.....	120
PG15 - TECNOLOGIAS SOCIOECONÔMICAS.....	068	PG38 - MONITORAMENTO BACIA DO RIO DOCE.....	122
PG16 - RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS.....	070	PG39 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.....	125
PG17 - RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS.....	072	PG40 - CAR E PRAS.....	127
PG18 - DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL.....	076	PG41 - GERENCIAMENTO PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.....	129
PG19 - MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS.....	078		
PG20 - ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL.....	080		
PG21 - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL.....	083		
PG22 - GERENCIAMENTO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.....	129		
PG42 - RESSARCIMENTO GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS.....	086		





EM BRANCO



ESTRUTURA DO ACORDO

Programas socioeconômicos

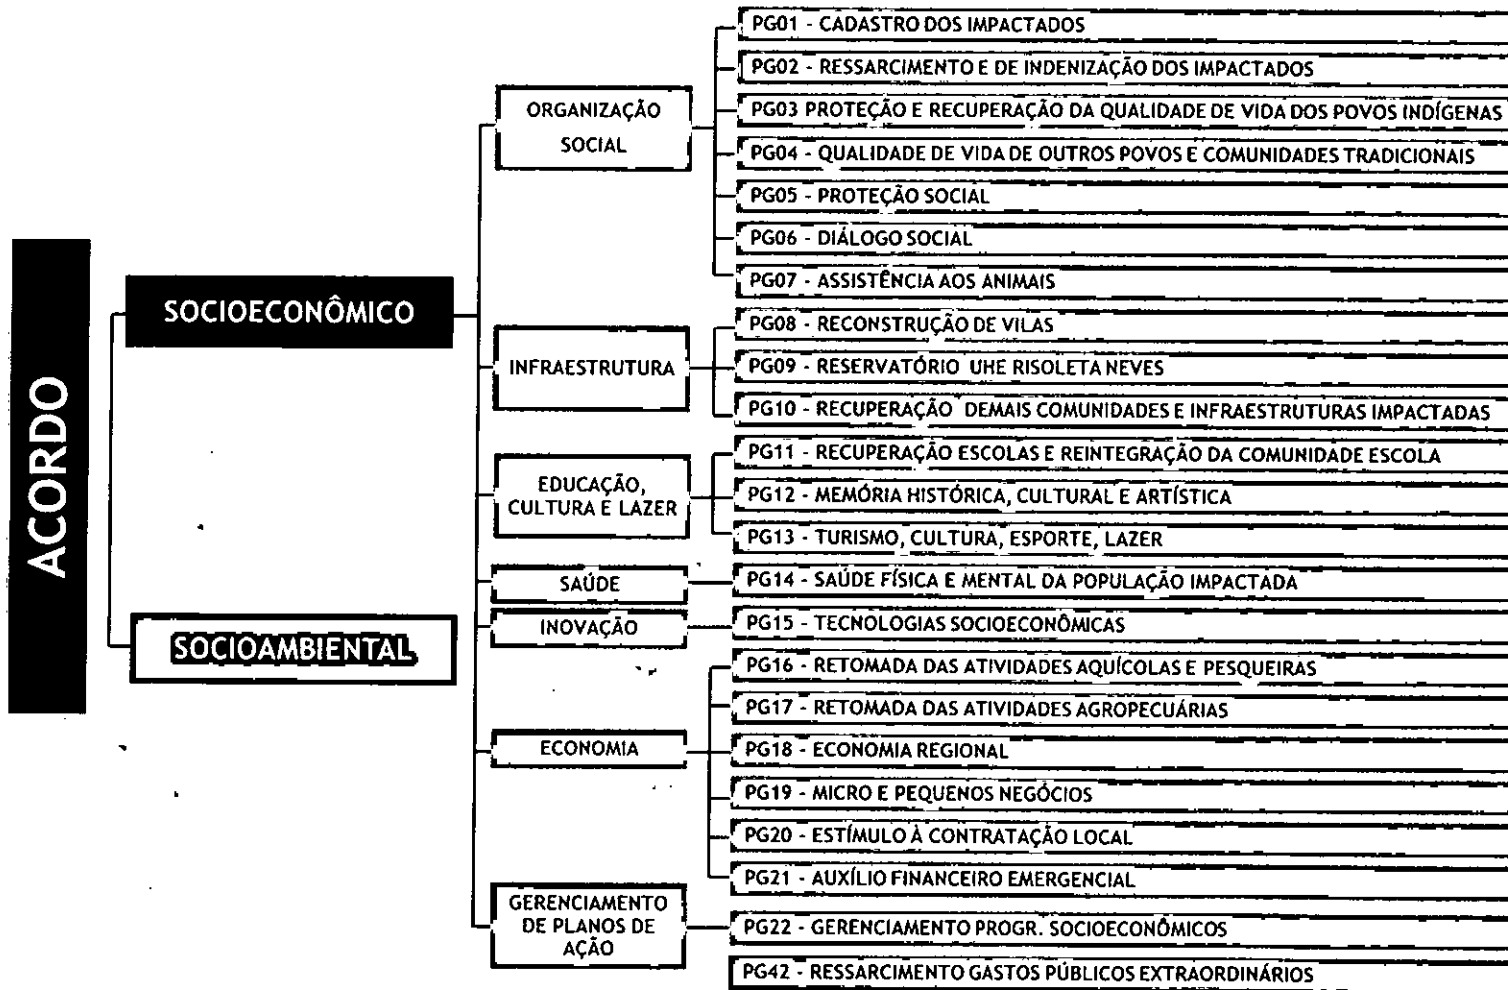


EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS



Orçamento (R\$MM)	Total: 45,9	Realizado: 10,5		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)		nov/15	out/19	
Metas do Programa		set/16	abr/17	
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo			set/16	
Definição do Programa		jun/16	out/16	
PF7010 - Definição do Programa de levantamento e de cadastro dos impactados		jun/16	out/16	
Execução do Programa		nov/15	jun/19	
Projetos		nov/15	set/17	
PF0059 - Levantamento e cadastro dos Impactados e produção de informações para demais programas	23%	nov/15	set/17	
Execução do Projeto		nov/15	jul/17	
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov/15	jul/16	
Elaboração de relatório de impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos impactados.		jan/17	jul/17	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul/17	set/17	
Processos		jan/17	jun/19	
PF8010 - Processos de Atualização, revisão e correção do Cadastro Socioeconômico dos Impactados		jan/17	jun/19	
PF8011 - Processos de monitoramento dos Impactos Socioeconômicos dos municípios		jun/17	jun/19	
PF8012 - Processo de estudo de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares		jun/17	jun/19	
Encerramento do Programa		jun/19	out/19	
PF9010 - Encerramento do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (captura e formalização de benefícios)		jun/19	out/19	



EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):

- Realização da 5ª reunião com CTOS em 03/10;
- Solicitação de dilação de prazos das etapas do processo do PG001 e estabelecimento de cronograma de trabalho, incluindo datas para envio de lotes de informação de cadastro integrado para validações da CTOS;
- Construção de cronograma integrado entre PG001 e PG002 (Programa de Indenização Mediada).

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:


- Atividades suspensas até que seja contratada consultoria técnica especializada para prestar assessoria prévia aos impactados;

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Início da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos.

Base de dados e Documentação:

- Consistência do banco de dados do cadastro emergencial de Barra Longa e Rio Doce.
- Ajuste de formulário no sistema de cadastro – SGS;
- Desenvolvimento da plataforma (SGS) com inserção das etapas do processo de cadastro para acompanhamento (ex.: aplicação do checklist de análise do cadastro, grid de acompanhamento das etapas do processo) – Em andamento
- Levantamento das solicitações de novos cadastros



EM BRANCO



LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS



AÇÕES PRÓXIMO MÊS

Reunião com Câmara Técnica de Organização Social (CTOS):

- Envio do primeiro lote de informações do Cadastro Integrado para análise da CTOS;
- 31 de outubro (6ª reunião), 03 de novembro (7ª reunião) e 02 de dezembro (8ª reunião), previstos.

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:

- Previsão de Kick Off da Consultoria Técnica especializada para prestação de assessoria aos impactados

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Continuidade da indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos em todo o território.

Base de dados e Documentação:

- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros;
- Início do acompanhamento do processo de cadastro via SGS;
- Início das cargas do cadastro integrado no SGS;
- Início da entrega da cópia do formulário para os potenciais impactados.



EM BRANCO





LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS




LOCAIS	FAMÍLIAS	PESSOAS
Mariana e Barra Longa	942	2.810
Rio Doce	7.573	26.804
TOTAL	8.515	29.614

CADASTRO EMERGENCIAL - atualizado em 27/07/2016

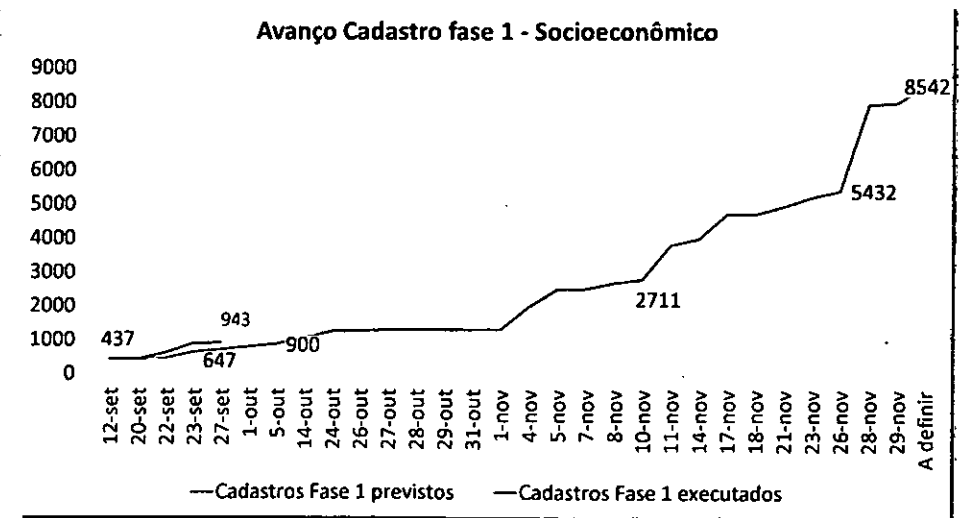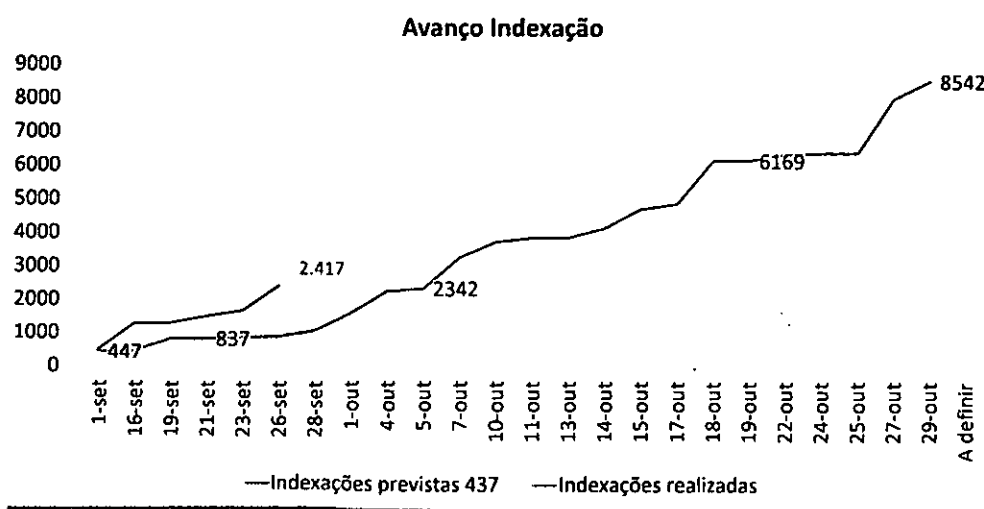

INFORMATIVO CADASTRO INTEGRADO - atualizado em 01/10/16



EM BRANCO




LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS



- Reuniões prévias com as comunidades para esclarecimentos sobre o cadastro integrado a ser implantado na área/ comunidade;
- Estas reunião são coordenadas pela equipe do PG001 Samarco, com apoio da Synergia




São José do Goiabal 06 e 08/09/2016

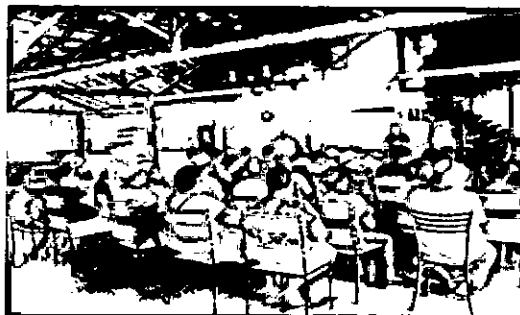


Caratinga 06/09/2016



Itueta 08/09/2016

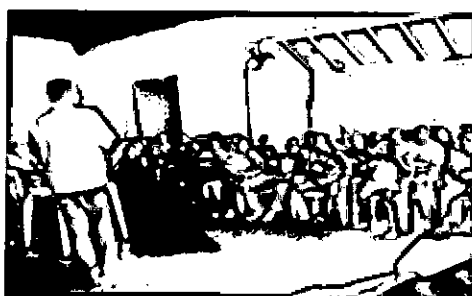


Tumiritinga 14/09/2016

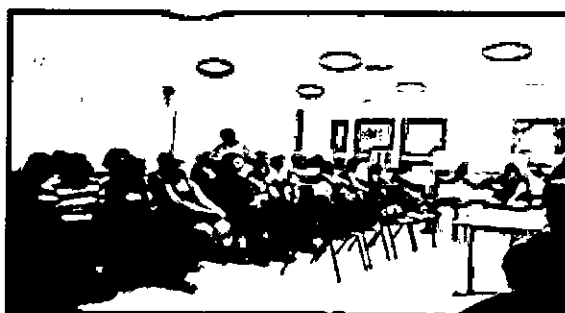

Colatina 12/09/2016



Marilândia 13/09/2016




EM BRANCO





LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS



Plantão Social – Baixo Guandu-ES



Plantão Social – Baixo Guandu-ES





Plantão Social – Baixo Guandu-ES



Equipe Ilhas



Plantão Social – Baixo Guandu-ES



EM BRANCO



Material de divulgação



CADASTRO INTEGRADO.

A Fundação renova para a Terra, Cadastro Integrado, é a primeira iniciativa de registo de produtores rurais e produtores urbanos em Portugal. A iniciativa integra:

1. O registo de produtores rurais e urbanos em Portugal, através do Cadastro Integrado, que permite a identificação dos produtores rurais e urbanos em Portugal.

2. O registo de produtores rurais e urbanos em Portugal, através do Cadastro Integrado, que permite a identificação dos produtores rurais e urbanos em Portugal.

PARA FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE CADASTRO OU ESCLARECER DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:

- ☎ 000 031 3303 - Telefone local: fundacaorenova.org
- 🌐 <http://www.fundacaorenova.org/tele-cooica/>

PARA FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE CADASTRO OU ESCLARECER DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:

- ☎ 000 031 3303
- 🌐 www.fundacaorenova.org/tele-cooica/



CADASTRO INTEGRADO.

PARA FORMALIZAR A SOLICITAÇÃO DE CADASTRO OU ESCLARECER DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO:

- ☎ 000 031 3303
- 🌐 www.fundacaorenova.org/tele-cooica/



ETAPAS DO PROCESSO

PASSO A PASSO



1. Preparação

Preparação dos dados necessários para a inscrição no Cadastro Integrado, através do preenchimento do formulário de inscrição no Cadastro Integrado, disponível em www.fundacaorenova.org/tele-cooica/.



4. Análise

Análise dos dados necessários para a inscrição no Cadastro Integrado, através do preenchimento do formulário de inscrição no Cadastro Integrado, disponível em www.fundacaorenova.org/tele-cooica/.



2. Verificação Inicial

Verificação inicial dos dados necessários para a inscrição no Cadastro Integrado, através do preenchimento do formulário de inscrição no Cadastro Integrado, disponível em www.fundacaorenova.org/tele-cooica/.




5. Reconexão

Reconexão dos dados necessários para a inscrição no Cadastro Integrado, através do preenchimento do formulário de inscrição no Cadastro Integrado, disponível em www.fundacaorenova.org/tele-cooica/.



3. Entrevista e Visita Técnica

Entrevista e visita técnica dos produtores rurais e urbanos em Portugal, através do Cadastro Integrado, que permite a identificação dos produtores rurais e urbanos em Portugal.




EM BRANCO



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS

Orçamento (R\$MM)	Total: 388,8	Realizado: 11,3			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38)				dez/15	jan/20
Metas do Programa				jun/17	jul/17
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)					jun/17
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa					jul/17
Definição do Programa				set/16	out/16
PF7020 - Definição do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados				set/16	out/16
Execução do Programa				dez/15	out/19
Projetos				mar/16	out/17
PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS				mar/16	out/17
Planejamento da Execução do Projeto em Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares			100%	mar/16	jul/16
Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas (excetuando-se Mariana e Barra Longa)				jun/16	out/16
Execução do Projeto				mai/16	jul/17
Implantar Centros de Negociação - Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares				mai/16	out/16
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)				out/16	jan/17
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)				out/16	jun/17
Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)				out/16	jul/17
Encerramento do Projeto				jul/17	out/17
Processos				dez/15	out/19
PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS				dez/15	jan/17
PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações				jul/17	out/19
Encerramento do Programa				out/19	jan/20
PF9020 - Encerramento do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (captura e formalização de benefícios)				out/19	jan/20



EM BRANCO



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS


- Realizada reunião de devolutiva de construção da matriz de danos com grupo de comerciantes de MG.
- Realizadas 9 audiências públicas para explicação do PIM em MG e ES a convite das defensorias públicas estaduais e da união.
- Validada a logística dos escritórios da fase 2 na CTOS.
- Atestados valores de eletrodomésticos e produtos junto ao CDL de Mariana.
- Revisados critérios de indenização agropecuária junto a Synergia, Icapar e Emater.
- Realizada reunião de construção de matriz de danos em Rio Doce.
- Concluídas obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1, Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce.
- Contratado e mobilizado efetivo do processo externo do PIM.
- Adquirido e instalado mobiliários dos escritórios da fase 1.
- Definidos imóveis para fase 2 dos escritórios de mediação.
- Realizado Workshop de simulação do processo PIM da danos de água.
- Aplicada Identidade visual nos escritórios do PIM, Fase 1.
- Homologado módulo indenizatório de DMA.

AÇÕES PRÓXIMO MÊS

- Realizar reuniões devolutivas com a população impactada e o poder público sobre o formato final do programa após sugestões coletadas e avaliadas.
- Executar plano de comunicação para início da operação dos escritórios.
- Apresentar versão final da matriz de danos, protocolo de elegibilidade e matriz comprobatória para defensorias, CTOS e população.
- Executar plano de comunicação para início da operação dos escritórios.
- Finalizar obras de infraestrutura no escritório de Mariana;
- Treinar equipe da Fundação para atendimento nos escritórios de Danos Gerais.
- Locar imóveis da Fase 2.
- Finalizar desenvolvimento e homologar módulo indenizatório de DG.

RESULTADOS

- Discutidas internamente e aprovadas 80% das sugestões de danos levantadas junto a população consultada.
- Concluídas obras de adequação de infraestrutura dos escritórios da fase 1: Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Governador Valadares, Barra Longa e Rio Doce.
- Finalizado procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios.
- Capacitada a equipe de atendimento danos de água.
- Testados os procedimentos operacionais de funcionamento dos escritórios.
- Revisadas as especificações no módulo indenizatório DMA e DG.
- Acompanhamento e suporte aos lançamentos de indenizações antecipadas no SGS.
- Implantação do módulo de agendamento DMA – SGS.



EM BRANCO



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS

Orçamento (R\$MM) Total: 61,7 Realizado: 8,0

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)		mar-16	dez-19
Metas do Programa		mar-16	out-19
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado	100%	abr-16	abr-16
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak	100%	jul-16	jul-16
Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		out-19	out-19
Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	100%	mar-16	mar-16
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani	100%	jul-16	jul-16
Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)		out-19	out-19
Definição do Programa		jul-16	nov-18
PF7030 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas		jul-16	nov-18
Execução do Programa		mar-16	mai-19
Projetos		nov-16	mai-19
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak		nov-16	mai-19
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak		jan-17	jan-19
Encerramento do Projeto		fev-19	mai-19
Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)		nov-18	nov-18
Processos		mar-16	jan-19
Processos de Apoio Emergencial		mar-16	jan-19
Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		ago-16	ago-18
Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		mar-16	out-16
Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro		mar-16	nov-16
Fornecimento Emergencial de Água - Krenak		ago-16	jan-19
Encerramento do Programa		out-19	dez-19
PF9030 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (captura e formalização de benefícios)		out-19	dez-19




EM BRANCO



PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<p>Geral:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunião para definição dos papéis e responsabilidades da Funai e Sesai e, Samarco/Fundação Renova.• Apresentação à Funai e Sesai do resultado das análises das águas dos rios e litoral marinho• Continuidade do Programa de Qualidade <p>Krenak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial• Manutenção das estradas para abastecimento de água• Troca do depósito para guarda da água mineral <p>Comboios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial• Reunião na Fibria para estudo do canal Caboclo Bernardo <p>Caieiras Velhas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial• Diálogo com caciques e lideranças de pesca para pleito de aditivo para pescadores profissionais indígenas• Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)	<p>Geral</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das ações de assistência emergencial para indígenas• Manutenção auxílio financeiro• Manutenção monitoramento de água• Apresentação do Plano de Trabalho do Estudo de Componente Indígena à Funai <p>Krenak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manutenção das estradas para abastecimento de água <p>Comboios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro• Identificação do potencial de contaminação no rio Comboios por meio do canal Caboclo Bernardo <p>Caieiras Velhas</p> <ul style="list-style-type: none">• Minuta para extensão do prazo de pagamento do auxílio financeiro
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R\$7.092) por família a 126 famílias, disponibilização de R\$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água• Tupiniquim(TI Comboios): Auxílio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias• Tupiniquins e Guaranis(Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R\$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R\$ 662.942,70, depositado em uma conta vinculada à associação indígena.	




EM BRANCO



QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS



Orçamento (R\$MM)	Total: 0,5	Realizado: -			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)				ago/16	jul/18
Metas do Programa				out/16	abr/18
Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)					out/16
Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas					jan/17
Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)					abr/18
Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)					abr/18
Definição do Programa				ago/16	abr/18
PF7040 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais				ago/16	abr/18
Execução do Programa (a definir)				abr/18	abr/18
Encerramento do Programa				abr/18	jul/18



EM BRANCO




QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS TRADICIONAIS

Estudo vila de Santa Efigênia



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Realização de reunião junto à FCP (13 de setembro) para apresentação de informações levantadas pela empresa em relação à localização e características da comunidade Quilombola de Santa Efigênia e dos pontos solicitados para revisão do TR.• Contatos com a FCP solicitando posicionamento em relação ao novo TR.	<ul style="list-style-type: none">• Tratativas com a FCP para liberação do TR revisado ou indicação de outras ações pertinentes para as tratativas da empresa em relação ao estudo inicialmente solicitado.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Liberação do Termo de Referência pela FCP (18 de maio).• Definição junto à Fundação Cultural Palmares de necessidade de ajustes no Termo de Referência expedido.• Protocolo do pedido formal de revisão do TR junto à FCP e CIF (5 de Agosto).• Concordância da FCP com relação à necessidade de revisão do TR anteriormente expedido.	




EM BRANCO



PROTEÇÃO SOCIAL



Orçamento (R\$MM)	Total: 38,6	Realizado: -			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
Nome da Tarefa			% Real.	Início	Término
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)				abr-16	jun-19
Metas do Programa				abr-16	abr-19
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social			100%	abr-16	abr-16
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social				abr-19	abr-19
Definição do Programa				nov-16	jul-17
PF7050 - Definição do Programa de Proteção Social				nov-16	jul-17
Execução do Programa				abr-16	abr-19
Processos				abr-16	abr-19
PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social				abr-16	jul-17
PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo)				jul-17	abr-19
Encerramento do Programa				abr-19	jun-19
PF9050 - Encerramento do Programa de Proteção Social (captura e formalização de benefícios)				abr-19	jun-19




EM BRANCO



PROTEÇÃO SOCIAL



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Atendimento às famílias impactadas (Bento e Paracatu).• Visitas domiciliares, grupos temáticos, atividade socioculturais• Encaminhamento para rede pública: saúde, educação e assistência social (CREAS e Conselho Tutelar).• Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos e professores).• Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida.• Reuniões de supervisão de casos com a equipe técnica do CRAS.• Elaboração do Termo de Referência para contratação de consultoria em Proteção Social.	<ul style="list-style-type: none">• Reunião rede de saúde, assistência social e educação, com Ministério Público de Minas Gerais.• Abertura de contratação de consultoria para Programa de Proteção Social.• Manter atendimentos às famílias impactadas.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica (CRAS) e encaminhamento para Proteção Especial (CREAS) – quando for o caso.• Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial.• Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território.	



EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL



Orçamento (R\$MM)	Total: 224,5	Realizado: 12,1			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72)				nov-15	dez-30
Metas do Programa				dez-16	abr-17
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO				dez-16	dez-16
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria				abr-17	abr-17
Definição do Programa				set-16	out-16
PF7060 - Definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social				set-16	out-16
Execução do Programa				nov-15	dez-30
Processos				nov-15	dez-30
Marcos de Processo				out-16	mar-17
PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional				nov-15	jul-16
PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo				jul-16	mar-17
PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento				mai-16	jan-17
PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO				nov-15	abr-17
PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional				jul-16	ago-17
PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo				mar-17	dez-30
PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento				jan-17	nov-30
PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO				abr-17	dez-30
Projetos				mai-16	abr-17
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO				mai-16	abr-17
Diagnóstico do processo de ouvidoria				jul-16	nov-16
Implantação e adequação do processo de ouvidoria				nov-16	abr-17
Encerramento do Projeto				abr-17	abr-17




EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL



Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento		mai-16	fev-17
Marcos do Projeto		set-16	dez-16
Reestruturação da Gestão do Processo		mai-16	jul-16
Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo		mai-16	jan-17
Reestruturação do Sistema		mai-16	jan-17
Encerramento do Projeto		jan-17	fev-17
Encerramento do Programa		out-30	dez-30
PF9060 - Encerramento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (captura e formalização de benefícios)		out-30	dez-30



EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL


Região I



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Trecho I: 4 municípios (Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce): 46 reuniões 1697 participantes)• Monitoramento de famílias impactadas na região de Mariana e Barra Longa.• Mapeamento/Monitoramento de stakeholders.• Mediação de conflitos.	<ul style="list-style-type: none">• Continuidade da adaptação do Plano de Relacionamento com comunidades para o momento de transição.• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios impactados.• Manutenção do Mapeamento/Monitoramento stakeholders locais.• Mediação de conflitos.

RESULTADOS

- Estabelecimento e continuidade de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução.
- Instituída reunião de prestação de contas no município de Mariana para reportar o avanço dos Programas
- Fomento e facilitação do diálogo com as comunidades para a organização dos grupos em prol da realização de festividades vinculadas às suas manifestações culturais tradicionais: Festa de São Bento/Bento Rodrigues e Festa do Menino Jesus/Paracatu de Baixo
- Comunicação formal do início da funcionamento da Fundação Renova com participação do Presidente e Diretor em reuniões de Diálogo no território de Barra Longa.
- Trecho I, II e III: aprofundamento e debates de temas relacionados aos Programas: PG001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 014.
- Acumulado de reuniões: 364 com 11.810 participantes no trecho I.



EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL


Região I



Reunião com lideranças de Barra Longa com presença de
Presidência e Diretoria da Fundação Renova

Reunião geral em Mariana - Status e prestação de contas
das ações de reparação em andamento

Café com prosa –
Diálogo Idosos



EM BRANCO




DIÁLOGO SOCIAL

Trecho Rio Doce



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Trecho II e III: 36 municípios de MG e ES ao longo do Rio Doce: 53 reuniões (2162 participantes).• Ampliação do diálogo com as comunidades impactadas nos municípios de MG e ES, por meio de reuniões e atendimentos individualizados/ visitas.• Mapeamento/ Monitoramento de stakeholders.	<ul style="list-style-type: none">• Continuidade da ampliação do diálogo com comunidades para o momento de transição, disseminando a Fundação e seus diversos programas.• Manutenção das Reuniões de Diálogo nos territórios impactados.• Manutenção do Mapeamento/ Monitoramento dos públicos prioritários.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Estabelecimento e continuidade de ampliação do diálogo e relacionamento com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de tensão e/ ou conflito e espaços de resolução.• Trechos II e III: aprofundamento do diálogo e estudos sobre temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006 e PG034.• Comunicação formal do início da funcionamento da Fundação Renova com participação do Diretor em reuniões de Diálogo nos municípios do Espírito Santo.• Acumulado de reuniões: 277 com 11.682 participantes nos trecho II e III.	



EMBRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

Trecho Rio Doce



Balanço das atividades realizadas


Participantes Temas das reuniões setembro/ 2016

Estados	Reuniões	Participantes
Minas Gerais	45	2010
Espírito Santo	8	152

Plano de Contingência



Progr. Indenização Mediada (PG002)



Diálogo Social Ampliado - Fundação



Cadastro Integrado (PG001)



EMBRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

Trecho Rio Doce




Reunião para construção de lista de danos (PG002) com grupo de pescadores de Galiléia, Conselheiro Pena, Itueta, Aimorés e Resplendor/ MG



Reunião para apresentação do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – Aimorés/ MG




Reunião para apresentação do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados – Bugre/ MG

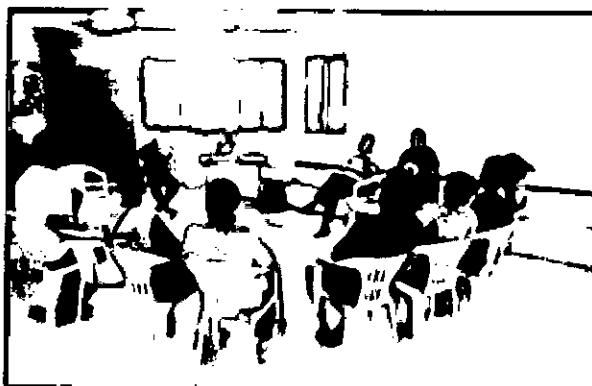

Reunião de diálogo com Associação de Pescadores, Povoação, Linhares/ ES



Reunião de devolutiva da lista de danos (PG002) com grupo de comerciantes de MG



EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

Canais de Relacionamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS


- Melhorias no módulo de manifestações do SGS
- Início da expansão dos postos de atendimento para região do Doce

AÇÕES PRÓXIMO MÊS

- Continuidade da expansão dos postos de atendimento para região do Doce

RESULTADOS

- Foram recebidas um total de 69.839 manifestações sendo 5.008 somente em setembro.






EM BRANCO



DIÁLOGO SOCIAL

Canais de Relacionamento

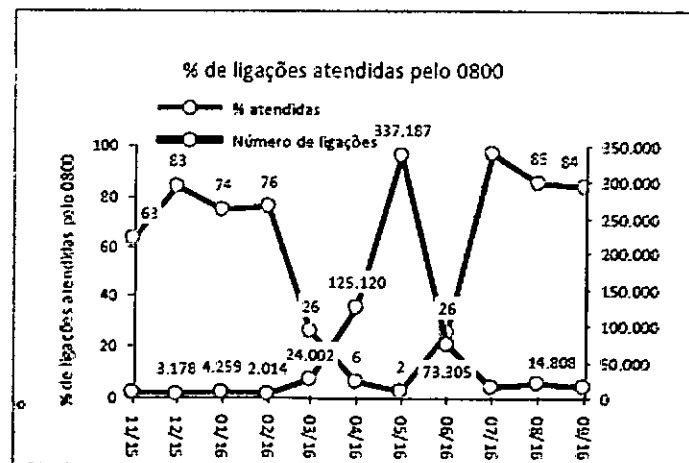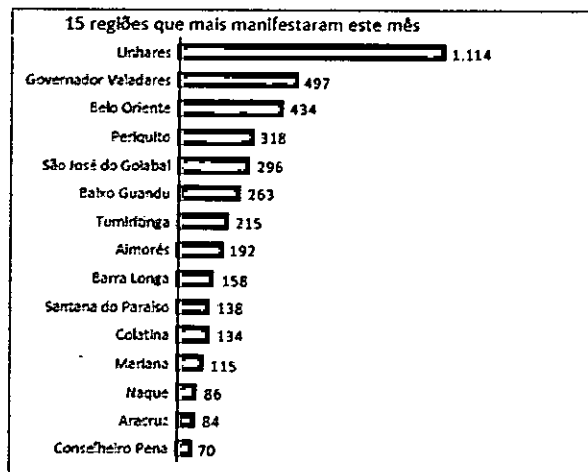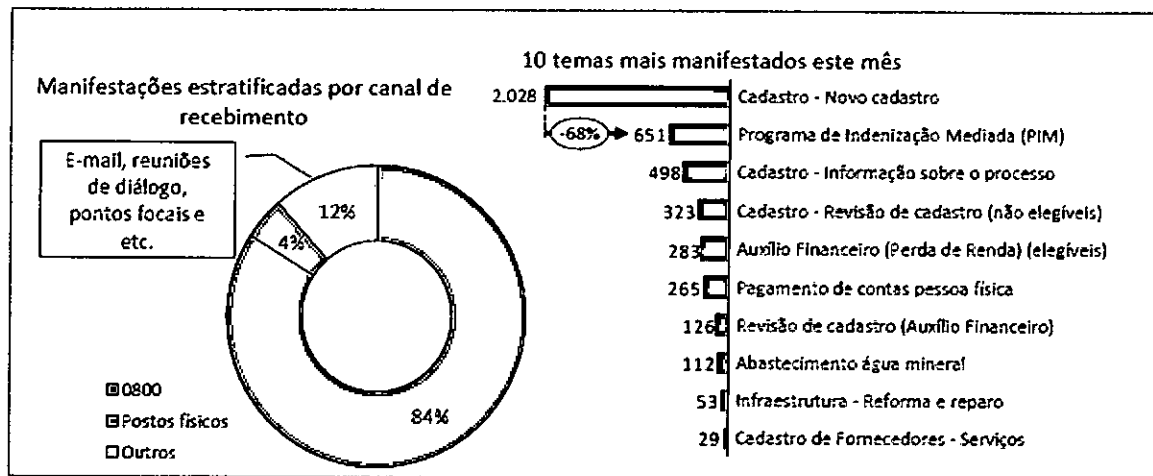


EM BRANCO



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS



Orçamento (R\$MM)	Total: 16,4	Realizado: 12,1		
Nome da tarefa			% Real.	Término
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)				mar/16 jul/19
Metas do Programa				mai/19 mai/19
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais				mai/19
Definição do Programa				set/16 out/16
PF7070 - Definição do Programa de Assistência aos Animais				set/16 out/16
Execução do Programa				mar/16 mai/19
Processos				mar/16 mai/19
PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)				mar/16 mai/19
Encerramento do Programa				mai/19 jul/19
PF9070 - Encerramento do Programa de Assistência aos Animais (captura e formalização de benefícios)				mai/19 jul/19




EM BRANCO



ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Vistas de pós adoção• Evento de Adoção de Animais em Mariana - MG• Resgate de animais em Bicas, Paracatu, Barra Longa e Bento Rodrigues• Devolução de animais de pequeno e grande porte aos tutores• Atendimentos de animais em campo• Suspensão do processo de compra de animais de grande porte por decisão judicial.• Transferência de animais de grande porte da Fazenda Sta. Tereza para Faz. Bom Retiro• Conclusão de extensão de contrato da Faz. Bom Retiro	<ul style="list-style-type: none">• Retomada da negociação de compra dos animais de grande porte junto a equipe de assessoria técnica dos proprietários rurais• Acompanhamento de pós adoção• Evento de adoção em Ouro Preto/MG• Devolução animais de grande e pequeno porte aos proprietários• Extensão do contrato de locação da Fazenda Bom Retiro até Janeiro/17.• Atualização de cadastros de animais no IMA• Transferir animais de propriedade rural para Fazenda Bom Retiro• Novo contrato de assistência aos animais• Castração de animais de pequeno porte
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• 57 visitas de acompanhamento do pós adoção• 13 adoções de animais de pequeno porte• 55 animais devolvidos aos seus responsáveis	<ul style="list-style-type: none">• 6 animais resgatados• 280 animais sob guarda do programa



EM BRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Orçamento (R\$MM)	Total: 322,5	Realizado: 17,1		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)		nov/15	mar/22	
Metas do Programa		mar/19	jun/19	
Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas			mar/19	
Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas)			jun/19	
Definição do Programa		set/16	out/16	
PF7080 - Definição do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira		set/16	out/16	
Execução do Programa		nov/15	mar/22	
Projetos		nov/15	jun/19	
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues		nov/15	jun/19	
Marcos do Projeto		out/16	ago/17	
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov/15	mai/16	
Definição do Escopo	10%	mai/16	ago/17	
Projeto Conceitual das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)	15%	jun/16	abr/17	
Projeto Conceitual da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos	5%	mai/16	ago/17	
Planejamento da Execução		fev/17	nov/17	
Planejamento da Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		fev/17	ago/17	
Planejamento da Execução da Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		mar/17	nov/17	
Execução do Projeto		set/16	mar/19	
Execução de supressão vegetal e outras atividades preliminares		set/16	fev/17	
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana (supressão vegetal, terraplenagem, infraestrutura de energia, água, saneamento, arruamento, pavimentação, drenagem e acessos)		ago/17	mai/18	
Construção das Casas e Equipamentos Urbanos		nov/17	mar/19	
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar/19	jun/19	




EMBRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0047 - Reconstrução de Paracatú de Baixo		nov/15	mai/19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	100%	nov/15	ago/16
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	0%	set/16	ago/17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		abr/17	fev/18
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev/18	mar/19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		mar/19	mai/19
PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira		ago/16	abr/18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas	20%	ago/16	abr/17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		fev/17	ago/17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas		mai/17	jan/18
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas		jan/18	abr/18
PF0049 - Reconstrução da escola de Gesteira		fev/16	fev/17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola	100%	fev/16	jul/16
Execução das obras de reconstrução da escola	43%	jul/16	nov/16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola		nov/16	fev/17
Processos		nov/15	mar/22
PF8080 - Processo de Aporte Financeiro para Assessoramento de IMPACTADOS		out/16	jul/17
PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	jun/19
PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	jun/19
PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov/15	abr/18
PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar/19	mar/22
PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar/19	mar/22
PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		jan/18	jan/21
Encerramento do Programa		dez/21	mar/22
PF9080 - Encerramento do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira		dez/21	mar/22




EMBRANCO



RECONSTRUÇÃO DE VILAS



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Iniciado processo de contratação de profissionais pela CÁRITAS.• Pagamento de 50% à ARCELOR MITTAL de aquisição da área para reassentamento da Comunidade de Bento. Minutas das escrituras concluídas para assinatura e pagamento do restante.• Concluída sondagem e topografia (geologia em andamento) e elaboração de vídeo para validação do Projeto Urbanístico pela Comunidade de Bento. Aguardando mobilização da CÁRITAS.• Realizada primeira reunião com SUPRAM para discutir os procedimentos para avaliação dos cenários ambientais, para fins de regularização ambiental para reassentamento das vilas.• Realizada votação pela Comunidade para escolha da área para reassentamento de Paracatu de Baixo.• Concluído projeto urbanístico de Gesteira. Aguardando mobilização da CÁRITAS e negociação da área com proprietário.• Concluída montagem das paredes de concreto PVC e laje pré-moldada da Escola de Gesteira.• Em andamento paisagismo e drenagem pluvial da Praça.	<ul style="list-style-type: none">• Conclusão da contratação de profissionais pela CÁRITAS, e início da mobilização para assessoria técnica aos atingidos, priorizando início do cadastro físico, socioeconômico e fundiário, bem como aprovações dos Projetos Urbanísticos• Início da elaboração das tipologias das casas, baseadas nos levantamentos de expectativas das Comunidades• Projeto básico e início da engenharia detalhada, para Loteamento de Bento Rodrigues• Contratação dos estudos ambientais, negociações com proprietários para aquisições das áreas e início dos estudos técnicos para engenharia (topografia, sondagem e geotecnia), para Paracatu de Baixo• Conclusão da negociação com proprietário para aquisição da área e dos estudos técnicos para engenharia (sondagem e geotecnia) para Gesteira• Conclusão da construção da Escola de Gesteira.• Em andamento urban., paisagismo e pavimentação da Praça
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Escolhido terreno da Lucila para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo com 65% dos votos e presença de 95% da Comunidade no processo de votação.	




EM BRANCO




RECONSTRUÇÃO DE VILAS


Construção da escola de Gesteira

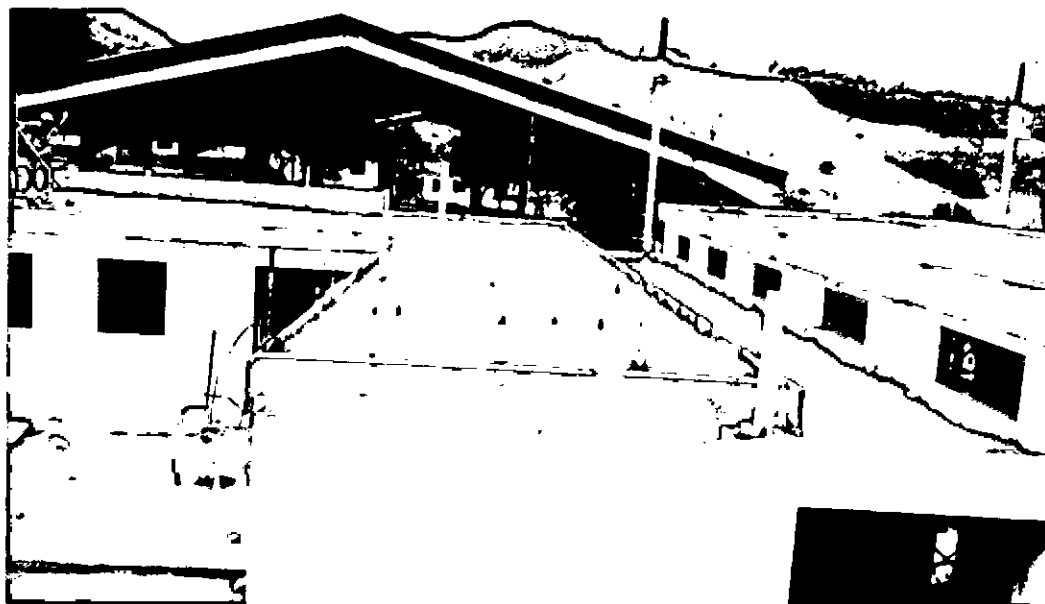

Concretagem da laje da Escola

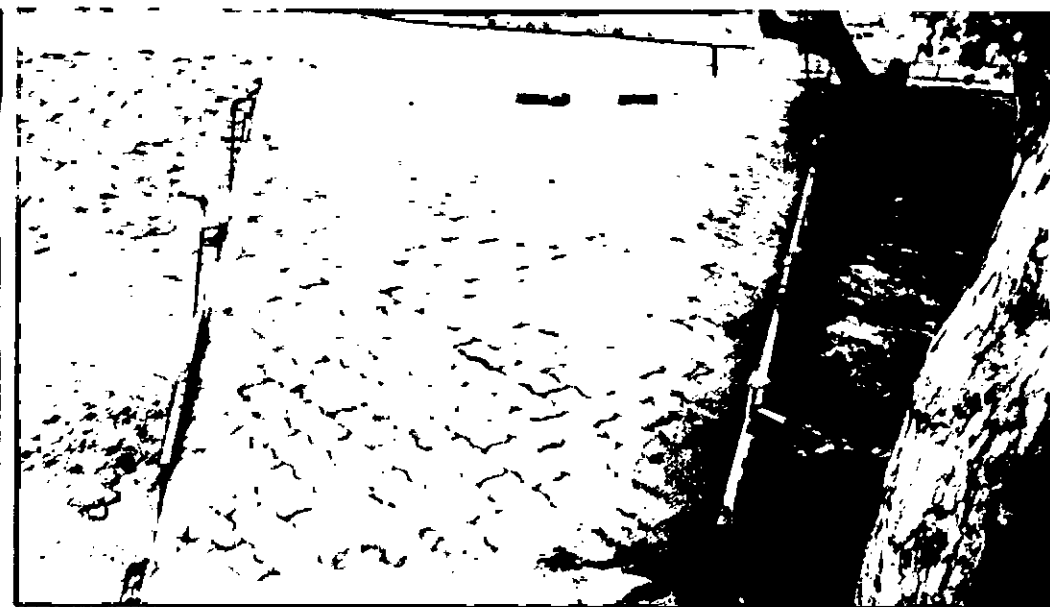

Início da Urbanização da Praça



EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Orçamento (R\$MM)

Total: 293,1

Realizado: 180,9

Nome da tarefa

% Real.

Início

Término

PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)

Metas do Programa

Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura

Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do ACORDO)

Definição do Programa

PF7100 - Definição do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Execução do Programa

Projetos

PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa

Execução do Projeto

Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)

PF0033 - Obras de recuperação de comércios e instituições em Barra Longa

Execução do Projeto

Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)

PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho

Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)

PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa

Execução do Projeto

Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)


PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP

Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)

PF0037 - Reforma e Limpeza

Execução do Projeto

Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0040 - Recuperação de estradas não pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados		nov-15	nov-16
Execução do Projeto	100%	nov-15	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	43%	ago-16	nov-16
PF0042 - Reconstrução de pontes		nov-15	nov-16
Execução do Projeto	100%	nov-15	jan-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	40%	ago-16	nov-16
PF0043 - Recuperação de drenagens de estradas e vias		fev-16	nov-16
Execução do Projeto	100%	fev-16	jun-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	33%	ago-16	nov-16
PF0044 - Recuperação de bordas de rios e enrocamentos		fev-16	jan-17
Execução do Projeto	85%	fev-16	out-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov-16	jan-17
PF0151 - Reconstrução de Pontes de Cabos de Aço		nov-15	nov-16
Reconstrução das Pontes de Cabos de Aço	100%	nov-15	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	44%	ago-16	nov-16
PF0038 - Reconstrução de propriedades rurais		jul-16	nov-18
Planejamento da Execução	85%	jul-16	dez-16
Execução do Projeto		dez-16	ago-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		ago-18	nov-18
PF0039 - Recuperação de estradas pavimentadas em Mariana, Barra Longa e seus respectivos distritos afetados		mai-16	abr-17
Execução do Projeto	50%	mai-16	jan-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan-17	abr-17
PF0087 - Reconstrução da Praça e rua Beira Rio		jan-16	mar-17
Planejamento da Execução	100%	jan-16	jun-16
Execução do Projeto	81%	mai-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez-16	mar-17




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0088 - Sistema de Estabilização de Maciços - Rio do Carmo		mar/16	abr/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jun/16
Execução do Projeto	46%	ago/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jan/17	abr/17
PF0126 - Reforma de quintais e lotes de Barra longa/Gesteira		mar/16	mar/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	64%	abr/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
PF0127 - Reconstrução de Casas Barra Longa / Gestelra		mar/16	out/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	13%	mai/16	jul/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul/17	out/17
PF0128 - Reconstrução do Parque de exposição		abr/16	mar/18
Planejamento da Execução	100%	abr/16	ago/16
Execução do Projeto	14%	ago/16	dez/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/17	mar/18
PF0129 - Reconstrução de currais em Barra Longa		mar/16	mar/17
Execução do Projeto	74%	mar/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
PF0145 - Reconstrução de pavimentação em Barra Longa		jul/16	mar/17
Execução do Projeto	49%	ago/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17
PF0150 - Recolhimento de Madrelra - Fase 1		jun/16	mar/17
Execução do Projeto	37%	jun/16	dez/16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		dez/16	mar/17




EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0152 - Reconstrução de Campos de Futebol		jan/17	jan/18
Avaliação de Alternativas		jan/17	abr/17
Definição do Escopo		abr/17	mai/17
Planejamento da Execução		mai/17	jul/17
Execução do Projeto		jul/17	out/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		out/17	jan/18
PF0153 - Reconstrução da Ponte de Camargos x Bento Rodrigues		ago/16	jan/18
Definição do Escopo	92%	ago/16	set/16
Planejamento da Execução		set/16	dez/16
Execução do Projeto		dez/16	set/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/17	jan/18
PF0155 - Estabilização de maciços - Rio do Gualaxo		ago/16	mar/18
Avaliação de Alternativas	41%	ago/16	nov/16
Definição do Escopo		nov/16	jan/17
Planejamento da Execução		jan/17	mar/17
Execução do Projeto		mar/17	nov/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		nov/17	mar/18
PF0156 - Recolhimento de Madeira - Fase 2		jan/17	jan/18
Planejamento da Execução		jan/17	mar/17
Execução do Projeto		mar/17	set/17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set/17	jan/18
Processos		mai/16	out/17
PF8100 - Processos de Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental	28%	mai/16	out/17
Encerramento do Programa		nov/18	fev/19
PF9100 - Encerramento do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga		nov/18	fev/19




EMBRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS Mariana



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e reforma da fazenda de Mainart.• Planejamento de execução do projeto (FEL3) – PF0038.• Processo dos ritos de aprovação do PF0038.• Definido fórum (Comitê de Reconstruções) para definição de diretrizes junto a equipe do Socioinstitucional e demais disciplinas sobre as reconstruções de propriedades e estruturas rurais.• Transferência de 3 propriedades do escopo de reformas para o escopo de reconstrução.	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento de novas demandas enviadas pelo Sistema de Manifestações - SGS. Contrato 4600002403.• Continuidade do Comitê de Reconstruções.• Execução dos serviços de demolição e sondagem da propriedade do Sr. José Arlindo da Silva.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Concluídas as reformas em 23 propriedades rurais e 18 espaços públicos em distritos atingidos	




EM BRANCO





RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Mariana



OBRA FINALIZADA
MAINART

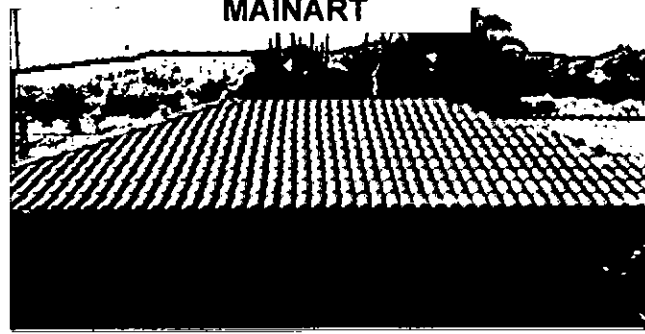

EM BRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Acessos/control de erosão



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Manutenção e umectação das vias não pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa.• Realizado 8,1 km de recolhimento de madeira em Gesteira - Trecho 2.• Finalizado a recuperação do calçamento em Claudio Manuel.• Recuperação de 55,5 km lineares de asfalto.	<ul style="list-style-type: none">• Recuperação de 3,5 km de asfalto do trecho de Águas Claras à Cláudio Manoel.• Recuperação do calçamento em Campinas.• Recolhimento de madeira no trecho 3 Bucão à Paracatu (8,6 km lineares).• Manutenção de estradas não pavimentadas entre Ponte do Gama à Barra Longa.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Avanço de 37,2 km lineares de recolhimento de madeira - 45%.• 100% do asfalto de Monsenhor Horta à Águas Claras recuperados.• 100% do calçamento de Cláudio Manoel recuperado.• Finalizado o recolhimento de madeira do trecho 2 - 12,5 km.	



EMBRANCO




RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Manutenção de vias não pavimentadas / aspersão e controle ambiental



Manutenção e aspersão nas vias não pavimentadas nos trechos de Ponte do Gama à Barra Longa.





EM BRANCO



RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS

Recuperação de estradas pavimentadas - Barra Longa, Acaiaca e Monsenhor Horta

Recuperação de 55,5 km de asfalto em Barra Longa, Acaiaca, Monsenhor Horta e Águas Claras danificados em função do trânsito intenso de veículos. Recuperação de 100% do calçamento em Cláudio Manoel.



EMBROID
