





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial do Gabinete da Presidência - DF





TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 24 dias do mês de abril de 2017, procedemos a abertura deste volume nº VII do processo de nº 02001.000974/2017-65, que se inicia com a página nº 983. Para constar subscrevo e assino.

RUBENS BATISTA DOS SANTOS
Técnico Administrativo do(a) GABIN/SETORIAL/IBAMA



MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO	
Documento - Tipo:	01
Nº. 02001. 022	964 / 2016-08
Recebido em:	14/12/2016
Assinatura	



Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2016

Ao I. COMITÊ INTERFEDERATIVO

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO
 PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO
 SCEN Trecho 2 – Ed. Sede – Caixa Postal nº 09566
 Brasília/DF – CEP: 70818-900

À PROMOTORIA DE TUTELA DE FUNDAÇÕES

A/C: DRA. VALMA CUNHA
 COORDENADORA DA PROMOTORIA E CURADORA DE FUNDAÇÕES
 Rua Timbiras, 2928 - 9º Andar, bairro Barro Preto.
 Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140-062

REF.: Relatório Mensal Referente aos Programas e Ações Previstos no TTAC em Cumprimento da Cláusula 192


Prezada Senhora Presidente do Comitê Interfederativo,

FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 25.135.507/0001-83, e com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("**FUNDAÇÃO**") vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor o quanto segue.

Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do *Termo de Transação e Ajuste de Conduta*, firmado em 2 de março de 2016 ("**TTAC**"), a **FUNDAÇÃO** deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do TTAC.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a **FUNDAÇÃO** apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de

EM BRANCO




dezembro de 2016, contendo informações atualizadas sobre dos programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de novembro de 2016.

A FUNDAÇÃO mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


FUNDAÇÃO RENOVA

EM BRANCO



FUNDAÇÃO **renova**

reparar, restaurar, reconstruir




EMBRANCO



Relatório mensal – Comitê interfederativo

Termo de transação e ajustamento de conduta

Novembro de 2016




EM BRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Segurança




Taxa de acidentes registrados

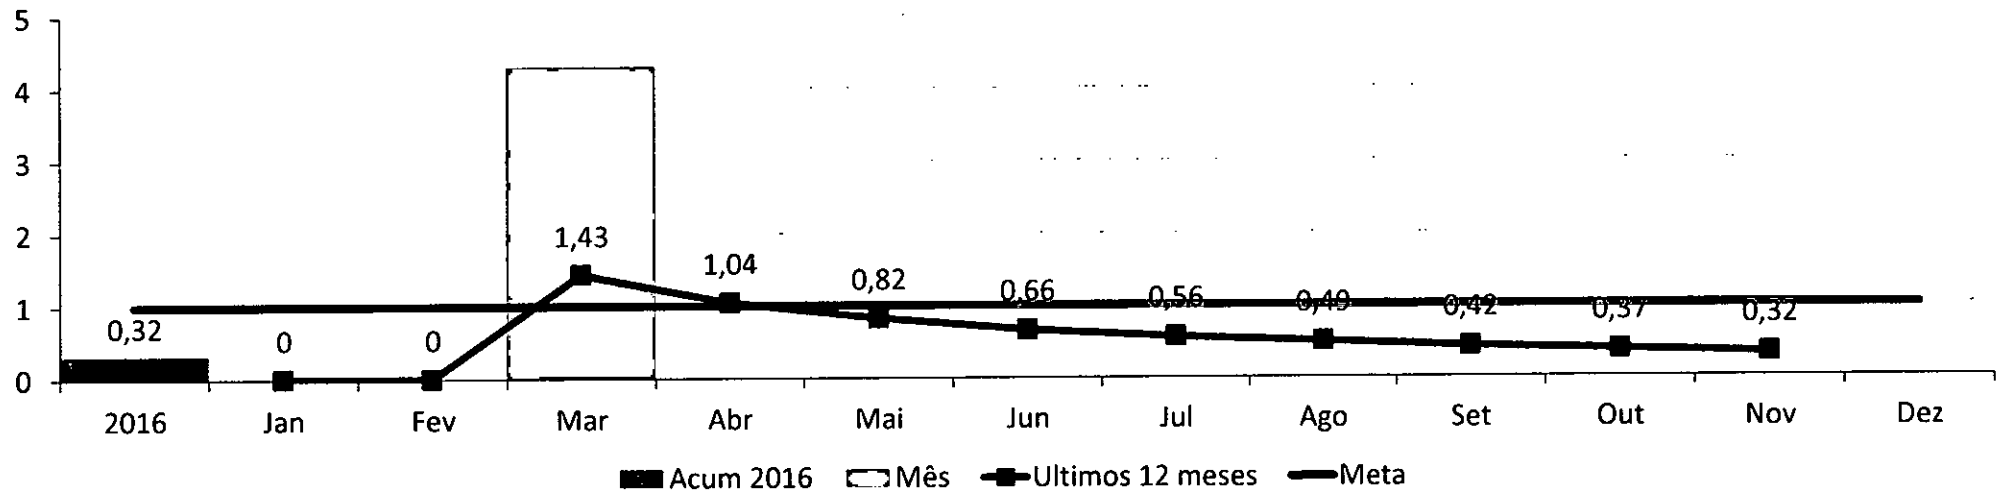

Horas trabalhadas / Efetivo	Empregados Fundação/cedidos	Empregados Contratados	Horas Trabalhadas
Novembro	196	1.930	357.272
Total acumulado	-	-	3.084.941

- Nenhum registro de acidentes em novembro nas obras da Fundação (obras do PG9 e PG24 não estão sendo consideradas, pois estão sob responsabilidade da Samarco).



EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Desembolso realizado/previsto



CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM			
	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Programas socioeconômicos (1)	3280,7	759,2	1131,9	1181,8
Programas socioambientais	4859,4	462,4	762,3	3382,8
Saldo medidas compensatórias	1713,1	0,0	0,0	1536,7
Total	9853,2	1221,6	1894,2	6101,3


CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM			
	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas reparatórias (1)	5753,3	1210,3	1312,5	2873,0
Medidas compensatórias (2)	4100,0	11,3	581,7	3228,3
Total	9853,2	1221,6	1894,2	6101,3

Comentários

- Valores previstos para os próximos anos reavaliados pelo processo de orçamento de 2017.

(1) Inclui ações emergenciais

(2) Inclui saldo de medidas compensatórias




EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Programas socioeconômicos



- Levantamento e cadastro - Audiência realizada para tratar da retomada dos trabalhos em Mariana: atividades suspensas aguardando parecer da assessoria técnica dos impactados (previsto para 14/12). Reunião em Barra Longa entre MP, grupo de impactados e Fundação: trabalhos podem ser retomados com aqueles que tiverem interesse em dar prosseguimento. Com a chegada da assessoria no município, o trabalho poderá ser revisitado;
- Ressarcimento e indenização - Instalados escritórios itinerantes em Governador Valadares para atendimento ao público e escritório de atendimento aos advogados que possuem causas contra a Samarco por dano moral por falta de abastecimento de água. Entregues 927 cartões indenizatórios (432 em Colatina e 495 em Governador Valadares);
- Reconstrução de vilas - Bento Rodrigues: concluída elaboração do projeto urbanístico, com participação da Comissão de Moradores. Em andamento estudos de impacto ambiental do terreno para reassentamento. Paracatu de Baixo: concluída topografia e sondagem no terreno para reassentamento. Gesteira: aguardando mediação do MPMG devido à recusa do proprietário na conclusão da negociação da área escolhida pela comunidade para reassentamento. Concluída construção da Escola de Gesteira, com inauguração em 07/12;
- Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves - 583 mil m³ dragados dos 400m.




EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Programas socioambientais



- Mobilização das equipes de bioengenharia e detalhamento do cronograma de obras das áreas prioritárias.
- Recuperação de 60 tributários (acumulado desde janeiro);
- Execução de 48% das obras de reconformação das calhas e controle de erosão das áreas prioritárias;
- Contratação da Golder para elaboração de projetos e disponibilização de ATOs para as áreas não prioritárias;
- Iniciado a implantação dos testes piloto de revegetação final dos 2.000 ha em 4 propriedades;
- Contratada empresa para elaboração dos projetos de recuperação de calha e controle de erosão das áreas não prioritárias;
- Iniciadas as atividades de recuperação das primeiras 500 nascentes pelo instituto Terra, nas sub bacias dos rios Pancas, Santa Maria do Doce e Suaçui Grande, com o cadastramento de 262 nascentes e o início da distribuição de insumos para cercamento e plantio em 44 nascentes;
- Iniciadas as atividades para avaliação de impactos à ictiofauna do rio Doce em atendimento à cláusula 164;
- Plano de trabalho para avaliação de impactos à fauna terrestre aprovado pela CT de Biodiversidade. A Fundação Renova está trabalhando nas revisões solicitadas para iniciar a execução do plano;
- Captações alternativas e melhorias nos sistemas de tratamento estão sendo realizadas no âmbito do Plano para o período chuvoso 2016/2017. Foram concluídas as adutoras da Lagoa Nova em Linhares e rio Santa Maria em Colatina. Perfurados poços profundos em São Vitor (1 poço), Cachoeira Escura (1 poço), Alpercata (2 poços) e Itueta (1 poço). Estas captações alternativas poderão ser validadas como definitivas após o término do estudo técnico de avaliação de oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, em atendimento a Deliberação nº16;




EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Programas socioambientais



- Contratada a Witt O'Briens, especializada em emergências ambientais, para gestão do plano de ações para o período chuvoso. Equipe mobilizada para atuação no plano;
- Iniciadas as atividades de gestão de riscos ambientais pela empresa Promanagement Analysis Assessoria;
- Recebida proposta de conteúdo mínimo para o Programa de Monitoramento Quali-quantitativo de Água e Sedimentos no rio Doce. A Fundação Renova está trabalhando no plano definitivo que será submetido à aprovação do CIF até dezembro/16;
- Finalizado o mapeamento dos pontos de irrigação através de sensoriamento remoto em atendimento à cláusula 180 do TTAC.
- Disponibilizados dados no WebGis dos órgãos ambientais, para análise e início de utilização. Está marcado para início de dezembro um esforço conjunto com o IBAMA para adequar a ferramenta ao que os órgãos necessitam;




EM BRANCO

ÍNDICE

Socioeconômico



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	010
Organização social	PG01 – Levantamento e cadastro	012
	PG02 – Ressarcimento e indenização	016
	PG03 – Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	018
	PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	021
	PG05 – Proteção social	024
	PG06 – Diálogo social	027
	PG07 – Assistência aos animais	030
Infraestrutura	PG08 – Reconstrução de vilas	034
	PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	040
	PG10 – Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas	047
Educação, cultura e lazer	PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	054
	PG12 – Memória histórica, cultural e artística	057
	PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer	061
Saúde	PG14 – Saúde física e mental da população impactada	063
Inovação	PG15 – Tecnologias socioeconômicas	065
Economia	PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	067
	PG17 – Retomada das atividades agropecuárias	069
	PG18 – Diversificação da economia regional	072
	PG19 – Micro e pequenos negócios	074
	PG20 – Estímulo à contratação local	077
	PG21 – Auxílio financeiro emergencial	080
Gestão	PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários	082
	PG22/41 – Gerenciamento programas	




EMBRANCO

ÍNDICE

Socioambiental



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	084
Gestão rejeitos e qualidade água	PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1	086
	PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios.....	093
Restauração florestal	PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes	098
Conservação da biodiversidade	PG28 – Conservação da biodiversidade	102
	PG29 – Recuperação da fauna silvestre	104
	PG30 – Fauna e flora terrestre	106
Segurança hídrica e qualidade água	PG31 – Coleta e tratamento de esgoto	108
	PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água	110
Educação, comunicação e informação	PG33 – Educação ambiental	120
	PG34 – Emergência ambiental	123
	PG35 – Informação para a população	129
	PG36 – Comunicação nacional/internacional	131
Preservação e segurança ambiental	PG37 – Gestão de riscos ambientais	133
	PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce	135
Gestão e uso sustentável da terra	PG39 – Unidades de conservação	139
	PG40 – CAR e PRAs	141
Gestão	PG22/41 – Gerenciamento programas	144




EMBRANCO

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais					197,1	152,8	19,5	17,4
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov/15	dez-16	dez-18	abr-19	35,8	17,3	9,9	3,3
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	dez-16	out-19	jan-20	249,1	12,6	177,7	32,8
PG003 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	mar/16	nov-18	mai-19	dez-19	92,9	10,9	40,1	39,8
PG004 - Outros povos e comunidades tradicionais	ago/16	jun-18	jun-18	set-18	1,8		1,5	
PG005 - Proteção social	abr/16	jul-17	abr-19	jun-19	3,2	0,3	1,1	1,9
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov/15	dez-16	dez-30	dez-30	218,9	16,7	27,9	165,9
PG007 - Assistência aos Animais	nov/15	set-16	jan-20	abr-20	24,9	10,3	3,3	6,9
PG008 - Reconstrução de vilas	nov/15	out-16	mar-22	mar-22	309,5	20,9	68,7	211,7
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov/15	nov-16	jul-18	out-18	369,6	96,3	164,9	64,3
PG010 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	nov/15	out-16	ago-18	ago-18	331,8	207,8	55,4	35
PG011 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	jan/16	dez-16	mar-21	mai-21	9,5	0,3	2,7	6
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev/16	jul-17	jul-22	dez-19	31,5	8,7	8,5	11
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	abr/16	fev-18	dez-22	dez-22	27,4	0,0	2,5	21,8
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov/15	dez-16	nov-25	nov-25	139,5	17,1	16,2	103,1
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	mar/17	jan-18	mar-20	mai-20	49	0,2	2,6	46,3
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	nov/15	out-16	dez-25	mar-26	182,1	12,2	24,4	143,3
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	dez/15	abr-17	abr-20	jul-20	21,5	0,9	0,8	19,6
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov/15	dez-16	jun-20	set-20	493,8	173,4	164,3	140,8
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun/16	dez-16	dez-19	dez-19	42,6	0,4		42
Total medidas reparatórias					2831,5	759,2	792,8	1418,9




EMBRANCO

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	dez-16	out-19	jan-20	376,6		336,6	
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	dez/16	jul-17	nov-24	fev-25	7,6		0,1	7,5
PG018 - Diversificação da Economia Regional	set/16	set-17	out-30	out-30	63,4		3,1	60,2
PG020 - Estímulo à Contratação Local	nov/15	mar-17	jun-21	jun-21	1,6		0,3	1,2
Total medidas compensatórias					449,2	0,0	340,1	68,9




EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 35,8	Realizado: 17,3	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)				nov-15	out-19
Metas do Programa				out-16	abr-17
Cláusulas 19 e 24 - Término do cadastramento e levantamento das perdas materiais dos Impactados* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa				mar-17	mar-17
Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa				abr-17	abr-17
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo			100%	out-16	out-16
Definição do Programa				jun-16	jan-17
PF7010 - Definição do Programa de levantamento e de cadastro dos Impactados				jun-16	jan-17
Execução do Programa				nov-15	jun-19
Projetos				nov-15	set-17
PF0173 - Levantamento e Cadastro Campanha 1 - Rio Doce				nov-15	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)			100%	nov-15	jul-16
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				ago-16	jan-17
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				set-16	mar-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				dez-16	abr-17
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconômico				jan-17	jul-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)				jul-17	set-17
PF0174 - Levantamento e Cadastro - Campanha 2 - Rio Doce (a definir)				jan-17	jan-17
PF0175 - Levantamento e Cadastro - Mariana				nov-15	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)			100%	nov-15	jul-16
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				jul-16	abr-17
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				mar-17	jun-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				abr-17	jul-17
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconômico				jan-17	jul-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)				jul-17	set-17




EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
PF0176 - Levantamento e Cadastro - Barra Longa		nov-15	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	100%	nov-15	jul-16
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		jun-16	jan-17
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)		ago-16	mar-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		jan-17	mai-17
Elaboração de Relatório de Impacto Socioeconomico		jan-17	jul-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		jul-17	set-17
Processos		jan-17	jun-19
PF8010 - Processos de Atualização, revisão e correção do Cadastro Socioeconômico dos Impactados		jan-17	jun-19
PF8011 - Processos de monitoramento dos Impactos Socioeconômicos dos municípios		jun-17	jun-19
Encerramento do Programa		jun-19	out-19
PF9010 - Encerramento do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (captura e formalização de benefícios)		jun-19	out-19



EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Término do Cadastramento Socioeconômico - Exceção de Barra Longa e Mariana	23/dez	23/dez
Cadastro Mariana – Início do cadastro dos impactados (depende da consultoria para apoio as comunidades)	01/fev	01/fev

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Famílias cadastradas emergencialmente (#)	NA	8515	NA
Pessoas cadastradas emergencialmente (#)	NA	29614	NA
Cadastros definitivos indexados (#) ¹	13823	13028	16000
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 (#) ¹	12219	9919	16000
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 (#) ¹	645	768	1250
Cadastros definitivos aprovados internamente (#) ¹	987	367	16000
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF (#) ¹	183	0	16000

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) / Comitê Interfederativo (CIF):

- Realização da 6ª reunião com CTOS em 07/11/16;
- Envio do Lote 001 de informações do Cadastro Integrado para CTOS/CIF – 04/11/16. Envio do Lote 002 – 25/11/16.

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:


- Audiência realizada dia 28/11 para tratar da retomada dos trabalhos em Mariana. Atividades suspensas aguardando parecer da assessoria técnica dos impactados previsto para o dia 14/12. Após essa data, a Fundação terá até 60 dias para se manifestar sobre o parecer;
- Após reunião do dia 22/11/16 em Barra Longa entre MP, grupo de impactados e Fundação ficou decidido que os trabalhos poderiam ser retomados no município com aqueles que tiverem interesse em dar prosseguimento e, com a chegada da assessoria no município, o trabalho poderá ser revisitado.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos. Entrega dos formulários preenchidos.

Base de dados e Documentação:

- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros;
- Início das cargas do cadastro integrado no SGS (sistema de banco de dados da Fundação Renova).




(1) Não inclui Barra Longa e Mariana


EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro

Fotos

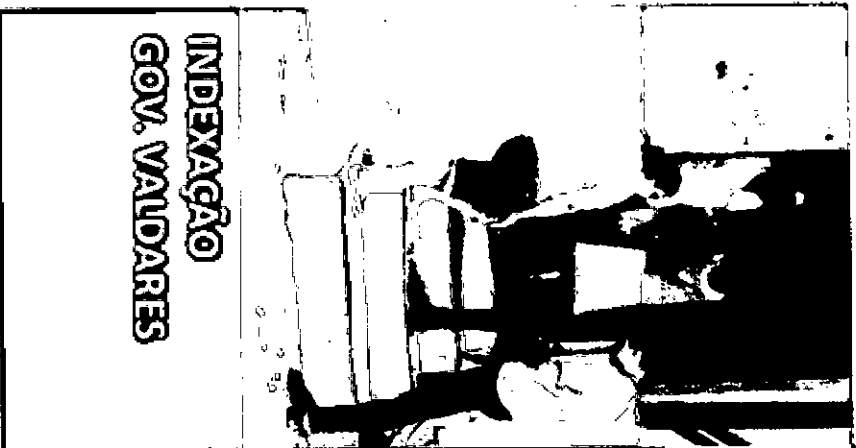

INDEXAÇÃO
GOV. VALDARES

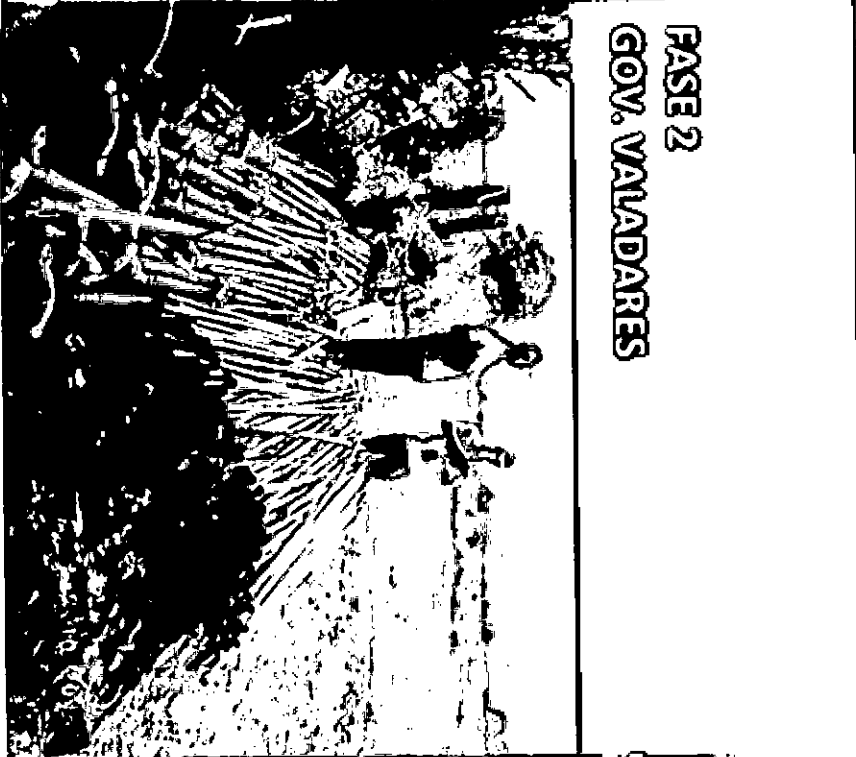


FASE 2
GOV. VALDARES



FASE 1
LINHARES



FASE 1
GOIATINA




EMBRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização Masterplan



Orcamento (R\$MM)	Total: 625,7	Realizado: 12,6		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38)		dez-15	jan-20	
Metas do Programa		out-17	dez-17	
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)		out-17	out-17	
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa		dez-17	dez-17	
Definição do Programa		dez-16	dez-16	
PF7020 - Definição do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados		dez-16	dez-16	
Execução do Programa		dez-15	out-19	
Projetos		mar-16	mar-18	
PF0060 - Ressarcimento e Indenização dos IMPACTADOS		mar-16	mar-18	
Execução do Projeto		mai-16	dez-17	
Implantar Centros de Negociação - Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Babo Guandú e Linhares	97,94%	mai-16	dez-16	
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)	6%	out-16	fev-17	
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		nov-16	out-17	
Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		dez-16	dez-17	
Encerramento do Projeto		dez-17	mar-18	
Processos		dez-15	out-19	
PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS		dez-15	jan-17	
PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações		dez-17	out-19	
Encerramento do Programa		out-19	jan-20	
PF9020 - Encerramento do Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (captura e formalização de benefícios)		out-19	jan-20	



EMBRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Início de operação em Linhares - Fase 01	27/out	15/dez
Início dos pagamentos de indenizações em B. Guandu- Fase 01	17/jan	17/jan
Início da operação dos escritórios da Fase 02	12/dez	02/jan

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Municípios com escritórios em operação	5	2	10

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Instalados escritórios itinerantes em Governador Valadares para atendimento ao público e escritório de atendimento aos advogados que possuem causas contra a Samarco por dano moral por falta de abastecimento de água;
- Iniciado os atendimentos nos escritórios itinerantes em Governador Valadares e nos escritórios fixos de Colatina;
- Geradas 9.788 propostas (3.360 em Colatina e 6.428 em Governador Valadares);
- Entregues 927 cartões indenizatórios (432 em Colatina e 495 em Governador Valadares);




EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas Masterplan



Orcamento (R\$MM)	Total: 92,9	Realizado: 10,9	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)					
Metas do Programa				mar-16	dez-19
				mar-16	out-19
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak			100%	mar-16	mar-16
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado			100%	abr-16	abr-16
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak			100%	jul-16	jul-16
Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)				out-19	out-19
Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani			100%	mar-16	mar-16
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani			100%	mar-16	mar-16
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani			100%	jul-16	jul-16
Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)				out-19	out-19
Definição do Programa				jul-16	nov-18
PF7030 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas				jul-16	nov-18
Execução do Programa				mar-16	mai-19
Projetos				jan-17	mai-19
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak				jan-17	mai-19
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak				jan-17	jan-19
Encerramento do Projeto				fev-19	mai-19
Plano de Ação Permanente Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)				nov-18	nov-18
Processos				mar-16	mai-19
PF8030 - Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro			8%	ago-16	mai-19
PF8031 - Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Cadeira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro			88%	mar-16	mai-19
PF8032 - Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro			79%	mar-16	mai-19
PF8033 - Fornecimento Emergencial de Água - Krenak			7%	ago-16	mai-19
Encerramento do Programa				out-19	dez-19
PF9030 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (captura e formalização de benefícios)				out-19	dez-19



EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Meta

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Geral:

- Envio do Plano de Trabalho do Estudo de Componente Indígena para aprovação da FUNAI.

TI Krenak:


- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Manutenção das estradas para abastecimento de água
- Visitas Técnicas na terra indígena Krenak.
- Recuperação dos acessos em ocasião as fortes chuvas.

TI Comboios:

- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Assinatura do Termo de Cumprimento ao TTAC – Comboios
- Reunião com lideranças indígenas para Prestação de Contas e diálogo permanente.

TI Caieiras Velhas:


- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)
- Reunião com lideranças indígenas para Prestação de Contas e diálogo permanente.



EMBRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Fotos

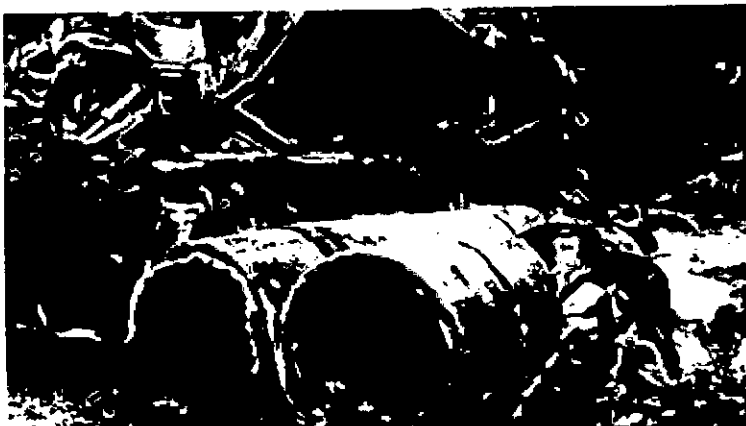

Recuperação dos Acessos TI Krenak




Recuperação dos Acessos TI Krenak



Reunião Assinatura Acordo TI Comboios



Reunião Assinatura Acordo TI Comboios




EM BRANCO

PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 1,8	Realizado: 0	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)				ago-16	set-18
Metas do Programa				dez-16	jun-18
Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)				dez-16	dez-16
Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas				mar-17	mar-17
Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)				jun-18	jun-18
Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)				jun-18	jun-18
Definição do Programa				ago-16	jun-18
PF7040 - Definição do programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais				ago-16	jun-18
Execução do Programa (a definir)				jun-18	jun-18
Encerramento do Programa				jun-18	set-18
PF9040 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (captura e formalização de benefícios)				jun-18	set-18



EM BRANCO

PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Articulações com a Fundação Cultural Palmares para vistoria de campo em áreas quilombolas
- Organização da agenda de visita aos povos quilombolas
- Visita de campo em parceria com a Fundação Palmares para consulta à comunidade Quilombola de Degredo em Linhares (ES) no dia 10/11.
- Visita de campo em parceria com a Fundação Palmares para consulta à comunidade Quilombola de Bernardos em Raul Soares (MG) em 16/11.
- Visita de campo em parceria com a Fundação Palmares para consulta à comunidade Quilombola de Vila de Santa Efigênia e Adjacências em Mariana em 17/11.



EM BRANCO

PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Fotos




Reunião – Degredo – 10/11/2016



Reunião Bernardos – 16/11/2016



Reunião Santa Efigênia – 17/11/2016




EM BRANCO

PG05 – Proteção social

Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 3,2	Realizado: 0,3		
Tarefa		% Real.	Início	Término	
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)					
Metas do Programa					
			abr-16	jun-19	
			abr-16	abr-19	
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social		100%	abr-16	abr-16	
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social			abr-19	abr-19	
Definição do Programa					
			nov-16	jul-17	
PF7050 - Definição do Programa de Proteção Social			nov-16	jul-17	
Execução do Programa					
Processos					
			abr-16	abr-19	
PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social		39%	abr-16	jul-17	
PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo)			jul-17	abr-19	
Encerramento do Programa					
			abr-19	jun-19	
PF9050 - Encerramento do Programa de Proteção Social (captura e formalização de benefícios)			abr-19	jun-19	



EM BRANCO

PG05 – Proteção social Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão do mapeamento de famílias em situação de vulnerabilidade	30/dez	30/dez
Conclusão da elaboração do plano de qualificação	03/fev	03/fev

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Acompanhamento das ações demandadas à Fundação pela equipe do CRAS (Mariana);
- Realização de reuniões de alinhamento com equipe do CRAS e RECRIA (Mariana);
- Encaminhamento de casos para rede pública: saúde, educação e assistência social (Mariana);
- Atendimento à rede escolar com grupos de apoio (pais, alunos e professores), sobretudo quanto ao tema hostilidade (Mariana);
- Encaminhamento para o Programa de Idosos do Recria Vida (Mariana);
- Reunião de apresentação do Programa de Proteção Social para Coordenadores de Proteção Básica e Proteção Social Especial de municípios do Espírito Santo (Aracruz, Linhares, Colatina e Baixo Guandu).




EM BRANCO

PG05 – Proteção social

Fotos



Reunião com coordenadores das áreas de Proteção Básica e de Proteção Social Especial dos municípios de Aracruz, Linhares, Colatina e Baixo Guandu (ES).




EM BRANCO

PG06 – Diálogo social Masterplan



Orcamento (R\$MM)	Total: 218,9	Realizado: 16,7	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 à 72)					
Metas do Programa					
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO					
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria					
Definição do Programa					
PF7060 - Definição do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social					
Execução do Programa					
Processos					
PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional					
PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo					
PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento					
PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO					
PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional					
PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo					
PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento					
PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO					
Projetos					
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO					
Planejamento - Diagnóstico do processo de ouvidoria					
Execução - Implantação e adequação do processo de ouvidoria					
Encerramento do Projeto					
PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento					
Reestruturação da Gestão do Processo					
Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo					
Reestruturação do Sistema					
Encerramento do Projeto					
Encerramento do Programa					
PF9060 - Encerramento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (captura e formalização de benefícios)					



EM BRANCO

PG06 – Diálogo social Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Pilar Ouvidoria: Contratação da função Ouvidor (Fundação)	30/out	15/dez

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Manifestações registradas	NA	59.719	NA
Manifestações concluídas	NA	37.545	NA
Reuniões – trecho Mariana à Santa Cruz	NA	430	NA
Reuniões – trecho Rio Doce*	NA	314	NA
Postos de atendimento	14	4	14

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Canais de Relacionamento :

- Postos de atendimentos: 4 escritórios em operação.
- Foram registradas 11.665 manifestações no mês de novembro.
- Foram concluídas 10.237 manifestações no mês de novembro.


Ouvidoria:

- Foram registradas desde o dia do acidente 845 denúncias, sendo 105 no mês de novembro.

Comunicação:

- Principais eventos e apresentações externas
 - ✓ Fórum internacional pelo desenvolvimento sustentável - Sustentar – São Paulo (1/11)
 - ✓ Visita da comissão de defesa dos animais da assembleia legislativa a Mariana (11/11)
 - ✓ Encontro de lideranças empresariais, em Pedra Azul, ES (25/11)
 - ✓ Encontro com professor Pavan, em Belo Horizonte, exibido ao vivo pela internet (28/11)

(*) Dados referentes a outubro



EM BRANCO

PG06 – Diálogo social


Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Comunicação:

- Período Chuvoso
 - ✓ Panfleto para municípios impactados – ES e MG
 - ✓ Reforço de estratégia de comunicação para escritórios itinerantes
 - ✓ Criação e aprovação de estratégia e Plano de Comunicação para Danos Gerais
- Imprensa
 - ✓ Entrevistas coletivas: 3
 - ✓ Releases enviados à imprensa: 4
 - ✓ Posicionamentos/Notas enviadas à imprensa: 15
 - ✓ Matérias conquistadas: 188




EMBRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 24,9	Realizado: 10,3	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)				mar-16	abr-20
Metas do Programa				jan-20	jan-20
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais				jan-20	jan-20
Definição do Programa				set-16	set-16
PF7070 - Definição do Programa de Assistência aos Animais				set-16	set-16
Execução do Programa				mar-16	jan-20
Processos				mar-16	jan-20
PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)				mar-16	jan-20
Encerramento do Programa				jan-20	abr-20
PF9070 - Encerramento do Programa de Assistência aos Animais (captura e formalização de benefícios)				jan-20	abr-20



EM BRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Animais resgatados (#)	NA	982	NA

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Resgate de 3 animais (2 de grande porte e 1 de pequeno porte).
- Recolhimento de 12 animais de grande porte.
- Devolução de 03 animais de pequeno e grande porte aos tutores.
- Atualização de cadastros de animais no IMA.
- Conclusão de acompanhamento de pós adoção de 62 animais.
- Transição do contrato de gestão de animais da empresa CP mais para a empresa ERG.
- Campanha de vacinação contra Brucelose e Febre Aftosa de animais de grande porte.
- Campanha de vacinação anti-rábica dos animais de pequeno porte.
- Realização de visita dos proprietários nas fazendas.
- Visita da Comissão Estadual de Direito e Defesa dos Animais.



EMBRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Fotos




Campanha de vacinação anti-rábica dos animais de pequeno porte.



Devolução de animal de pequeno após tratamento reabilitação



Campanha de vacinação contra Brucelose e Febre Aftosa de animais de grande porte





EMBRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Fotos



Programação de visita dos proprietários nas Fazendas




EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 309,5	Realizado: 20,9	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)				nov-15	mar-22
Metas do Programa				mar-19	jun-19
Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas				mar-19	mar-19
Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas)				jun-19	jun-19
Definição do Programa				set-16	out-16
PF7080 - Definição do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira				set-16	out-16
Execução do Programa				nov-15	mar-22
Projetos				nov-15	mai-19
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues				nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas			100%	nov-15	mai-16
Definição do Escopo				mai-16	dez-17
Planejamento da Execução				mar-17	abr-18
Execução do Projeto				set-16	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas				mar-19	mai-19
PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo				nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas			100%	nov-15	set-16
Definição do Escopo				set-16	dez-17
Planejamento da Execução				abr-17	abr-18
Execução do Projeto				out-17	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas				mar-19	mai-19
PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira				jun-16	mai-18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas			12%	jun-16	out-17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas				abr-17	out-17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas				ago-17	mai-18
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas				fev-18	mai-18




EM BRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
PF0049 - Reconstrução da escola, quadra e praça de Gesteira		fev-16	jan-17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola	100%	fev-16	jul-16
Execução das obras de reconstrução da escola	90%	jul-16	dez-16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola		dez-16	jan-17
Processos		nov-15	mar-22
PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	ago-18
PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		mai-18	mai-21
Encerramento do Programa		dez-21	mar-22
PF9080 - Encerramento do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (captura e formalização de benefícios)		dez-21	mar-22



EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão do projeto detalhado de urbanismo do Novo Bento Rodrigues	27/jan	27/jan
Levantamentos de campo na localidade de Nova Paracatu de Baixo	19/out	26/dez
Aprovação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade	30/set	31/jan
Aprovação do Projeto Urbanístico de Paracatu de Baixo junto à Comunidade	30/dez	30/dez
Aprovação do Projeto Urbanístico de Gesteira junto à Comunidade	03/nov	-
Início do Cadastro de Campo em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo	20/out	03/jan

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Concluída elaboração do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues, com participação da Comissão de Moradores
- Em andamento estudos de impacto ambiental do terreno para reassentamento de Bento Rodrigues
- Concluída topografia e sondagem (geologia em andamento até Janeiro/17) no terreno para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo
- Solicitada aprovação junto ao Conselho Curador para aquisição das áreas para reassentamento de Paracatu de Baixo
- Emitido pedido de compra para ECOBILITY, para estudos de impacto ambiental para reassentamento de Paracatu de Baixo
- Aguardando mediação, pelo MPMG, devido à recusa do proprietário na conclusão da negociação da área escolhida pela Comunidade para reassentamento de Gesteira
- Concluída construção da Escola de Gesteira; inauguração em 07/12

Próximas ações:


- Apresentação do parecer técnico da Cáritas para consolidação do formulário para início do cadastro socioeconômico
- Início do processo de validação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade; expectativa de aprovação até 28/Janeiro/17
- Validação do Levantamento de Expectativas junto à Comunidade de Paracatu de Baixo, para elaboração do Projeto Urbanístico
- Início dos estudos de impacto ambiental para terreno escolhido para reassentamento de Paracatu de Baixo;
- Início das entregas de projetos básicos de engenharia para Acesso, ETA / ETE e Canteiro de Obras, para reassentamentos de Bento e Paracatu





EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas

Fotos

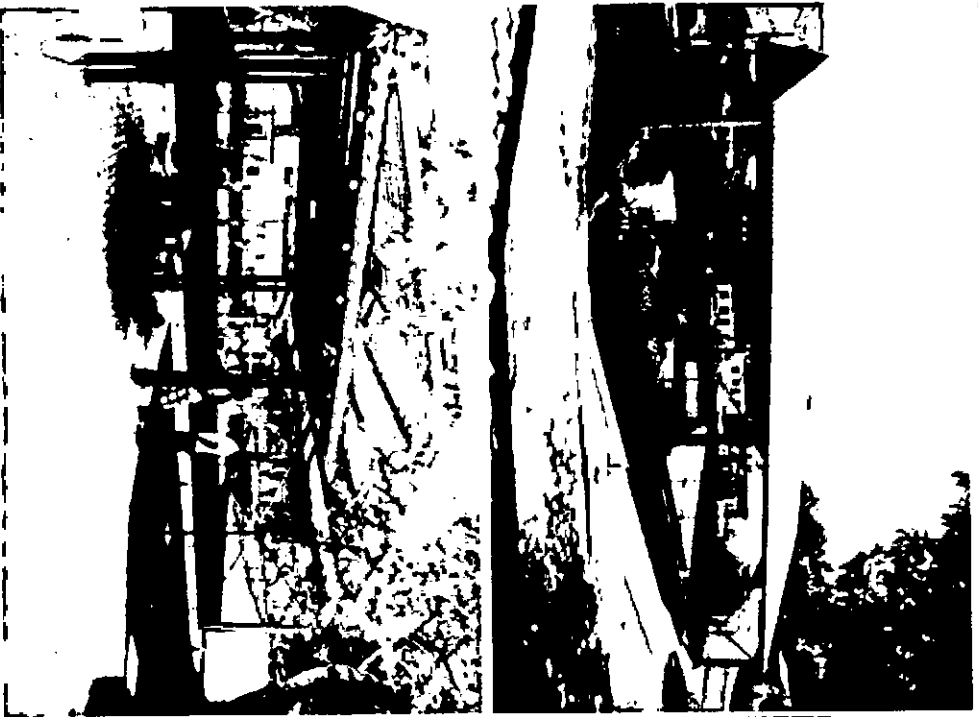

Reconstrução da escola de Gesteira

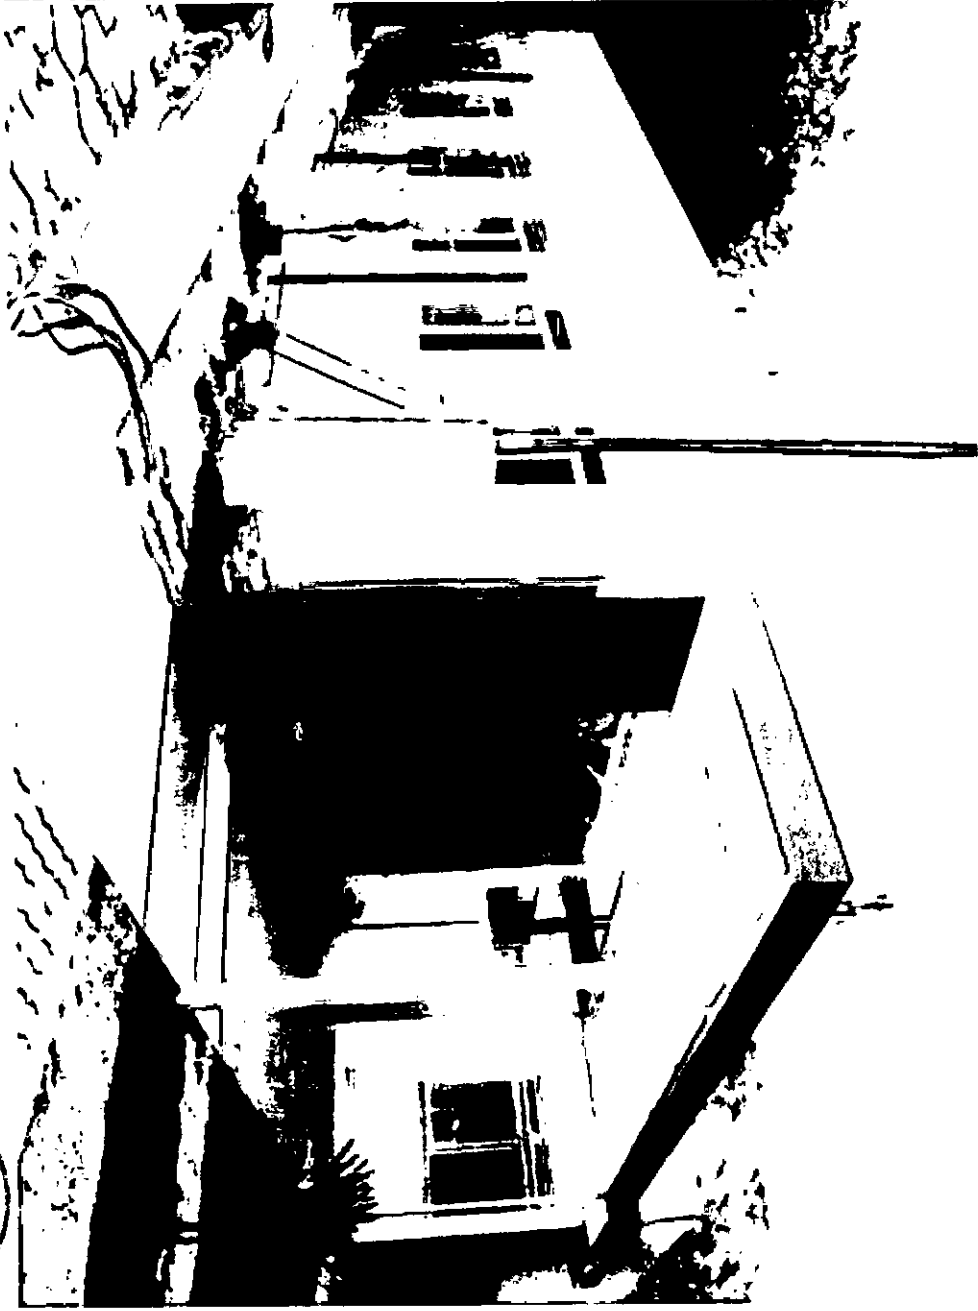


EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas

Fotos




Reconstrução da escola de Gesteira



EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas
Fotos

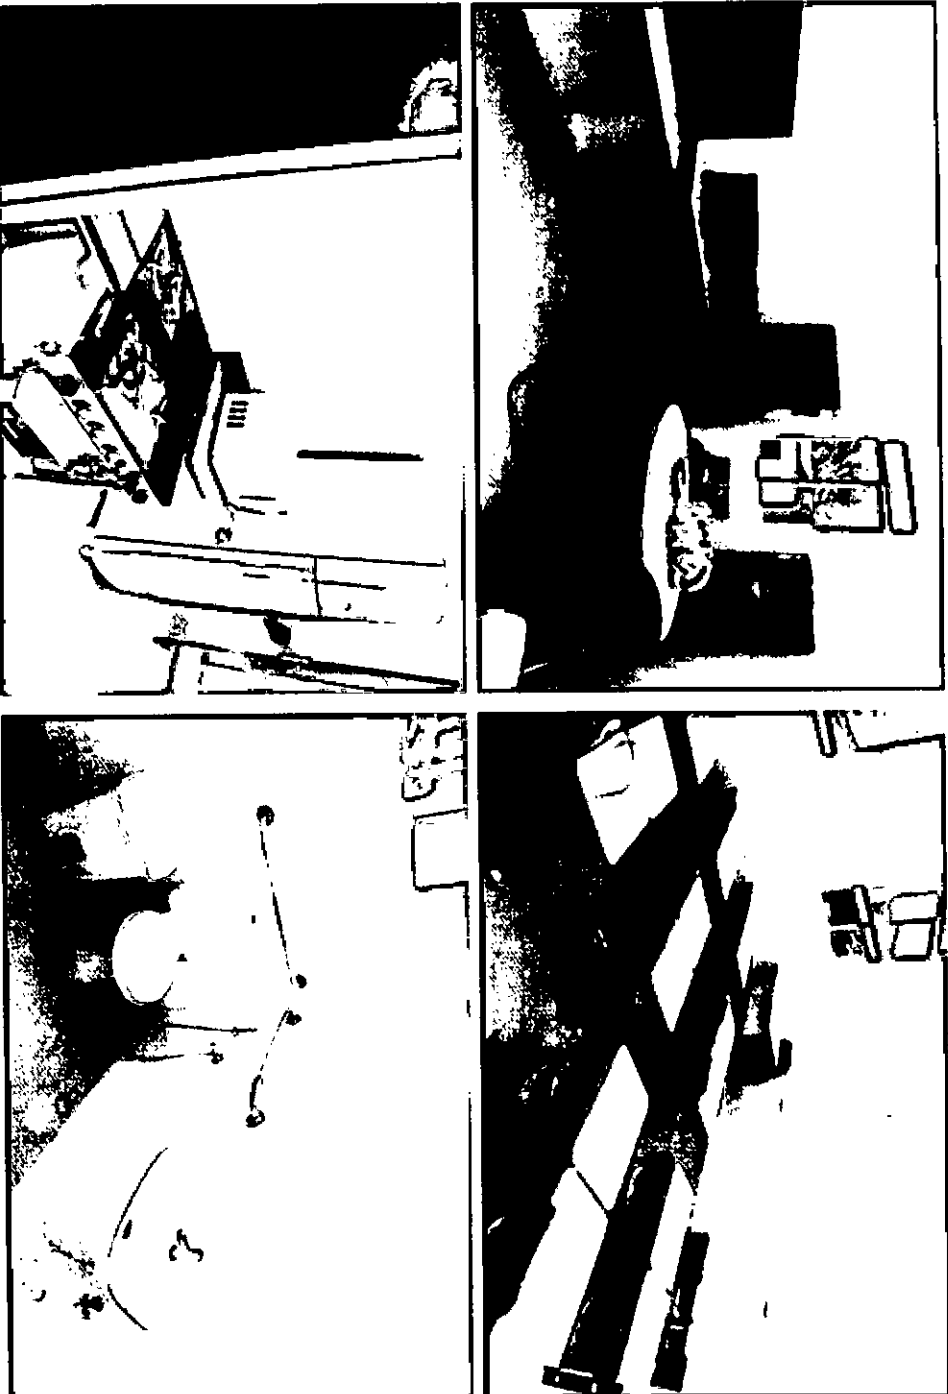

Reconstrução da escola de Gesteira



EMBRANCO

PROGRAMA SOB RESPONSABILIDADE DA SAMARCO




O programa *PG09 – Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves* apresentado a seguir está sob responsabilidade e permanecerá sendo executado pela Samarco até a conclusão da primeira fase.

Dessa forma a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude das informações apresentadas.

A sua presença neste documento é apenas de caráter informativo.

A Fundação assumirá a responsabilidade pelo seu desenvolvimento a partir da conclusão da primeira fase do programa.




EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 369,6	Realizado: 96,3	% Real.	Início	Término
Tarefa					
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81)				nov-15	out-18
Metas do Programa				abr-18	abr-18
Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)				abr-18	abr-18
Definição do Programa				out-16	nov-16
PF7090 - Definição do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves				out-16	nov-16
Execução do Programa				nov-15	jul-18
Projetos				nov-15	jul-18
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)				nov-15	jul-18
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	49,56%			nov-15	jun-17
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m				jun-17	abr-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	0%			abr-18	jul-18
Encerramento do Programa				jul-18	out-18
PF9090 - Encerramento do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (captura e formalização de benefícios)				jul-18	out-18



EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da engenharia detalhada para bombeamento direto para Fazenda Floresta	03/out	12/dez
Conclusão da engenharia detalhada para disposição na pilha externa do Velho Soberbo	15/set	30/nov

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Volume dragado - trecho de 400m (mil m3)	569	583	1300
Barreira metálica B (à 5 km) (t)	790	428	790

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Concluída a engenharia executiva para disposição confinada à jusante do dique 4A. Iniciada a contratação dos serviços e materiais para execução desta atividade (capacidade de armazenamento estimada de 150.000m³)
- Negociada a utilização da área do entorno do Barramento C
- Iniciada a execução do vertedor definitivo do Setor 4
- Produtividade da dragagem impactada pelas constantes quebras na linha de recalque da Draga B20
- Em elaboração o estudo de remanso e investigações geotécnicas para engenharia da Barreira Metálica C
- Contratada a engenharia executiva dos diques e da linha para a Fazenda Floresta (Allonda)
- Engenharia das pilhas e do desaguamento da Fazenda Floresta em andamento (Walm e ECM)
- Barreira Metálica B com 54,2% de avanço na cravação
- Iniciada a utilização do Setor 5 para disposição de sedimentos dragados
- Barreira de Turbidez e LogBoom contratados e em fabricação



EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves
Fotos



43
 TAMAPRESI
 09/14
 RUB
 10/8

EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves


Fotos



Dragagem



Setor 8

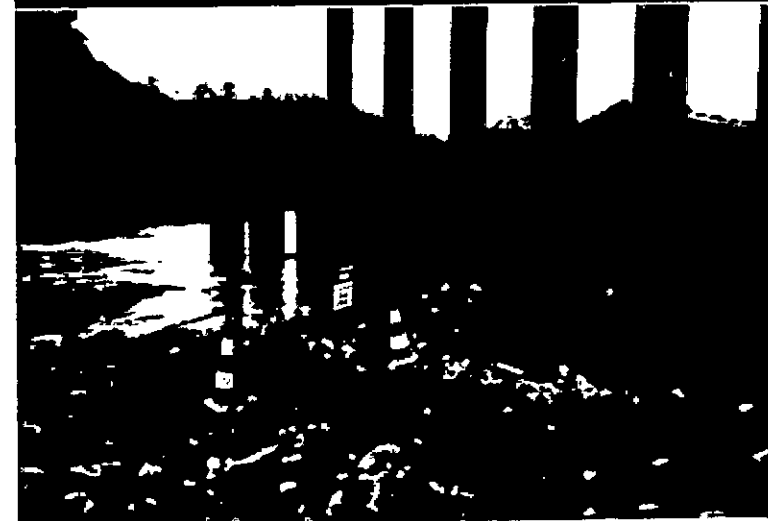

Barreira metálica B




EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Fotos




Fazenda Floresta




EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Fotos

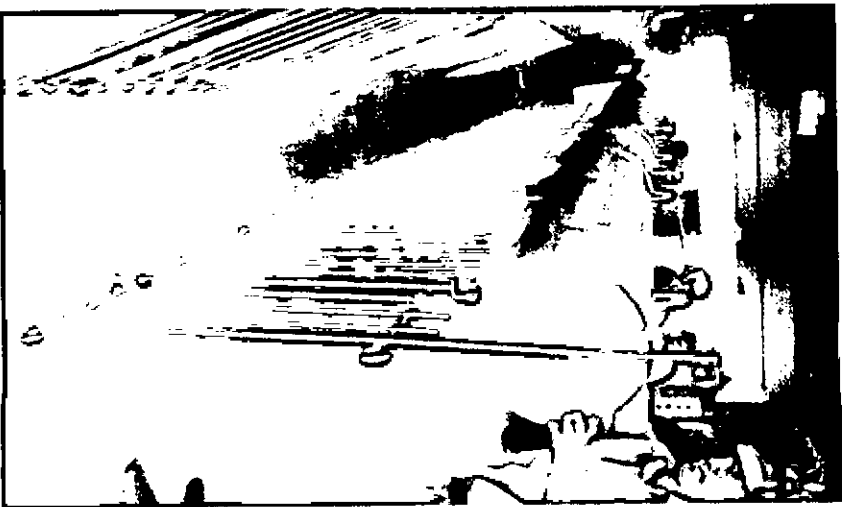

Fabricação Logboom

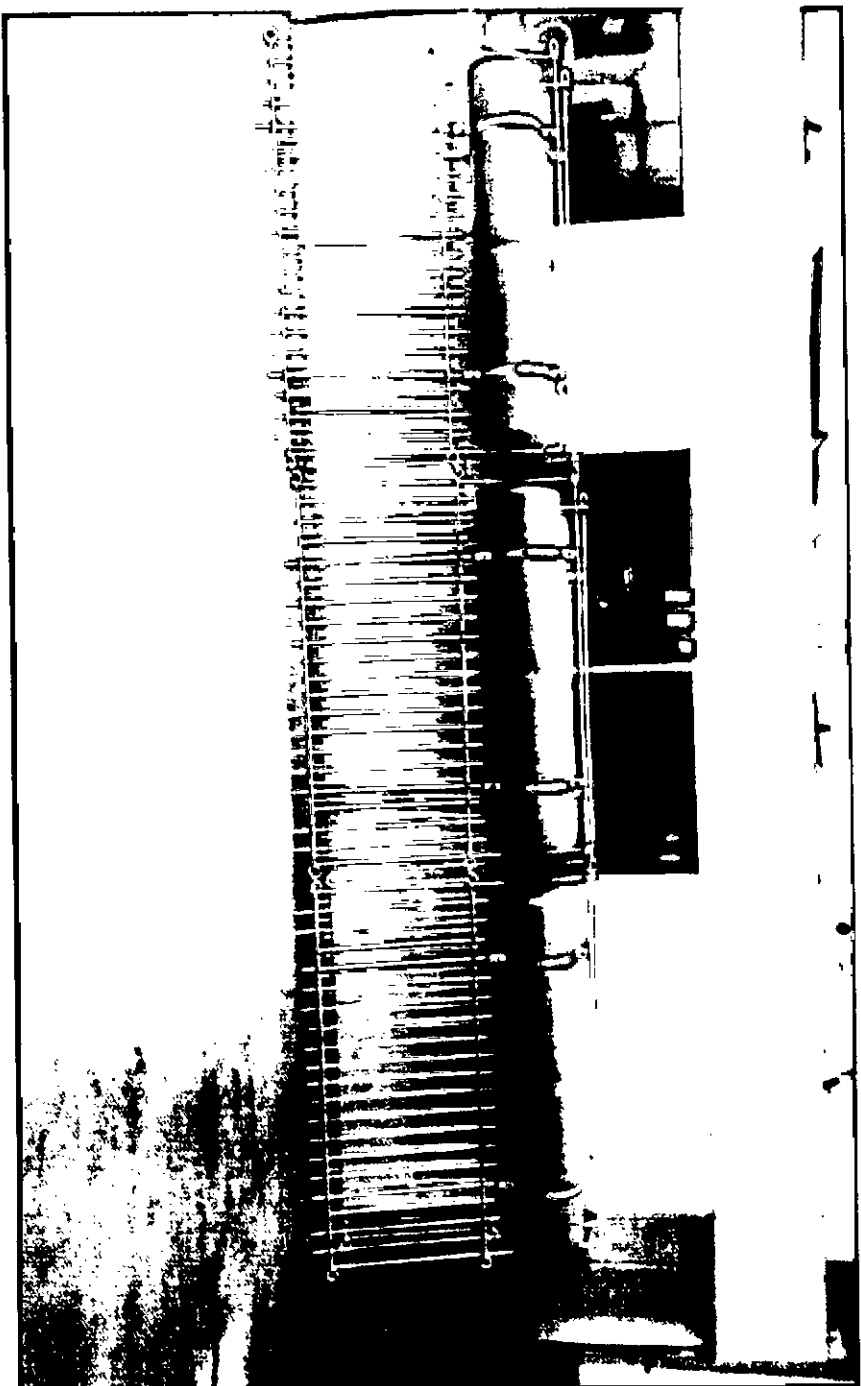


EMBRANCO

PG10 – Rec das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 331,8	Realizado: 207,8	% Real.	Início	Término
Tarefa						
PG010-R - Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga (Cláusulas 82 à 88)					nov-15	ago-18
Metas do Programa					mar-16	ago-18
Cláusula 88 - Início do Programa de Recuperação das Outras Comunidades e Infraestrutura				100%	mar-16	mar-16
Cláusula 88 - Conclusão da Recuperação das infraestruturas e comunidades impactadas entre Fundão e Candonga (prevista para 30 meses após assinatura do ACORDO)					ago-18	ago-18
Definição do Programa					set-16	out-16
PF7100 - Definição do Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga					set-16	out-16
Execução do Programa					nov-15	ago-18
Projetos					nov-15	ago-18
PF0032 - Obras de recuperação de Residências em Barra Longa					nov-15	mar-17
Execução do Projeto				99%	nov-15	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)					dez-16	mar-17
PF0033 - Obras de recuperação de comércio e Instituições em Barra Longa					nov-15	set-17
Execução do Projeto				93%	nov-15	jun-17
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)					jun-17	set-17
PF0177 - Recuperação do Hotel de Barra Longa					nov-15	nov-15
Execução do Projeto					nov-15	nov-15
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)					nov-15	nov-15
PF0034 - Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho				100%	jan-16	ago-16
Execução do Projeto				100%	jan-16	mai-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)				100%	mai-16	ago-16
PF0035 - Obras de Remoção de material em Barra Longa					fev-16	nov-16
Execução do Projeto				100%	fev-16	ago-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)				90%	ago-16	nov-16
PF0036 - Cercamento de propriedade - acordo com MP					jun-16	nov-16
Execução do Projeto				73%	jun-16	nov-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)					jan-16	jun-17
PF0037 - Reforma e Limpeza					jan-16	dez-16
Execução do Projeto				100%	jan-16	dez-16
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)					set-16	jun-17



EMBRANCO
