


PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 1284,7	Realizado: 1,3		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG026-C/PG027-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos (Cláusulas 161 e 162) / Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163)		set-16	mar-26	
Metas do Programa		mar-26	mar-26	
Cláusula 161 - Recuperação de APPs degradadas - 40000 ha		mar-26	mar-26	
Cláusula 163 - Recuperação de nascentes - 5000 nascentes (500/ano)		mar-26	mar-26	
Definição do Programa		set-16	jun-17	
PF7260 - Definição do Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos		set-16	jun-17	
/ PG027 - Programa de recuperação de Nascentes				
Execução do Programa		nov-16	mar-26	
Projetos		nov-16	mar-26	
PF0135 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163)		nov-16	mai-18	
Execução das ações para reabilitação de 500 nascentes		nov-16	fev-17	
Execução de barraginhas e fossas sépticas dos proprietários beneficiados		nov-16	mai-18	
Projetos/Processos de recuperação de APPs, Nascentes degradadas e monitoramento da efetividade da recuperação das mesmas		mar-17	mar-26	
Encerramento do Programa		dez-25	mar-26	
PF9260 - Encerramento do Programa de recuperação de APPs e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce (captura e formalização de benefícios)		dez-25	mar-26	



EM BRANCO

PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Recebimento de proposta técnica revisada do IBIO	18/dez	18/dez

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Mobilização e cadastro de produtores rurais (#)	50	79	250
Elaboração de projetos técnicos (#)	140	185	500
Proteção de nascentes (#)	0	0	500


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Recuperação de APPs

- O Termo de Referência de Definição de Critérios de Priorização de Áreas para Recuperação Ambiental na Bacia do Rio Doce, elaborado pela Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água, foi avaliado e considerado muito bom. Foi enviado à Câmara Técnica apenas um questionamento sobre alguns termos e uma solicitação para avaliação de alteração no prazo proposto para realização destes estudos;
- Com base no Termo de Referência, está sendo construído o escopo para contratação da Elaboração do Plano Diretor para a recuperação de 40.000 ha de APPs e 5.000 nascentes na Bacia do Rio Doce.

Recuperação de nascentes

- O Instituto Terra iniciou os trabalhos no dia 08/11 realizando reuniões com lideranças locais;
- O Instituto Terra já realizou o cadastro de 262 nascentes com seus respectivos projetos técnicos, sendo de 124 na bacia do Rio Suaçuí Grande, 78 na bacia do Rio Santa Maria do Doce e 60 na bacia do Rio Pancas;
- O Instituto Terra iniciou em 28/11 a entrega dos insumos para cercamento e plantio. Realizada a entrega de insumos para 44 nascentes, sendo para 30 na bacia do Rio Suaçuí Grande, 7 na bacia do Rio Santa Maria do Doce e 7 na bacia do Rio Pancas.




EM BRANCO

PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes

Fotos



Reunião com lideranças municipais de Frei Inocência, Jampruca e Campanário.



EM BRANCO

PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes


Fotos



Assinatura do Termo de Compromisso.




Entrega de Insumos na bacia do Rio Santa Maria do Doce.

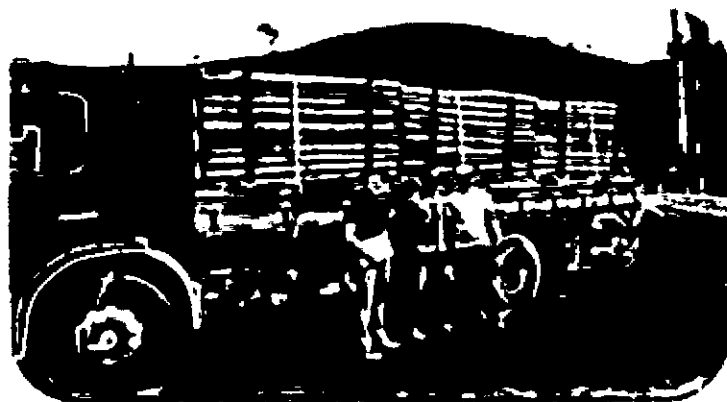

Entrega de Insumos na bacia do Rio Pancas.



Entrega de Insumos na bacia do Rio Suaçuí Grande




EM BRANCO

PG28 – Conservação da biodiversidade Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 35,4	Realizado: 0		
Tarefa				% Real.	Término
PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à 166)					jun-16
Metas do Programa					mai-22
					jun-16
Cláusula 165i - Proposta de estudo para avaliação da qualidade e ecotoxicidade da água e descrição metodológica das medidas de monitoramento da fauna aquática				100%	jun-16
Cláusula 164 - Estudo populacional da ictiofauna, avaliação da conservação das espécies nativas e medidas para recuperação e conservação da fauna aquática					dez-16
Cláusula 165ii - Estudo de avaliação do impacto agudo/crônico nas espécies e cadeia trófica; e do habitat de fundo marinho					mai-17
Cláusula 166 - Apresentação das ações de contingência de resposta ao monitoramento da fauna aquática					jul-17
Definição do Programa					set-16
PF7280 - Definição do Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada					dez-20
Execução do Programa					nov-16
Processos					fev-22
PF8280 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inclui o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)					nov-16
Encerramento do Programa					fev-22
PF9280 - Encerramento do Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (captura e formalização de benefícios)					mai-22



EM BRANCO

PG28 – Conservação da biodiversidade

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Contratação do Tamar para atendimento à parte do escopo da cláusula 165	18/nov	09/dez

MÉTRICAS


Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Formalizada a contratação da Econservation para atendimento a Cláusula 164, para a execução completa do TR encaminhado pelo ICMBio;
- Recebido o TR para a Cláusula 165. Em andamento contratação de logística para a execução do monitoramento do ambiente marinho, em conjunto: Fundação Renova, ICMBio, IBAMA, IEMA e Universidade. Toda a análise técnica será realizada pelas Universidades.
- Foi realizada reunião de alinhamento com as universidades, ICMBio e IEMA para discussão do plano de trabalho para formalizar o convênio com a Fundação da UFES, que irá executar 6 dos 8 anexos apresentados no TR da Cláusula 165;
- Em andamento monitoramento marinho em conjunto (universidade, órgãos ambientais e Fundação Renova), para início do atendimento à Cláusula 165.



Carta de Intenção da Fundação Renova à Econservation




EM BRANCO

PG29 – Recuperação da fauna silvestre

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 0,3	Realizado: 0		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG029-C - Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre (Cláusula 167)		ago-17	mar-22	
Metas do Programa		mar-18	mar-18	
Cláusula 167 - Emissão do Termo de Referência pelo IBAMA (Previsão/Premissa)		mar-18	mar-18	
Definição do Programa		ago-17	mar-18	
PF7290 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre		ago-17	mar-18	
Execução do Programa		mar-18	dez-21	
Projetos		mar-18	dez-18	
PF0167 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG		mar-18	dez-18	
PF0168 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em ES		mar-18	dez-18	
Processos		jan-19	dez-21	
PF8290 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS		jan-19	dez-21	
Encerramento do Programa		dez-21	mar-22	
PF9290 - Encerramento do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre (captura e formalização de benefícios)		dez-21	mar-22	



EM BRANCO

PG29 – Recuperação da fauna silvestre

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Recebimento de Termos de Referência para CETAS aprovado em CT	08/nov	06/dez

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Discutido em reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade, realizada no dia 08 de novembro, o escopo dos dois CETAS a serem construídos, um em MG e outro no ES. Os projetos serão desenvolvidos de forma conjunta pela Fundação Renova e órgãos responsáveis de acordo com termo de referência que será emitido em novembro.
- Não foi entregue o TR para atendimento a esta cláusula no dia 23/11.
- Será apresentado na CTBio do dia 06/12 a proposta técnica do TR para atendimento a este programa.




EMBRANCO

PG30 – Fauna e flora terrestre Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 3,4	Realizado: 0		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG030-R - Programa de conservação da fauna e flora terrestre (Cláusula 168)		nov-15	nov-17	
Metas do Programa		nov-15	dez-16	
Cláusula 168 - Apresentação do estudo de identificação, caracterização do impacto e do plano de ação para conservação das espécies terrestres ameaçadas de extinção		dez-16	dez-16	
Cláusula 168/P2 - Aprovação do plano de ação pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS		dez-16	dez-16	
Cláusula 168/P2 - Início da Execução do Plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre		nov-15	nov-15	
Definição do Programa		ago-16	ago-17	
PF7300 - Definição do Programa de conservação da fauna e flora terrestre		ago-16	ago-17	
Execução do Programa		nov-15	nov-15	
Processos		nov-15	nov-15	
PF8300 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (a ser definido no plano de monitoramento)		nov-15	nov-15	
Encerramento do Programa		ago-17	nov-17	
PF9300 - Encerramento do Programa de conservação da fauna e flora terrestre (captura e formalização de benefícios)		ago-17	nov-17	



EMBRANCO

PG30 – Fauna e flora terrestre

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

-

MÉTRICAS

Descrição

Planejado


Realizado

Meta

-

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- A Golder está trabalhando na elaboração da avaliação de impacto das espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção ao longo de toda a área impactada. Recebemos um Draft com a introdução, metodologia e objetivos;
- Solicitado ao Consórcio Aliança os dados de monitoramento para compor a resposta para a cláusula 168;
- Foi aprovado o Plano de Trabalho enviado ao IBAMA, na CT de Biodiversidade, para atendimento a notificação relacionada a fauna terrestre. Será encaminhado o parecer e ofício do IBAMA informando esta aprovação;
- Foi protocolado junto a CTBio, um ofício sugerindo a data de 19 e 20 de dezembro para que seja apresentado o primeiro resultado para atendimento a notificação do IBAMA relacionada a fauna terrestre;
- O estudo para atendimento à Cláusula 168 está em andamento e será entregue no prazo estabelecido no TTAC.




EMBRANCO

PG31 – Coleta e tratamento de esgoto

Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 500 Realizado: 0			
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG031-C - Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos (Cláusulas 169 e 170)		dez-15	mar-19
Metas do Programa		dez-16	dez-18
Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item I - R\$ 50.000.000,00		dez-16	dez-16
Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item II - R\$ 100.000.000,00		jun-17	jun-17
Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item III - R\$ 100.000.000,00		dez-17	dez-17
Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item IV - R\$ 125.000.000,00		jun-18	jun-18
Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item V - R\$ 125.000.000,00		dez-18	dez-18
Definição do Programa		set-16	nov-16
PF7310 - Definição do Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos		set-16	nov-16
Execução do Programa		dez-15	dez-18
PF8310 - Processo de Pagamento do Programa de Coleta e Tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos		dez-15	dez-18
Encerramento do Programa		dez-18	mar-19
PF9310 - Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		dez-18	mar-19



EMBRANCO

PG31 – Coleta e tratamento de esgoto

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Não houve ainda nenhuma notificação formal do CIF para depósito dos valores determinados no acordo. Previsão inicial era 31/10.
- O convênio entre Fundação Renova e BNDES para maior abrangência do programa está em avaliação entre as partes. Não há prazo para essa definição ainda neste ano.
- Provisionamento do recurso de 2016 planejado para ocorrer neste mês de Dezembro.




EMBRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 206,6	Realizado: 22,3		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG032-R/C - Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água (Cláusula 171)		jan-16	abr-21	
Metas do Programa		mar-18	set-20	
Cláusula 171 - Levantamentos de campo, estudos de concepção e projetos básicos		mar-18	mar-18	
Cláusula 171 - Conclusão da construção de sistemas alternativos de captação e adução, e melhoria das estações de tratamento de água para os municípios que captam da calha do Rio Doce		set-20	set-20	
Definição do Programa		nov-16	out-17	
PF7320 - Definição do Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água		nov-16	out-17	
Execução do Programa		jan-16	dez-20	
Projetos		mar-16	dez-20	
PF0022 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Governador Valadares		mar-16	ago-20	
Planejamento da execução		mar-16	dez-17	
Execução da Construção do Projeto de Governador Valadares		jan-18	set-20	
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)		set-20	dez-20	
Processos		jan-16	mai-17	
Processos Mitigatórios para o período chuvoso 2016/17		jan-16	mai-17	
PF8320 - Processo de ações preventivas mitigatórias e de contingência para o período chuvoso 2016/17		abr-16	abr-17	
Encerramento do Programa		jan-21	abr-21	
PF9320 - Encerramento do Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água (captura e formalização de benefícios)		jan-21	abr-21	



EMBRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

-

MÉTRICAS

Descrição

Planejado


Realizado

Meta

-

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- As captações alternativas e melhorias dos sistemas de tratamento estão sendo realizadas dentro do âmbito do Plano de ações para período chuvoso 2016/2017. Estas captações alternativas poderão ser validadas como definitivas após o término do estudo técnico de avaliação de oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, em atendimento a Deliberação nº16.
- No âmbito do plano para período chuvoso:
 - Conclusão da adutora de Lagoa Nova em Linhares;
 - Conclusão da adutora do rio Santa Maria em Colatina;
 - Perfurados poços profundos em São Vitor (1 poço), Cachoeira Escura (1 poço), Alpercata (2 poços) e Itueta (1 poço).
 - Adutora do rio Pancas em comissionamento.
 - Recuperados 05 poços em Colatina
 - Conclusão de melhorias nas estações de tratamento em Governador Valadares, Belo Oriente, Galiléia, Colatina e Regência.
- Witt O'Briens já atuando junto a estrutura de comando de gestão do plano de ações para período durante o período de chuvas;
- No âmbito do estudo de avaliação de oferta hídrica:
 - Contratação de especialistas para elaboração do escopo do estudo técnico de avaliação de oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrâneos, em atendimento a Deliberação nº16.




EM BRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Fotos



MUNICÍPIO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	MELHORIA CONCLUÍDA
Governador Valadares	ETA Central	Melhorias no sistema elétrico, mecânico e operacional da captação
		Melhorias no sistema elétrico, mecânico e operacional nos floculadores
		Melhorias no sistema elétrico, mecânico e operacional dos decantadores
		Melhorias operacionais na casa de químicos
	ETA Vila Isa	Melhorias do sistema de filtração (substituição das camadas filtrantes)
		Melhorias do sistema de decantação
		Melhorias operacionais na casa de químicos
	ETA Santa Rita	Melhorias do sistema de filtração (substituição das camadas filtrantes)
Belo Oriente	ETA Cachoeira Escura	Instalação de nova ETA (comissionamento)
Galileia	ETA Central	Instalado sistema de dosagem de hidróxido de sódio
Linhares	ETA Regência	Melhorias na infraestrutura do laboratório
		Melhorias no sistema de preparação e dosagem de produtos químicos
		Melhoria no sistema de captação do poço




EMBRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Fotos



MUNICÍPIO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	MELHORIA CONCLUÍDA
Colatina	ETA 1 - Bairro Marista - Sul	Substituição da balsa de captação
		Melhorias no sistema de captação
		Melhorias do sistema de filtração (substituição das camadas filtrantes)
		Melhorias no sistema elétrico e mecânico na casa de químicos
	ETA 2 - Bairro N. Sra. Aparecida - Norte	Melhorias no sistema elétrico e mecânico da captação
		Melhorias do acesso seguro na área dos decantadores e floculadores
		Melhorias no sistema mecânico dos decantadores
		Melhorias do sistema de filtração (substituição das camadas filtrantes)
		Melhorias no sistema elétrico e mecânico na casa de químicos
	ETA 4 - Bairro Columbia	Melhorias do sistema elétricos da captação
		Melhorias do sistema de filtração (substituição das camadas filtrantes)
		Melhorias no sistema de preparação e dosagem de produtos químicos
		Melhorias no sistema elétrico, mecânico e operacional na casa de químicos



EM BRANCO


PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Fotos




Recuperação de 05 poços em Colatina

Perfurados após 05 de novembro de 2015

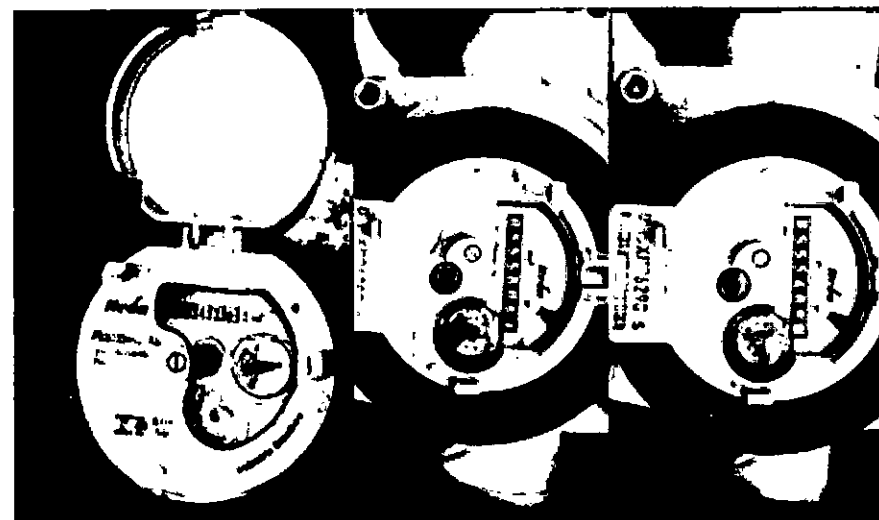

Poço - PA1N – 53,22 m³/h
Poço - PA2N - 20,8 m³/h
Poço - PA3N - 11,2 m³/h
Poço - PA1S - 32,3 m³/h
Poço – Columbia – 1,9 m³/h




EM BRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Fotos




Adutora Santa Maria - Colatina

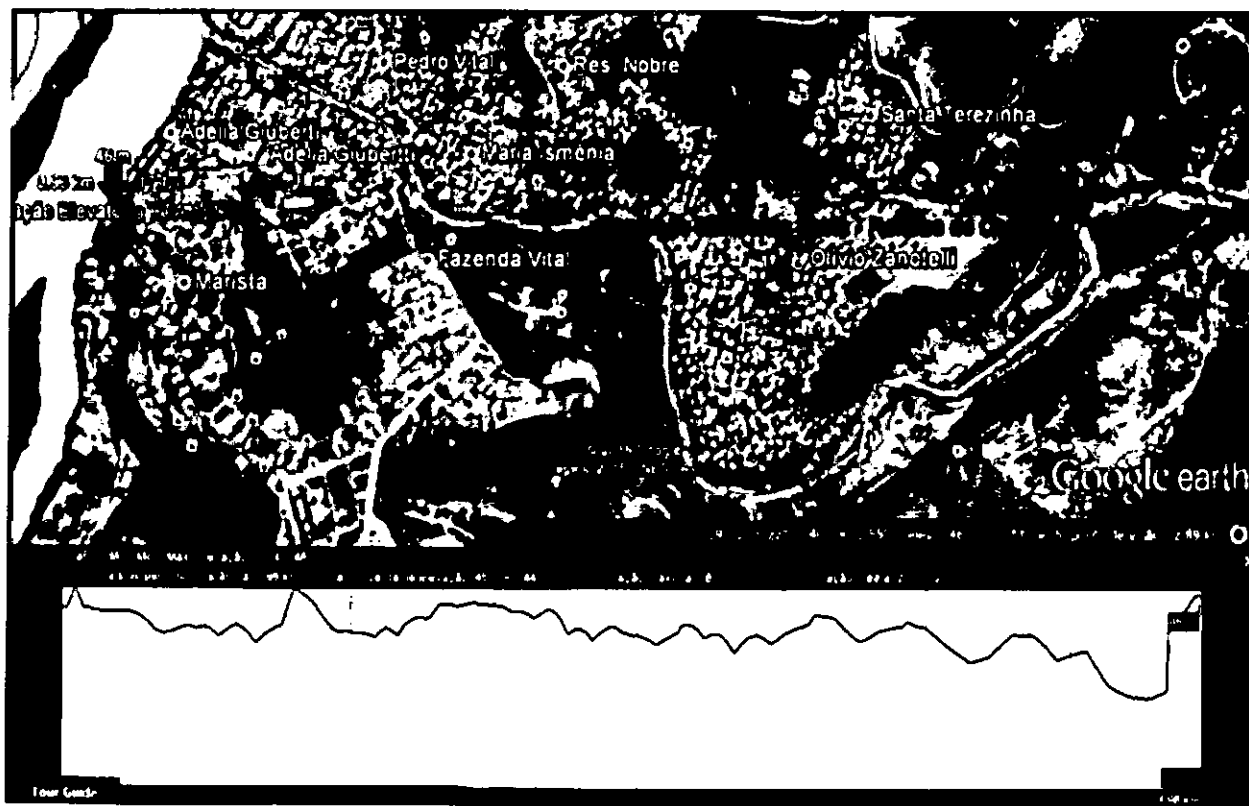

Trajeta

- Execução: 08/01 a 31/10 de 2016
- Operação assistida: Outubro/Novembro 2016
- Capacidade de transporte: 80 l/s, volume equivalente a 20% do consumo da cidade.
- Extensão: cerca de 4 quilômetros
- Características:
 - Sistema de bombeamento composto por 2 bombas, sendo uma *stand-by*.
 - Operação local.




EM BRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água


Fotos




Adutora Santa Maria - Colatina

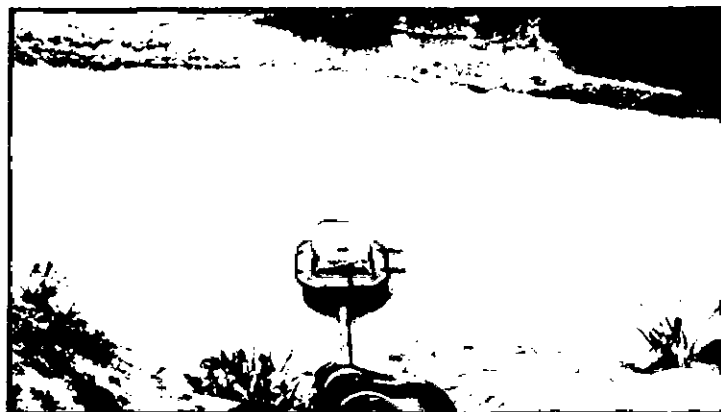

Sistema de Bombeamento e Boosters

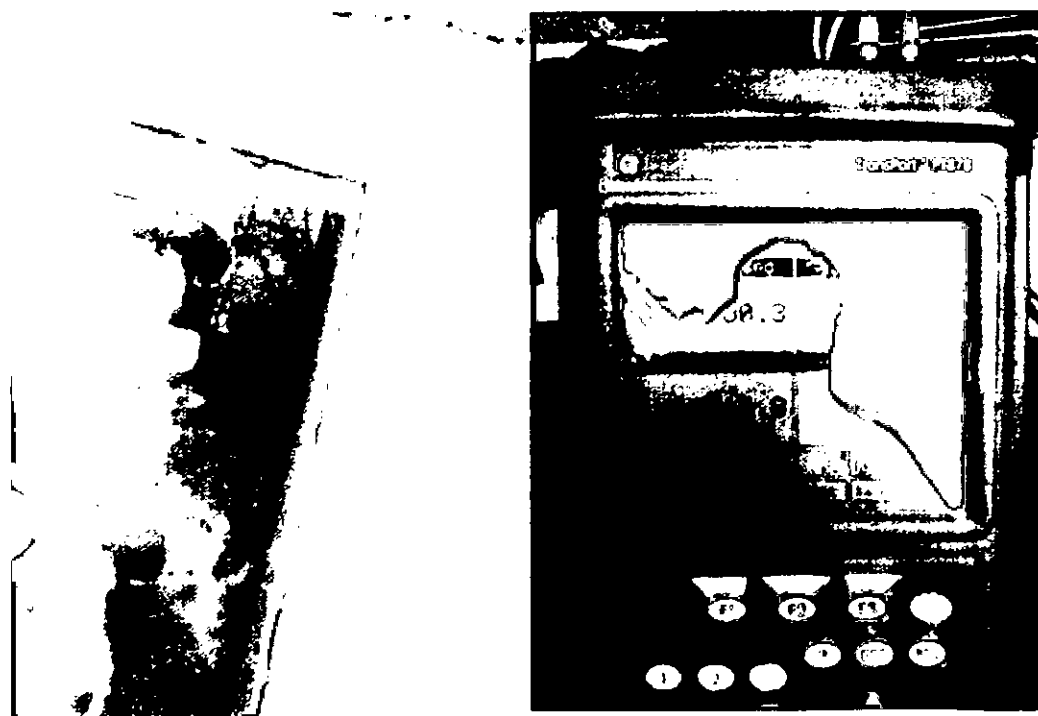


Chegada de água no SANEAR e aferição da vazão real
-Cobertura e isolamento da casa de bombas em andamento



EMBRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Fotos




Adutora Lagoa Nova - Linhares



Trajeto

- Execução: 29/07 a 30/09 de 2016
- Operação assistida: Outubro 2016
- Capacidade de transporte: 200 l/s, volume equivalente a 50% do consumo da cidade
- Extensão: cerca de 9 quilômetros
- Características:
 - Sistema de bombeamento composto por 3 bombas, sendo uma de *stand by*.
 - Operação remota com painel na sala de operação do SAAE.



EM BRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água

Fotos




Adutora Lagoa Nova - Linhares



Sistema de Bombeamento e Subestação



Chegada de água no SAAE e painel de operação Remota



EM BRANCO

PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água


Fotos



Perfuração de poços



São Vitor

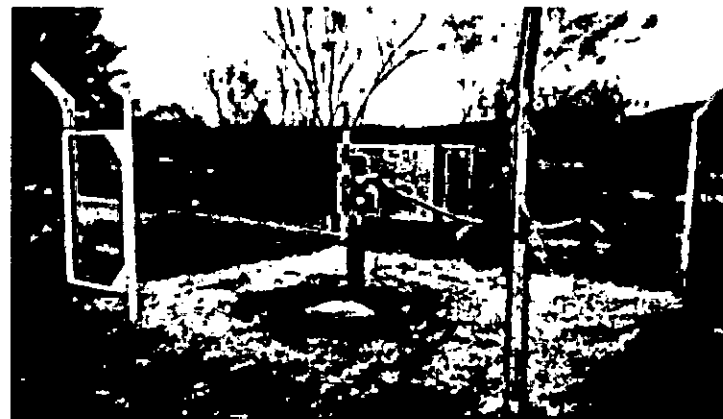


Cachoeira Escura



Itueta



Alpercata




EM BRANCO

PG33 – Educação ambiental Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 43,4	Realizado: 7,1 (inclui PG34)		
Tarefa		% Real.	Início	Término
PG033-C - Programa de educação ambiental (Cláusula 172)			jul-16	dez-26
Metas do Programa			set-16	set-16
Cláusula 172 - Implantação de medidas de educação ambiental em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na ÁREA AMBIENTAL 1		100%	set-16	set-16
Definição do Programa			nov-16	nov-16
PF7340 - Definição do Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais			nov-16	nov-16
Execução do Programa			jul-16	set-26
Projetos			jul-16	mai-18
PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce			jul-16	mai-18
Execução da Implantação das medidas de Educação Ambiental			jul-16	abr-18
Encerramento do Projeto			abr-18	mai-18
Processos			jun-17	set-26
PF8343 - Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental			jun-17	set-26
Encerramento do Programa			set-26	dez-26
PF9340 - Encerramento do Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (captura e formalização de benefícios)			set-26	dez-26



EM BRANCO

PG33 – Educação ambiental

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Contratação de serviços de apoio à execução de ações em Educação Ambiental (Reestruturação Equipe PEA)	30/dez	30/dez

MÉTRICAS


Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Reuniões com a Escola de Paracatu: avaliação das ações realizadas e planejamento de ação de fechamento do ano escolar;
- Intervenções artísticas nas escolas de Bento Rodrigues e Paracatu;
- Oficina na Escola de Paracatu;
- Palestras na Escola Estadual de Barra Longa;
- Reunião com a Comunidade de Campinas;
- Ação de educação ambiental na comunidade de Campinas;
- Oficina com o Grupo de Jovens de Bento Rodrigues.

Resultados:

- Subsídio para estruturação do PEA no ano de 2017;
- Cumprimento de cronograma de ações de educação ambiental junto aos públicos;
- Aderência do Grupo de Jovens de Bento Rodrigues às ações do PEA, além de possibilitar mais momentos de encontros entre os jovens;
- Integração da comunidade escolar a partir das ações do PEA na Escola de Paracatu, através de ações que compreenderam música, dança, artesanato e atividades culturais;
- Estímulo ao fortalecimento da comunidade de Campinas para estruturação do plano de desenvolvimento local.



EMBRANCO

PG33 – Educação ambiental

Fotos



Reunião de Gestão na Escola de Paracatu – 21/11/16



Intervenção artística na Escola de Bento Rodrigues – 11/11/16



Oficina "Reciclagem" na Escola de Paracatu – 11/11/16



Oficina "Reutilização" com o Grupo de Jovens de Bento Rodrigues – 16/11/16




Palestra na Escola Estadual de Barra Longa – 18/11/16



Intervenção artística na Escola de Paracatu – 19/11/16



Intervenção artística com a comunidade de Campinas – 29/11/16




EM BRANCO

PG34 – Emergência ambiental Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 43,4	Realizado: 7,1 (inclui PG34)		
Tarefa		% Real.	Início	Término
PG034-C - Programa de preparação para as emergências ambientais (Cláusula 173)			fev-16	out-26
Metas do Programa			set-16	mar-17
Cláusula 173 - Emissão do diagnóstico quanto à necessidade de inclusão dos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce e às necessidades específicas das ações após consulta ao órgão de Defesa Civil	100%		set-16	set-16
Cláusula 173 - Implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta a partir de uma atuação integrada à Defesa Civil nos municípios de Mariana e Barra Longa			mar-17	mar-17
Definição do Programa			set-16	nov-16
PF7341 - Definição do Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais			set-16	nov-16
Execução do Programa			fev-16	mar-22
Projetos			fev-16	mai-17
PF0041 - Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência			fev-16	abr-17
Execução da Construção de Acessos para implantação do sistema de emergência			fev-16	jan-17
Encerramento do Projeto			jan-17	abr-17
PF0071 - Instalação de sirenes de emergência			abr-16	mai-17
Execução da Implantação do Sistema de Alerta para Emergência	88%		abr-16	fev-17
Encerramento do Projeto			fev-17	mai-17
Processos			jun-16	mar-22
PF8340 - Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência			fev-17	mar-22
PF8343 - Processo de Implantação do Sistema de alerta de chuva e cheias para o período chuvoso 2016/17			out-16	jul-17
PF8344 - Processo de reestruturação da brigada e das defesas civis à jusante das barragens para atendimento a emergência de barragens			jun-16	mar-17
Encerramento do Programa			ago-26	out-26
PF9341 - Encerramento do Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (captura e formalização de benefícios)			ago-26	out-26



EM BRANCO

PG34 – Emergência ambiental

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Meta

Acessos para sistemas de emergência realizados (#)

NA

20

20

Sirenes instaladas em campo (#)

22

22

31

Sirenes operacional pelo sistema de gerenciamento Vektra (#)


22

22

31

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Finalizado fase 1 do projeto de sirenes
- Realizados os simulados de emergência nas cidades e distritos de Barra Longa e Mariana, coordenado pela Defesa Civil Municipal e Estadual.
- Realizado teste de acionamento remoto de 20 sirenes das comunidades de Mariana e Barra Longa durante os simulados de emergência.
- Realizadas reuniões institucionais nos municípios e diálogo com as comunidades.
- Realizado teste de propagação de som das sirenes na Barragem de Germano e Santarem.
- Realizado teste de acionamento e propagação de som utilizando caminhonetes sirenes em 11 localidades de Barra Longa.



EM BRANCO

PG34 – Emergência ambiental

Fotos



REUNIÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO	PÚBLICO	DATA
Mariana	Prefeitura	18/out
	Câmara Municipal	18/out
Barra Longa	Prefeitura	19/out
	Câmara Municipal	19/out
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Prefeitura	20/out
	Câmara Municipal	20/out

ETAPA 1

Reuniões
Institucionais

ETAPA 2


Reuniões
Coletivas

ETAPA 3

Diálogo
Direto

ETAPA 4

Execução
do Simulado



EM BRANCO

PG34 – Emergência ambiental

Fotos



TODOS OS MUNICÍPIOS

22

Total de comunidades



42

Total de Campanhas



937


Total de Interlocuções

22

Média Interlocuções



Reuniões coletivas de preparação para o simulado



EMBRANCO

PG34 – Emergência ambiental

Fotos



DIALOGO DIRETO

22

Total de comunidades

42

Total de Campanhas

937

Total de Interloquções

22

Média Interloquções



SIMULADO DE EMERGÊNCIA

MARIANA

7

Comunidades

215

Pessoas presentes

BARRA LONGA

6


Comunidades

527

Pessoas presentes




Simulados de emergência



EMBRANCO

PG34 – Emergência ambiental

Fotos

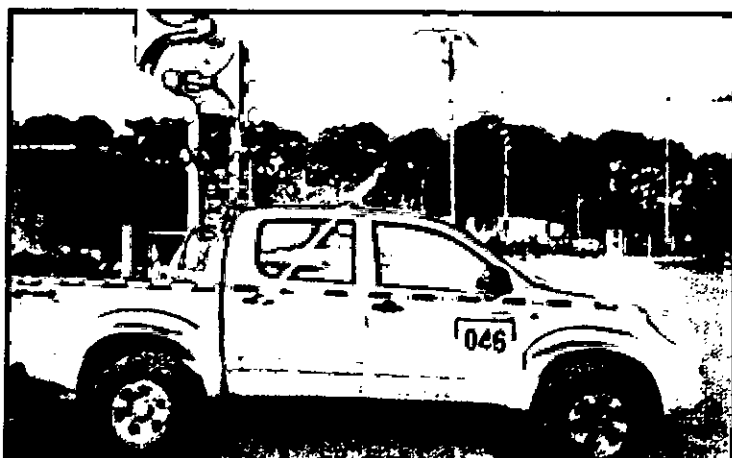


Caminhonetes sirenes
Equipadas



Simulados de emergência
em Mariana 08/11 e Barra
Longa 09/11



Reunião de encerramento do
comando Integrado em
Mariana 08/11




EM BRANCO

PG35 – Informação para a população Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 19,5 Realizado: 0			
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG035-C - Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174)		jun-16	dez-26
Metas do Programa		jan-17	jan-17
Cláusula 174 - Implantação dos centros de informação técnica		jan-17	jan-17
Definição do Programa		set-16	nov-16
PF7350 - Definição do Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1		set-16	nov-16
Execução do Programa		jun-16	dez-26
Projetos		jun-16	abr-17
PF0092 - Centros de Informação técnica		jun-16	abr-17
Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica		jun-16	nov-16
Execução da Implantação do centro de informação técnica		nov-16	jan-17
Encerramento do Projeto		jan-17	abr-17
Processos		set-16	dez-26
PF8350 - Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais		set-16	ago-26
PF8351 - Processo de manutenção das estruturas implantadas		dez-16	dez-26
Encerramento do Programa		out-26	dez-26
PF9350 - Encerramento do Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (captura e formalização de benefícios)		out-26	dez-26



EMBRANCO

PG35 – Informação para a população

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

-

MÉTRICAS

Descrição

Planejado


Realizado

Meta

-

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Levado para discussão na Câmara Técnica de Comunicação, Diálogo e participação social a unificação/sinergia do PG035 com o PG006, compartilhando postos de atendimento.




EMBRANCO

PG36 – Comunicação nacional/internacional Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 5,2	Realizado: 0,2		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG036-C - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175)		jun-16	jan-27	
Metas do Programa		jul-16	jul-16	
Cláusula 175 - Apresentação do draft do programa de comunicação regional, nacional e internacional	100%	jul-16	jul-16	
Definição do Programa		set-16	nov-16	
PF7360 - Definição do Programa de comunicação nacional e internacional		set-16	nov-16	
Execução do Programa		jun-16	jan-27	
Projetos		jun-16	mar-17	
PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital		jun-16	mar-17	
Execução da Implantação da Plataforma Digital		jun-16	mar-17	
Encerramento do Projeto		set-16	mar-17	
Processos		set-16	jan-27	
PF8360 - Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico		set-16	jan-27	
Encerramento do Programa		out-26	jan-27	
PF9360 - Encerramento do Programa de Comunicação nacional e internacional (captura e formalização de benefícios)		out-26	jan-27	



EMBRANCO

PG36 – Comunicação nacional/internacional

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Site da Fundação Renova:

- Páginas novas publicadas no mês: landing page "Fundação Renova promove evento com Prof. Pavan Sukhdev"
- Quantidade de notícias publicadas no mês: 12 notícias publicadas, nos três idiomas
- Quantidade de documentos técnicos publicados no mês: 40 documentos
- Quantidade de e-mails recebidos via Fale Conosco: 1.015 contatos
- Transmissão ao vivo do encontro com o Prof. Pavan Sukhdev, a saber:
 - ✓ Quantidade de pessoas cadastradas no formulário para acesso à transmissão: 115 cadastros
 - ✓ Quantidade de acessos à transmissão: 122 pessoas acompanharam o evento online (78 permaneceram até o final da transmissão simultânea)




EM BRANCO

PG37 – Gestão de riscos ambientais Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 0,2 Realizado: 0			
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG037-R - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusula 176)		out-16	jun-17
Metas do Programa		mar-17	mar-17
Cláusula 176 - Apresentação do estudo aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS		mar-17	mar-17
Definição do Programa		out-16	mar-17
PF7370 - Definição do Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce		out-16	mar-17
Execução do Programa		mar-17	mar-17
Processos		mar-17	mar-17
PF8370 - Processos de ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos identificados serão realizadas pela SAMARCO (a definir com base no Estudo e Definição do Programa)		mar-17	mar-17
Encerramento do Programa		mar-17	jun-17
PF9370 - Encerramento do Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 (captura e formalização de benefícios)		mar-17	jun-17



EM BRANCO

PG37 – Gestão de riscos ambientais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Realizados todos os treinamentos mandatórios para mobilização e integração da PM Analysis;
- Disponibilizado para contratada, arquivos e documentos específicos para confecção da documentação;
- Realizado visitas às captações de água em Brumal e em Matipó;
- Iniciado a confecção de estudos relacionados às captações de água;
- Próxima etapa: Visita às barragens – Previsão para semana do dia 12/12/2016.




EM BRANCO

PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce

Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 230,5	Realizado: 79
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG038-R/C - Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas (Cláusulas 177 à 180)			
Metas do Programa		nov-15	dez-30
Cláusula 177 - Aprovação do projeto de rede de monitoramento, bem como a localização das estações pelos ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS e pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS e CIF (Previsão/Premissa)		dez-16	dez-16
Cláusula 177 - Implantação da rede de monitoramento constituída por equipamentos automatizados, coleta de amostras de águas e sedimentos e ensaios de laboratório		jul-17	jul-17
Cláusula 180 - Conclusão do estudo de identificação de áreas de irrigação ao longo do Rio Doce		dez-16	dez-16
Definição do Programa		ago-16	jan-17
PF7380 - Definição do Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas		ago-16	jan-17
Execução do Programa		nov-15	dez-30
Processos		nov-15	dez-30
PF8380 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das águas do Rio Doce e Tributários para Intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)		nov-15	dez-30
PF8381 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das águas do Rio Doce e Tributários para Intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)		mar-17	mar-19
PF8382 - Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)		jul-17	dez-30
PF8383 - MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO EMERGENCIAL SISTEMÁTICO E PARA INTERVENÇÕES		fev-16	dez-17
Projetos		ago-16	jul-17
PF0148 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado		ago-16	jul-17
Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177)		ago-16	out-16
Execução da Compra e instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado		dez-16	jul-17
PF0171 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado em Candonga		ago-16	abr-17
Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177)	100%	ago-16	out-16
Execução da compra e instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado		nov-16	abr-17
Encerramento do Programa		out-30	dez-30
PF9380 - Encerramento do Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas (captura e formalização de benefícios)		out-30	dez-30



EM BRANCO

PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Definição de escopo do projeto de irrigação	30/dez	30/dez
Previsão de compra do sistema automatizado (5 sondas em Candonga)	31/out	31/dez

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


- Recebido, em ofício da ANA, a versão final da proposta de conteúdo mínimo para o Programa de Monitoramento Quali-qualitativo da Água e dos Sedimentos do Rio Doce;
- Protocolado no SEMAD relatório mensal de avaliação da qualidade da água vertida no dique S3;
- Visita de campo dos órgãos ambientais aos pontos do plano de monitoramento do ES;
- Reunião com IBAMA (21 e 22 de novembro) para discussão dos resultados do monitoramento do Rio Doce e Zona Costeira;
- Início das coletas de água para análises dos coloides;
- No dia 20 de dezembro será entregue o plano de monitoramento permanente proposto pela Fundação com base no conteúdo mínimo deliberado pelo CIF;
- No final do mês de dezembro será entregue o estudo das áreas irrigadas pelo Rio Doce, conforme descrito na cláusula 180 do TTAC;
- Término do monitoramento do AI Total nas ETAs de Governador Valadares/MG;
- Mudança na frequência do monitoramento da água do Rio Doce, de quinzenal para semanal.




EM BRANCO

PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce

Fotos

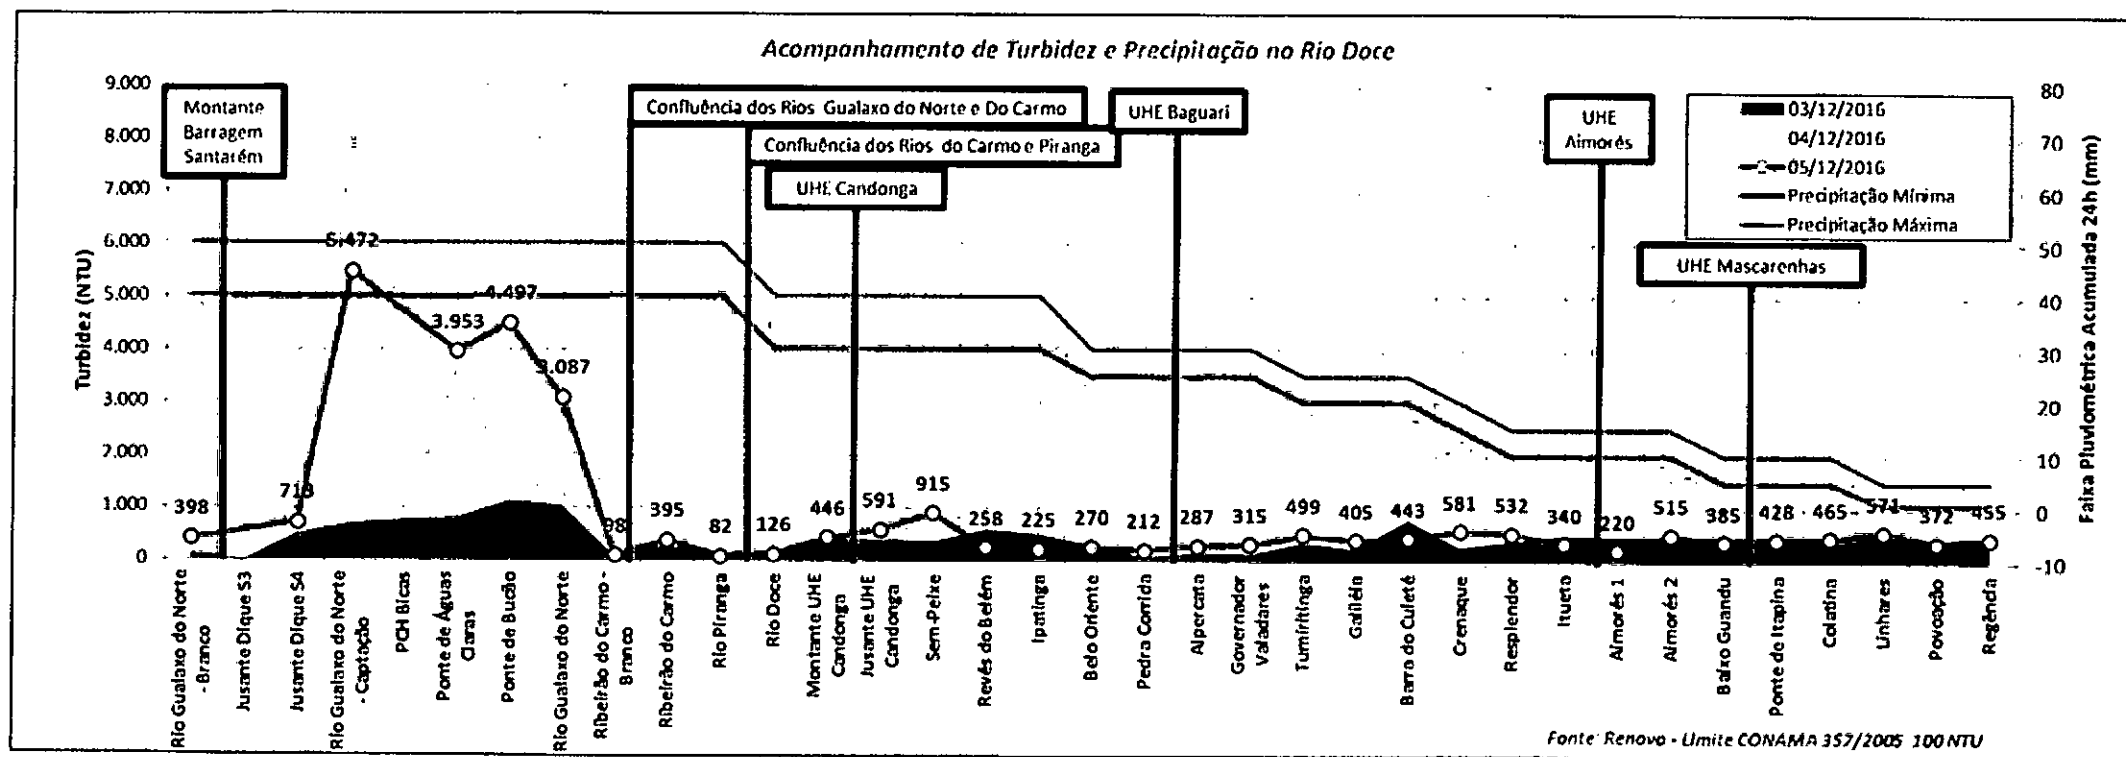


Acompanhamento Turbidez do Rio Doce - NTU




EM BRANCO

PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce

Fotos

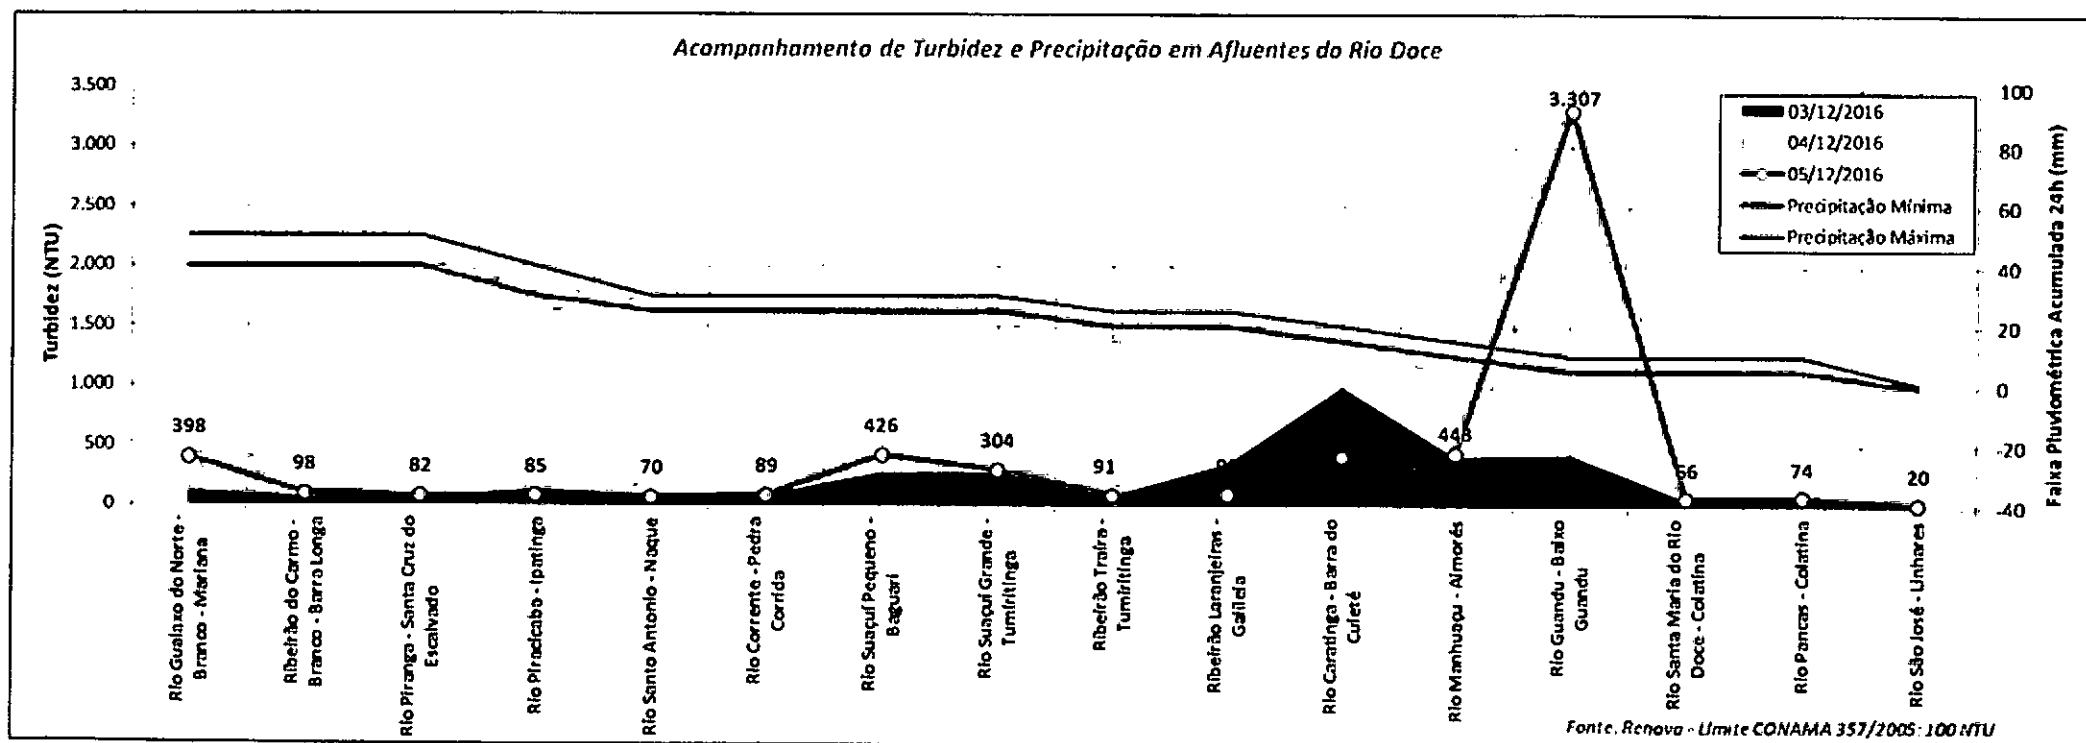

Acompanhamento Turbidez dos Afluentes do Rio Doce - NTU




EM BRANCO

PG39 – Unidades de conservação Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 2,8 Realizado: 0			
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG039-R/C - Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias (Cláusulas 181 e 182)		ago-16	mai-22
Metas do Programa		jan-17	jul-17
Cláusula 181 - Divulgação dos estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação e implantação de ações de reparação previstas nos mesmos		jul-17	jul-17
Cláusula 182 - Custear ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e a construção da sede da APA na foz do Rio Doce		jan-17	jan-17
Cláusula 182 - Criação da APA na foz do Rio Doce pelo PODER PÚBLICO (Data estimada)		jan-17	jan-17
Definição do Programa		ago-16	jul-17
PF7390 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias		ago-16	jul-17
Execução do Programa		jan-17	jan-22
Processos		jan-17	jan-22
PF8390 - Processos de contingenciamento de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação		jan-17	jul-17
PF8391 - Processo de monitoramento do subsídio às ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e implementação da Área de Proteção Ambiental (incluindo a construção da sede)		jan-17	jan-22
Encerramento do Programa		jan-22	mai-22
PF9390 - Encerramento do Programa de consolidação de unidades de conservação (captura e formalização de benefícios)		jan-22	mai-22



EM BRANCO

PG39 – Unidades de conservação

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Aprovação de Termos de Referência (TR) das 4 Unidades de Conservação na Câmara Técnica	06/dez	06/dez

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Apresentado na reunião da CT de Biodiversidade, no dia 08/11, o TR para atendimento a RVS (Reserva da Vida Silvestre) de Santa Cruz, em atendimento a parte da Cláusula 182;
- O TR da RVS foi apresentado ao CIF no dia 23 e 24 de novembro de 2016;
- Será apresentado na CTBio as alterações solicitadas pelo CIF no TR da RVS, sendo que esta revisão se dará somente pela apresentação de um orçamento para execução das atividades;
- Apresentado pela Golder, no dia 02/11/2016, o Plano de Trabalho para avaliação do impacto no PERD (atendimento à Cláusula 181), este será protocolado na CTBio para avaliação.




EM BRANCO

PG40 – CAR e PRAs

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 6	Realizado: 0		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG040-C - Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório (Cláusula 183)		nov-15	mai-26	
Metas do Programa		mar-26	mar-26	
Cláusula 183 - Suportar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e fomentar a elaboração e a implementação dos Programas de Regularização Ambiental (PRA) na ÁREA AMBIENTAL 1		mar-26	mar-26	
Definição do Programa		set-16	out-16	
PF7400 - Definição do Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório		set-16	out-16	
Execução do Programa		nov-15	mar-26	
Processos		nov-15	mar-26	
PF8400 - Processo de cadastro ambiental rural (CAR) e regularização ambiental (PRA)		nov-15	mar-26	
Encerramento do Programa		mar-26	mai-26	
PF9400 - Encerramento do Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 (captura e formalização de benefícios)		mar-26	mai-26	




EM BRANCO

PG40 – CAR e PRAs


Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias			
Descrição	Planejado	Tendência	
-			
MÉTRICAS			
Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Proprietários com CAR efetivado (#)	160	163	203
AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES			
- Realização de Reunião com comunidade de produtores rurais de Barra Longa para explicações sobre o CAR e sinergia com o PG017 - Planejada reunião com comunidade de produtores rurais de Mariana - Definição de parceria junto à UFV para aplicação de diagnóstico de CAR / ISA (35 pessoas) - Atualização cadastral da EMATER - Aprovação de Compliance e Conselho Curador da Fundação - Agendamento de assinatura do contrato com a Emater para semana do dia 12/12/2016			




EM BRANCO

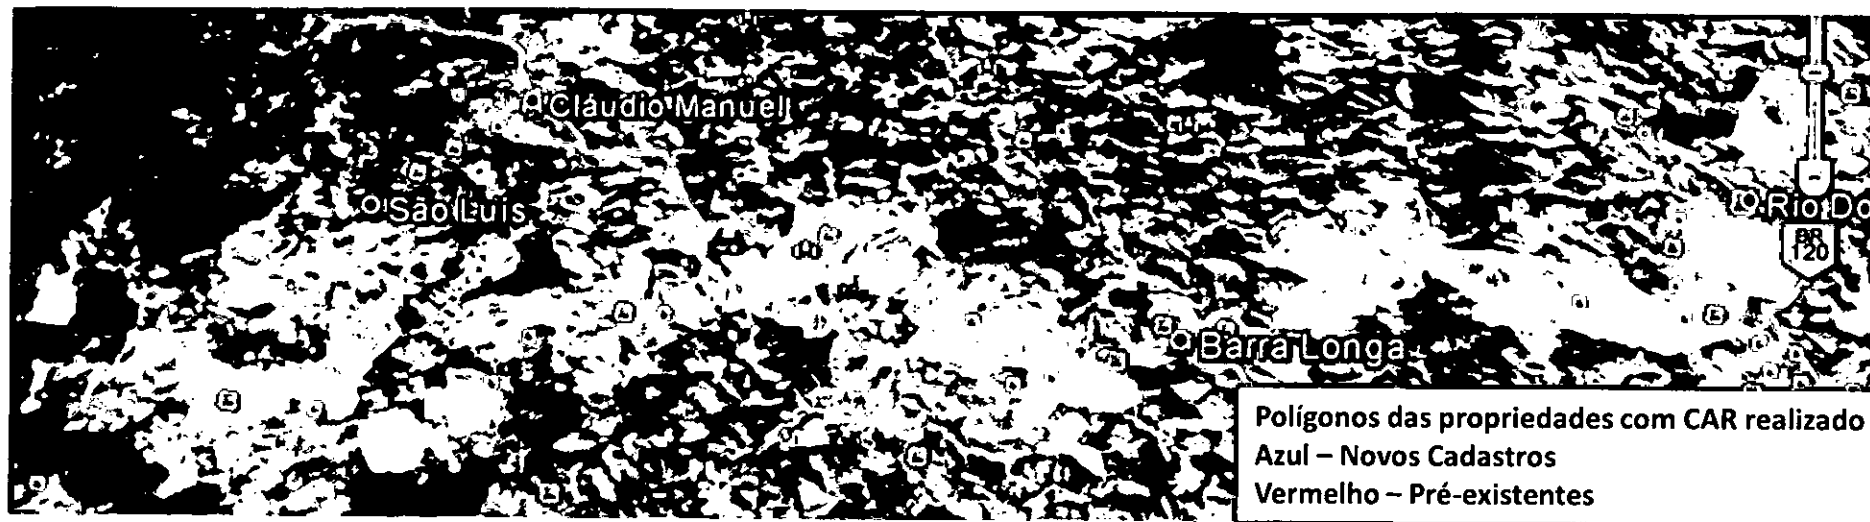

89% das 203 propriedades com CAR realizado.

- 47 novos Cadastros dentro do PG040
- 31 revisões de Cadastros pré-existentes
- Faltam 35 propriedades a serem cadastradas




EM BRANCO

PG22/41 – Gerenciamento programas Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 590,6 Realizado: 5,2			
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG041-R/PG022-R - Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e socioambientais (Cláusulas 144 e 184)		mar-16	dez-30
Metas do Programa		nov-16	nov-16
Cláusula 184 - Formalização do Programa junto ao CIF		nov-16	nov-16
Definição do Programa		nov-16	nov-16
PF7220 - Definição do Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e socioambientais		nov-16	nov-16
Execução do Programa		mar-16	dez-30
Processos		mar-16	dez-30
PF8410 - Processo de gestão de programas socioeconômicos e socioambientais		mar-16	dez-30
Encerramento do Programa		out-30	dez-30
PF9410 - Encerramento do Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e socioambientais (captura e formalização de benefícios)		out-30	dez-30



EM BRANCO

PG22/41 – Gerenciamento programas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


- Em andamento detalhamento dos projetos e processos.
- Em fase final de conclusão plano orçamentário de 2017 com data de entrega até 9 de dezembro de 2016, negociado com Comitê Interfederativo.
- Em andamento desenvolvimento dos demais módulos do sistema informatizado de gestão de programas (módulo de gestão de projetos concluído).



EM BRANCO



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Divisão de Apoio Ao Comitê Interfederativo



DESP. ENC. ABERT. 02001.000528/2017-51 DCI/IBAMA

Brasília, 25 de abril de 2017

Ao Arquivo Setorial da GABIN/SETORIAL

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo nº 02001.000974/2017-65. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo para à Divisão de Apoio Ao Comitê Interfederativo.


Atenciosamente,


RENATO MIRANDA CARVALHO
Técnico Administrativo da DCI/IBAMA

EM BRANCO



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial do Gabinete da Presidência - DF



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 26 dias do mês de abril de 2017, procedemos ao encerramento deste volume nº VII do processo de nº 02001.000974/2017-65, contendo 149 folhas. Abrindo-se em seguida o volume nº VIII. Assim sendo subscrevo e assino.

RUBENS BATISTA DOS SANTOS
Técnico Administrativo do(a) GABIN/SETORIAL/IBAMA

