





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial do Gabinete da Presidência - DF



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 26 dias do mês de abril de 2017, procedemos a abertura deste volume nº VIII do processo de nº 02001.000974/2017-65, que se inicia com a página nº 1133. Para constar subscrevo e assino.

RUBENS BATISTA DOS SANTOS
Técnico Administrativo do(a) GABIN/SETORIAL/IBAMA



DIGITALIZADO NO IBAMA

DICAD/COAPS/CGEAD


Em 16/01/2017

Às 14:15 horas

Wameli

Assinatura

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Tipo: <u>Protocolo</u>
Nº. 02001.00 <u>0753</u> /2017- <u>97</u>
Recebido em: <u>16/1/2017</u>
Assinatura <u>Wameli</u>



Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2017

AO I. COMITÊ INTERFEDERATIVO

A/C: ILMA. SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO
SCEN Trecho 2 – Ed. Sede – Caixa Postal nº 09566
Brasília/DF – CEP: 70818-900

À PROMOTORIA DE TUTELA DE FUNDAÇÕES

A/C: DRA. VALMA CUNHA
COORDENADORA DA PROMOTORIA E CURADORA DE FUNDAÇÕES
Rua Timbiras, 2928 - 9º Andar, bairro Barro Preto.
Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140-062

REF.: Relatório Mensal Referente aos Programas e Ações Previstos no TTAC em Cumprimento da Cláusula 192


Prezada Senhora Presidente do Comitê Interfederativo,

FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 25.135.507/0001-83, e com sede na Avenida Getúlio Vargas, 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("**FUNDAÇÃO**") vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor o quanto segue.

Como é de conhecimento de V. Sa., nos termos da Cláusula 192 do *Termo de Transação e Ajuste de Conduta*, firmado em 2 de março de 2016 ("**TTAC**"), a **FUNDAÇÃO** deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os programas e ações previstos no âmbito do TTAC.

Nesse sentido, para cumprir com a obrigação prevista na Cláusula 192 do TTAC, a **FUNDAÇÃO** apresenta, neste ato, o relatório mensal de acompanhamento relativo ao mês de janeiro

EMBRANCO



de 2017, contendo informações atualizadas sobre dos programas e ações previstos no TTAC executados até o fim do mês de dezembro de 2016.

A **FUNDAÇÃO** mantém-se à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.


Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA

RIVALDO VILELA


GERENTE DE GOVERNANÇA DE PROGRAMAS

EMBRANCO



FUNDAÇÃO **renova**

reparar, restaurar, reconstruir




EMBRANCO



Relatório mensal – Comitê interfederativo
Termo de transação e ajustamento de conduta

Dezembro de 2016




EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO


Segurança



Taxa de acidentes registrados (acidentes/milhão de horas trabalhadas)

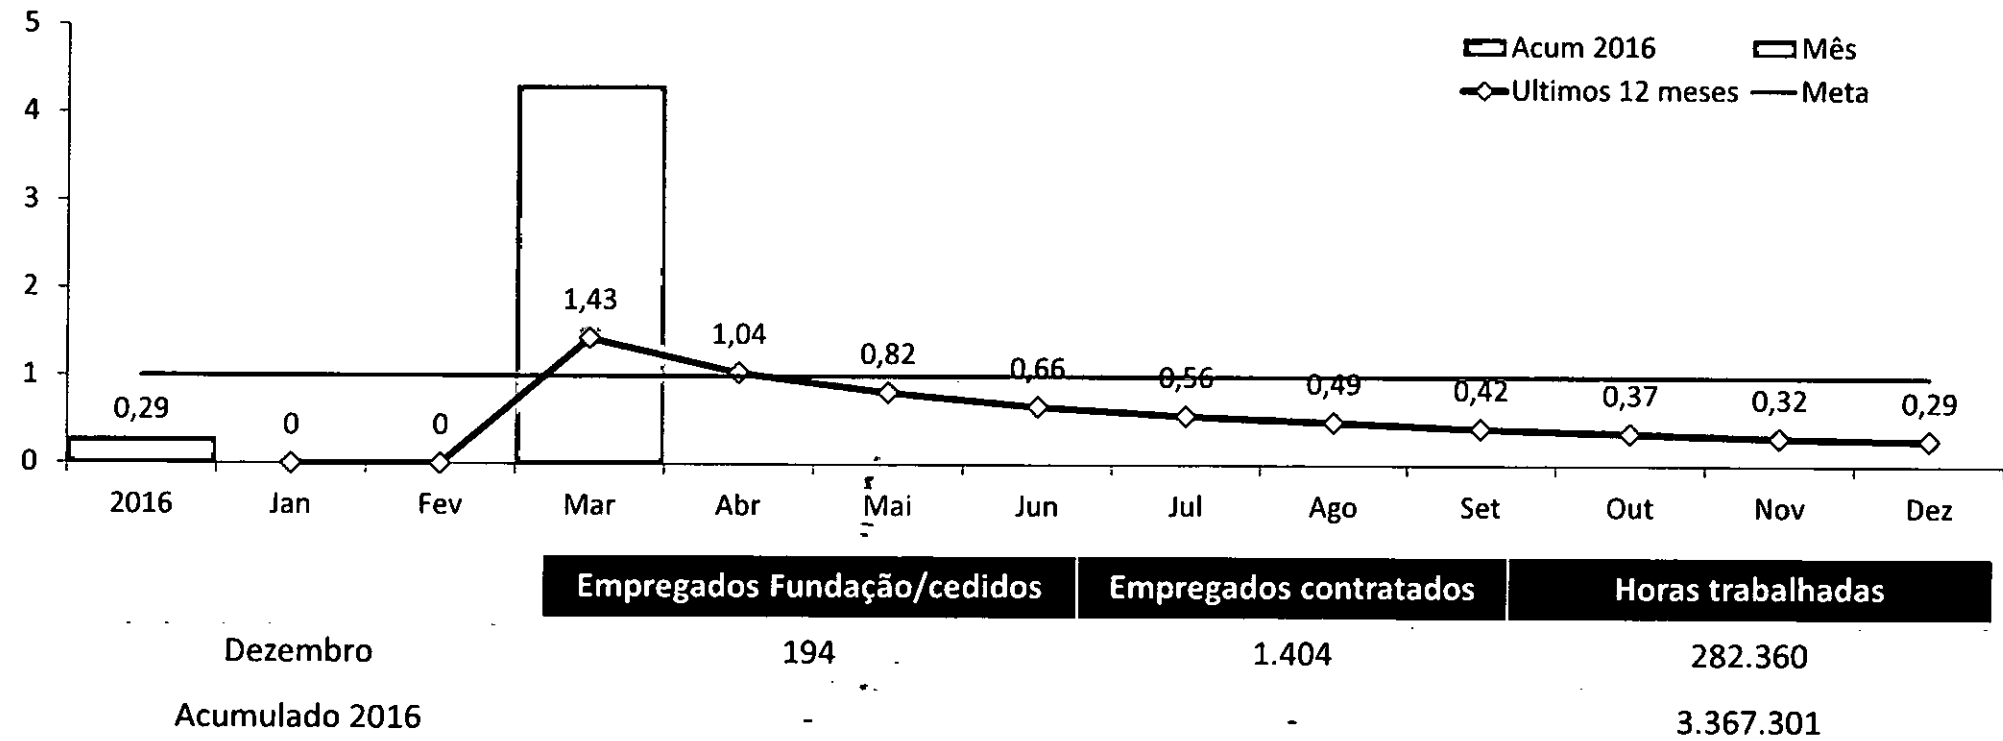

- Nenhum registro de acidente em dezembro nas obras da Fundação (obras do PG9 e PG24 não estão sendo consideradas, pois estão sob responsabilidade da Samarco)



EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Desembolso realizado/previsto




CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM			
	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais	194,7	157,8	19,5	17,4
Programas socioeconômicos	2966,1	689,2	1112,4	1164,5
Programas socioambientais	4775,7	630,6	762,3	3382,8
Saldo medidas compensatórias	1536,9			1536,9
Total	9473,4	1477,6	1894,2	6101,6

CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM			
	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas reparatórias	5642,2	1456,7	1312,5	2873,0
Medidas compensatórias ¹	3831,2	20,9	581,7	3228,6
Total	9473,4	1477,6	1894,2	6101,6

Comentários

- Valores previstos para os próximos anos reavaliados pelo processo de orçamento de 2017.

(1) Inclui saldo de medidas compensatórias




EM BRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Programas socioeconômicos



- **Levantamento e cadastro:** recebido nota técnica da assessoria dos impactados (Cáritas). Fundação responderá dentro do prazo acordado de 60 dias. Retomado o processo de cadastramento em Barra Longa.
- **Ressarcimento e indenização:** pagamento indenizatório por Dano Moral da Água de 2.639 beneficiários (1.202 em Governador Valadares e 1.437 em Colatina). Iniciado atendimento para o processo de Indenização Mediada por Danos Gerais em Linhares e em Governador Valadares para o grupo de areeiros;
- **Reassentamento:** inaugurada em 7/12 Escola de Gesteira. Validado, com 70% de presença das famílias elegíveis, levantamento de expectativas para elaboração do projeto urbanístico conceitual de Paracatu de Baixo. Realizada reunião com Prefeitura Municipal para tratar do projeto urbanístico de Bento Rodrigues, com presença da Comissão e Cáritas. Em andamento projetos básicos dos sistemas de água e esgoto, canteiros de obras e novos acessos a Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e andamento dos estudos do terreno para reassentamento da comunidade de Paracatu de Baixo;
- **Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves:** 602 mil m³ dragados dos 400m;
- **Recuperação das infraestruturas – principais obras entregues:** recuperação do Campo Barralenguense; reforma do telhado do posto de saúde de Mariana (UBS); “Academia Popular Comunitária” e parque comunitário em Ponte do Gama;
- **Reintegração da comunidade escolar:** elaborada TR para contratação de consultoria em psicopedagogia em conjunto com as secretarias de educação de Mariana e Barra Longa;
- **Diversificação da economia regional:** retomada a avaliação e discussão do projeto Mariana 2030 que tem o objetivo apontar alternativas para a diversificação da economia daquela região.
- **Estímulo à contratação local:** contratação da empresa DVF para avaliação dos potenciais de desenvolvimento de mercado e de contratação local.
- **Atividades agropecuárias:** assinado em 19/dez/16 contrato de assistência/parceria técnica com a EMATER.




EM BRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Programas socioambientais



- **Manejo de rejeitos:** apresentação e entrega da proposta de Termo de Referência de Análise de Risco à Saúde Humana e Ecológico para FEAM, SEMAD, IBAMA e IEMA. Emitidos os relatórios dos testes de lixiviação cinéticos e da avaliação da presença de metais nas planícies de inundação;
- **Recuperação da área ambiental 1:** recuperação de 60 tributários, execução de 52% das obras de reconformação das calhas e controle de erosão das áreas prioritárias. Início do plantio do teste piloto em 3 propriedades afetadas;
- **Recuperação de APPs:** avaliação do TR de Definição de Critérios de Priorização de Áreas para Recuperação Ambiental na Bacia do Rio Doce elaborado pelo CT-FLOR. Enviada resposta ao CT-FLOR/CIF em consideração ao TR solicitando aumento do prazo de execução pré-estabelecido em função da complexidade dos estudos. Elaborado escopo de contratação dos serviços baseado no TR para início do processo de contratação;
- **Recuperação de 500 nascentes 1º ano:** 204 produtores rurais cadastrados; 513 nascentes cadastradas e com projeto técnico elaborado; distribuídos insumos para cercamento de 354 nascentes; 154 nascentes cercadas; plantio realizado em 4 nascentes.
- **Conservação da biodiversidade:** formalizada a contratação da Econservation para a execução completa do TR encaminhado pelo ICMBio, que já foi mobilizada, aguardando autorização do IBAMA para a realização das coletas. Recebido o TR para a Cláusula 165.
- **Fauna e flora terrestre:** aprovado o Plano de Trabalho enviado ao IBAMA, na CT de Biodiversidade, para atendimento a notificação relacionada a fauna terrestre.
- **Coleta e tratamento de esgoto:** realizado, no dia 28 de dezembro de 2016, o depósito no valor de R\$ 51.895.016,76 referente ao valor de R\$50 milhões estabelecido pelo item I da Cláusula 170 corrigidos pela variação do IPCA;
- **Emergência ambiental:** foram treinadas as equipes de operação no sistema de supervisão Vektra das sirenes de emergência e da equipe de automação no sistema de alerta de emergência;




EMBRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO

Programas socioambientais



- **Melhoria sistema de abastecimento de água:** comissionamento da ETA de Cachoeira Escura em Belo Oriente e da ETA móvel em Regência. Concluída a construção da adutora no rio Pancas em Colatina. Concluída a contratação de especialistas, NHC e Prof. Tucci, para elaboração do escopo do estudo técnico de avaliação de oferta hídrica dos mananciais superficiais e subterrânea;
- **Centros de informação para a população:** implantados 12 centros de informação em sinergia com os postos de atendimento;
- **Unidades de conservação:** foram identificadas mais 35 UCs com aprovação do CIF para que seja realizada a avaliação de impacto sobre estes ambientes;
- **Gestão de riscos:** realizado vistorias em campo às barragens Germano e estruturas, Santarém e Cava de Germano). Entrega dos estudos de riscos relacionados às captações de água (Bruma e Matipó). Próxima etapa: Vistoria em campo aos minerodutos com previsão para semana do dia 16/01/2017;
- **Monitoramento Hídrico:** coletas de água para análises dos coloides 12 a 16/12 no dique S3. Protocolo do estudo das áreas irrigadas pelo Rio Doce, conforme descrito na cláusula 180 do TTAC. Protocolo junto ao CIF / CTSHQA do plano de monitoramento permanente, conforme descrito na cláusula 177 do TTAC e de intervenções do PRAI (água e sedimentos), conforme descrito na cláusula 178 do referido documento;
- **Cadastro ambiental rural e programa de regularização ambiental:** fechada parceria com a UFV para aplicação de diagnóstico de CAR / ISA (35 pessoas) e assinado contrato com a EMATER;
- **Informações georreferenciadas:** disponibilizados dados no WebGis dos órgãos ambientais, para análise e início de utilização. Realizado no início de dezembro um esforço conjunto com o IBAMA para verificação de necessidades e posterior adequação da ferramenta ao que os órgãos necessitam.




EMBRANCO

ÍNDICE

Socioeconômico



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	010
Organização social	PG01 – Levantamento e cadastro	012
	PG02 – Ressarcimento e indenização	016
	PG03 – Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	018
	PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	021
	PG05 – Proteção social	023
	PG06 – Diálogo social	025
	PG07 – Assistência aos animais	032
Infraestrutura	PG08 – Reconstrução de vilas	034
	PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	040
	PG10 – Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas	047
Educação, cultura e lazer	PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	061
	PG12 – Memória histórica, cultural e artística	064
	PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer	071
Saúde	PG14 – Saúde física e mental da população impactada	073
Inovação	PG15 – Tecnologias socioeconômicas	075
Economia	PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	077
	PG17 – Retomada das atividades agropecuárias	079
	PG18 – Diversificação da economia regional	082
	PG19 – Micro e pequenos negócios	084
	PG20 – Estímulo à contratação local	087
	PG21 – Auxílio financeiro emergencial	089
Gestão	PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários	091
	PG22/41 – Gerenciamento programas	148




EM BRANCO

ÍNDICE

Socioambiental



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	093
Gestão rejeitos e qualidade água	PG23/PG25 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1	095
	PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios.....	103
Restauração florestal	PG26/PG27 – Recuperação de APPs / Recuperação de nascentes	108
Conservação da biodiversidade	PG28 – Conservação da biodiversidade	111
	PG29 – Recuperação da fauna silvestre	113
	PG30 – Fauna e flora terrestre	115
Segurança hídrica e qualidade água	PG31 – Coleta e tratamento de esgoto	117
	PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água	119
Educação, comunicação e informação	PG33 – Educação ambiental	126
	PG34 – Emergência ambiental	129
	PG35 – Informação para a população	132
	PG36 – Comunicação nacional/internacional	135
Preservação e segurança ambiental	PG37 – Gestão de riscos ambientais	137
	PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce	139
Gestão e uso sustentável da terra	PG39 – Unidades de conservação	143
	PG40 – CAR e PRAs	145
Gestão	PG22/41 – Gerenciamento programas	148




EM BRANCO

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM			
		Definição	Exec.	Encerr.	Total	Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais					195,1	158,2	19,5	17,4
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov/15	jan/17	jun/19	out/19	37,5	24,3	9,9	3,3
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	jan/17	out/19	jan/20	228,5	18,0	177,7	32,8
PG003 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	mar/16	nov/18	mai/19	dez/19	92,5	12,6	40,1	39,8
PG004 - Outros povos e comunidades tradicionais	ago/16	jun/18	jun/18	set/18	1,5	0,0	1,5	
PG005 - Proteção social	abr/16	jul/17	abr/19	jun/19	3,3	0,3	1,1	1,9
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	213,0	19,2	27,9	165,9
PG007 - Assistência aos Animais	mar/16	nov/16	jan/20	abr/20	22,0	11,8	3,3	6,9
PG008 - Reconstrução de vilas	nov/15	out/16	mar/22	mar/22	305,5	25,1	68,7	211,7
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov/15	nov/16	jul/18	out/18	341,0	111,8	164,9	64,3
PG010 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	nov/15	out/16	ago/18	ago/18	313,6	223,2	55,4	35
PG011 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	jan/16	fev/17	mar/21	mai/21	9,0	0,3	2,7	6
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev/16	jul/17	dez/21	mar/22	30,0	10,5	8,5	11
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	jul/16	fev/18	dez/22	mar/23	25,7	1,4	2,5	21,8
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov/15	mar/17	nov/25	nov/25	138,5	19,2	16,2	103,1
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	jan/17	jan/18	dez/19	mar/20	49,1	0,2	2,6	46,3
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	dez/15	out/16	dez/25	mar/26	184,0	16,3	24,4	143,3
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	jul/16	abr/17	abr/20	jul/20	21,3	0,9	0,8	19,6
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov/15	fev/17	jun/20	set/20	491,5	186,4	164,3	140,8
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun/16	dez/16	dez/19	dez/19	42,4	0,4		42
Total medidas reparatórias					2744,9	840,0	792,0	1132,9



EMBRANCO


PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	jan/17	out/19	jan/20	343,6	7,0	336,6	
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	fev/17	jul/17	nov/24	fev/25	7,6	0,0	0,1	7,5
PG018 - Diversificação da Economia Regional	dez/16	jul/17	out/30	out/30	63,3	0,0	3,1	60,2
PG020 - Estimulo à Contratação Local	jun/16	mai/17	jun/21	jun/21	1,5	0,0	0,3	1,2
Total medidas compensatórias					416,0	7,0	340,1	68,9

11/11/16




EM BRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 37,5	Realizado: 24,3		
Tarefa		% Real.	Início	Término	
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)					
Metas do Programa			nov-15	out-19	
			out-16	abr-17	
Cláusulas 19 e 24 - Término do cadastramento e levantamento das perdas materiais dos Impactados* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa			mar-17	mar-17	
Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa			abr-17	abr-17	
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo			100%	out-16	out-16
Definição do Programa			jun-16	jan-17	
Execução do Programa			nov-15	jun-19	
Projetos			nov-15	set-17	
PF0173 - Levantamento e Cadastro Campanha 1 - Rio Doce			nov-15	set-17	
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)			100%	nov-15	jul-16
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				ago-16	jan-17
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				set-16	mar-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				dez-16	abr-17
PF0174 - Levantamento e Cadastro - Campanha 2 - Rio Doce (a definir)				jan-17	jan-17
PF0175 - Levantamento e Cadastro - Mariana				nov-15	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)			100%	nov-15	jul-16
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				jul-16	abr-17
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				mar-17	jun-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				abr-17	jul-17
PF0176 - Levantamento e Cadastro - Barra Longa				nov-15	set-17
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)			100%	nov-15	jul-16
Execução do Cadastro Socioeconômico Definitivo - (Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				jun-16	jan-17
Execução do Levantamento de Perdas Materiais - (Agendamento, Coleta, Organização e Tratamento de Dados)				ago-16	mar-17
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo				jan-17	mai-17
Encerramento do Programa				jun-19	out-19



EM BRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Término do Cadastramento Socioeconômico - Exceção de Barra Longa e Mariana	23/dez	23/dez
Cadastro Mariana – Início do cadastro dos impactados (depende da consultoria para apoio as comunidades)	01/fev	01/fev

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Famílias cadastradas emergencialmente (#)	NA	8.515	NA
Pessoas cadastradas emergencialmente (#)	NA	29.614	NA
Cadastros definitivos indexados (#) ¹	16.000	13.738	16.000
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 (#) ¹	16.000	12.333	16.000
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 (#) ¹	1.161	1.243	1.250
Cadastros definitivos aprovados internamente (#) ¹	4.630	2.021	16.000
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF (#) ¹	1.618	0	16.000

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) / Comitê Interfederativo (CIF):

- Realização da 7ª reunião com CTOS em 06/12/16;
- Envio do Lote 003 de informações do Cadastro Integrado para CTOS/CIF – 21/12/16;
- Revisão da lista de pessoas não localizadas, na base de manifestações até 30/10/16.


Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:

- Recebido o parecer da assessoria técnica dos impactados (Cáritas). Fundação terá até 60 dias para se manifestar;
- Retomada do cadastro em Barra Longa iniciada. Após reunião do dia 22.11.16 em Barra Longa, entre MP, grupo de impactados e Fundação Renova, ficou decidido que os trabalhos poderiam ser retomados no município com quem desejar dar prosseguimento e, com a chegada da assessoria no município, o trabalho poderá ser revisitado.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos;
- Entrega dos formulários preenchidos.

(1) Não inclui Barra Longa e Mariana



EMBRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro

Acompanhamento




AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Base de dados e Documentação:

- Consolidação dos protocolos de consistência;
- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros.

(1) Não inclui Barra Longa e Mariana



EM BRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro

Fotos




Aplicação de Cadastro Fase 1 - Santana do Paraíso



Entrega de Cadastro – Belo Oriente

Aplicação de Cadastro Fase 1 – IPABA



Mobilização para Cadastro – Amoreás




EM BRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 572,1	Realizado: 25		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG002-R/C Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 à 38)		dez-15	jan-20	
Metas do Programa		jun-17	jul-17	
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)		jun-17	jun-17	
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO impactada pelo PG001)* - Excetuando-se Mariana e Barra Longa		jul-17	jul-17	
Definição do Programa		jan-17	jan-17	
Execução do Programa		dez-15	out-19	
Projetos		mar-16	out-17	
PF0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS		mar-16	out-17	
Planejamento da Execução		mar-16	out-16	
Projeto em Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares	100%	mar-16	jul-16	
Projeto nas Demais Áreas (excetuando-se Mariana e Barra Longa)	100%	jun-16	out-16	
Execução do Projeto		mai-16	ago-17	
Implantar Centros de Negociação - Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Baixo Guandú e Linhares	97,94%	mai-16	dez-16	
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)	6%	out-16	fev-17	
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		out-16	jul-17	
Efetuar os Pagamentos de Indenizações* (Excetuando-se Mariana e Barra Longa)		nov-16	ago-17	
Encerramento do Projeto		jul-17	out-17	
Processos		dez-15	out-19	
PF8020 - Ações Emergenciais de Adiantamento de indenizações e reposições de veículos e ferramentas de trabalho aos IMPACTADOS		dez-15	jan-17	
PF8021 - Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes, para IMPACTADOS que não aderirem ao programa até abr/17 e demais negociações		jul-17	out-19	
Encerramento do Programa		out-19	jan-20	



EMBRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Início dos Pagamentos de Indenizações em B. Guandu- Fase 01	17/jan	01/fev
Início da Operação dos Escritórios da Fase 02	12/dez	30/jan

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Atendimento acumulado em 2016: 28.711 beneficiários com propostas geradas, sendo 19.618 Governador Valadares e 9.093 em Colatina;
- Propostas de acordos aceitas, acumulado em 2016: 3.179 beneficiários, sendo 9.439 Governador Valadares e 3.740 em Colatina;
- Pagamento indenizatório por Dano Moral da Água de 2.639 Beneficiários em 2016 sendo, 1.202 em Governador Valadares e 1.437 em Colatina;
- Iniciado atendimento para o processo de Indenização Mediada por Danos Gerais em Linhares;
- Iniciado atendimento para o processo de Indenização Mediada por Danos Gerais em Governador Valadares para o grupo de areeiros;
- Finalizado o processo de contratação dos imóveis para 2ª fase dos escritórios de Danos Gerais;
- 90% do efetivo contratado para operação dos escritórios é composto de mão de obra local.




EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 92,5	Realizado: 12,6		
Tarefa	% Real.	Início	Término	
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 à 45)		mar-16	dez-19	
Metas do Programa		mar-16	out-19	
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	100%	mar-16	mar-16	
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado	100%	abr-16	abr-16	
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak	100%	jul-16	jul-16	
Cláusula 43 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		out-19	out-19	
Cláusula 44 - Diagnóstico Inicial sobre os Tupiniquim e Guarani	100%	mar-16	mar-16	
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	100%	mar-16	mar-16	
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani	100%	jul-16	jul-16	
Cláusula 44 - Detalhamento e Implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)		out-19	out-19	
Definição do Programa		jul-16	nov-18	
Execução do Programa		mar-16	mai-19	
Projetos		jan-17	mai-19	
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak		jan-17	mai-19	
Execução de Infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak		jan-17	jan-19	
Encerramento do Projeto		fev-19	mai-19	
Plano de Ação Permanente Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)		nov-18	nov-18	
(Início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)		nov-18	nov-18	
Processos		mar-16	mai-19	
PF8030 - Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	8%	ago-16	mai-19	
PF8031 - Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Cateira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	88%	mar-16	mai-19	
PF8032 - Tupiniquim e Guarani (Combolos) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	79%	mar-16	mai-19	
PF8033 - Fornecimento Emergencial de Água - Krenak	7%	ago-16	fev-19	
Encerramento do Programa		out-19	dez-19	
PF9030 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (captura e formalização de benefícios)		out-19	dez-19	



EMBRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Geral:

- Recebimento da devolutiva da FUNAI sobre o Plano de Trabalho do Estudo de Componente Indígena e ajustes para reencaminhamento;
- Rotina de diálogo sobre principais pautas apresentadas pelos povos indígenas em Aracruz;

TI Krenak:


- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Manutenção das estradas para abastecimento de água
- Visitas Técnicas na terra indígena Krenak.
- Recuperação dos acessos em ocasião as fortes chuvas.

TI Comboios:

- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Reunião com lideranças indígenas para Prestação de Contas
- Reunião de Diálogo sobre aumento de famílias na Terra Indígena
- Visita técnica na Terra Indígena Comboios

TI Caieiras Velhas:


- Manutenção das ações de assistência emergencial
- Monitoramento dos recursos hídricos (Piraque-açu, Guaxintaba e Sahy)
- Reunião com lideranças indígenas para Prestação de Contas e diálogo permanente.



EMBRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas


Fotos

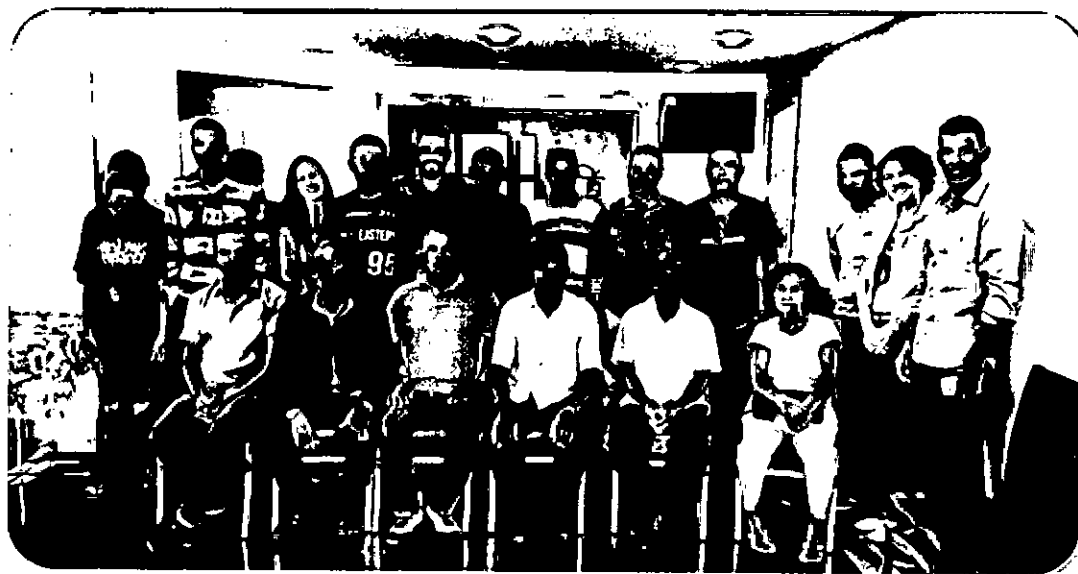

Reunião Diálogo Aumento Famílias - TI Comboios



Visita Técnica Associação TI Comboios




EM BRANCO

PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 1,5	Realizado: 0
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG004-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (Cláusulas 46 à 53)			
Metas do Programa		ago-16	set-18
		jan-17	jun-18
Cláusula 46 - Entrega do Termo de Referência pela FCP (nova emissão)		jan-17	jan-17
Cláusula 46 - Contratação de Estudo sobre os Quilombolas		abr-17	abr-17
Cláusula 46 - Detalhamento de um Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		jun-18	jun-18
Cláusula 46 - Início da Execução do Plano de Ação Permanente - Quilombolas (depende do resultado do estudo)		jun-18	jun-18
Definição do Programa		ago-16	jun-18
Execução do Programa (a definir)		jun-18	jun-18
(Não prevista nenhuma ação além do Estudo)		jun-18	jun-18
Encerramento do Programa		jun-18	set-18
PF9040 - Encerramento do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais (captura e formalização de benefícios)		jun-18	set-18



EM BRANCO

PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Reunião presencial com a Fundação Cultural Palmares em Brasília para discussão dos resultados das visitas técnicas realizadas;
- Contatos telefônicos com a Fundação Palmares para entendimentos sobre a liberação do termo de referencia para estudos quilombolas.




EMBRANCO

PG05 – Proteção social Masterplan



(Orçamento (R\$MM)) - Total: 3,3 Realizado: 0,3			
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 à 58)			
Metas do Programa		abr-16	jun-19
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social	100%	abr-16	abr-16
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		abr-19	abr-19
Definição do Programa		nov-16	jul-17
Execução do Programa		abr-16	abr-19
Processos		abr-16	abr-19
PF8050 - Plano de Ações Emergenciais Socioassistenciais de Proteção Social	39%	abr-16	jul-17
PF8051 - Plano de Ações Socioassistenciais de Proteção Social (36 meses após o início conforme Acordo)		jul-17	abr-19
Encerramento do Programa		abr-19	jun-19
PF9050 - Encerramento do Programa de Proteção Social (captura e formalização de benefícios)		abr-19	jun-19



EM BRANCO

PG05 – Proteção social

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da elaboração do plano de qualificação	03/fev	03/fev

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Acompanhamento das ações demandadas à Fundação pela equipe do CRAS (Mariana);
- Realização de reuniões de alinhamento com equipe do CRAS e RECRIA (Mariana);
- Encaminhamento de casos para rede pública: saúde, educação e assistência social (Mariana);
- Discussão sobre o Programa de Idosos do Recria Vida (Mariana);
- Ajustes do Termo de Referência para contratação da Consultoria para o programa de Proteção Social, em acordo com discussões da CTOS.



EM BRANCO


PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Masterplan



Orçamento (R\$MM) Total: 213 Realizado: 19,2

Tarefa	% Real.	Início	Término
PG006-R Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 a 72)		nov-15	dez-30
Metas do Programa		dez-16	mai-17
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO		dez-16	dez-16
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria		mai-17	mai-17
Definição do Programa		out-16	jan-17
Execução do Programa		nov-15	dez-30
Processos		nov-15	dez-30
Marcos de Processo		dez-16	jun-17
PF8060 - Processo emergencial de comunicação institucional		ago-16	jun-17
PF8061 - Processo emergencial de participação e diálogo		jul-16	mar-17
PF8062 - Processo emergencial de canais de relacionamento		jul-16	jul-17
PF8063 - Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO		nov-15	jun-17
PF8064 - Processo estruturado de comunicação institucional		jun-17	dez-30
PF8065 - Processo estruturado de participação e diálogo		mar-17	dez-30
PF8066 - Processo estruturado de canais de relacionamento		jul-17	dez-30
PF8067 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO		mai-17	dez-30
Projetos		mai-16	mai-17
PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO		mai-16	mai-17
Planejamento - Diagnóstico do processo de ouvidoria		jul-16	jan-17
Execução - Implantação e adequação do processo de ouvidoria		set-16	mai-17
PF0170 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento		mai-16	abr-17
Execução do Projeto		mai-16	mar-17
Reestruturação da Gestão do Processo	100%	mai-16	jul-16
Criação dos novos Postos de Atendimento e Readequação do Processo	16%	mai-16	mar-17
Reestruturação do Sistema	74%	mai-16	fev-17
Encerramento do Programa		out-30	dez-30
PF9060 - Encerramento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (captura e formalização de benefícios)		out-30	dez-30



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Pilar Ouvidoria: Contratação da função Ouvidor (Fundação)	30/out	15/dez

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Manifestações registradas	NA	64.948	NA
Manifestações concluídas	NA	45.852	NA
Reuniões – trecho Mariana à Santa Cruz	NA	471	NA
Reuniões – trecho Rio Doce	NA	387	NA
Postos de atendimento	14	12	14


AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Canais de Relacionamento

- Postos de atendimentos: 12 escritórios em operação;
- Foram registradas 8.111 manifestações no mês de dezembro.

Diálogo

- Mapeamento/ Monitoramento de stakeholders;
- Plano de Contingência do período chuvoso: 04 reuniões com comunidades impactadas e 06 reuniões com poder público local;
- Atividades de análise territorial estratégica para apoio à implementação dos programas da Fundação Renova e às interações sociais;
- Ampliação do diálogo com as comunidades impactadas nos municípios de MG e ES, por meio de reuniões e atendimentos individualizados/ visitas;
- Realização de Grupos de Trabalho com foco no reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu;
- Realização de Reuniões com Comunidades – Prestação de Contas de 2016.
- Número de reuniões no mês: 55 (25 Mariana, 6 Barra Longa, 2 Rio Doce e Santa Cruz e 22 Trecho Rio Doce)
- Número de participantes no mês: 1.833 (677 Mariana, 284 Barra Longa, 78 Rio Doce/Santa Cruz, 432 Trecho Rio Doce)



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social


Acompanhamento – Comunicação social



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Comunicação Social

- Principais eventos e ações externas:;
 - ✓ Entrega da Escola Gustavo Capanema, de Gesteira, em Barra Longa (MG);
 - ✓ Apoio à comemoração do Dia de Nossa Senhora da Conceição, em Gesteira (Barra Longa / MG);
 - ✓ Distribuição de peças de comunicação sobre a Central de Relacionamento (0800) e Ouvidoria, em Governador Valadares (MG).
- Período Chuvoso:
 - ✓ Planejamento das ações de comunicação digital para o período chuvoso;
 - ✓ Alinhamento com Defesa Civil Estadual de MG sobre as ações de comunicação a serem desenvolvidas;
 - ✓ Treinamento de porta-vozes, líderes de frente e profissionais de comunicação das bases;
 - ✓ Entrega de flyer com as ações de prevenção para o período chuvoso para as comunidades durante as reuniões de diálogo social;
 - ✓ Criação de Informativo semanal, em parceria com IGAM e outros órgãos ambientais ("Informativo Rio Doce");
 - ✓ Elaboração de campanhas de contingência;
 - ✓ Produção e alinhamento de mensagens-chave por risco mapeado e região e atualização de Q&A, junto às equipes de Comunicação e Diálogo Social;
 - ✓ Entrega da nova ETA no distrito de Cachoeira Escura, em Belo Oriente (MG).
- Imprensa:
 - ✓ Releases enviados à imprensa: 12;
 - ✓ Posicionamentos/Notas enviadas à imprensa: 13;
 - ✓ Matérias conquistadas: 42.
- Redes sociais:
 - ✓ Início da atuação no You tube (para acervo e conteúdo audiovisual).





EMBRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos




Comunicação Social



Flyer sobre canais de relacionamento, distribuído em GV



Imã de geladeira sobre canais de relacionamento, distribuído em GV



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Comunicação Social



Entrega do flyer período chuvoso em Tumiritinga...




...e em Pedra Corrida (distrito de Periquito), em MG



ETA antiga, Cachoeira Escura (GV)



ETA nova, Cachoeira Escura (GV)




EMBRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Diálogo Social

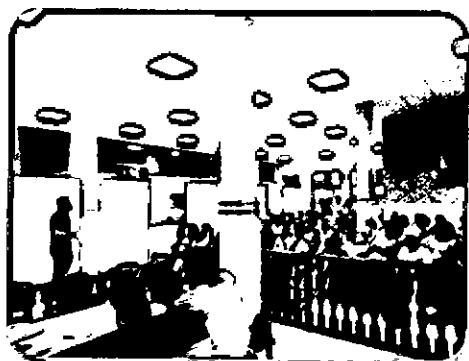


Reunião com Comunidade |
Barra Longa |12/12/2016



Reunião com Comerciantes
|Barra Longa |19/12/2016



Grupo de Trabalho Paracatu | Mariana
|06/12/2016

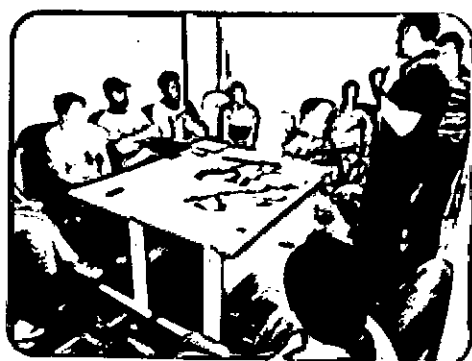


Grupo de Trabalho | Mariana
|07/12/2016




Reunião com Comunidade -
Pedras | Mariana |21/12/2016



Reunião com Comunidade - Campinas |
Mariana |07/12/2016





PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Diálogo Social




Reunião de diálogo com representantes do Poder Público local - Fernando Tourinho/MG (01/12) | Plano de Cheias



Reunião de Diálogo – cadastro integrado - com produtores rurais de Conselheiro Pena/MG (06/12)



Reunião de diálogo com moradores da comunidade de Cachoeira Escura – Belo Oriente/MG (15/12) | Plano de Cheias

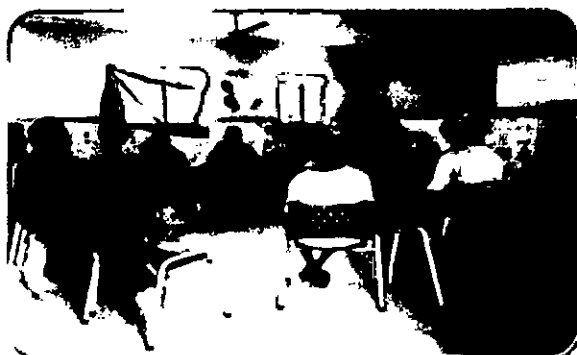


Reunião com moradores da comunidade de Humaitá - Linhares/ES (01/12) | Plano de Cheias



Reunião de diálogo - PIM Água - com representantes de bairros – Colatina/ES (06/12)



Reunião de diálogo - cadastro integrado - com representantes da comunidade - Aracruz/ES (09/12)




EM BRANCO

PG07 – Assistência aos animais Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 22	Realizado: 11,8
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)		mar-16	abr-20
Metas do Programa		jan-20	jan-20
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais		jan-20	jan-20
Definição do Programa		set-16	nov-16
Execução do Programa		mar-16	jan-20
Processos		mar-16	jan-20
Marcos de Processo		out-16	jan-17
PF8070 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)		mar-16	jan-20
Encerramento do Programa		jan-20	abr-20
PF9070 - Encerramento do Programa de Assistência aos Animais (captura e formalização de benefícios)		jan-20	abr-20



EMBRANCO

PG07 – Assistência aos animais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Total

Animais resgatados (#)

NA

1006

NA

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Resgate de 1 animal de grande porte (prontamente devolvido ao responsável);
- Recolhimento de 2 animais de grande porte;
- Devolução de 3 animais de grande porte aos tutores;
- Recolhimento de 2 animais adotados;
- Adoção de 2 animais de pequeno porte;
- Conclusão do processo de contratação de Clínica Veterinária para atendimento cirúrgicos de alta complexidade;
- Conclusão do processo de contratação do serviço de castração de animais (2ª Campanha);
- Acompanhamento de pós adoção de 21 animais;
- Mobilização do contrato de gestão de animais da empresa ERG;
- 22 novos atendimentos aos animais em propriedades rurais;
- Manutenção do programa de visitas dos responsáveis dos animais às fazendas.




EM BRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 305,5	Realizado: 25,1		
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG008-R - Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (Cláusulas 76 à 78)					
Metas do Programa					
				nov-15	mar-22
				mar-19	jun-19
Cláusula 78 - Encerramento da Reconstrução das Vilas				mar-19	mar-19
Cláusula 77j - Conclusão da Disponibilização de moradia temporária após a Reconstrução das Vilas (90 dias após a reconstrução das respectivas vilas)				jun-19	jun-19
Definição do Programa					
				set-16	out-16
Execução do Programa					
				nov-15	mar-22
Projetos					
PF0046 - Reconstrução de Bento Rodrigues					
				nov-15	mai-19
				nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas			100%	nov-15	mai-16
Definição do Escopo					
				mai-16	dez-17
Planejamento da Execução					
				mar-17	abr-18
Execução do Projeto					
				set-16	mar-19
PF0047 - Reconstrução de Paracatu de Baixo					
				nov-15	mai-19
Avaliação de Alternativas - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas			100%	nov-15	set-16
Definição do Escopo					
				set-16	dez-17
Planejamento da Execução					
				abr-17	abr-18
Execução do Projeto					
				out-17	mar-19
Encerramento do Projeto de Infraestrutura e Construção de Casas					
				mar-19	mai-19
PF0048 - Reconstrução da área afetada em Gesteira					
				jun-16	mai-18
Definição do Escopo - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas			12%	jun-16	out-17
Planejamento da Execução - Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas					
				abr-17	out-17
Execução das Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de Casas					
				ago-17	mai-18
PF0049 - Reconstrução da escola, quadra e praça de Gesteira					
				fev-16	jan-17
Planejamento da Execução - Obras de reconstrução da escola			100%	fev-16	jul-16
Execução das obras de reconstrução da escola					
			90%	jul-16	dez-16
Encerramento do Projeto de reconstrução da escola					
				dez-16	jan-17




EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas

Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
Processos		nov-15	mar-22
PF8081 - Processo de disponibilização de moradia temporária Bento Rodrigues (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
PF8082 - Processo de disponibilização de moradia temporária Paracatú de Baixo (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	jun-19
PF8083 - Processo de disponibilização de moradia temporária Gesteira (até 3 meses após construção das vilas)		nov-15	ago-18
PF8084 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Bento Rodrigues (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
PF8085 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Paracatú de Baixo (até 36 meses após construção das vilas)		mar-19	mar-22
PF8086 - Processo de acompanhamento do reassentamento de Gesteira (até 36 meses após construção das vilas)		mai-18	mai-21
Encerramento do Programa		dez-21	mar-22
PF9080 - Encerramento do Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (captura e formalização de benefícios)		dez-21	mar-22



EMBRANCO

PG08 – Reconstrução de vilas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão do projeto detalhado de urbanismo do Novo Bento Rodrigues	27/jan	27/jan
Aprovação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade	30/set	31/jan
Aprovação do Projeto Urbanístico de Paracatu de Baixo junto à Comunidade	30/dez	11/jan
Aprovação do Projeto Urbanístico de Gesteira junto à Comunidade	03/nov	-

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Inaugurada Escola de Gesteira, inclusive Revitalização da Praça e Quadra;
- Validado Levantamento de Expectativas para elaboração do Projeto Urbanístico Conceitual, com presença de 70% das famílias elegíveis ao reassentamento de Paracatu de Baixo;
- Iniciado processo de validação do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues junto à Comunidade;
- Realizada reunião com Prefeitura Municipal para tratar do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues, com presença da Comissão e Cáritas;
- Realizada reunião com Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) para tratar das estratégias de licenciamento para reassentamento das Comunidades;
- Em andamento projetos básicos dos Sistemas de Água e Esgoto, Canteiros de Obras e Novos Acessos a Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo;
- Em andamento Estudos de Impacto Ambiental nos terrenos escolhidos para reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo;
- Em andamento Estudos do Terreno (geologia em andamento) para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo;
- Apresentado parecer técnico da Cáritas para consolidação do formulário para início do cadastro socioeconômico em Fevereiro.



EMBRANCO

PG008 – Reconstrução de Vilas


Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Próximas ações:

- Aprovação do Projeto Urbanístico Conceitual de Bento Rodrigues junto à Comunidade, e inícios dos Anteprojeto de Urbanismo e Processo de Aprovação do Loteamento junto à Prefeitura;
- Início da elaboração do Projeto Urbanístico Conceitual de Paracatu de Baixo, para aprovação junto à Comunidade até Março;
- Aprovação, junto ao Conselho Curador, para aquisição das áreas para reassentamento de Paracatu de Baixo e início do processo de compra e regularização fundiária junto aos proprietários;
- Conclusão dos projetos básicos e início dos projetos executivos dos Sistemas de Água e Esgoto, e Novos Acessos a Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo;
- Conclusão dos Estudos do Terreno (geologia em andamento) para reassentamento da Comunidade de Paracatu de Baixo;
- Prosseguimento dos Estudos de Impacto Ambiental nos terrenos escolhidos para reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo;
- Mediação, pelo MPMG, junto ao proprietário da área escolhida pela Comunidade para reassentamento de Gesteira, devido à recusa deste na conclusão da negociação.






EMBRANCO

PG008 – Reconstrução de Vilas

Fotos



Oficina piloto para aprovação do projeto urbanístico de Bento Rodrigues

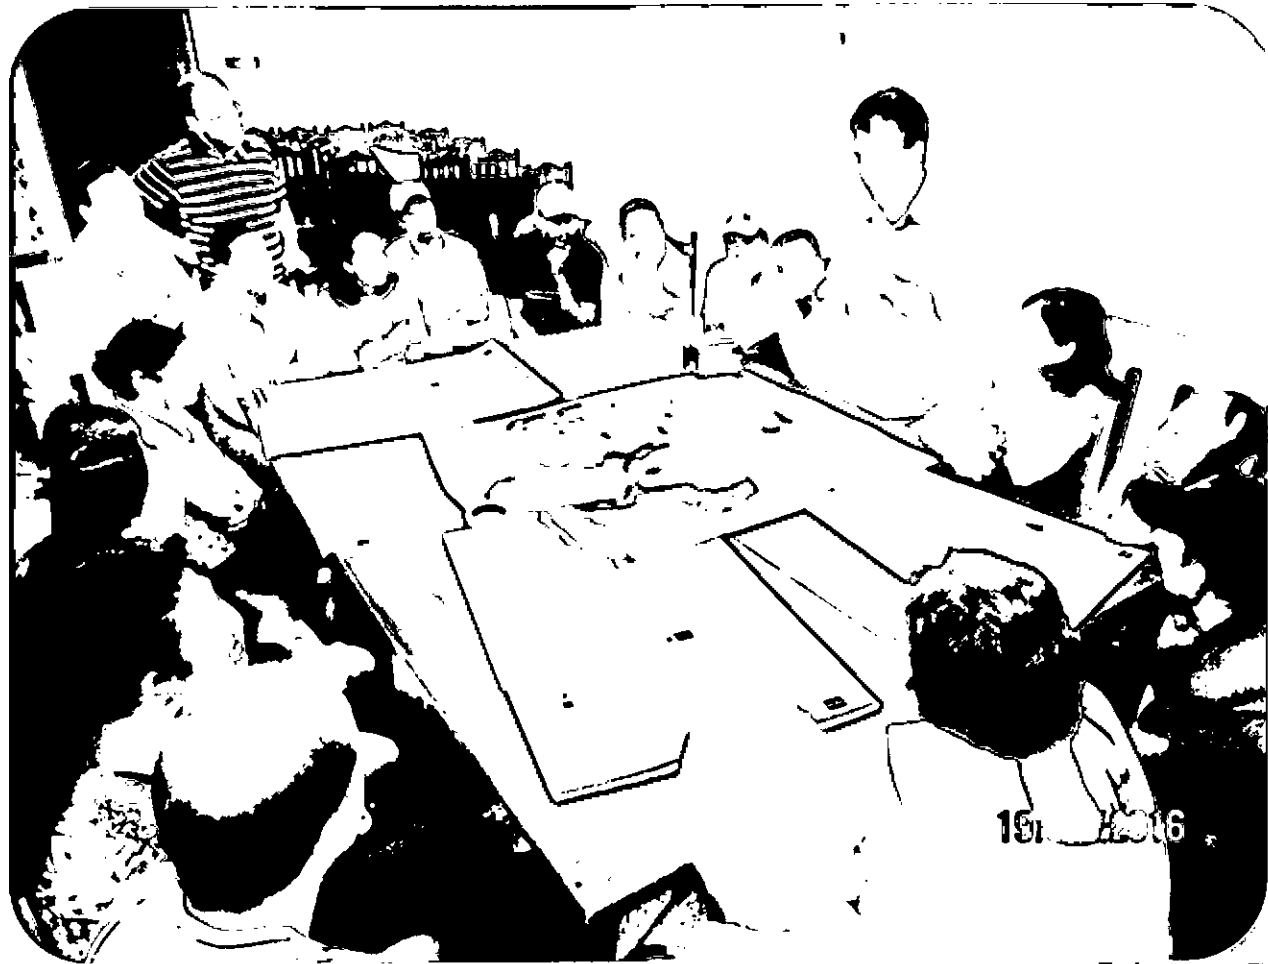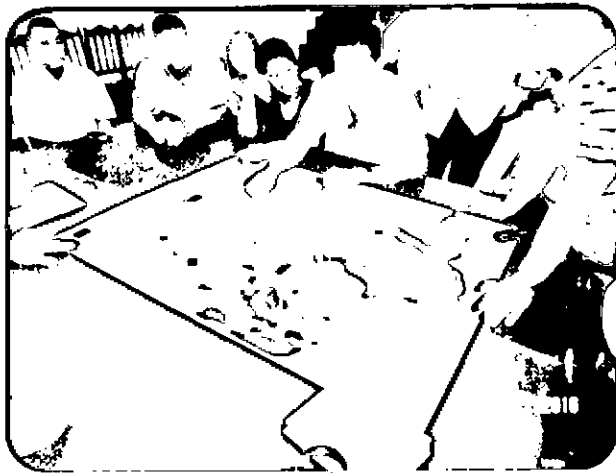


EMBRANCO

PG008 – Reconstrução de Vilas

Fotos



Validação do Levantamento de Expectativas de Paracatu de Baixo



EMBRANCO

PROGRAMA SOB RESPONSABILIDADE DA SAMARCO




O programa *PG09 – Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves* apresentado a seguir está sob responsabilidade e permanecerá sendo executado pela Samarco até a conclusão da primeira fase.

Dessa forma a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude das informações apresentadas.

A sua presença neste documento é apenas de caráter informativo.

A Fundação assumirá a responsabilidade pelo seu desenvolvimento a partir da conclusão da primeira fase do programa.




EM BRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 341	Realizado: 111,8
Tarefa	% Real.	Início	Término
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 à 81)			
Metas do Programa		abr-18	abr-18
Cláusula 79 - Recuperação das condições para Retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)		abr-18	abr-18
Definição do Programa		out-16	nov-16
Execução do Programa		nov-15	jul-18
Projetos		nov-15	jul-18
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)		nov-15	jul-18
Execução do Projeto		nov-15	abr-18
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	51,48%	nov-15	jun-17
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m		jun-17	abr-18
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	0%	abr-18	jul-18
Encerramento do Programa		jul-18	out-18
PF9090 - Encerramento do Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (captura e formalização de benefícios)		jul-18	out-18



EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da engenharia detalhada para bombeamento direto para Fazenda Floresta	03/out	12/dez
Conclusão da engenharia detalhada para disposição na pilha externa do Velho Soberbo	15/set	30/nov

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Volume dragado - trecho de 400m (mil m3)	677	602	1.300
Barreira metálica B (à 5 km) (t)	790	473	790

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Setor 4:


- Concluída a engenharia para confinamento de sedimentos à jusante do dique 4A
- Iniciada a adequação da área à jusante para disposição dos bags
- Concluído o lançamento de rochas do vertedor definitivo e sendo preparado para início da concretagem

Setor 8:

- Concluída a análise do projeto pela SNC-Lavalan com a liberação para início das atividades
- Concluída a linha de recalque e a cota média do dique é 317,5 possibilitando o início do bombeamento
- Conexões finais com a draga sendo realizada

Barreira B:

- Altas afluições do Rio Doce ocorridas entre os últimos dias de novembro até meados de dezembro dificultou a conclusão da barreira no prazo inicial
- Em andamento o aterro pela margem direita para conclusão da cravação
- Iniciada a concretagem da proteção de jusante



EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Barreira C:


- Concluído o estudo de remanso determinando a cota de topo na 322
- Em andamento a campanha de sondagem
- Acesso da margem esquerda concluído e em execução o acesso da margem direita

Fazenda Floresta:

- Concluída a aquisição das áreas adicionais dos diques da 354 e 392. Iniciada a investigação geotécnica nestas áreas
- Emitido o projeto conceitual da planta de desagramento
- Concluída a engenharia executiva da pilha A e em andamento a engenharia da pilha B

Dragagem:


- Aporte nos 400m até o dia 27/12 era de 0,265hm³
- Andamento da dragagem prejudicado em função da baixa capacidade do setor 5 e elevado índice de turbidez na saída deste setor



EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Mapa Geral



Fazenda Floresta
 (Eixo 2 cota 390
 e eixo 3 cota 352)

IBRAM/RESI
 Proc. FLS. 1199
 RUA

EMBRANCO

EMBRANCO

PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Fotos



Setor 4




Fazenda Floresta



Setor 8



Barreira B



EMBRANCO
