

DIGITALIZADO NO IBAMA

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Tipo: **CT**
Nº. 02001. 004 **217/2017-61**
Recebido em: 14/3/2017
Luciana
Assinatura



Belo Horizonte, 14 de março de 2017.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

REF.: Relatório Mensal referente aos Programas e Ações Previstos no TTAC, em Cumprimento da Cláusula 192

Prezada Senhora Presidente do Comitê,

A FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, expor o quanto segue.


Como se sabe, nos termos da Cláusula 192¹ do Termo de Transação e Ajuste de Conduta, firmado em 2 de março de 2016, no âmbito do Processo nº 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“TTAC”), a FUNDAÇÃO deve apresentar, até o décimo dia útil de cada mês, um relatório informativo do andamento de todos os Programas e ações previstos no âmbito do TTAC.

¹ CLÁUSULA 192: Um relatório do andamento de todos esses PROGRAMAS deverá ser enviado mensalmente, no décimo dia útil de cada mês, ao COMITÊ INTERFEDERATIVO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os relatórios devem ser individualizados por PROGRAMA, caso possível, contendo metas e indicadores para cada uma das medidas adotadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Além dos relatórios mensais, deverá ser emitido um relatório anual, até o dia 20 de janeiro de cada ano, o qual terá que ser submetido à validação pela AUDITORIA INDEPENDENTE.

EM BRANCO



reodar - instituiçao - reconstruir

Assim, em atendimento à obrigação prevista na referida Cláusula 192 do TTAC, a FUNDAÇÃO apresenta, neste ato, o Relatório Mensal de acompanhamento relativo ao mês de março de 2017 (Doc. 01), contemplando as informações atualizadas sobre os Programas e ações previstos no TTAC executados até o final do mês de fevereiro de 2017.


Sendo o que nos cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA
CARLOS ANSELMO CENACHI
GERENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

COMING



FUNDAÇÃO
renova



Handwritten text, possibly a signature or date, which is extremely faint and illegible.

Handwritten text, possibly a date or reference number, which is extremely faint and illegible.


EM BRANCO

SUMÁRIO EXECUTIVO


Segurança



Taxa de acidentes registrados (acidentes/milhão de horas trabalhadas)

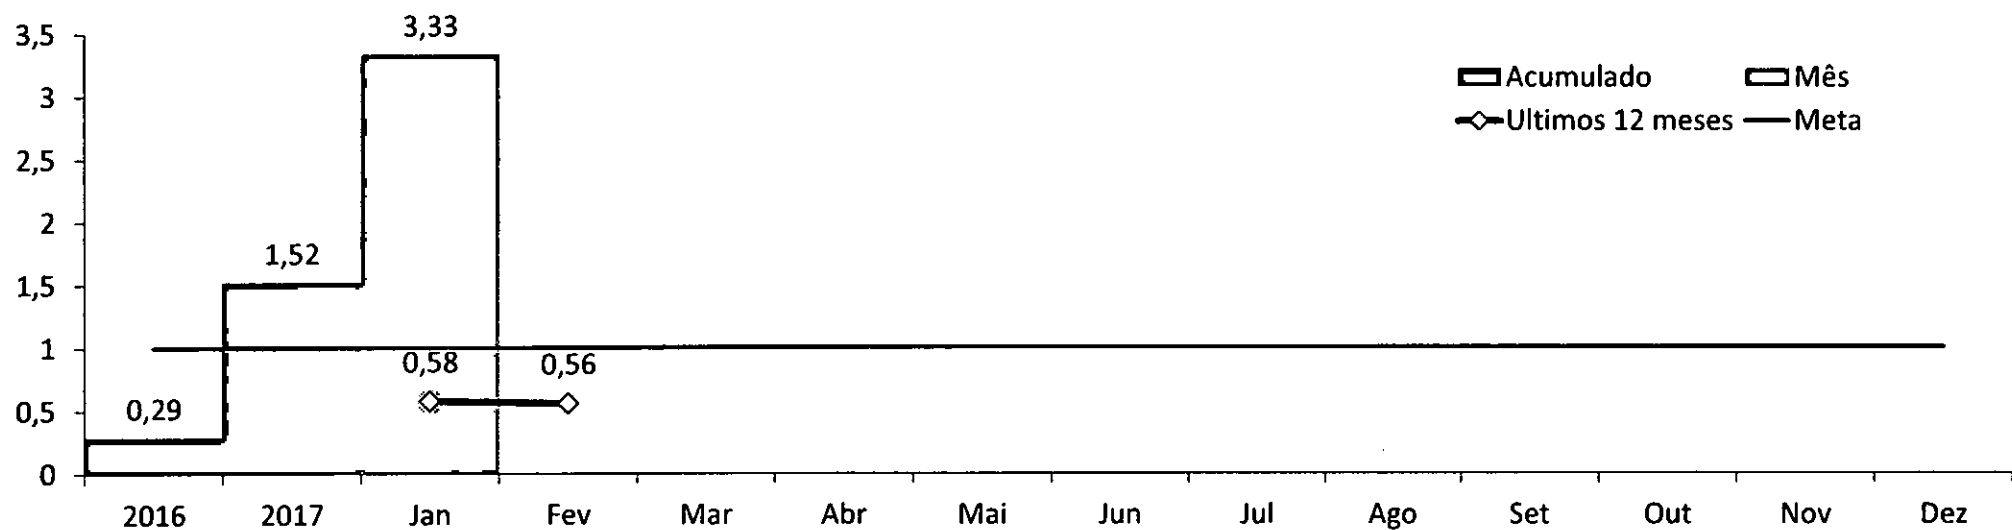

	Empregados Fundação/cedidos	Empregados contratados	Horas trabalhadas
Fevereiro	391	1.698	358.785
Total 2017	-	-	659.106



COMPTON INC.

SUMÁRIO EXECUTIVO

Desembolso realizado/previsto




CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM					
	Total	Realizado	Realizado anterior	Realizado Fev	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais	194,70	164,97	159,45	5,52	19,50	17,40
Programas socioeconômicos	2.966,10	811,06	742,40	68,66	1.112,40	1.164,50
Programas socioambientais	4.775,70	743,13	683,08	60,05	762,30	3.382,80
Saldo medidas compensatórias	1.536,90	-	-	-	-	1.536,90
Total	9.473,40	1.719,16	1.584,93	134,23	1.894,20	6.101,60

CAPÍTULO	Desembolso em R\$ MM					
	Total	Realizado	Realizado anterior	Realizado Fev	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas reparatórias	5.642,20	1.679,26	1.558,91	120,35	1.312,50	2.873,00
Medidas compensatórias ¹	3.831,20	39,91	26,02	13,89	581,70	3.228,60
Total	9.473,40	1.719,16	1.584,93	134,23	1.894,20	6.101,60

Comentários

- Valores previstos para os próximos anos reavaliados pelo processo de orçamento de 2017.

(1) Inclui saldo de medidas compensatórias




COMPTON

ÍNDICE

Socioeconômico



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	007
Organização social	PG01 – Levantamento e cadastro	009
	PG02 – Ressarcimento e indenização	013
	PG03 – Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	014
	PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	016
	PG05 – Proteção social	017
	PG06 – Diálogo social	019
	PG07 – Assistência aos animais	024
Infraestrutura	PG08 – Reconstrução de vilas	025
	PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	027
	PG10 – Recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas	033
Educação, cultura e lazer	PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	040
	PG12 – Memória histórica, cultural e artística	042
	PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer	047
Saúde	PG14 – Saúde física e mental da população impactada	048
Inovação	PG15 – Tecnologias socioeconômicas	049
Economia	PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	050
	PG17 – Retomada das atividades agropecuárias	051
	PG18 – Diversificação da economia regional	052
	PG19 – Micro e pequenos negócios	053
	PG20 – Estímulo à contratação local	054
	PG21 – Auxílio financeiro emergencial	057
Gestão	PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários	059
	PG22/41 – Gerenciamento programas	092




ALFRANCO

ÍNDICE

Socioambiental



Visão geral	Visão geral – reparatório/compensatório	060
Gestão rejeitos e qualidade água	PG23/PG25 – Manejo dos rejeitos / Recuperação área ambiental 1	062
	PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios.....	068
Restauração florestal	PG26/PG27 – Recuperação de APPs / Recuperação de nascentes	071
Conservação da biodiversidade	PG28 – Conservação da biodiversidade	073
	PG29 – Recuperação da fauna silvestre	074
	PG30 – Fauna e flora terrestre	075
Segurança hídrica e qualidade água	PG31 – Coleta e tratamento de esgoto	076
	PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água	077
Educação, comunicação e informação	PG33 – Educação ambiental	079
	PG34 – Emergência ambiental	081
	PG35 – Informação para a população	083
	PG36 – Comunicação nacional/internacional	085
Preservação e segurança ambiental	PG37 – Gestão de riscos ambientais	086
	PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce	087
Gestão e uso sustentável da terra	PG39 – Unidades de conservação	089
	PG40 – CAR e PRAs	090
Gestão	PG22/41 – Gerenciamento programas	092




EL BRANCO

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017 Orçado	Após 2017 Projetado
Medidas mitigatórias emergenciais					195,10	165,37	19,50	17,40
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov/15	mar/17	jun/19	out/19	37,50	24,45	9,90	3,30
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	jan/17	jan/20	abr/20	228,50	22,15	177,70	32,80
PG003 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas	mar/16	dez/18	jul/19	dez/19	92,50	15,44	40,10	39,80
PG004 - Outros povos e comunidades tradicionais	ago/16	abr/18	fev/19	mai/19	1,50	0,01	1,50	
PG005 - Proteção social	abr/16	jul/17	abr/19	jun/19	3,30	0,30	1,10	1,90
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	213,00	23,13	27,90	165,90
PG007 - Assistência aos Animais	nov/15	nov/16	dez/19	mar/20	22,00	12,53	3,30	6,90
PG008 - Reconstrução de vilas	nov/15	out/16	mar/22	mar/22	305,50	27,17	68,70	211,70
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov/15	nov/16	jul/18	out/18	341,00	157,87	164,90	64,30
PG010 – Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	nov/15	out/16	ago/18	ago/18	313,60	230,10	55,40	35,00
PG011 – Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar	jan/16	mar/17	mar/21	mai/21	9,00	0,50	2,70	6,00
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev/16	dez/17	dez/21	mar/22	30,00	12,11	8,50	11,00
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	jul/16	fev/18	dez/22	mar/23	25,70	1,62	2,50	21,80
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov/15	abr/17	nov/25	nov/25	138,50	21,55	16,20	103,10
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	jul/16	jan/18	dez/19	mar/20	49,10	0,27	2,60	46,30
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	dez/15	out/16	dez/25	mar/26	184,00	18,63	24,40	143,30
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	jul/16	mai/17	mai/20	ago/20	21,30	1,03	0,80	19,60
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov/15	jan/17	ago/20	nov/20	491,50	218,64	164,30	140,80
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun/16	dez/16	dez/19	dez/19	42,40	0,40		42,00
Total medidas reparatórias					2.745,00	953,25	792,00	1.112,90




PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS

Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total	Desembolso em R\$ MM		
		Definição	Exec.	Encerr.		Realizado	2017	Após 2017
							Orçado	Projetado
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez/15	jan/17	jan/20	abr/20	343,60	22,82	336,60	
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	fev/17	jul/17	nov/24	fev/25	7,60	0,00	0,10	7,50
PG018 - Diversificação da Economia Regional	jan/17	set/17	out/30	out/30	63,30	0,05	3,10	60,20
PG020 - Estímulo à Contratação Local	jun/16	mai/17	jun/21	jun/21	1,50	0,01	0,30	1,20
Total medidas compensatórias					416,00	22,88	340,10	68,90



EM BRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição

Planejado

Tendência


MÉTRICAS – RIO DOCE			
Descrição	Planejado	Realizado	Total
Famílias cadastradas emergencialmente ^{1*}	NA	7.617	7.617
Pessoas cadastradas emergencialmente ^{1*}	NA	26.870	26.870
Cadastros definitivos indexados ¹	15.420	15.420	15.420
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 ¹	14.125	14.125	14.125
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 ¹	2.408	2.352	2.408
Cadastros definitivos que concluíram consistência ¹	14.125	13.686	14.125
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF ¹	10.327	1.896	10.327
MÉTRICAS – BARRA LONGA			
Famílias cadastradas emergencialmente	NA	436	436
Pessoas cadastradas emergencialmente	NA	1.245	1.245
Cadastros definitivos indexados ²	613	613	613
Cadastros definitivos que concluíram fase 1 ²	535	535	535
Cadastros definitivos que concluíram fase 2 ²	424	423	424
Cadastros definitivos que concluíram consistência ²	444	245	444
Cadastros definitivos aprovados pelo CIF ²	80	21	80
MÉTRICAS – MARIANA			
Famílias cadastradas emergencialmente	NA	514	514
Pessoas cadastradas emergencialmente	NA	1.611	1.611

* Nos meses passados o reporte considerou o realizado em Mariana e Barra Longa.

(1) Não inclui Barra Longa e Mariana. Valores Planejados e Totais sendo revisados.


(2) Valores Planejados e Totais sendo revisados.

NOTA: Cadastros em Mariana não iniciados.



PG01 – Levantamento e cadastro

Diagrama de processo do cadastramento

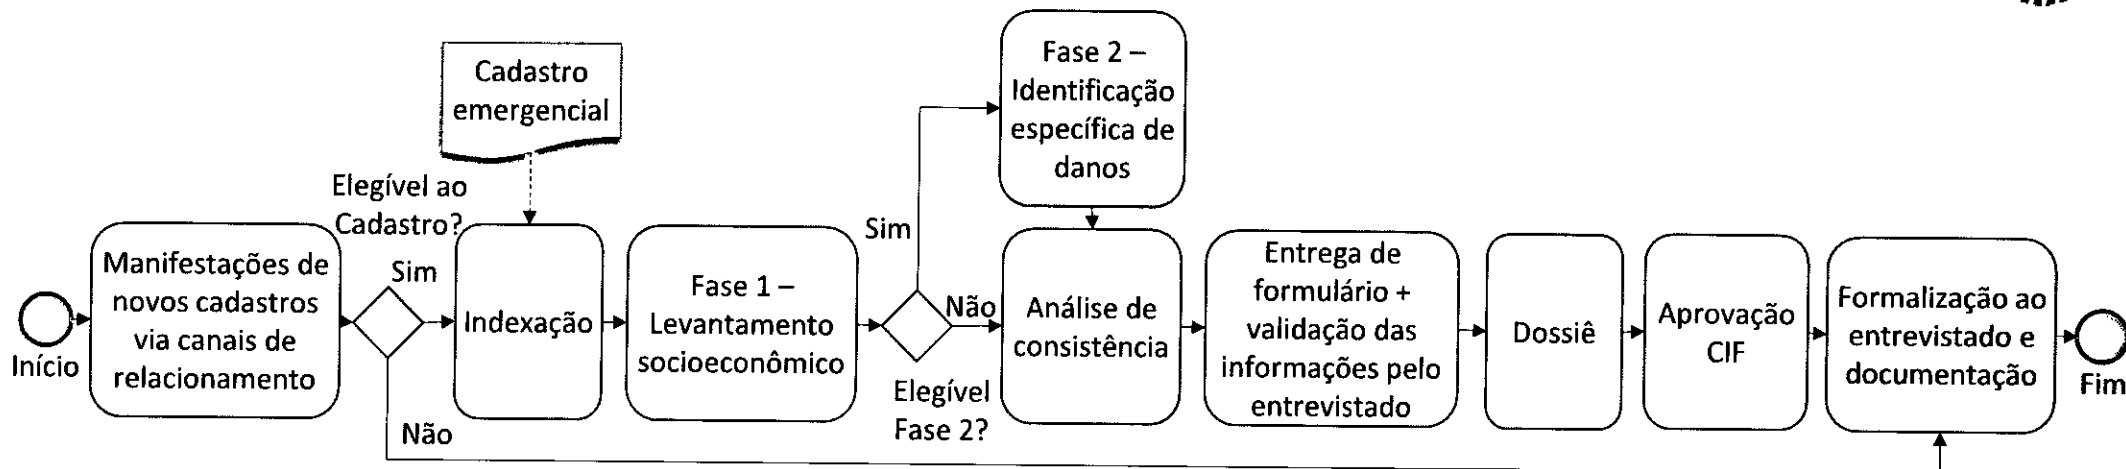

Nota:


Para dimensionar o quantitativo de cadastros que deverão ser realizados em uma determinada campanha do Programa, é necessário que o pacote de manifestações definido seja devidamente atendido e avaliado até a fase 1 do fluxograma apresentado, o que implica em revisões constantes no universo que efetivamente se transformará em cadastro. Isso é explicado pelo fato de as unidades de medida utilizadas para mensurar as etapas variam conforme característica de cada uma, segundo justificativas a seguir:

1. O registro de manifestações pode ser realizado uma ou mais vezes por um único manifestante;
2. A indexação pode ser realizada uma ou mais vezes de acordo com o número de propriedades impactadas e residência de cada manifestante e do público cadastrado na fase 1;
3. Na fase 1 é possível ter um ou mais manifestantes dentro do mesmo cadastro familiar, com uma ou mais propriedades;
4. A fase 2 é realizada apenas em casos específicos que exigem a visita técnica para apuração e quantificação dos danos alegados em propriedade e comércio (turismo);
5. As etapas de consistência, entrega de formulário e aprovação do CIF seguem o mesmo quantitativo da fase 1.

Cadastro Emergencial

O Cadastro Emergencial ocorreu entre o dia 06/11/2015 até o dia 01/08/2016, 10 famílias com 33 pessoas de outros municípios como Contagem, Ouro Branco, Ouro Preto, Dom Silvério, Alvinópolis, Belo Horizonte e Acaiaca.

No total foram cadastradas emergencialmente 8.577 famílias e 29.759 pessoas, sendo 514 famílias



TM BRANCO

PG01 – Levantamento e cadastro

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Câmara Técnica de Organização Social (CTOS) / Comitê Interfederativo (CIF):

- Realização da 9ª reunião com CTOS em 14/02/17;
- Envio do Lote 005 de informações do Cadastro Integrado para CTOS/CIF no dia 13/02/17.

Aplicação da pesquisa em Mariana e Barra Longa:

- Mariana: Reunião realizada no dia 13/02 com a Comissão de Atingidos, Assessoria Técnica e Ministério Público. Nessa agenda foram discutidos os principais pontos do parecer técnico apresentado pela Comissão sobre o Cadastro Integrado e solicitada a estruturação de uma agenda de trabalho para discutir tecnicamente a metodologia que será aplicada.
- Barra Longa: Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico, levantamentos de danos, entrega dos formulários preenchidos.

Rio Doce à Linhares e Aracruz:

- Realização das ações de comunicação e diálogo social para informação das comunidades sobre Programa;
- Indexação, agendamento e realização do cadastro socioeconômico e levantamentos de danos;
- Entrega dos formulários preenchidos às famílias entrevistadas.
- Implementação de novas estratégias para identificação dos “não localizados”

Base de dados e Documentação:

- Análise e tratamento das solicitações de novos cadastros.

PG01 – Levantamento e cadastro

Fotos



Aplicação de Cadastro (fase 1) – Bom Jesus do Galho – 02/02/2017




Aplicação de Cadastro (fase 1) – Rio Casca – 01/02/2017



Visita Técnica (Fase 2) Santana do Paraíso 16/02/2017



Visita Técnica (Fase 2) Tumiritinga 07/02/2017



EM BRANCO

PG02 – Ressarcimento e indenização

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-----------	-----------	-----------

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-----------	-----------	-----------	-------

AÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO 2017/ OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Atendimento acumulado em fevereiro de 2017: 70.922 beneficiários com propostas geradas, sendo 46.637 Governador Valadares e 24.285 em Colatina;
- Propostas de acordos aceitas, acumulado em fevereiro 2017: 41.179 beneficiários, sendo 28.804 Governador Valadares e 12.375 em Colatina;
- Pagamento indenizatório por Dano Moral da Água , acumulado em fevereiro de 2017: 20.588 Beneficiários sendo, 12.859 em Governador Valadares e 7.729 em Colatina;
- Estruturação de uma equipe extra para reagendamentos decorrentes da paralização da polícia militar no ES, com capacidade para cerca de 960 atendimentos/mês;
- Reunião com a Desembargadora de Vitória para demandar a questão das homologações visando protocolar os respectivos processos no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Vitória ou Colatina;
- Apresentado para o Tribunal de Justiça de Governador Valadares modelo de reunião única para otimizar os atendimentos de Dano de Água, visando aumento da capacidade de atendimento a população e redução no tempo de pagamento ao impactado.
- Workshop com clientes e empresários do setor de extração de areia de Governador Valadares buscando identificar possíveis alterações do produto decorrente do acidente da Barragem.



EM BRANCO

PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Total

AÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO 2017/ OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Geral:

- Plano de Trabalho para Estudo da Componente Indígena aprovada pela FUNAI e SESAI, previsão do início é final de Março.
- Realizada a visita técnica da SESAI para levantamento situacional e orientação da componente saúde nas TI Krenak, TI Comboios e TI Caieiras-Velha II
- Manutenção das ações de assistência emergencial do acordo para cumprimento do TTAC
- Participação em agenda do Fórum de Empreendimentos de Aracruz, convocado pelo MPF.
- Reunião de alinhamento institucional e de trabalho com a Polifônicas em Brasília.

TI Krenak:


- Continuidade da manutenção das vias de acesso às aldeias para abastecimento de água nas aldeias e equipamentos sociais
- Mobilização das comunidades pela FUNAI junto as aldeias para análise e consulta do Plano de Trabalho da Polifônicas referente ao ECI
- SESAI vai apresentar um projeto-base para reabilitação do Sistema de Abastecimento de Água Krenak à FR em 45 dias

TI Comboios:

- Acompanhamento dos repasses acordados com lideranças indígenas.
- Reunião de diálogo sobre os resultados do monitoramento hídrico.
- Visita técnica na TI Comboios com participação de FUNAI, SESAI, Defensoria Pública, Fibria, ICMbio e Projeto Tamar como atividade do GT do Plano de cheias.
- Monitoramento e diálogo social na Terra Indígena Comboios

TI Caieiras Velhas:

- Acompanhamento dos repasses acordados com lideranças indígenas
- Encontro para socialização dos achados técnicos e engajamento social sobre monitoramento hídrico
- Estruturação de acompanhamento participativo dos indígenas nas atividades de monitoramento hídrico.
- Reunião de esclarecimento a APECI sobre o pleito de aditivo ao acordo emergencial




PG03 – Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas

Fotos



Visita Técnica - TI Comboios



PG04 – Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição


Planejado

Realizado

Total

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Em processo concorrencial a contratação de consultoria para a implementação de Estudo de Impacto para a comunidade Quilombola de Degredo
- MPF recomendou um consultor para realizar um estudo para mapeamento dos Faiscadores em Mariana, Rio Doce e Santa Cruz do Descalvado, no entanto o consultor ainda não apresentou uma proposta técnica detalhada.



PG05 – Proteção social

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição


Planejado

Realizado

Total

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Realização de reuniões para análise dos estudos de casos demandados à Fundação pela equipe dos CRAS (Mariana);
- Encaminhamento de casos para rede de serviços socioassistenciais – Mariana.
- Realização de visitas domiciliares para subsidiar os estudos de casos demandados pelos demais Programas da Fundação Renova.
- Reuniões com os CRAS de Mariana para construção conjunta, planejamento e realização do Projeto Piloto de hortas verticais: **Horta VertiCRAS**, com Apoio dos programas: PG-017- Retomada da atividade agropecuária, PG-033- Educação Ambiental e PG-06- Diálogo e Comunicação.
- Realização de Reuniões com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC Mariana) para elaboração um novo escopo do Plano de Ação, referente ao contrato dos profissionais de assistência social.
- Em janeiro/2017: Promoção e realização de reunião para apresentação do Plano de Contingência de Chuva do Município de Mariana (Defesa Civil) associado ao Plano de Contingência de Chuvas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC Mariana) para os representantes e equipe dos serviços socioassistencias do município de Mariana/MG.




PG05 – Proteção social

Fotos



Projeto Piloto: Horta VertiCRAS



PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Pilar Ouvidoria - Contratação Função Ouvidor (Fundação)	30/out	30/mar


MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Manifestações registradas	NA	86.002	NA
Manifestações concluídas	NA	54.807	NA
Reuniões – trecho Mariana à Santa Cruz	NA	536	NA
Reuniões – trecho Rio Doce	NA	459	NA
Postos de atendimento	14	12	14

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Diálogo Social – Região 1:

- Reuniões de diálogo: total de 27 reuniões em fevereiro/17, com 1.015 presenças: Mariana: 15 reuniões e 526 presenças; Barra Longa: 9 reuniões e 157 presenças; Rio Doce/Santa Cruz: 3 reuniões e 332 presenças;
- Acumulado de reuniões no Região 1: 536 reuniões e 17.202 presenças (média de 34 participantes por reunião).
- Monitoramento das Famílias: até o presente momento, 104 famílias já foram visitadas em Barra Longa, Rio Doce e Sta. Cruz do Escalvado. O trabalho tem como finalidade analisar a atual condição de renda de um conjunto de famílias não assistidas pelo Auxílio Financeiro.
- Diálogo social abordando principalmente temas relacionados aos programas: PG 001, 002, 005, 008, 010, 012 e 017
- Apoio ao trabalho das frentes da Fundação, para mediação e coleta de assinaturas do termo de autorização para intervenções na calha do rio e tributários, em Mariana.
- Coleta de assinaturas para liberação de estudos nas propriedades adjacentes ao terreno anfitrião de Paracatu de Baixo.
- Visitas a moradores de Barra Longa com propriedades recuperadas, para obtenção de termos de autorização, ordens de serviço, termos de entrega e identificação de casos críticos.
- Discussão sobre assessoria técnica, junto ao MP e comunidades para atendimento dos municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.



PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Acompanhamento – Comunicação social




AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Diálogo Social - Regiões 2 e 3

- Reuniões de diálogo: total de 45 reuniões em fevereiro, com 950 presenças.
- Mapeamento/ Monitoramento de públicos prioritários ao longo do território.
- Atividades de análise territorial estratégica para apoio à implementação dos programas da Fundação Renova.
- Ampliação e monitoramento do diálogo com as comunidades impactadas, grupos específicos, setores do Poder Público e entidades (sociais, religiosas, educacionais e de saúde).
- Acumulado de reuniões nas Regiões 2 e 3: 459 reuniões e 16.310 presenças (média de 36 participantes por reunião).
- Ampliação e manutenção do diálogo individualizado e do relacionamento com as comunidades impactadas, que permitem análises dos contextos locais, definição de temas prioritários, antecipação de cenários e construção de soluções.
- Diálogo social abordando principalmente temas relacionados aos Programas: PG 001, 002, 006, 017, 021 .
- Definição de estratégias de diálogo para apoio à entrada de Programas nos territórios.
- Apoio nas atividades das frentes de implementação de Programas, como visita a produtores rurais, levantamento e cadastro dos impactados e Programa de Indenização Mediada (PIM).
- Apoio na realização de 03 Plantões de esclarecimento do status de cadastramento integrado (PG001) no ES.

Canais de Relacionamento:

- Postos de atendimentos: 12 escritórios em operação;



PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Diálogo Social – Região 1



*Reunião com comunidade – Ponte do Gama
Mariana/MG (11/02)*



*Reunião com lideranças – Bento Rodrigues
Mariana/MG (09/02)*



*Reunião com produtores rurais - Barreto
Barra Longa/MG (09/02)*



*Reunião com Poder Público
Barra Longa/ MG (22/02)*



*Reunião com comunidade
Santa Cruz do Escalvado/MG (08/02)*



*Reunião com lideranças
Santa Cruz do Escalvado/MG (17/02)*



EM BRANCO

PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Fotos



Diálogo Social – Região 2 e 3



*Reunião com equipamento público - CRAS
Naque/MG (14/02)*



*Reunião com comunidade - Itapina
Colatina/ES (13/02)*



*Reunião com grupo de comerciantes - Regência
Linhares/ES (16/02)*



*Reunião com Poder Público
Tumiritinga/ MG (21/02)*



*Reunião com entidade religiosa – CONEP GV
Governador Valadares/MG (22 /02)*



*Reunião com lideranças
Aimorés/MG (22/02)*



PG06 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social


Fotos



Diálogo Social – Região 2 e 3




*Reunião Plantão PG001 – Comunidade de Itapina
Colatina/ES (16/02)*

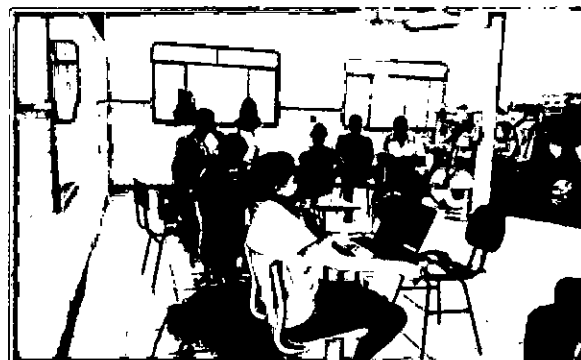

*Reunião Plantão PG001 – Comunidade de Mascarenhas
Baixo Guandu/ES (22/02)*



*Reunião Plantão PG001 – Comunidade de Maria Ortiz
Colatina/ES (22/02)*



PG07 – Assistência aos animais

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Renovação de Contratos de Parcerias com ONG's	20/jan	31/mar

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Animais resgatados, animais nascidos e atendidos (#)	NA	1041	NA

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Resgate de 1 animais de pequeno porte;
- Recolhimento de 1 animais adotados;
- Acompanhamento de pós adoção de 18 animais;
- Realização de evento de adoção realizado em Mariana.
- Adoção de 11 animais de pequeno porte sendo: 1 gato e 10 cães;
- Atendimento de 1 animal de pequeno porte de tutor e 1 animal de grande porte;
- Manutenção do programa de visitas dos responsáveis dos animais às fazendas.
- Restituição de 1 animal de grande porte ao proprietário;
- Medicina preventiva em 175 animais de grande porte (121 animais desverminados controle de 54 ectoparasitas);
- Medicina preventiva em 3 animais de pequeno porte (desverminação e vacinação);
- Revisão de todos os prontuários de animais;
- Nascimento de 2 animais de grande porte.



PG08 – Reconstrução de Vilas

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Emissão do MasterPlan preliminar de Gesteira	15/03/2017	15/03/2017

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
-			

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Em andamento os projetos básicos de Bento Rodrigues;
- Em andamento Estudos de Impacto Ambiental nos terrenos escolhidos para reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo;
- Em andamento diagnóstico junto à comunidade de Paracatu de Baixo para identificação de sítios para reassentamento;
- Em andamento processo de negociação para aquisição de terreno para Paracatu de Baixo;
- Em andamento processo de negociação para aquisição de terreno em Gesteira.




PG08 – Reconstrução de Vilas Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Próximas ações:

- Continuidade do processo de aprovação do loteamento de Bento Rodrigues junto a Prefeitura de Mariana;
- Início do processo de contratação da infraestrutura de Bento Rodrigues;
- Conclusão dos Estudos de Impacto Ambiental no terreno escolhido de Paracatu de Baixo;
- Entrada no processo de licenciamento de Bento Rodrigues junto ao órgão ambiental;
- Aprovação do projeto urbanístico de Paracatu de Baixo junto à comunidade;
- Aquisição dos terrenos em Paracatu de Baixo;
- Aquisição do terreno em Gesteira;
- Alinhamento e discussão com as comunidades sobre os projetos individuais de casas;



PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento




O programa PG09 – Programa de recuperação da UHE Risoleta Neves encontra-se em momento de transição entre a Samarco e a Fundação Renova.

A transição será de forma gradual, de forma a garantir a continuidade das atividades e evitar a perda de informações e conhecimento adquirido.

A Fundação assumirá integralmente a responsabilidade pelo desenvolvimento deste programa a partir de Julho/17 conforme cronograma macro abaixo.

Descrição	M	A	M	J	J	...
Engenharia	Samarco + Fundação					
Interface com Órgãos	Fundação					
Construção das Barreiras Metálicas	Samarco + Fundação					Fund
Construção Estruturas da Fazenda Floresta	Samarco + Fundação			Fundação		
Processo de Dragagem	Samarco				Fundação	



PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição

Planejado

Tendência

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Total

Volume dragado - trecho de 400m (mil m3)

808

662

1.576

Barreira metálica B (à 5 km) (t)

790

790

790

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Setor 4:


- Continuação da adequação da área à jusante para disposição dos bags e início dos drenos e reforço de fundação

Barreira A:

- Iniciada cravação de estacas 10/02/17
- 22 estacas cravadas e 21 pranchas
- Previsão da conclusão do barramento – MAI/17

Dragagem:

- Aporte nos 400m até o dia 22/02 era de 0,392hm³
- Volume diário removido ampliado devido ao início da utilização do Setor 8




CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SOLUÇÕES DEFINITIVAS

- Estruturação de Grupo de Trabalho Específicos com membros da Fundação, CT-Rejeitos, Samarco, Mantenedoras e Aliança para identificação, avaliação e validação de alternativas para solução definitiva da dragagem do reservatório.
- Variáveis consideradas para tomada de decisão:
 - Prazo de Implantação (fator-chave);
 - Impactos ambientais das soluções;
 - Eficiência das soluções;
 - Capacidade de execução.



Workshop do Plano de Manejo de Rejeitos
realizados em 25/01/17 e 23/02/17



PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves Acompanhamento



CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SOLUÇÕES DEFINITIVAS Compromisso da Fundação Renova


- Criar condição para avaliação e validação coletiva das alternativas técnicas estudadas e desenvolver estudos para novas alternativas eventualmente identificadas;

- Consolidar as soluções técnicas que devem ser implantadas para garantir a dragagem do reservatório;

- Aumentar a previsibilidade e sustentabilidade das soluções, com aporte técnico interno (gestão da Fundação Renova) e externo (empresas especializadas);

- Principais Metas deste Plano de Trabalho:**
 - Definir Cronograma para Conclusão da Fase 1: 14/Abr/17**

 - Definir as Diretrizes e Soluções Técnicas para Fase 2: a definir após conclusão do Plano de Manejo de Rejeitos.



PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento




CONSTRUÇÃO COLETIVA DE SOLUÇÕES DEFINITIVAS

Compromisso da Fundação Renova

Estratégias para UHE Risoleta Neves						
Reuniões Técnicas	06/03/2017	10/03/2017	15/03/2017	20/03/2017	07/04/2017	14/04/2017
Variáveis Econômicas:						
1. Kick-off Grupo de Trabalho com Aliança para Avaliações de Alternativas	<input checked="" type="checkbox"/>					
2. Apresentação das Potenciais Alternativas e Avaliações Preliminares para Conselho Curador			<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Próximos passos dependerão das análises e diretrizes do Conselho Curador				[Barra de progresso]		
Nota: a apresentação destas variáveis no Documento Técnico Final também depende da avaliação do Conselho Curador						
Variáveis Técnicas/Ambientais:						
1. Levantamentos de Alternativas ao Cenário Atual	[Barra de progresso]					
2. Reunião de Alinhamento Prévio com Órgãos Ambientais	<input checked="" type="checkbox"/>					
3. Planejamento Detalhado das Soluções de Disposição Atuais e Barreira Metálica A		<input checked="" type="checkbox"/>				
4. Workshop para Construção Colaborativa da Solução de Sequenciamento de Disposição de Rejeitos				<input checked="" type="checkbox"/>		
5. Preparação da Engenharia e Planejamento Detalhado da Solução de Candonga					<input checked="" type="checkbox"/>	
6. Protocolo do Documento Final para o CIF (conforme Deliberação 46)						<input checked="" type="checkbox"/>


Em 14/abr a Fundação Renova deverá apresentar um Plano de Trabalho Definitivo para conclusão da Fase 1 da Dragagem do Reservatório de Candonga.



EM BRANCO



PG09 – Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

Acompanhamento



ATUALIZAÇÃO DRAGAGEM

- ❑ Produtividade Média de Dragagem: 3.300m³ por dia;
- ❑ Resultado Volume Batimétrico / Volume Dragado = 39% (258.496m³ ÷ 660.810m³)
- ❑ Aporte de Material Período Chuvoso 2016-17 nos 400m: 391.900m³
- ❑ % Retorno Médio de Material (carga circulante): +/- 14% (91.853m³ ÷ 660.810m³)

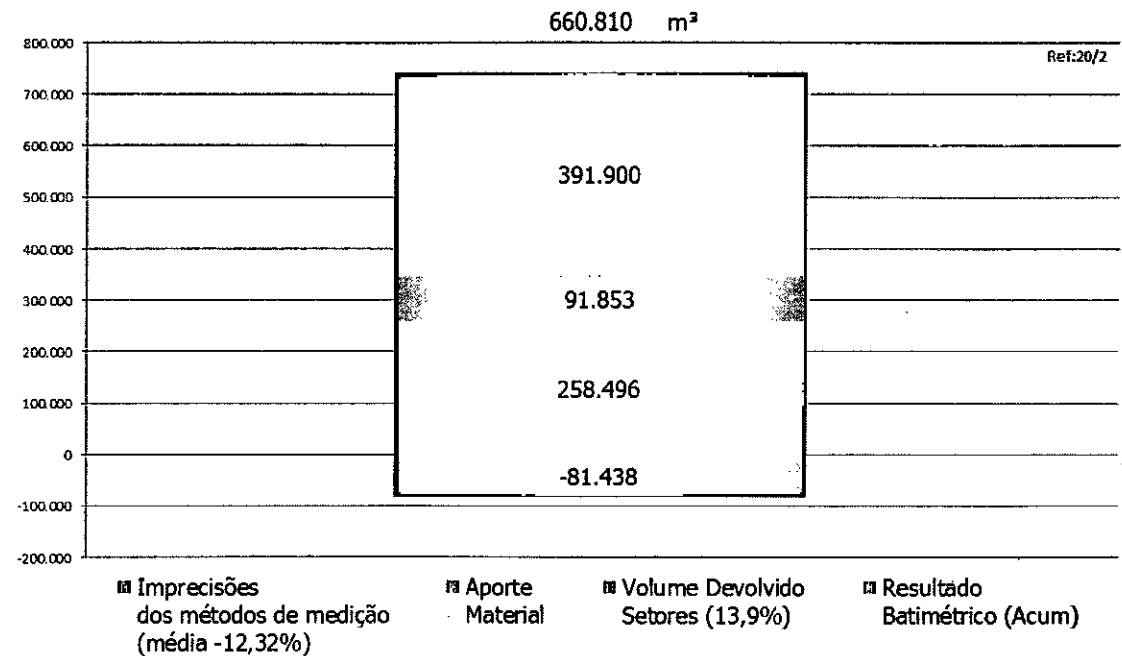

PG10 – Rec. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Acompanhamento




PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Conclusão da reforma de Residências em Barra Longa	31/out	31/jul
Conclusão da recuperação de comércios e instituições em Barra Longa	09/fev	31/mai

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Casas reformadas em Barra Longa (#)	95	95	99
Comércios reformados em Barra Longa (#)	36	34	36
Contenções Rio do Carmo em Barra Longa - Morro Vermelho (km)	1,1	1,1	1,1
Material removido em Barra Longa (mil m3)	157	157	157
Cercamento de propriedades (acordo com MP) (km)	100	105	100
Propriedades rurais reformadas e limpas (#)	33	33	45
Estradas pavimentadas recuperadas (km)	80	80	80
Estradas não pavimentadas recuperadas (km)	110	110	110
Pontes reconstruídas (#)	7	7	7
Drenagens de estradas e vias recuperadas (#)	102	102	102
Bordas de rios e enrocamentos recuperados (#)	47	47	47
Recuperação da praça e alameda Beira Rio em Barra Longa (#)	2	2	2
Maçãos estabilizados em Barra Longa (km)	1,2	1,2	1,2
Quintais e lotes reformados de Barra Longa (#)	94	97	199
Casas reconstruídas em Barra Longa (#)	11	2	13
Reconstrução do parque de exposição e campo dos rodoviários (#)	1	0	2
Currais reconstruídos em Barra Longa (#)	17	19	21
Mata burros reconstruídos em Barra Longa (#)	13	14	26
Pavimentação reconstruída em Barra Longa (km)	2,5	2,5	2,5
Madeira recolhida fase1 e fase2 – (km)	80,8	44,5	80,8
Pontes de cabo de aço reconstruídas (#)	9	9	9
Campos de futebol reconstruídos (#)	3	3	3



PG10 – Rec. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/17 E OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


Barra Longa

Entregas do mês

- Entrega de quintais;
- Recuperação de acessos para comunidade – emergências causadas por chuvas;
- Término de casa no Morro Vermelho.

Próximas entregas

- Entrega da casa 199 – Boate Kiss;
- Entrega da casa 140;
- Entrega da casa 10, na Volta da Capela;






PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Fotos



Recuperação de currais, quintais e mata-burros


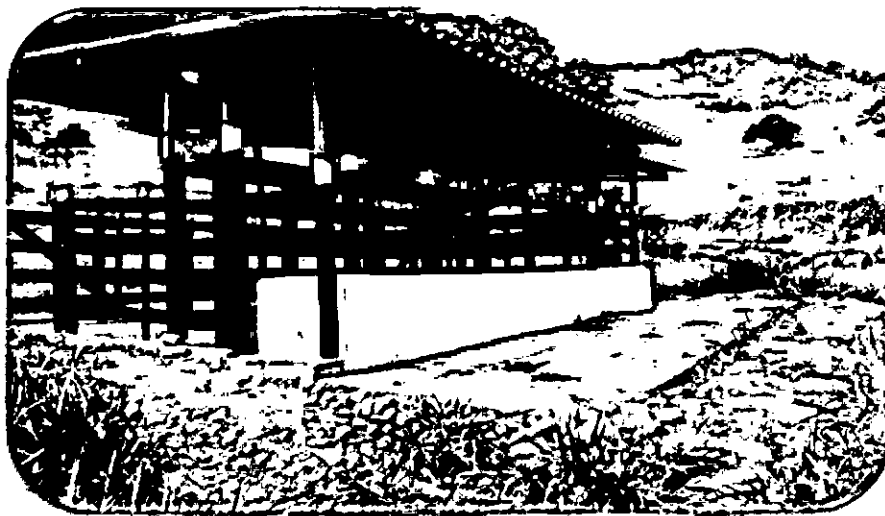
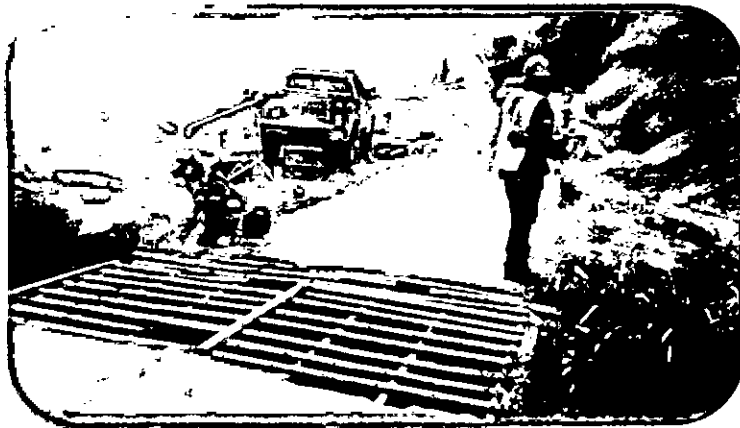


PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Fotos



Reforma e reconstrução de residências

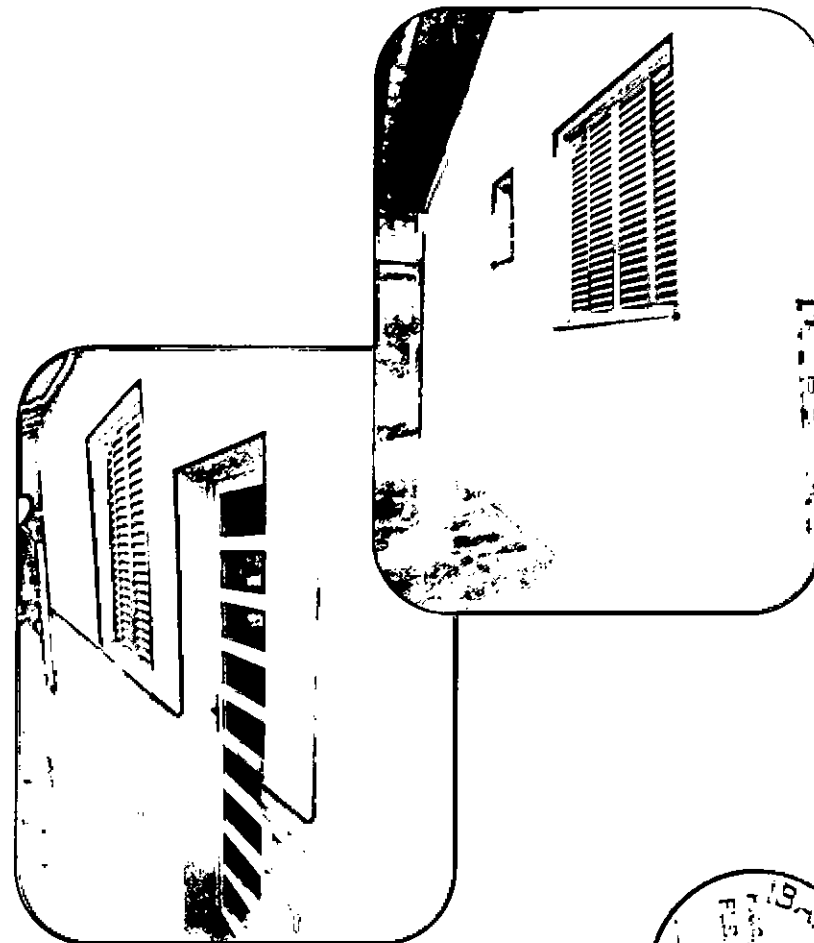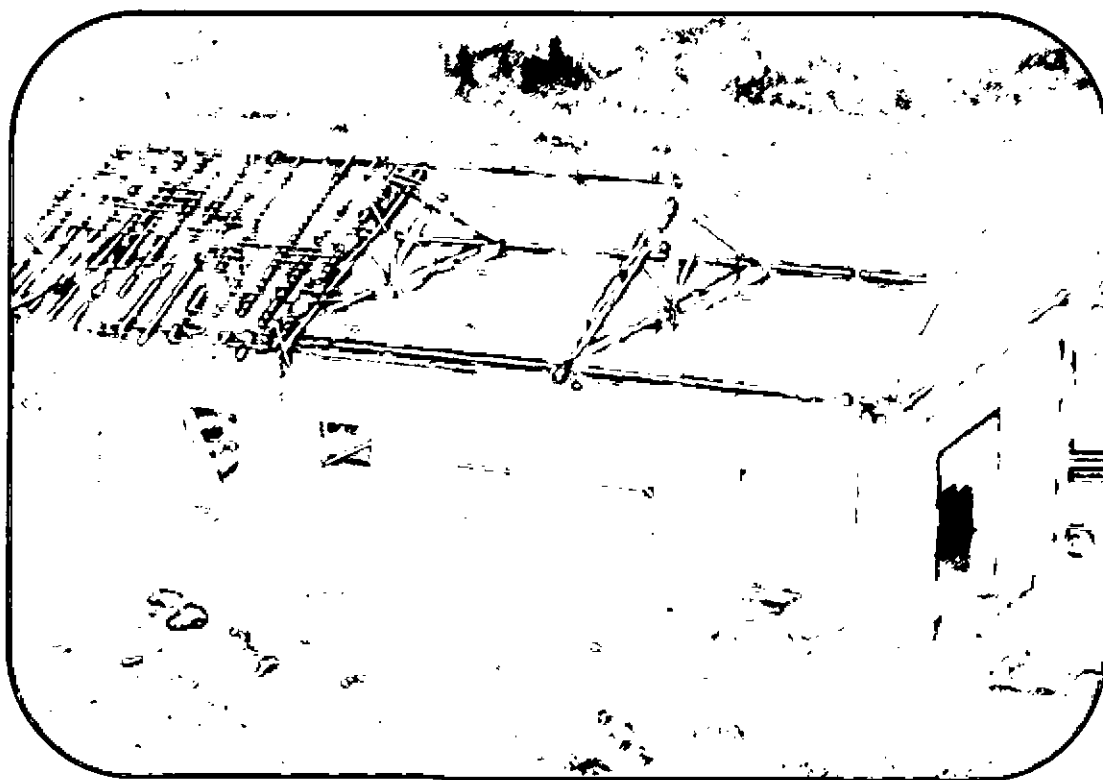

PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Fotos



Recuperação de acessos - emergências



PG10 – Recup. das demais comunidades e infraestruturas impactadas

Acompanhamento



AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


Mariana

Entregas realizadas

- Entrega dos ploteiros das 4 casas que devem ser reconstruídos;
- Realizada a engenharia detalhada de 3 casas que serão construídas;
- Entrega da Engenharia Conceitual de 2 casas;
- Liberação de licenças para construções das 3 casas;
- Topografia de 10 casas que serão reconstruídas;
- Sondagem de 3 casas que serão reconstruídas;
- Ampliação do prédio de armazenamento de Artes Sacras;
- Entrega da reforma do muro do cemitério;
- Reforma do telhado e instalação de fossa na Fazenda Mainart;
- Entrega da reforma da escola do Morro de Santana;
- Entrega formal da reforma Unidade Básica de Saúde – Mariana;
- Instalação de cerca em Barra Longa – Dona Zeni;
- Manutenção em Vias não Pavimentadas;

Próximas entregas:

- Sondagem de 3 casas;
- Entrega da engenharia conceitual de 3 casas;
- Instalação de porteira e mata burro – Comunidade do Borba;
- Reforma da Fazenda em Pedras – Marco Mol;
- Reforma de uma casa em Borba;



PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição

Planejado

Tendência

-

MÉTRICAS

Descrição

Planejado

Realizado

Total

Alunos relocados em escolas temporárias


900

900

900

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Realização das obras para melhoria da escola temporária de Paracatu de Baixo. Devido ao atraso na finalização das obras, os alunos iniciaram o ano letivo na Escola Municipal Morro do Santana;
- Início do ano letivo para alunos de Mariana e Barra Longa;
- Avaliação das propostas técnicas da consultoria psicopedagógico;
- Realização das obras para nova escola temporária de Bento Rodrigues;
- Definição por manter a Escola Municipal José de Vasconcelos Lana no imóvel alugado pela Fundação Renova até que seja encontrada a solução definitiva.




PG11 – Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar

Fotos



Troca do telhado com isolamento térmico

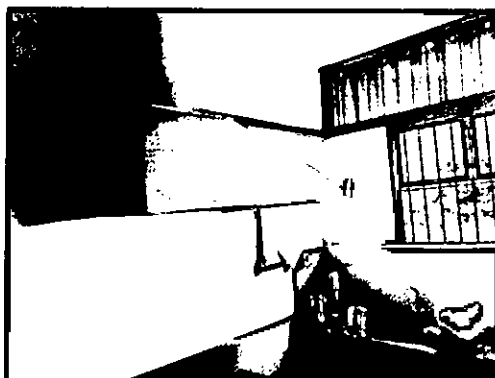

Instalação de coifa na cozinha



Recuperação do forro em PVC



Instalação de grades para segurança



Fachada da escola temporária de Bento Rodrigues



Instalação de alambrado na área externa



Pintura interna com barramento de 1,5m



Instalação de corrimão e tela de proteção



PG12 – Memória histórica, cultural e artística

Acompanhamento



PRINCIPAIS MARCOS - 60 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Total
Itens/fragmentos de origem sacra coletadas (#)	NA	2061	NA
Pessoas capacitadas para identificação de peças sacras (#)	NA	2146	NA

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

Relativo aos bens artísticos e integrados dos templos e reserva técnica


- Conclusão dos Critérios de Triagem do Acervo;
- Outras coletas de amostras para análise de laboratório;
- Continuidade dos serviços de conservação e preservação do acervo das capelas;
- Conclusão da etapa de Identificação e Diagnóstico dos projetos das capelas de Paracatu e Gesteira, inclusive bens integrados;
- Término do inventário de bens integrados e pesquisa histórica das capelas de Paracatu e Gesteira;

Relativo ao trabalho de monitoramento dos templos, prospecção, curadoria e educação patrimonial

- Resgate de 29 peças;
- 46 capacitações técnicas aos diversos públicos (empresas terceirizadas, SAMARCO e comunidade);
- Reunião de alinhamento com as diretoras das escolas, que atendem a comunidade de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo - orientações acerca das atividades programadas para o mês de março – reunião corrida em 21 de fevereiro. A diretora da Escola Municipal Bento Rodrigues, Eliene dos Santos Almeida, agendou para o dia 06 de março de 2017 o evento de capacitação dos professores. Na Escola Municipal Paracatu de Baixo, o encontro está agendando para o dia 09 de março de 2017, em dois turnos.

NOTA: Foi realizado uma revisão dos números de peças sacras recolhidas e pessoas capacitadas considerando que houve atuação de 2 empresas distintas atuando nesta contagem e considerando a mudança de contrato com este fim. Assim, apresentamos os números corretos de peças coletadas:

#	Nov15	Dez15	Jan15	Fev16	Mar16	Abr16	Mai16	Jun16	Jul16	Ago16	Set16	Out16	Nov16	Dez16	Jan17	Fev17
Itens/fragmentos de origem sacra coletadas	383	68	15	76	33	10	24	337	614	264	72	20	84	11	21	29
Pessoas capacitadas para identificação de peças sacras	-	99	103	236	104	187	146	189	139	200	153	38	183	228	95	46






PG12 – Memória histórica, cultural e artística

Fotos



Reserva Técnica / Adequação e Serviços emergenciais

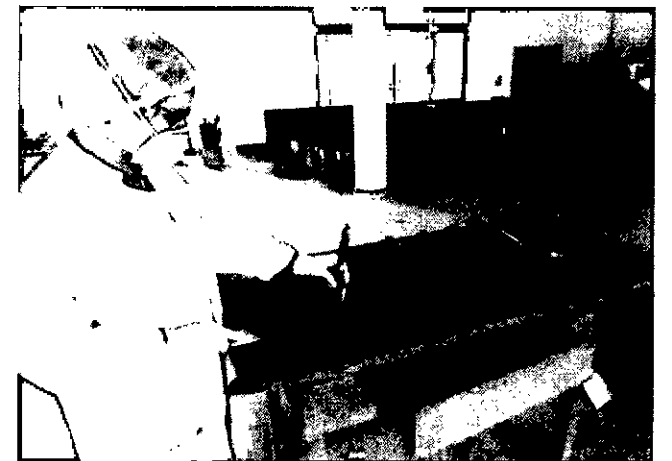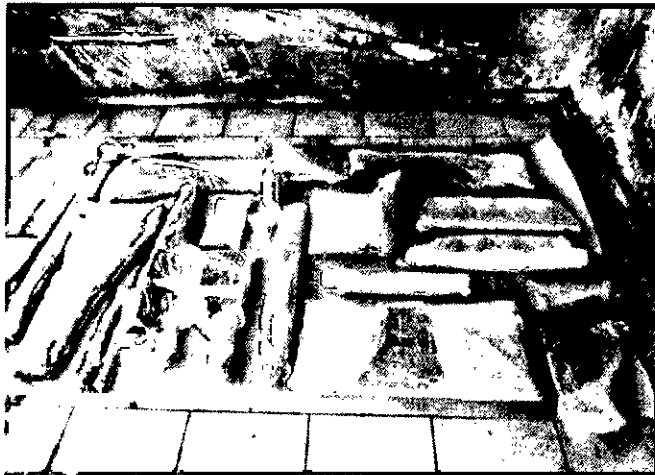
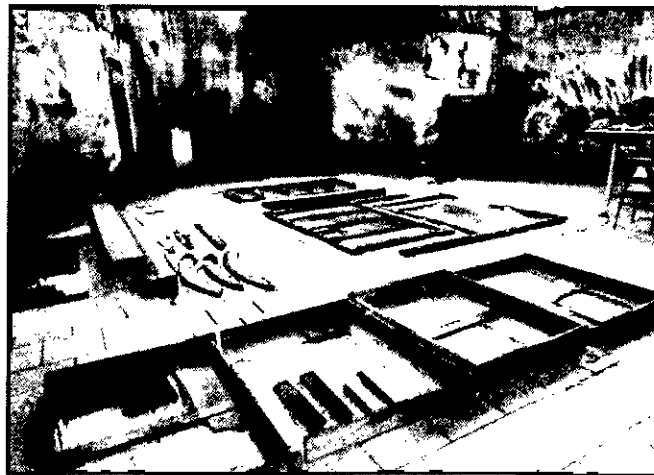


PG12 – Memória histórica, cultural e artística

Fotos




Capacitações técnicas realizadas com os diversos públicos





PG12 – Memória histórica, cultural e artística

Fotos



Peças encontradas no monitoramento

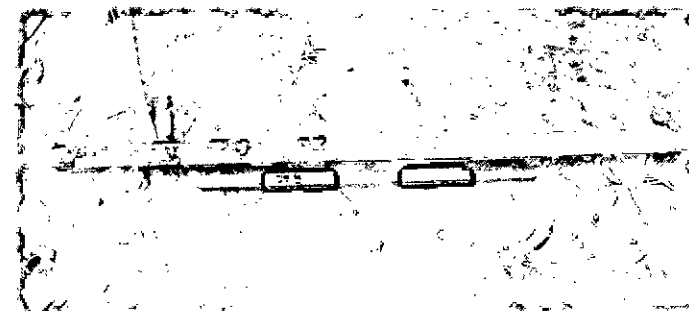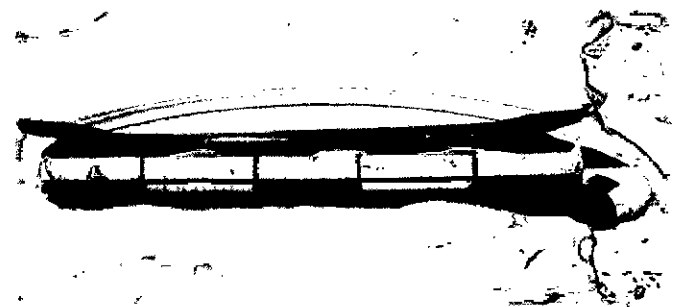

PG12 – Memória histórica, cultural e artística

Fotos



Peças encontradas pela comunidade



