

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Peças sacras coletadas (#)	NA	1944	NA
Pessoas capacitadas para identificação de peças sacras (#)	NA	1586	NA

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES


- Realização de curadoria das peças sacras que encontram-se na reserva técnica da Samarco - Total de 19 peças inventariadas no mês;
- Realização de reuniões com as comunidades de Paracatu e Bento Rodrigues acerca dos bens imateriais;
- Resgate de 19 peças realizadas por meio de prospecção, monitoramento e atividades no interior das igrejas;
- Finalização da mobilização da empresa Lume
- Início da mobilização da empresa Estilo Nacional




EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

Fotos

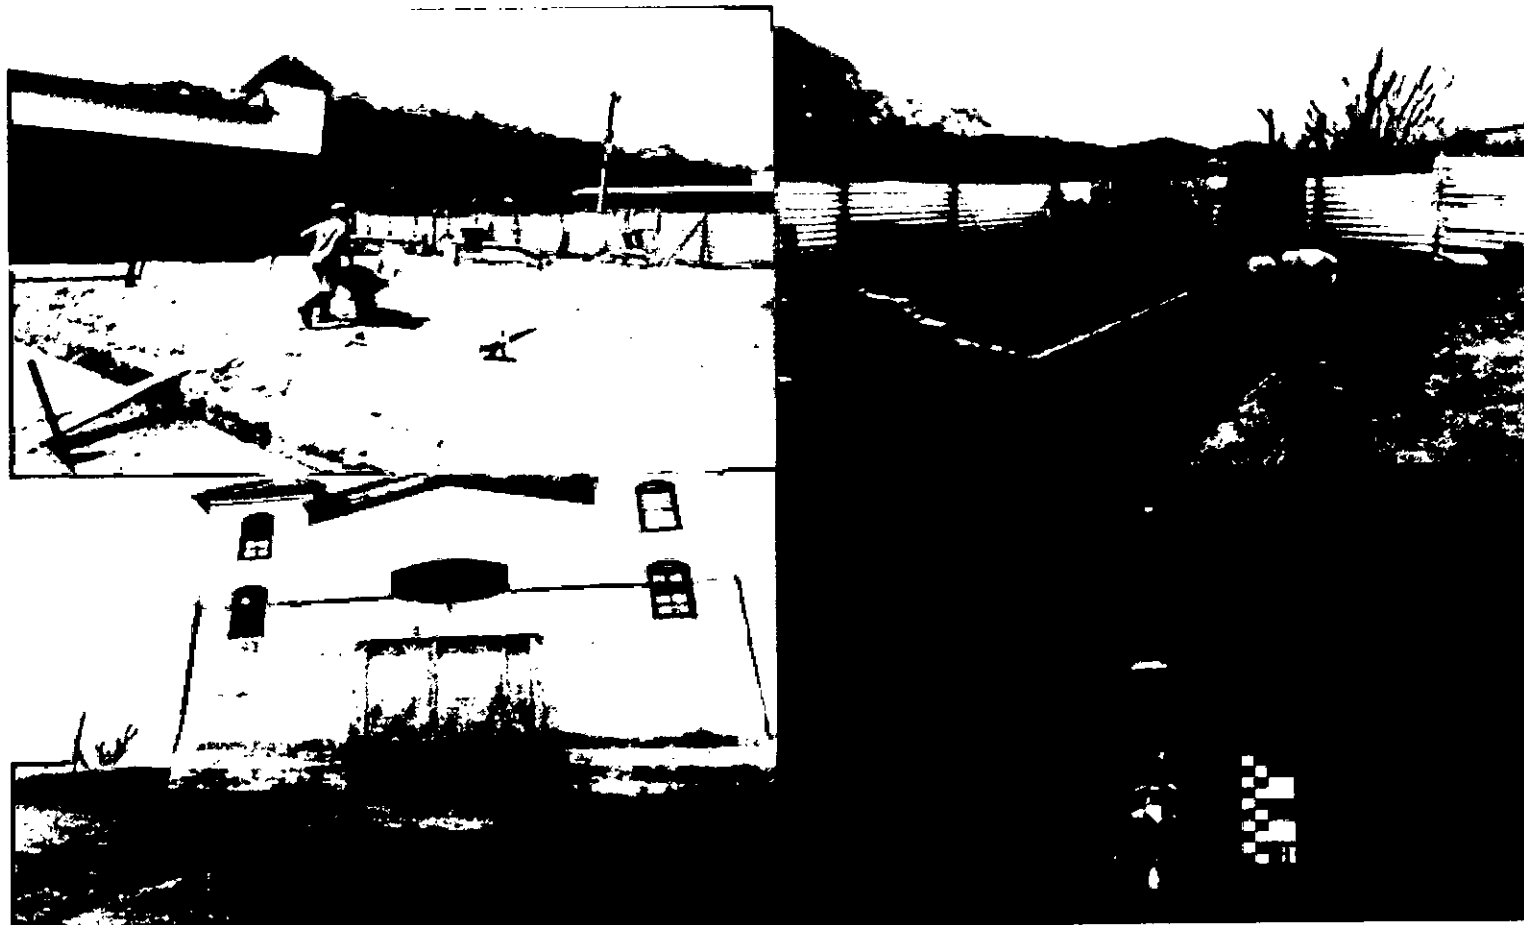

Resgate arqueológico na Capela de Paracatu  
As atividades de campo foram concluídas em 26 de setembro de 2016



EM BRANCO


# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



Resgate arqueológico na Capela de Gesteira

As atividades de campo foram concluídas em 30 de setembro de 2016 - continuidade de escavações no Salão Paroquial




EMBRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



Resgate arqueológico na Capela de Bento Rodrigues  
As atividades de campo foram concluídas em 20 de setembro de 2016



EM BRANCO

# PG12 – Memória histórica, cultural e artística

## Fotos



Atividade de prospecção nas áreas impactadas  
As atividades de campo foram concluídas em 26 de outubro de 2016




EMBRANCO

# PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 18,3	Realizado: 0			
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG013-R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)					
Metas do Programa					
Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer				fev/17	mar/22
Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer				mar/22	mar/22
Definição do Programa					
PF7130 - Definição do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer				set/16	mar/17
Execução do Programa					
Processos					
PF8130 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIF)			16%	jul/16	abr/17
PF8131 - Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)				mar/17	mar/22
Encerramento do Programa					
PF9130 - Encerramento do Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (captura e formalização de benefícios)				mar/22	jun/22



EMBRANCO

# PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			


### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Diagnóstico do Impacto e Inventários do Turismo

- Emissão de carta de apresentação das empresas contratadas e emissão de e-mail apresentando empresas às prefeituras
- Reunião com a Secretaria de Estado de Turismo de MG, realizada pela Expressão Socioambiental, sobre o Inventário da Oferta Turística
- Início dos trabalhos em campo conforme metodologia e prioridade estabelecidas:
  - ✓ **MG: Mariana**
    - Coleta de dados secundários
    - Reunião com a coordenação de turismo do município
  - ✓ **MG: Rio Doce**
    - Coleta de dados primários
    - Reunião técnica com representantes da Prefeitura (com participação do prefeito)
  - ✓ **ES: Regência e Povoação**
    - Reunião com lideranças comunitárias de Regência
    - Levantamento de dados secundários
    - Coleta de dados e mapeamento de stakeholders


#### Eventos Promocionais

- Apoio institucional e participação nos projetos Remando no Rio Doce e Festa das Crianças, realizados no dia 12/10, na Foz do Rio Doce



EMBRANCO

**PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer**  
**Fotos**

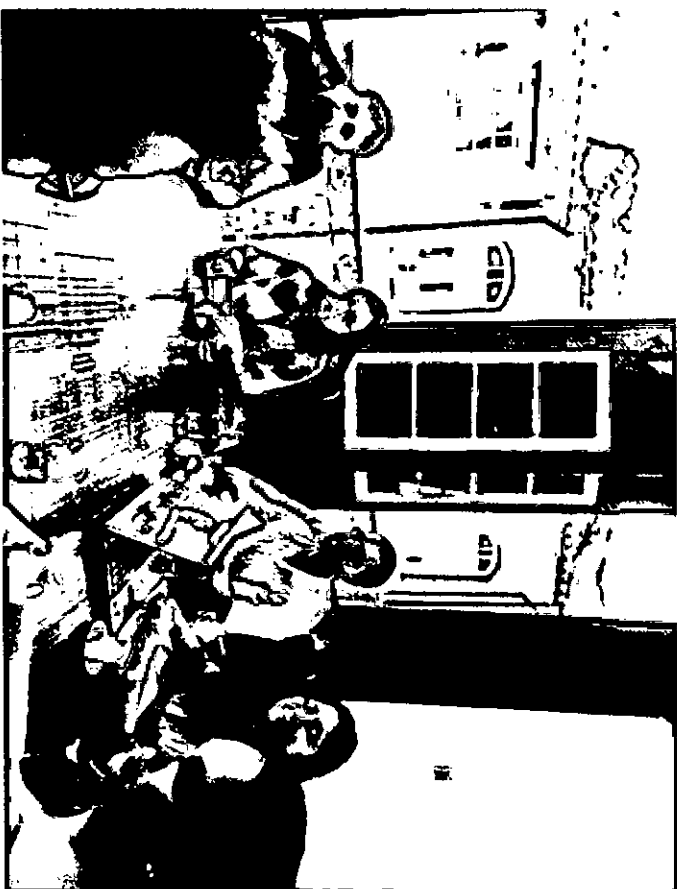

Reunião com a coordenação de turismo do município de Mariana – 19 de outubro de 2016





EM BRANCO

PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer  
Fotos



Evento Remando no Rio Doce. Foz do Rio Doce – 12 de outubro de 2016







**PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer**  
**Fotos**




Remando no Rio Doce. Regência à Povoação – 12 de outubro de 2016





57 IBAMA/PRESI  
Proc. 902  
FLS. 902  
RUB.

EMBRANCO

**PG13 – Turismo, cultura, esporte, lazer**  
**Fotos**



Festa Lazer Criança. Regência – 12 de outubro de 2016




EMBRANCO

# PG14 – Saúde física e mental da população impactada

## Masterplan



Orcamento (R\$MM)	Total: 162,6	Realizado: 15,7			
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG014-R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 106 à 112)					
Metas do Programa					
				nov/15	nov/25
				mar/19	nov/25
Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental				mar/19	mar/19
Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico				nov/25	nov/25
Definição do Programa					
PF7140 - Definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada				out/16	nov/16
				out/16	nov/16
Execução do Programa					
Processos					
PF8140 - Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS (36 meses)			27%	nov/15	mar/19
PF8141 - Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões Impactadas (Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva - 10 anos antes e após o EVENTO)				nov/15	nov/25
Encerramento do Programa					
PF9140 - Encerramento do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (captura e formalização de benefícios)				ago/25	nov/25
				ago/25	nov/25



EM BRANCO

# PG14 – Saúde física e mental da população impactada

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Ações realizadas do plano de ação de Mariana e Barra Longa	24	24	27

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Saúde/Ação Social Mariana:


- Gestão dos planos acordados com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social;
- Início da reforma no imóvel que será a Unidade Básica de Saúde provisória das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu – previsão de entrega: Dez/2016

#### Saúde Barra Longa:

- Gestão das demandas acordadas com a Secretaria de Saúde e MP;
- Início do apoio técnico na gestão da saúde municipal através de consultorias especializadas em saúde coletiva e mental;

#### Estudo epidemiológico e toxicológico:

- Continuidade nas tratativas para o engajamento da instituição de pesquisa parceira na condução do Estudo;




EM BRANCO

# PG15 – Tecnologias socioeconômicas Masterplan



Orcamento(R\$MM)	Total: 7,6	Realizado: 0	%Real.	Início	Término
<b>Tarefa</b>					
PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)					
<b>Metas do Programa</b>				jan/17	mar/22
Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formatação do Programa junto ao CIF				jul/17	jul/17
<b>Definição do Programa</b>				jan/17	jul/17
PF7150 - Definição do Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória				jan/17	jul/17
<b>Execução do Programa</b>				mai/17	dez/21
<b>Processos</b>				mai/17	dez/21
PF8150 - Processo de monitoramento das linhas de Pesquisa				mai/17	dez/21
<b>Encerramento do Programa</b>				dez/21	mar/22
PF9150 - Encerramento do Programa de Apoio à Pesquisa (captura e formalização de benefícios)				dez/21	mar/22



EMBRANCO

# PG15 – Tecnologias socioeconômicas

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Realizados contatos com instituições que já tem expertise no amparo e fomento à pesquisa em MG e ES: FAPEMIG, FAPES, CAPES, CNPq. FAPEMIG e FAPES se posicionaram favorável em participar na definição do programa em conjunto com a Fundação Renova..




EMBRANCO

# PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 10,2	Realizado: 0,1			
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG016-R - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123)					
Metas do Programa					
Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa)					
Definição do Programa					
PF7160 - Definição do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras					
Execução do Programa					
Processos					
PF8160 - Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica)					
Encerramento do Programa					
PF9160 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (captura e formalização de benefícios)					



EMBRANCO

# PG16 – Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Manutenção dos cartões de auxílio financeiro distribuídos para pescadores que perderam temporariamente suas fontes de renda.
- Construção do Termo de Referência.
- Foram feitas reuniões área socioambiental e jurídico para aprofundamento das demandas e riscos que interferem na modelagem do Programa e precisam ser considerados no desenho do TR.
- Realização de reunião com Câmara Técnica de Economia e Inovação para apresentação do desenho do TR e encaminhamentos (09/11).




EM BRANCO

# PG17 – Retomada das atividades agropecuárias Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 125,5	Realizado: 11,1		
Tarefa		% Real.	Início	Término	
<b>PG017-R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128)</b>					
<b>Metas do Programa</b>					
			dez/15	fev/23	
			out/17	nov/22	
Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo			out/17	out/17	
Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem			nov/20	nov/20	
Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades			nov/22	nov/22	
<b>Definição do Programa</b>					
			set/16	out/16	
PF7170 - Definição do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias			set/16	out/16	
<b>Execução do Programa</b>					
<b>Projetos</b>					
			dez/15	nov/22	
PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas			dez/15	jan/21	
			abr/16	mai/17	
Execução do cercamento das demais propriedades afetadas		79%	abr/16	fev/17	
Encerramento do Projeto		0%	fev/17	mai/17	
<b>PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)</b>					
			dez/15	jan/18	
Planejamento da Execução		100%	dez/15	abr/16	
Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo		52%	jan/16	out/17	
Encerramento do Projeto			out/17	jan/18	
<b>PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a;b;l)</b>					
			jun/16	fev/20	
Planejamento da Execução		59%	jun/16	fev/17	
Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais			fev/17	nov/19	
Encerramento do Projeto			nov/19	fev/20	
<b>PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)</b>					
			ago/16	jan/20	
Avaliação de Alternativas, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (URTs)		38%	ago/16	jun/17	
Definição do Escopo			jun/17	set/17	
Planejamento da Execução			set/17	fev/18	
Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda			fev/18	nov/19	
Encerramento do Projeto			nov/19	jan/20	




EM BRANCO

# PG17 – Retomada das atividades agropecuárias

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)</b>		mai/16	jan/21
Avaliação de Alternativas	27%	mai/16	mai/17
Definição do Escopo		mai/17	set/17
Planejamento da Execução		set/17	jan/18
Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas		jan/18	nov/20
Encerramento do Projeto		nov/20	jan/21
<b>Processos</b>		jan/16	nov/22
PF8170 - Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)		jan/16	nov/20
PF8171 - Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)		out/16	nov/22
PF8172 - Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa)		out/18	jul/21
<b>Encerramento do Programa</b>		nov/22	fev/23
PF9170 - Encerramento do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (captura e formalização de benefícios)		nov/22	fev/23



EMBRANCO

# PG17 – Retomada das atividades agropecuárias

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Identificação das necessidades para reconstrução de poços de peixe (autorização ambiental)	15/dez	15/dez

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Cercamentos recuperados (km)	106,9	107	135
Produção de forragem substitutiva (t/mês)	150	90	150
Solo recuperado (ha)	165	165	165
Fornecimento de alimentação animal (t/mês)	NA	9600	9600

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Reunião com a EPAMIG para definição do escopo do trabalho de diversificação da fonte de renda dos produtores rurais;
- Conclusão da minuta do contrato de parceria técnica com a EMATER;
- Execução de 10 km de cercas;
- Atendimento ao Plano de Ação – Risco de Cheias;
- Abertura de mais silos com volumoso construídos nas propriedades rurais, com o objetivo de reduzir a aquisição de silagem na época de estiagem;
- Atividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de formicida e herbicida);
- Corte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio realizado já está em ponto de corte;
- Plantio de pomares e hortaliças;
- Continuação da entrega de silagem aos produtores de Mariana a Santa Cruz do Escalvado.




EM BRANCO

# PG18 – Diversificação da economia regional Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 42,7	Realizado: 0		
Tarefa	% Real.	Início	Término		
<b>PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131)</b>					
<b>Metas do Programa</b>					
Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas		out/16	dez/30		
		set/17	set/17		
<b>Definição do Programa</b>					
PF7180 - Definição do Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria		out/16	nov/17		
<b>Execução do Programa</b>					
<b>Processos</b>					
PF8180 - Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)		nov/17	dez/30		
<b>Encerramento do Programa</b>					
PF9180 - Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		out/30	dez/30		



EM BRANCO

# PG18 – Diversificação da economia regional

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- As ações do Programa serão direcionadas pela seguinte Visão Estratégica:
  - Contribuir para a diminuição da dependência econômica de Mariana com relação à indústria minerária, propiciando o aumento do número de empregos formais em indústrias distintas da extração minerária
- Para o alcance desta Visão, tem como requisitos: (i) a inexistência de fatores externos ao País, na forma de crise aguda e de longo prazo, que afetem a economia; (ii) a imprescindível estabilidade político, institucional, social e econômica, notadamente do município; (iii) o engajamento dos governantes municipais à implementação das propostas do Programa e a continuidade administrativa.
- Seguindo definições metodologias, os trabalhos terão início pela elaboração do PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MARIANA 2030, com visão de longo prazo, objetivando direcionar as ações do município para um futuro desejado por toda a sociedade. Os trabalhos foram especificados e contratados em outubro e têm datas estabelecidas para início em dezembro de 2016 e término janeiro de 2017, com amplo envolvimento do poder público, instituições e setores organizados.




EM BRANCO

# PG19 – Micro e pequenos negócios Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 26,5	Realizado: 0,9			
Tarefa			% Real.	Início	Término
PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)					
Metas do Programa					
Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDAÇÃO)				ago/19	ago/19
Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais				mar/20	mar/20
Definição do Programa					
PF7190 - Definição do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo				nov/16	abr/17
Execução do Programa					
Processos					
PF8190 - Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação			22%	jul/16	mai/17
PF8191 - Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação				abr/17	ago/19
PF8192 - Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após Formalização do Programa)				abr/17	mar/20
Encerramento do Programa					
PF9190 - Encerramento do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (captura e formalização de benefícios)				mar/20	jun/20



EM BRANCO

# PG19 – Micro e pequenos negócios

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Processos concluídos em Mariana (#)	179	165	179
Processos concluídos em Barra Longa (#)	96	87	96

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Tratativa dos processos que foram incluídos seguindo os critérios estabelecidos;
- Continuação da execução das ações do planejamento realizado para Barra Longa/Candongá;
- Finalização do processo de auxílio financeiro de Regência;
- Início do processo de pagamento de boletos da associação de pescadores de regência;
- Continuação do processo de pagamento de boletos dos areeiros;
- Finalização do processo do "Bar e Quiosque da Barra";
- Início das discussões para contratação de consultoria técnica para o programa 19;





EMBRANCO

# PG19 – Micro e pequenos negócios

## Fotos




### ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS

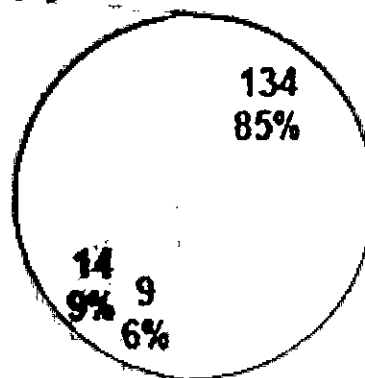


- Comércios estingidos indiretamente
- Comércios com processo em curso
- Comércios ainda não iniciados
- Comércios com processos finalizados

### DESEMBOLSO GLOBAL: R\$ 1.912.784,96

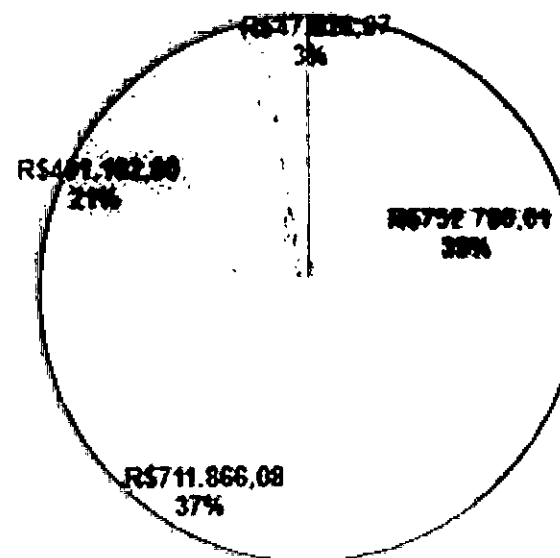

- Desembolso com EQPTOS Barra Longa/Candonga
- Desembolso com BOLETOS Barra Longa/Candonga
- Desembolso com EQPTOS Mariana/Paracatu
- Desembolso com BOLETOS Mariana/Paracatu



EM BRANCO



EM BRANCO

# PG20 – Estímulo à contratação local

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		


### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Contratação de mão-de-obra local (%)	NA	57	NA
Contratação de fornecedores locais (%)	NA	76	NA



### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Fechamento do escopo de contratação do diagnóstico e início do processo de contratação.

**FORNECEDORES LOCAIS – CONTRATOS ATIVOS**  
Empresas dos estados da área de abrangência

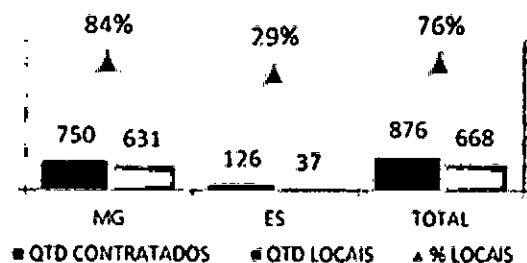

**MÃO DE OBRA LOCAL**  
NTE das cidades da área de abrangência

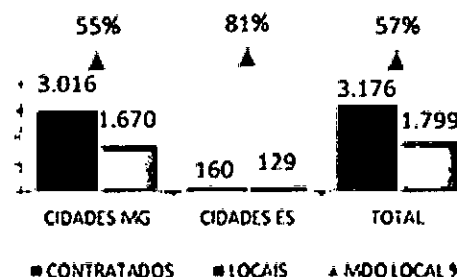


EM BRANCO

# PG21 – Auxílio financeiro emergencial Masterplan



Orçamento (R\$MM)		Total: 464,1	Realizado: 162,4		
Tarefa		% Real.	Início	Término	
PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 à 140)					
Metas do Programa					
Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal			jun/20	jun/20	
Definição do Programa					
PF7210 - Definição do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS			out/16	out/16	
Execução do Programa					
Processos					
PF8210 - Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)			18%	nov/15	jun/20
Encerramento do Programa					
PF9210 - Encerramento do Programa de Auxílio Financeiro Emergencial (captura e formalização de benefícios)			jun/20	set/20	



EM BRANCO

# PG21 – Auxílio financeiro emergencial

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Cartões entregues (#)	NA	7919	NA
Indenizações antecipadas 10 mil (#)	NA	35	NA
Indenizações antecipadas 20 mil (#)	NA	347	NA

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Manutenção da entrega de cartões aos ribeirinhos identificados como elegíveis ao programa.
- Avaliação de casos indefinidos de possível perda de renda em Mariana e concessão de cartões auxílio financeiro.
- Análise de elegibilidade e atualização do Registro de Análises (SGS) dos integrantes das famílias dos cartões concedidos em juízo
- Reunião com a comunidade para retirada de dúvidas sobre o auxílio financeiro ( Colatina).
- Abertura de requisição para distribuição de cestas básicas a garimpeiros de Santa Cruz do Escalvado




EMERGENCY

# PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 29,4	Realizado: 0	% Real.	Início	Término
<b>Tarefa</b>					
PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)					
Metas do Programa					
Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES					
Definição do Programa					
PF7220 - Definição do Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e formalização junto ao CIF					
Execução do Programa					
Processos					
PF8420 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES					
Encerramento do Programa					
PF9420 - Encerramento do Programa de Ressarcimento dos gastos públicos (captura e formalização de benefícios)					



EM BRANCO

# PG42 – Ressarcimento gastos públicos extraordinários

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
-		

### MÉTRICAS


Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

- Reanálise dos procedimentos elaborados para o Programa, com o intuito de assegurar conformidade do processo de ressarcimento de gastos públicos extraordinários
- Recebimento e análise de solicitação relativa ao município de Belo Oriente.

### Ações futuras em especificação e / ou contratação :

- Em paralelo as ações de elaboração do PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MARIANA 2030 ocorrerão estudos relativos ao mercado comprador da região (raio de 50 km) e o diagnóstico das potencialidades e restrições da produção local.
- Ainda em 2017 terão início os trabalhos de levantamento das bases cartográficas do território de forma a subsidiar a revisão do plano diretor e promover adequações nas legislações municipais existentes, visando à instalação de novos empreendimentos na região e fortalecimento dos atuais, por meio de mecanismos de fomento, abertura de mercado, capacitação, disponibilização de crédito, incentivo à cooperação, outros.




EM BRANCO

# ÍNDICE

## Socioambiental



<b>Visão geral</b>	Visão geral – reparatório/compensatório .....	080
<b>Gestão rejeitos e qualidade água</b>	PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1 .....	082
	PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios.....	089
<b>Restauração florestal</b>	PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes .....	094
<b>Conservação da biodiversidade</b>	PG28 – Conservação da biodiversidade .....	097
	PG29 – Recuperação da fauna silvestre .....	099
	PG30 – Fauna e flora terrestre .....	101
<b>Segurança hídrica e qualidade água</b>	PG31 – Coleta e tratamento de esgoto .....	103
	PG32 – Melhoria sist. de abastecimento de água .....	105
<b>Educação, comunicação e informação</b>	PG33 – Educação ambiental .....	112
	PG34 – Emergência ambiental .....	115
	PG35 – Informação para a população .....	120
	PG36 – Comunicação nacional/internacional .....	122
<b>Preservação e segurança ambiental</b>	PG37 – Gestão de riscos ambientais .....	124
	PG38 – Monitoramento bacia do Rio Doce .....	126
<b>Gestão e uso sustentável da terra</b>	PG39 – Unidades de conservação .....	130
	PG40 – CAR e PRAs .....	132
<b>Gestão</b>	PG22/41 – Gerenciamento programas .....	134



EM BRANCO


# PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

## Visão geral - Reparatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total*	Real.	2016*	2017*	2018*	2019*
PG023 - Manejo dos rejeitos	dez/15	mar/17	out/26	jan/27	0	0,0	0	0	0	0
PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	nov/15	set/16	fev/20	mai/20	648,5	148,2	276,8	203,3	98,1	61,2
PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos	dez/15	mar/17	out/26	jan/27	1023	144,6	194,6	279,6	108,7	120,8
PG028 - Conservação da biodiversidade	jun/16	jul/17	nov/20	fev/21	39,2	0,0	7,4	6,4	7	7
PG030 - Fauna e flora terrestre	ago/16	dez/16	set/21	nov/21	18	0,0	6	2,4	2,4	2,4
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan/16	ago/17	ago/20	abr/21	96,3	12,4	15	30,4	50,4	0,2
PG037 - Gestão de riscos ambientais	set/16	mar/17	mar/17	jun/17	2	0,0	0	2	0	0
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	263,7	72,3	86,5	29,4	46,4	11,1
PG039 - Unidades de conservação	set/16	jul/17	jan/22	mai/22	6	0,0	0,6	1,3	1	1
PG022/PG041 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais	mar/16	nov/16	dez/30	dez/30	590,6	2,9	33,1	114,2	83,5	64,9
<b>Total medidas reparatórias</b>					<b>2.687</b>	<b>380</b>	<b>620</b>	<b>669</b>	<b>398</b>	<b>269</b>

(\*) Referência: Plano de 3 anos



EM BRANCO


# PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

## Visão geral - Compensatório



Programa	Início do programa	Término da Fase			Total*	Desembolso em R\$ MM				
		Definição	Execução	Encerr.		Real.	2016*	2017*	2018*	2019*
PG026 - Recuperação de APPs	set/16	fev/17	mar/26	mar/26	1262	0,2	15,1	59,1	63,4	77,7
PG027 - Recuperação de nascentes	set/16	fev/17	mar/26	mar/26	0	0	0	0	0	0
PG029 - Recuperação da fauna silvestre	mar/18	mar/18	mar/23	mai/23	29,3	0	0,1	0,1	14,8	3,6
PG031 - Coleta e tratamento de esgoto	set/16	out/16	dez/18	mar/19	500	0	50	200	250	0
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan/16	ago/17	ago/20	abr/21	67,6	2,5	9,5	24,3	30,1	1,2
PG034 - Educação ambiental	fev/16	out/16	mar/22	out/26	35,6	6,4	16,8	6	2,2	3,1
PG035 - Informação para a população	jun/16	out/16	mar/26	mar/26	24,8	0	1,4	2,3	2,3	2,3
PG036 - Comunic. nacional/internacional	jun/16	out/16	mar/26	mar/26	5,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov/15	jan/17	dez/30	dez/30	13,5	0	1	10,2	2	0,2
PG039 - Unidades de conservação	set/16	jul/17	jan/22	mai/22	15	0	6,5	8,5	0	0
PG040 - CAR e PRAs	nov/15	out/16	mar/26	mai/26	6	0	0,7	2	0,5	0,4
<b>Total medidas compensatórias</b>					<b>1959</b>	<b>9</b>	<b>102</b>	<b>313</b>	<b>366</b>	<b>89</b>

(\*) Referência: Plano de 3 anos




EM BRANCO

# PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1

## Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 1023	Realizado: 144,6	% Real.	Início	Término
<b>Tarefa</b>					
PG023-R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160)					
<b>Metas do Programa</b>					
Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosedimentológica			100%	nov/15 jul/16	jan/27 mar/20
Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeira				jul/16	jul/16
Cláusula 158 - Revegetação inicial (800 ha)			100%	mar/20	mar/20
Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1				jul/16	jul/16
Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1				mar/20	mar/20
<b>Definição do Programa</b>					
PF7230 - Definição do Programa de manejo dos rejeitos / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1				dez/17	dez/17
<b>Execução do Programa</b>					
<b>Projetos</b>					
PF0019 - Revegetação Inicial (emergencial)				fev/16	mar/17
Execução da Revegetação Inicial (800 ha)			100%	fev/16	mar/17
PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues				nov/15	out/26
Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição)				nov/15	nov/22
Execução da Limpeza de Bento Rodrigues			100%	dez/15	jul/16
Encerramento do Projeto				dez/15	jul/16
PF0020 - Reabilitação dos Tributários				ago/16	mar/17
Execução de recuperação ambiental dos tributários			76%	ago/16	ago/16
Encerramento do Projeto				set/16	dez/16
PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias) / PF0146 - Controle de Erosão e dispositivos de Drenagens				dez/16	mar/17
Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias			80%	dez/15	set/17
Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal			68,30%	jun/17	set/17
Execução de recuperação ambiental da calha principal (Incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017)			36,35%	nov/15	jan/18
Encerramento do Projeto				jun/16	jul/16
PF0169 - Recuperação de áreas degradadas				jul/16	mar/17
Revegetação em APP - 2000 ha				jul/16	out/17
Encerramento do Projeto				out/17	jan/18
				ago/16	jan/21
				nov/17	mar/20
				mar/20	mar/20




EM BRANCO

# PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0133 - UHE Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)</b>		jan/17	nov/22
Avaliação de Alternativas		jan/17	abr/17
Definição do Escopo		abr/17	out/17
Planejamento da Execução		out/17	abr/18
Execução do manejo de rejeitos da UHE Risoleta Neves (em paralelo com eventual dragagem adicional para liberação dos 400m)		abr/18	ago/22
Encerramento do Projeto		ago/22	nov/22
<b>Processos</b>		nov/15	out/26
PF8230 - Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)		nov/17	out/26
PF8231 - Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais		nov/15	nov/23
<b>Encerramento do Programa</b>		out/26	jan/27
PF9230 - Encerramento do Programa de manejo dos rejeitos (captura e formalização de benefícios)		out/26	jan/27



EM BRANCO

# PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Áreas Não Prioritárias - Contratar engenharia	10/dez	10/dez

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Revegetação inicial (ha)	800	808	800
Tributários recuperados (#)	74	58	92
Controle de Erosão - Áreas prioritárias (Gualaxo do Norte e Carmo) (ha)	226	2216	596

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Manejo dos rejeitos:


- Reunião no IEMA para discussão sobre os estudos biogeoquímicos;
- Apresentação da Golder sobre a matriz de decisão de manejo de rejeitos;
- Recebimento do Termo de Referência para Análise de Risco;
- Finalização das respostas às dúvidas, críticas e sugestões dos Workshops;
- Início de elaboração de documentação para adicionar ao PRAI explicando a estratégia assumida sobre o manejo de rejeitos.

#### Controle atmosférico de Barra Longa:

- Contratação de 2 canhões de névoa; Contratação de 1 caminhão varredor a vácuo;
- Entrega de estudo sobre análise química da poeira.

#### Recuperação da área ambiental 1:

- Operação Águas - fase Argos;
- Detalhamento das atividades nas áreas prioritárias junto as empresas de bioengenharia;
- Elaboração de manual técnico para padronização da atuação nas obras de drenagem;
- Disponibilização de dados no WebGis dos órgãos ambientais
- Conclusão da recuperação de 1 tributário.



EM BRANCO

# PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1

## Fotos




### Controle Atmosférico de Barra Longa



Caminhão Varredeira


Canhões de Névoa



EMBRANCO



**Gestão Atmosférica - Controle de fumaça negra**

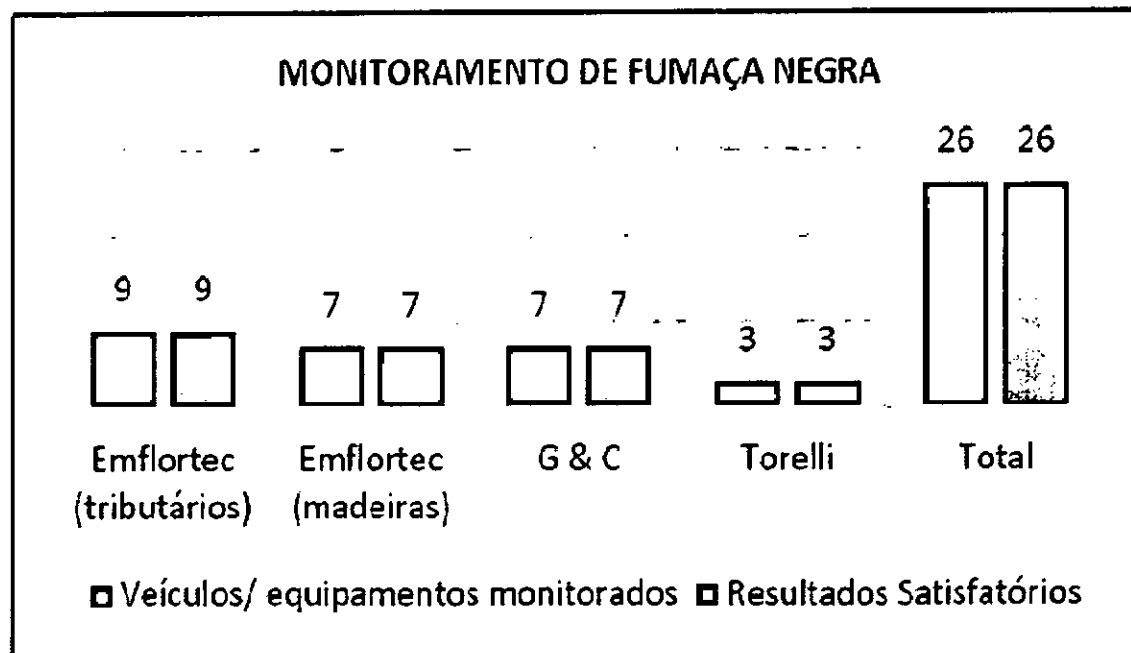

Realização do Monitoramento de Fumaça Negra

Mensalmente é realizado o monitoramento de fumaça negra de todos os veículos e equipamentos movidos a óleo diesel. Após a verificação utilizando a Escala Ringelmann, os veículos e equipamentos que estiverem dentro dos padrões aceitáveis, são identificados com selo verde.

EM BRANCO




Recuperação área ambiental 1



Atividades nas calhas dos rios –  
área 06




T 08 Rio do Carmo- andamento da obra

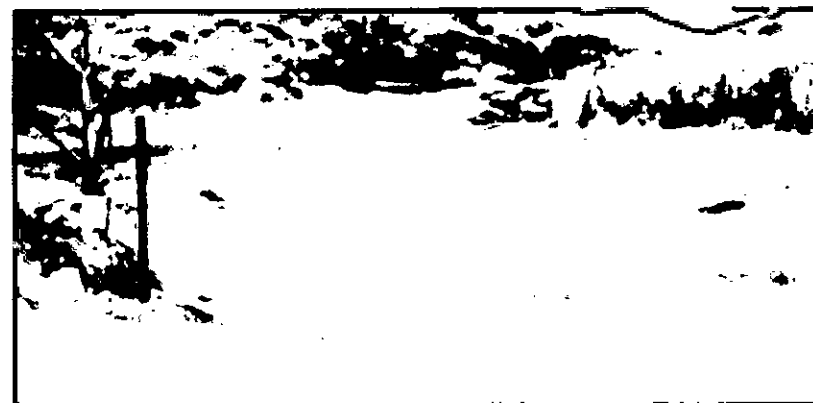

T 07 Rio do Carmo- andamento da obra

Atividades nos tributários





EM BRANCO

# PG23 – Manejo dos rejeitos / PG25 – Recuperação área ambiental 1


## Fotos



### Recuperação área ambiental 1

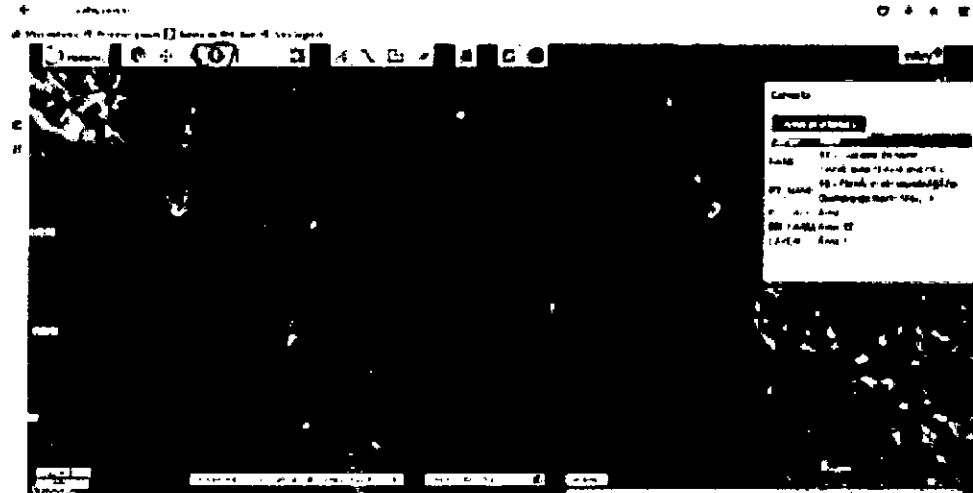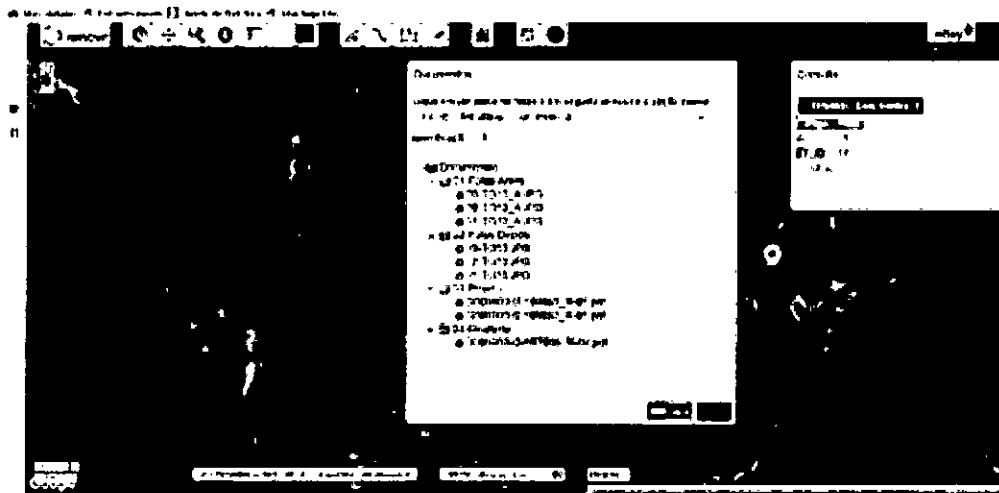

Disponibilização de dados no WebGis dos órgãos ambientais



EMBRANCO

## PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios




O programa PG24 – Programa de implantação dos sistemas de contenção de rejeitos e tratamento in situ dos rios impactados apresentado a seguir está sob responsabilidade e permanecerá sendo executado pela Samarco até a conclusão do projeto PF0056 – Fundão eixo 1 – fase 1.

Dessa forma a Fundação Renova não garante e nem assume qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude das informações apresentadas.

A sua presença neste documento é apenas de caráter informativo.

A Fundação assumirá a responsabilidade pelo desenvolvimento deste programa a partir da conclusão do projeto.



EM BRANCO


# PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios

## Masterplan



**Orçamento (R\$MM)** Total: 648,5 Realizado: 148,2

Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PG024-R - Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157)</b>			
<b>Metas do Programa</b>			
Cláusula 155 - Estudo para adoção de melhores técnicas de contenção de rejeitos	100%	ago/16	ago/16
Cláusula 154 - Construção das estruturas emergenciais para contenção de sedimentos - Primeiro período chuvoso		jan/17	jan/17
Cláusula 157 - Redução da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 NTU (inclui ações em outros programas)		mar/19	mar/19
<b>Definição do Programa</b>			
PF7240 - Definição do Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados		mar/16	set/16
<b>Execução do Programa</b>			
<b>Projetos</b>			
<b>Projetos emergenciais de contenção de rejeito</b>			
Reforço da Barragem de Santarém	100%	nov/15	mai/16
Dique S1A	100%	fev/16	fev/16
Dique S2A	100%	dez/15	fev/16
Dique S3	100%	nov/15	fev/16
<b>PF0018 - Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo (Projeto em HOLD)</b>			
Planejamento da Execução	99%	abr/16	set/16
Execução dos Diques do Gualaxo e Estações de Dosagem	10%	jun/16	abr/17
Encerramento do Projeto		abr/17	jul/17
<b>PF0056 - Fundão Eixo 1 - Fase 1</b>			
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	44%	mar/16	dez/16
Encerramento do Projeto		dez/16	mar/17
<b>PF0132 - Fundão Eixo 1 - Fase 2 (EL.860)</b>			
Definição do Escopo		nov/16	fev/20
Planejamento da Execução		nov/16	dez/16
Execução do Projeto		jan/17	fev/17
Encerramento do Projeto		abr/17	nov/19
		nov/19	fev/20




EMBRANCO

# PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios

## Masterplan



Tarefa	% Real.	Início	Término
<b>PF0057 - Nova Barragem Santarém</b>	51%	mar/16	mar/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	49%	abr/16	dez/16
Encerramento do Projeto		dez/16	mar/17
<b>PF0062 - Alçamento do Dique S3 - Fase 1</b>		fev/16	jul/16
Execução do Projeto	100%	fev/16	abr/16
Encerramento do Projeto	100%	abr/16	jul/16
<b>PF0065 - Alçamento do Dique S3 - Fase 2</b>	29%	mar/16	fev/17
Planejamento da Execução	100%	mar/16	jul/16
Execução do Projeto	29%	jun/16	nov/16
Encerramento do Projeto		nov/16	fev/17
<b>PF0130 - Dragagem dique S3</b>	NI	out/16	jun/17
Execução do Projeto		out/16	mar/17
Encerramento do Projeto		mar/17	jun/17
<b>PF0055 - Dique S4</b>	15%	jul/16	fev/17
Planejamento da Execução	98,50%	jul/16	set/16
Execução do Projeto	9%	set/16	jan/17
Encerramento do Projeto		jan/17	fev/17
<b>PF0131 - Manejo de águas superficiais em Germano</b>		jun/16	fev/17
Planejamento da Execução	100%	jun/16	ago/16
Execução do Projeto	8%	jul/16	jan/17
Encerramento do Projeto		jan/17	fev/17
<b>Processos</b>		fev/17	dez/19
<b>PF8240 - Processo de Operação/Manutenção nas bacias de sedimentação do Gualaxo (clarificação de água/remoção de rejeitos) - incluindo descomissionamento dos</b>		fev/17	dez/19
<b>Diques</b>		fev/20	mai/20
<b>Encerramento do Programa</b>		fev/20	mai/20
<b>PF9240 - Encerramento do Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ (captura e formalização de benefícios)</b>		fev/20	mai/20



EM BRANCO

# PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias


Descrição	Planejado	Tendência
Start-up do Manejo de águas superficiais em Germano - Operação manual (automação 25/01)	03/dez	03/dez
Conclusão da Execução do S4	17/jan	17/jan
Conclusão da compactação da 2da Etapa de Nova Santarém até EL.770,00	09/dez	30/dez
Conclusão da Dragagem S3	05/out	25/mar

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
Aterro do maciço Dique S4 (mil m3)	0	0	45
Aterro do maciço Fundão Eixo 1 - Fase 1 (mil m3)	0	0	38
Aterro do maciço Nova Barragem Santarém (mil m3)	436,87	351,84	545
Dragagem Dique S3 (mil m3)		17,23	600
Lançamento de tubulação PEAD - Manejo das águas (mil m3)	12,1	12,1	21,4

### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES



- Nova Barragem de Santarém: Em andamento a engenharia para usar blocos com finos para alcançar El. 770m em 2016.
- Eixo 1 – Fase 1: Concluído o teste de aterro com solocal e em andamento as atividades de lançamento de blocos para proteger a enseadeira.
- Alteamento do dique S3: Em andamento transporte e colocação de blocos. As atividades foram paralisadas de 02 a 05/11, conforme solicitado pelo Ministério Público.
- Dragagem Dique S3: As atividades estão sendo impactadas pelo baixo nível de água do reservatório do dique S3. As atividades foram paralisadas de 02 a 05/11, conforme solicitado pelo Ministério Público



EM BRANCO

# PG24 – Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios


## Fotos




Visão Geral = Nova Santarém



Visão Geral = Parque SS

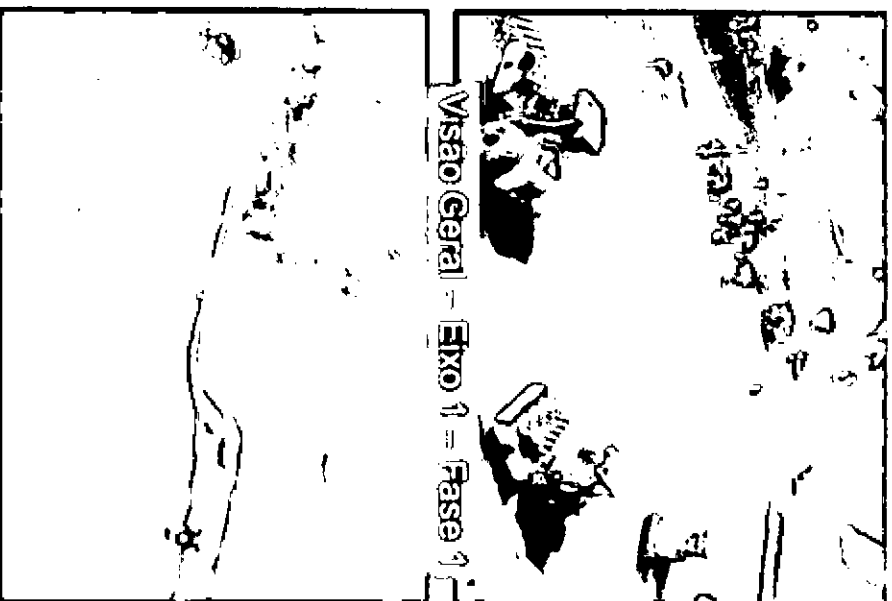

Visão Geral = Eixo 1 = Fase 1




EMERSON

# PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes Masterplan



Orçamento (R\$MM)	Total: 1262	Realizado: 0,2	% Real.	Início	Término
<b>Tarefa</b>					
PG026-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos (Cláusulas 161 e 162) / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163)				out/15	mar/26
<b>Metas do Programa</b>				mar/26	mar/26
Cláusula 161 - Recuperação de APPs degradadas - 40000 ha				mar/26	mar/26
Cláusula 163 - Recuperação de nascentes - 5000 nascentes (500/ano)				mar/26	mar/26
<b>Definição do Programa</b>				out/15	fev/17
PF7260 - Definição do Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes				out/15	fev/17
<b>Execução do Programa</b>				out/16	mar/26
<b>Projetos</b>				out/16	mar/26
PF0135 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163)				out/16	mar/17
Execução da reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163, com premissa de início imediato após emissão do Plano de forma emergencial)				out/16	fev/17
Projetos/Processos de recuperação de APPs, Nascentes degradadas e monitoramento da efetividade da recuperação das mesmas				mar/17	mar/26
<b>Encerramento do Programa</b>				dez/25	mar/26
PF9260 - Encerramento do Programa de recuperação de APPs e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce (captura e formalização de benefícios)				dez/25	mar/26



EM BRANCO

# PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes

## Acompanhamento



### PRINCIPAIS MARCOS - 90 dias

Descrição	Planejado	Tendência
Recebimento de Proposta técnica revisada do IBIO	21/out	14/nov
Início das atividades de campo na região de Colatina (sub-bacias do Santa Maria do Doce e Pancas)	03/nov	03/nov
Início das atividades de campo na região de GV (sub-bacia Suassuí Grande)	07/nov	07/nov
Início das atividades de campo na região de GV (sub-bacia Suassuí Grande)	07/nov	07/nov

### MÉTRICAS

Descrição	Planejado	Realizado	Meta
-			


### AÇÕES REALIZADAS NO MÊS / OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES

#### Recuperação de APPs

- Foi recebido o Termo de Referência de Definição de Critérios de Priorização de Áreas para Recuperação Ambiental na Bacia do Rio Doce, elaborado pela Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água. Após avaliação do mesmo será definido o escopo para contratação da Elaboração do Plano Diretor para a recuperação de 40.000 ha de APPs e 5.000 nascentes na Bacia do Rio Doce.

#### Recuperação de nascentes


- O contrato do Instituto Terra está em revisão para encurtar o cronograma de recuperação de nascentes com data final de 28/02 visando atender o prazo do TTAC, após isso serão definidos indicadores para acompanhamento da recuperação das nascentes.
- O Instituto Terra iniciou os trabalhos no dia 08/11 realizando contato prévio com lideranças no município de Frei Inocência e Jampruca - MG
- Programadas reuniões com proprietários do município de Frei Inocência.




EM BRANCO

# PG26 – Recuperação de APPs / PG27 – Recuperação de nascentes

Fotos



Contato prévio com lideranças no município de Frei Inocêncio e Jampruca - MG



EM BRANCO
