FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Ano 2022 – Janeiro 2023

Sumário

Apresentação 5

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados 6

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados 14

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas 21

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais 42

PG005 Programa de Proteção Social 51

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 64

PG007 Programa de Assistência aos Animais 103

PG008 Reconstrução de Vilas 113

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves 136

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga 157

PG011 Recuperação das Escolas Impactadas e Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio Doce 167

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística 177

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 184

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada 193

PG015 Promoção da Inovação 202

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 210

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias 219

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica 230

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios 238

PG020 Estímulo à Contratação Local 245

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial 263

PG023 Manejo de Rejeitos 270

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 276

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas 283

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes 291

PG028 Conservação da Biodiversidade 298

PG029 Recuperação da Fauna Silvestre 306

PG030 Fauna e Flora terrestre 312

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos 319

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água 341

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental) 357

PG034 Preparação para Emergências Ambientais 363

PG035 Programa de Informação para a População 373

PG036 Comunicação Nacional e Internacional 386

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce 394

PG039 Unidades de Conservação 405

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA 414

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários 421

Glossário 428

Gestão Econômica* 435

Apresentação

O presente documento cumpre a Cláusula 192, parágrafo segundo, do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), o qual determina a elaboração de relatório anual sobre o andamento de todos os Programas — Socioambientais e Socioeconômicos desenvolvidos e executados pela Fundação Renova — e envio ao Comitê Interfederativo (CIF), até o dia 20 de janeiro de cada ano. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em 5 novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao evento, como está disposto na Cláusula 5, Inciso I, do referido termo.

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos socioeconômicos. Esse programa abrange as cláusulas 19 a 30 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022



Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 175.759,00 solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento;
- 35.317 cadastro enviados ao CIF, correspondente a 30.821 famílias e 99.553 pessoas, desde o início do programa até o momento.

Fatos relevantes do Ano

03-2022 Retomada do Cadastro Fase 2 - eixo 7 -conforme decisão judicial da 12o Vara Federal Civil / MG

04-2022 Avanço no Cadastro de Mariana conforme dados abaixo:

Total de Cadastros liberados: 1.470
Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de 2019 (Universo de 79): 89 pesquisas realizadas. Pesquisa finalizada.
Total de Pesquisas Aplicadas da Lista de 2020 (Universo de 177): 158 pesquisas realizadas mais 19 cadastros em tratativas. Pesquisa Finalizada.

05-2022 Finalização da aplicação do cadastro de Mariana pela Cáritas Brasileira :
Pesquisas aplicadas: 1.505
Vistorias realizadas: 956

11-2022 Realizada a sincronização parcial de dados dos atendimentos da Fase 2.

12-2022 Atendimento de 36.855 solicitantes no Ano de 2022.

Indicadores

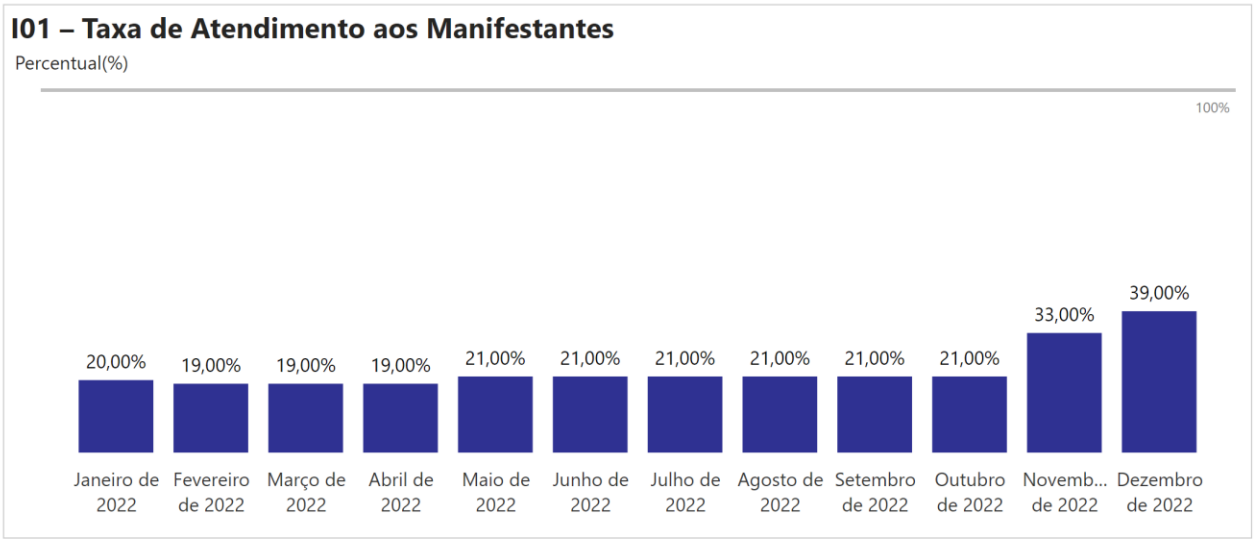


Gráfico 1: I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes - Frequência Mensal

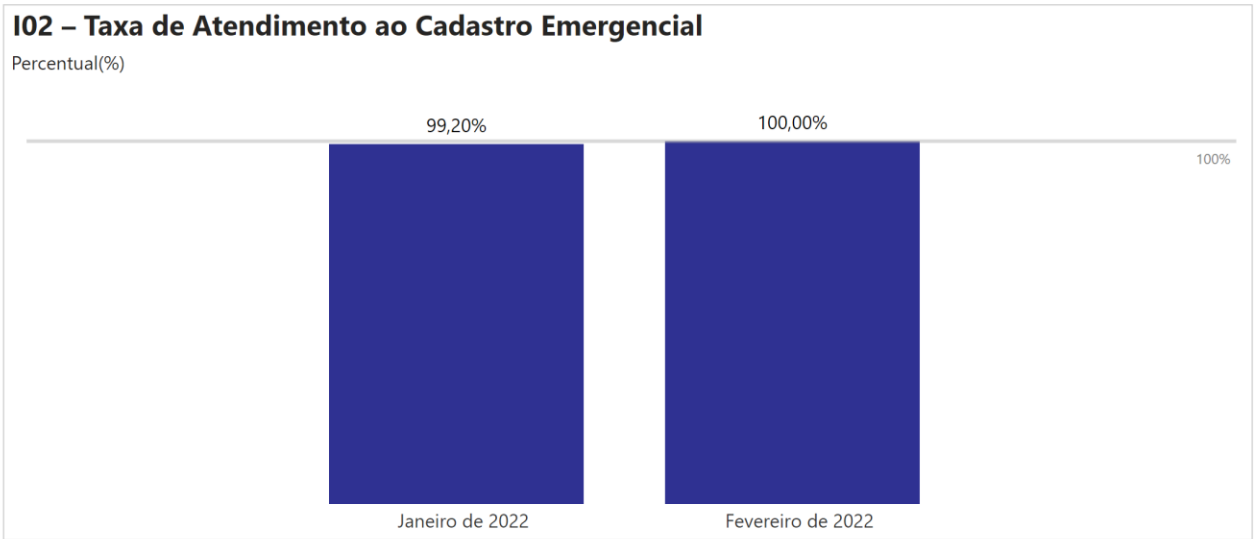


Gráfico 2: I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial - Frequência Mensal

Indicadores

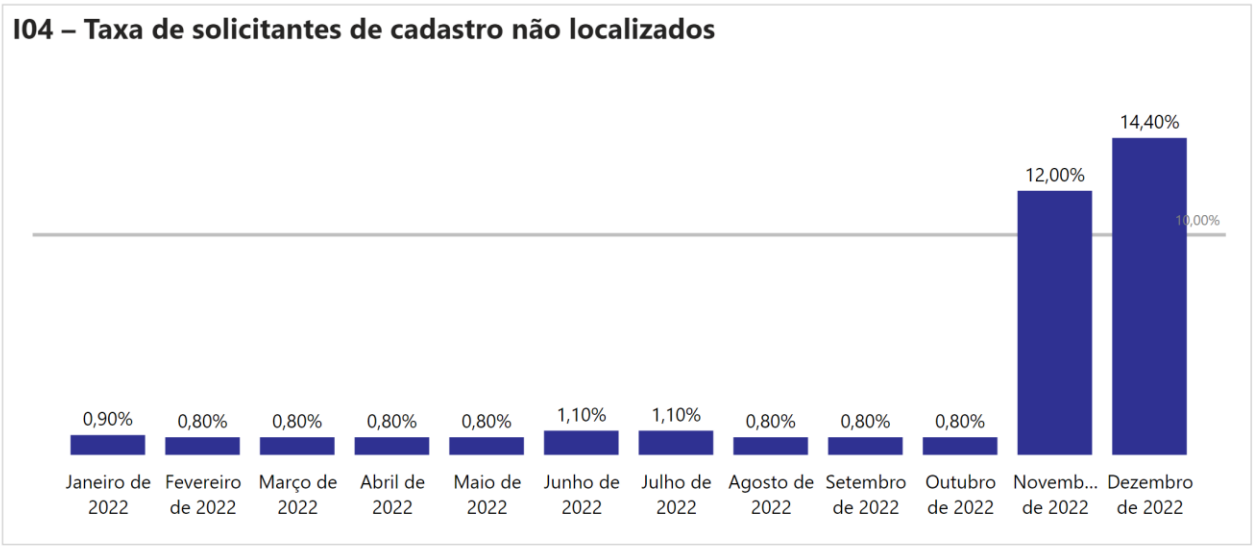


Gráfico 3: I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados - Frequência Mensal

Indicadores de Acompanhamento

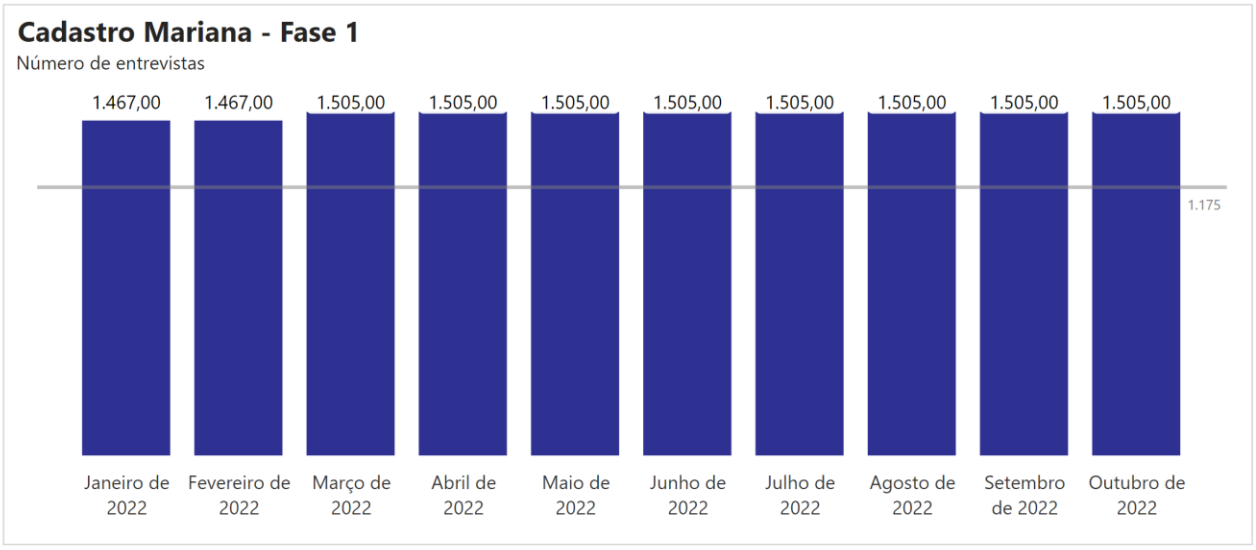


Gráfico 4: Cadastro Mariana - Fase 1 - Frequência Mensal

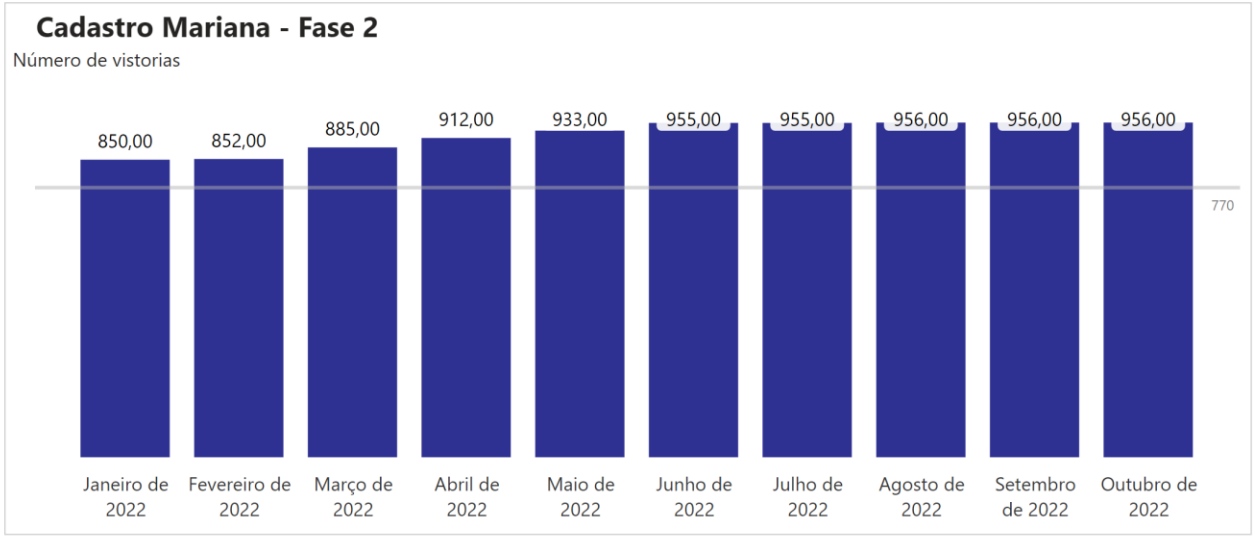


Gráfico 5: Cadastro Mariana - Fase 2 - Frequência Mensal

PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial. Cláusulas 31 a 38 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não foi possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- **Para Dano Água**, até o momento foram atendidas 320.179,00 pessoas, sendo que 270.372,00 aceitaram propostas. Destas, 264.988,00 propostas já foram pagas (98,01% das propostas aceitas). Os pagamentos somam **R$** 305,24 Mi .

- **Para Danos Gerais**, 10.813,00 núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização, sendo que 10.761,00 já foram pagos (99,52% dos casos). Os pagamentos de Danos Gerais somam **R$** 1.896,52 Mi .

- **Para a campanha de Mariana**, até o momento foi realizado o pagamento de 807,00 indenizações, o que representa 98,53% do total das 819,00 propostas aceitas.

Fatos Relevantes do Ano

12/2022	Até o momento, 74.892 requerentes tiveram seus acordos homologados junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
12/2022	Até o momento, foi realizado o pagamento de 807 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,5% do total das 819 propostas aceitas. Foram 10 indenizações pagas no mês.

Indicadores

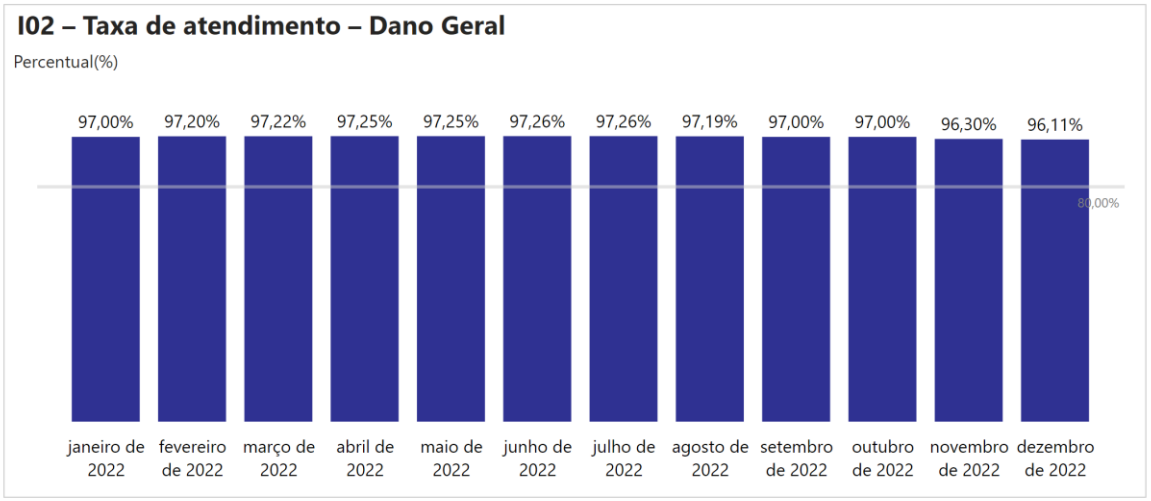


Gráfico 1: I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral - Frequência Mensal

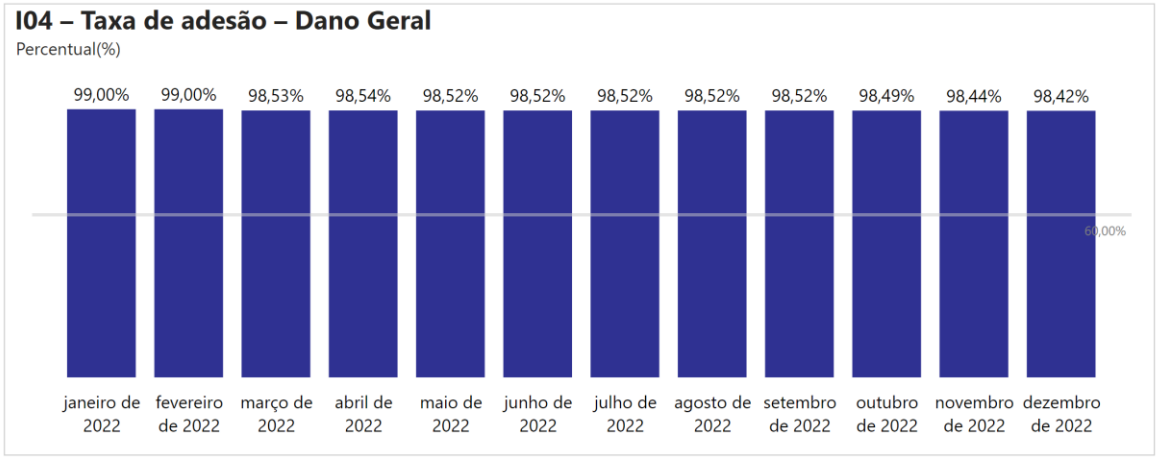


Gráfico 2: I04 – Taxa de adesão – Dano Geral - Frequência Mensal

Indicadores

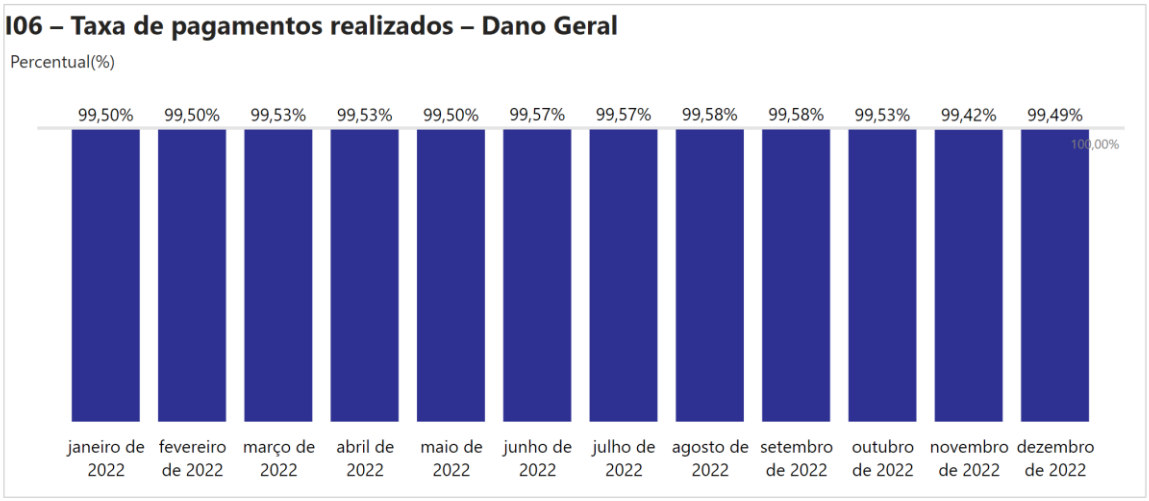


Gráfico 3: I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral - Frequência Mensal

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos indígenas Tupiniquim, Guarani e Krenak em acordo com os impactos identificados conforme cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

Em reunião com GT de Revisão do programa em 17/08/2022, e alguns representantes Indígenas da FUNAI e CT, solicitaram a interrupção dos trabalhos sem data de retorno.

Grandes números do programa

- 600.00 **pessoas abastecidas com água minera**l Povos Indígenas de Resplendor (total de 90,000.00 litros);

- 142.00 **pontos de abastecimento de água mineral** Povos Indígenas de Resplendor;

- 174.00 **pontos de abastecimento de água potável** Povos Indígenas de Resplendor (total de 4,171.30 m^3);

- 65.00 **pontos de abastecimento de água bruta** Povos Indígenas de Resplendor (total de 744.70 m^3);

Fatos relevantes do Ano

Tupiniquim-Guarani

01/2022	Detalhamento das ações do PBAI Tupiniquim Guarani de Aracruz: - Foi realizado a contratação de consultoria independente em maio de 2021; - Entre setembro e outubro de 2021 foi validado o plano de trabalho entre comunidades indígenas e consultoria; - Entre outubro/novembro/dezembro de 2021, foram realizadas as oficinas entre consultoria independente e comunidades indígenas. Atualmente, a consultoria independente trabalha no detalhamento dos programas e projetos.
08/2022	Em agosto foi realizado o protocolo do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) conceitual à FUNAI e o início da execução do PBAI com o Programa de Retomada Econômica. A Fundação Renova repassou, através de transferência eletrônica, um total de R$8.387.037,50 as 06 associações indígenas (AITG; ATUGUAA; ATCV; AITUPAIRA; ATUPIAPABRA; AITAA), registradas sob os números de CNPJ (02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; 31.585.246/0001-04; 15.829.241/0001-15; 09.569.165/0001-53; 19.266.784/0001-22 Respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1.293 famílias indígenas das terras indígenas de Caieiras Velhas II e Tupiniquim de Aracruz. As 1.293 famílias indígenas estão distribuídas nas 6 associações conforme segue: 677 famílias da AITG, 56 famílias da ATGUAA, 19 famílias da ATCV, 201 famílias de Irajá; 278 famílias de ATUPIAPABRA; 62 famílias de AITAA. O total de R$ R$ 8.387.037,50, compreende o pagamento R$ 6.486,49 para cada uma das 1.293 famílias referente a 1ª parcela do Programa de Retomada Econômica.
05/2022	Foi iniciado o processo de revisão participativa do PBAI entre consultoria independente e Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani.
01/2022	Tupiniquim-Guarani (FAIC) Iniciativas Comunitárias Foram contemplados em Outubro de 2021 20 projetos socioambientais, com previsão de conclusão para 6 meses, divididos em 2 etapas de execução. Atualmente os Projetos do FAIC estão na 2ª Etapa de execução.
04/2022	Validação do Plano Básico Ambiental (PBA) Conceitual para Aldeia Três Palmeiras.

Fatos relevantes do Ano

Tupiniquim-Guarani

11/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$3.481.071,49 para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI MB; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG; ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA ; ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), registradas sob os números de CNPJ (10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; e 09.569.165/0001-53 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1348 famílias indígenas das terras Tupiniquim – Guarani. As 1348 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 164 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN DE AREAL, 719 famílias da ASSOCIAÇÃO INDIGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS. O total de R$3.481.071,49 compreende o pagamento mensal por família de R$ 1.242,00, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, adicionado o valor de uma cesta básica do DIEESE/ES e 5% de taxas administrativas para as Associações.

Comboios

01/2022 Comboios (FAIC) Iniciativas Comunitárias
Foram contemplados em Outubro de 2021 4 projetos socioambientais, com previsão de conclusão para 6 meses, divididos em 2 etapas de execução. Atualmente os Projetos do FAIC estão na 2ª Etapa de execução.

01/2022 Detalhamento das ações do PBAI Comboios:
- Foi realizado a contratação de consultoria independente em maio de 2021;
- Entre setembro e outubro de 2021 foi validado o plano de trabalho entre comunidades indígenas e consultoria;
- Entre outubro/novembro/dezembro de 2021, foram realizadas as oficinas entre consultoria independente e comunidades indígenas.
Atualmente, a consultoria independente trabalha no detalhamento dos programas e projetos.

01/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 36.000 litros distribuídos nos dias, 23 e 30 de dezembro de 2021 e, 06, 13, e 20 de janeiro 2022 (total de 21800 galões de 20 litros).

02/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 31.480 litros distribuídos nos dias 27 de janeiro, 03 10 e 17 de fevereiro de 2022 (total de 1574 galões de 20 litros)

03/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 35.960 litros distribuídos nos dias 24 de fevereiro, 03 10 e 17 de março de 2022 (total de 1798 galões de 20 litros).

03/2022 No mês de março ocorreram oficinas para revisão participativa do Plano Básico Ambiental (PBA) para a TI Comboios.

Validação de 9 programas presentes no PBAI TI Comboios em 31.03.2022.

04/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 32.580 litros distribuídos nos dias 24 e 31 de Março, 07 e 14 de abril de 2022 (total de 1629 galões de 20 litros).

04/2022 Validação do Plano Básico Ambiental (PBA) Conceitual para TI Comboios.

05/2022 A execução do Programa de Retomada Econômica marca o início das ações do Plano Básico Ambiental Indígena. O programa foi construído em conjunto com os indígenas Tupiniquim de Comboios e consultoria independente e tem por objetivo estimular o desenvolvimento de ações para retomada econômica das famílias. Foram repassados, por meio da Associação Indígena Tupiniquim de Comboios, o recurso financeiro para 293 famílias indígenas de Comboios.

05/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 41.580 litros distribuídos nos dias 21 e 28 de Abril, 05, 12 e 19 de Maio de 2022 (total de 2079 galões de 20 litros).

Comboios

06/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 32.860 litros distribuídos nos dias 26 de maio, 02, 09 e 16 de Junho de 2022 (total de 1643 galões de 20 litros).

06/2022 Foi concluído o processo de revisão participativa do PBAI conceitual entre consultoria independente e Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani.

07/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 32.300 litros distribuídos nos dias 23 e 30 de Junho, 07 e 14 de julho de 2022 (total de 1615 galões de 20 litros).

08/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 36.560 litros distribuídos nos dias 21 e 28 de Julho, 05, 11 e 18 de Agosto de 2022 (total de 1828 galões de 20 litros).

09/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 28.120 litros distribuídos nos dias 25 de agosto, 01, 08 e 15 de setembro de 2022 (total de 1406 galões de 20 litros).

10/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 41.080 litros distribuídos nos dias 22 e 29 de setembro, 06, 13 e 20 de outubro de 2022 (total de 2.054 galões de 20 litros).

11/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios inscrita no CNPJ 02.536.221/0001-04, um total de R$1.283.296,50, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios, esse valor, compreende o pagamento de 2,5 salários-mínimos mensal por família, acrescido de 20% sobre o valor de 1 salário-mínimo por dependente, mais o valor de uma cesta básica e 5% de taxa administrativa para as Associação.

11/2022 Distribuição de água mineral para a Comunidade de Comboios – 30.480 litros distribuídos nos dias 27 de outubro, 03, 10 e 27 de novembro de 2022 (total de 1524 galões de 20 litros).

Resplendor

01/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.356.300,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.356.300,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.100,00 para cada uma das 137 famílias

01/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/12/2021 até 20/01/2022.no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros)

01/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/12/2021 até 20/01/2022

01/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/12/2021 até 20/01/2022

01/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/12/2021 até 20/01/2022

Resplendor

02/2022	A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias
02/2022	Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2022 até 20/02/2022.no total diário de 3000 litros. (total de 84.000 litros)
02/2022	Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/01/2022 até 20/02/2022
02/2022	Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/01/2022 até 20/02/2022
02/2022	Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/01/2022 até 20/02/2022

Resplendor

03/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

03/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/02/2022 até 20/03/2022.no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

03/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

03/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

03/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

Resplendor

04/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

04/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/03/2022 até 20/04/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

04/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/03/2022 até 20/04/2022.

04/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/02/2022 até 20/03/2022.

04/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/03/2022 até 20/04/2022.

Resplendor

05/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

05/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2022 até 20/05/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

05/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/04/2022 até 20/05/2022.

05/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/04/2022 até 20/05/2022.

05/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/04/2022 até 20/05/2022

Resplendor

06/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,19 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 11 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 27 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

06/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/05/2022 até 20/06/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

06/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/05/2022 até 20/06/2022.

06/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/05/2022 até 20/06/2022.

06/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/05/2022 até 20/06/2022

Resplendor

07/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 26 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

07/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/06/2022 até 20/07/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

07/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/06/2022 até 20/07/2022.

07/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/06/2022 até 20/07/2022.

07/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/06/2022 até 20/07/2022.

Resplendor

08/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE,18 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 11 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 26 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias

08/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/07/2022 até 20/08/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

08/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/07/2022 até 20/08/2022

08/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/07/2022 até 20/08/2022

08/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/07/2022 até 20/08/2022

Resplendor

09/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

09/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/08/2022 até 20/09/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

09/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/08/2022 até 20/09/2022.

09/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/08/2022 até 20/09/2022.

09/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/08/2022 até 20/09/2022.

Resplendor

10/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

10/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/09/2022 até 20/10/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 93.000 litros).

10/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/09/2022 até 20/10/2022

10/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/09/2022 até 20/10/2022

10/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/09/2022 até 20/10/2022

Resplendor

11/2022 A Fundação Renova pagou no mês corrente, através de transferência eletrônica, um total de R$ 1.494.396,00 das associações indígenas (UATU; ATORÃN; BAKÃN; BURUM ERERRÉ-AIBE; KRENAK; NÁKNENUK; NAKRERRÉ; e BURUM TAKRUK), registradas sob os números de CNPJ (08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76 e 20.076203/0001-79 respectivamente), para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 137 famílias indígenas da terra de Resplendor. As 137 famílias indígenas estão distribuídas nas 8 associações conforme segue: 31 famílias da Associação Indígena ATORÃN, 10 famílias da Associação Indígena BAKÃN, 17 famílias da Associação Indígena BURUM ERERRE, 20 famílias da Associação Indígena KRENAK, 12 famílias da Associação Indígena NAKNENUK, 10 famílias da Associação Indígena NAKRERRE, 12 famílias da Associação Indígena TAKRUK e 25 famílias da Associação Indígena UATU. O total de R$ 1.494.396,00, compreende o pagamento mensal de R$ 1.212,00 para cada uma das 137 famílias.

11/2022 Apoio à realização de atividade de plantio na TI Krenak.

11/2022 Apoio à realização do curso de cerqueiros

11/2022 Apoio às atividades culturais em comemoração ao dia das crianças na TI Krenak

11/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/10/2022 até 20/11/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

11/2022 Distribuição de Água Mineral para os Povos Indígenas de Resplendor – total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/11/2022 até 20/12/2022 no total diário de 3000 litros. (total de 90.000 litros).

11/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/10/2022 até 20/11/2022.

11/2022 Distribuição de ração na Terra Indígenas de Resplendor – 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias de 21/11/2022 até 20/12/2022

11/2022 Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígenas de Resplendor – 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/10/2022 até 20/11/2022

11/2022 Distribuição de silagem de milho na Terra Indígenas de Resplendor – 240 toneladas para 100 famílias de 21/10/2022 até 20/11/2022

Três Palmeiras

05/2022 Foi elaborado entre consultoria independente e indígenas o PBAI conceitual da aldeia de Três Palmeiras. A elaboração contou com ampla participação social dos indígenas e foram definidos linhas e premissas para o desenvolvimento de 09 programas.

06/2022 Foi elaborado entre consultoria independente e indígenas o PBAI detalhado da aldeia de Três Palmeiras. A elaboração contou com ampla participação social dos indígenas e foram definidas as ações especificas para o desenvolvimento de 09 programas.

09/2022 Em setembro foi iniciado o processo de consulta das ações que foram construídas pela comunidade para os programas do PBAI da aldeia de Três Palmeiras. A consultoria independente apresentou os programas, construídos de forma conjunta com a comunidade, para alinhamento e retirada de dúvidas, contando com a tradução oral para a língua Guarani. Após essa etapa a consultoria confeccionará o documento para análise da comunidade e dos órgãos.

Indicadores

Os indicadores do Programa estão em revisão.

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantar as ações mitigatórias, reparatórias e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta - TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	494	1	Concluída Internamente
Deliberação	494	2	Concluída Internamente
Deliberação	281	4	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Aprovação pela Câmara Técnica (CT-IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do detalhamento do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) de Degredo

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

01/2022 Acompanhamento a retomada do monitoramento da água para consumo dos poços de Degredo – PMQACH

01/2022 Realização de oficina cultural - programa 02 Incentivo as praticas culturais do degredo.

02/2022 PG02 - Incentivo às práticas culturais de Degredo - Realização da Oficina Cultural para organização das fogueiras de santos em junho e forró., da Oficina do Jongo, construção de instrumentos e confecção de vestimentas para o grupo de Jongo.

02/2022 PG10 - Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo - Continuidade do trabalho de documentação do material botânico

02/2022 PG17 - Capacitação de lideranças Quilombolas- Realização do Seminário de Relações-étnico Raciais

02/2022 PG18 - Monitoramento e gestão das ações do PBAQ- Início da pesquisa Baseline

03/2022 Entrega da versão final do PBAQ, em versões impressa e digital, para a Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo e para o sistema CIF

03/2022 Incentivo às manifestações culturais, ensaios do jongo de São Benedito, atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.

03/2022 Publicação da agenda cultural da comunidade, atividade vinculada ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ

03/2022 Realização de oficinas culturais para planejamento e organização das manifestações "quadrilha" e "forró", atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.

03/2022 Realização de pesquisa etnográfica na comunidade, atividade vinculada ao PG01 – Documentação de referências culturais PBAQ.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

04/2022 Assinatura do termo de cooperação técnica para execução das obras do SAA para a Comunidade Quilombola de Degredo.

04/2022 Continuidade do trabalho de documentação do material botânico, atividade vinculada ao PG10 - Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo

04/2022 Realização de oficinas culturais para planejamento e organização das manifestações "Festa de Aparecida" e "forró", atividades vinculadas ao PG02 – Incentivos às práticas culturais do degredo PBAQ.

04/2022 Realização de pesquisa etnográfica na comunidade, atividade vinculada ao PG01 – Documentação de referências culturais PBAQ.

05/2022 Ensaios das quadrilhas infantil e adultos - Atividade vinculada ao PG02 - Incentivo as práticas culturais do Degredo PBAQ

05/2022 Oficina Cultural e Entrega de Certificados das oficinas de Jongo - Atividade vinculada ao PG02 - Incentivo as práticas culturais do Degredo PBAQ

05/2022 Realização de pesquisa etnográfica na comunidade, atividade vinculada ao PG01 – Documentação de referências culturais PBAQ

06/2022 Oficina cultural – Ensaio da quadrilha infantil - PG02 – Incentivo às práticas culturais do degredo

06/2022 Oficina cultural – folia de reis - PG02 – Incentivo às práticas culturais do degredo

08/2022 Retomada do contrato da empresa PACATU (execução dos Programas 01, 02 e 10 do Plano Básico Ambiental Quilombola), atendendo solicitação da Comissão Quilombola de Degredo.

09/2022 Continuidade do contrato da empresa Pacatu (execução dos programas 01, 02 e 07 do Plano Básico Ambiental Quilombola).

09/2022 Realização da primeira Oficina para Definição de Escopo de Programa - PG04, com os Grupos de Trabalho.

Fatos relevantes do mês

Quilombolas

10/2022 Realização da Segunda Oficina para Definição de Escopo de Programa - PG04, com os Grupos de Trabalho.

11/2022 Assinatura do 2º Aditivo ao Termo de Acordo, acerca do repasse das obrigações do PBAQ, da Fundação Renova para a ASPERQD.

12/2022 3ª oficina para elaboração de nova versão do documento de definição do programa com o GT CT-IPCT.

12/2022 Decisão judicial de nulidade do acordo celebrado entre ASPERQD e FUNDAÇÃO RENOVA de transferência de execução do PBAQ pela ASPERQD.

Faiscadores

12/2022 Não houve fatos relevantes no mês.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG005 Programa de Proteção Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Desenvolver e executar ações para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvendo o acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo EVENTO, priorizando os IMPACTADOS com deslocamento físico, e considerando os agravos das vulnerabilidades decorrentes do evento, segundo a CLÁUSULA 54 e demais cláusulas do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	307	2a	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Caratinga - MG
março de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Conselheiro Pena - MG
março de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Naque- MG
abril de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Itueta- MG
abril de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Periquito - MG
maio de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Bom Jesus do Galho - MG
julho de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Santana do Paraíso- MG
dezembro de 2022	Conclusão das ações de responsabilidade do PPS Bugre - MG
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação de Operadores nas temáticas da Proteção Social nos municípios do ES e MG
dezembro de 2022	Conclusão do fornecimento de insumos para oficinas do SCFV em Barra Longa

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- Disponibilização de recursos para a suplementação de 134 **profissionais** (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficineiros) em 13 municípios atingidos e no Estado do Espírito Santos, para promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, desenvolvimento o acompanhamento às famílias com deslocamento físico;

- **Repasse financeiro** de R$ 19,72 Mi ,além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas;

- Disponibilização de 20 **veículos** com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas;

- 23370 **famílias cadastradas pela Fundação** a serem beneficiadas por meio dos Planos de Proteção Social implementados pelos municípios atingidos com o apoio da Fundação Renova.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Aceite dos municípios de Aimorés (não aderente) e Marilândia (impactado pelo novo conceito de vulnerável) do plano de reparação em proteção social.

01/2022 Início das atividades coletivas com as famílias das comunidades atingidas no município de Tumiritinga por meio da entidade aprovada no Edital de Proteção Social, a Rede Vidas.

02/2022 Conclusão das atividades do plano municipal de Caratinga.

02/2022 Efetuada a distribuição do incidente de divergência sobre o conceito de vulnerável (12ª VF).

02/2022 Último repasse financeiro para o município de Naque.

03/2022 Conclusão do plano de reparação no município de Ipaba.

03/2022 Implementação do COMAPPS (Comitê de Acompanhamento das Ações do Plano de Proteção Social), com a participação de atingidos, no município de Rio Doce.

03/2022 Início da capacitação para agentes de proteção social de 14 municípios do estado de MG com a temática "Trabalho Social com famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero".

04/2022 Após rodadas de negociação para alteração da modalidade do plano de reparação, o programa recebeu "de acordo" do município de São José do Goiabal para pactuação do plano de reparação.

04/2022 Conclusão da capacitação presencial para os operadores de proteção social do município de Mariana com o tema "Saúde mental em tempos de pandemia".

05/2022 Conclusão das atividades de responsabilidade da Fundação Renova do plano do município de Bom Jesus do Galho.

05/2022 Obtenção do "de acordo" do município de Aimorés para seguir com a pactuação do plano de reparação em proteção social.

05/2022 Reunião do COMAPPS, para acompanhamento das atividades do plano de reparação em proteção social, com a participação de representantes dos signatários do termo e atingidos, no município de Linhares.

Fatos relevantes do Ano

06/2022 Assinatura do novo acordo com o município de Marilândia para execução das atividades de fortalecimento de vínculo familiar e comunitário com as famílias vulneráveis atingidas por meio de entidade socioassistencial.

06/2022 Capacitação para os operadores de proteção social do município de Mariana com a temática "Comunicação Não Violenta".

06/2022 Obtenção do "De acordo" do município de Resplendor (considerado município não aderente anteriormente) para pactuação do plano de reparação em proteção social.

07/2022 Assinatura dos termos com os municípios de Pingo D'Água, Rio Casca e São José do Goiabal (este último sendo para alteração do modelo, a pedido do município), para execução do plano de reparação em proteção social, com o objetivo de atender as comunidades atingidas e foco nas famílias vulneráveis.

07/2022 Entrega de mais dois veículos para a equipe suplementar de proteção social do município de Linhares acessar as comunidades atingidas.

07/2022 Município de Belo Oriente (até este momento sendo considerado não aderente) formalizou o "de acordo" para pactuação do termo e plano de reparação em proteção social.

08/2022 Conclusão das atividades e atendimentos às famílias vulneráveis atingidas, conforme planos de trabalho acordados com os municípios de Santana do Paraíso e Bom Jesus do Galho.

08/2022 Repasses de recursos para municípios e entidades, conforme previsto nos planos de reparação pactuados, para desenvolvimento de atividades com as famílias vulneráveis atingidas, com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

08/2022 Conclusão de mais duas turmas de capacitação para os operadores de proteção social dos municípios atingidos com o tema "Vigilância Socioassistencial", com foco na qualidade de atendimento às famílias atingidas e respectivo monitoramento das informações.

Fatos relevantes do Ano

08/2022 Assinatura do termo de cooperação técnica e financeira para execução do plano de reparação em proteção social com o município de Aimorés.

08/2022 Criação do COMAPPS (Comitê de Acompanhamento das Ações do Programa de Proteção Social) nos municípios de Santa Cruz do Escalvado e Marilândia.

08/2022 Reuniões de acompanhamento dos planos municipais e estadual, com participação de atingidos, representantes dos municípios/estado e representantes da Fundação Renova, no município de estado do Rio Doce e Espírito Santo.

09/2022 Assinatura do novo plano de reparação em proteção social com os municípios de Bugre.

09/2022 Entrega de insumos para oficinas em Mariana, para oferta de oficinas de fortalecimento de vínculo comunitário e familiar às famílias vulneráveis atingidas

09/2022 Assinatura do novo plano de reparação em proteção social com os municípios de Fernandes Tourinho

09/2022 COMAPPS/reuniões de prestação de contas dos planos de reparação em proteção social, com a participação das comunidades, nos seguintes municípios: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Fernandes Tourinho, Governador Valadare, Ibapa, Itueta, Santa Cruz, Sooretama.

09/2022 Conclusão da capacitação 5 (Trabalho social com famílias) aos operadores de proteção social para os municípios de MG e ES e o estado do ES, com o objetivo de qualificar os atendimentos às famílias vulneráveis atingidas pelas equipes dos municípios.

10/2022 Assinatura do plano de reparação em proteção social com o município de Belo Oriente.

10/2022 Conclusão décima primeira capacitação para os operadores de proteção social do município de Mariana com a
temática "Práticas colaborativas na intervenção social junto de pessoas em situação de vulnerabilidade".

10/2022 Acompanhamento em audiência judicial de conciliação para tentativa de negociação com os municípios não aderentes
de Resplendor e Galileia

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Publicação de portaria para oficialização do COMAPPS (Comissão de acompanhamento das atividades dos planos de proteção social) pelo município de Marilândia.

10/2022 Conclusão da sexta capacitação para operadores de proteção social dos municípios de Minas Gerais com a temática "Trabalho social com famílias", com foco na qualidade do atendimento social às famílias vulneráveis atingidass.

10/2022 -Entrega de veículos para apoiar no deslocamento da equipe suplementar para atender as famílias das comunidades atingidas em Pingo D'Água, Rio Casca e Barra Longa.

10/2022 Realização de reuniões de prestação de contas e acompanhamento das atividades dos planos de proteção social, com a participação dos atingidos e municípios nos municípios de: Linhares, Aimorés, Itueta, Santana do Paraíso e Periquito.

11/2022 Realização de workshop de entidades socioassistenciais que atuam na reparação no Programa de Proteção Social

11/2022 Baixa contábil do Termo de Cooperação Técnica e Financeira do município de Bugre.

11/2022 COMAPPS em Naque, Conselheiro Pena e Santa Cruz do Escalvado.

11/2022 Início de capacitação ofertados aos municípios de Córrego Novo, Alpercata, Dionísio, Governador Valadares, Marliéria, São Pedro dos Ferros, Sobrália e Tumiritinga;

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Finalizado curso de Capacitação ofertado aos municípios: Corrégo Novo, Alpercata,Dionísio, Gov. Vazares, Marlieria, São Pedro dos Ferros, Sobralia, Tumiritinga.

12/2022 Comapps realizadas em dezembro, municípios de Pingo D'água em 01/12 e São José do Goiabal em 15/12/2022

12/2022 Baixa contábil dos Termos de Cooperação Técnica de Bom Jesus do Galho, Naque, Santana do Paraíso entidades de Governador Valadares e Tumiritinga.

12/2022 Entrega de insumos para as oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aos municípios de Barra Longa e Mariana.

12/2022 Disponibilização de veículos ao município de Aimorés para apoiar nas atividades das equipes suplementadas pelo Termo de Cooperação Técnica e Financeira

Indicadores



Gráfico 1:I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social - Frequência Anual



Gráfico 2: I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

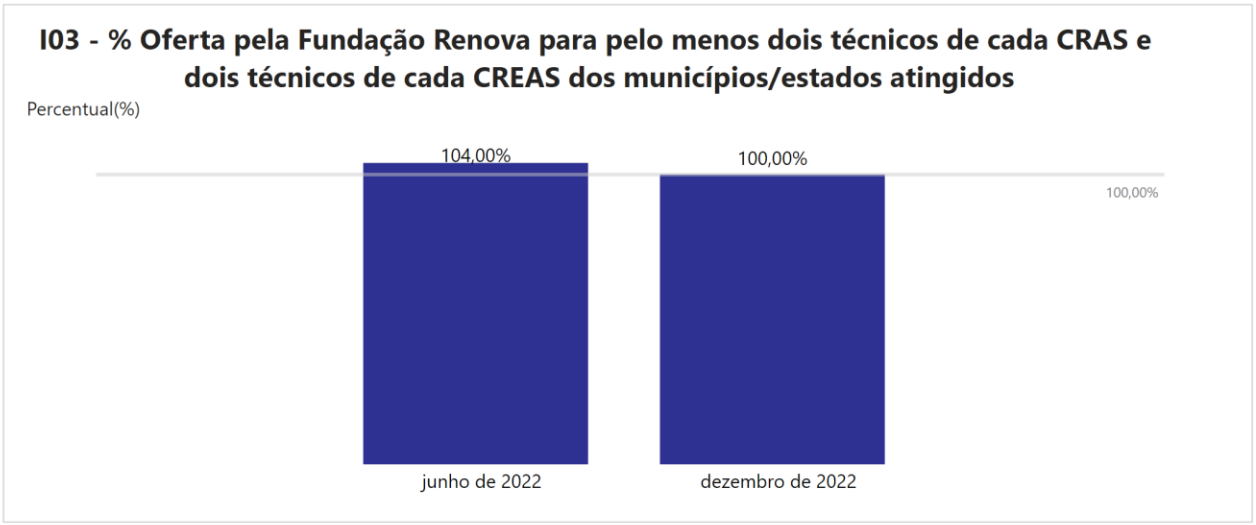


Gráfico 3: I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

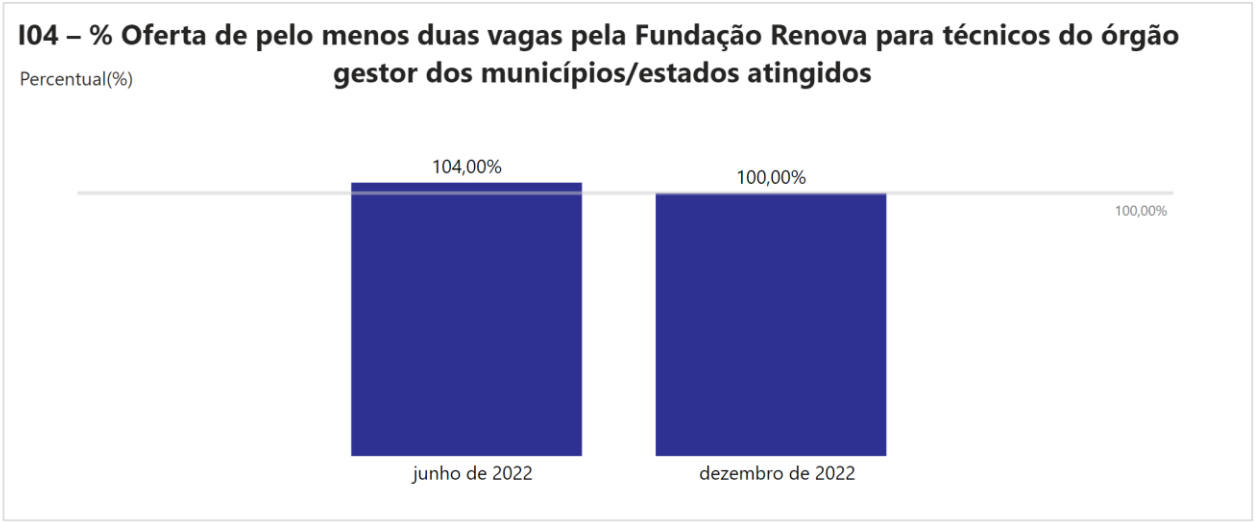


Gráfico 4: I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - Frequência Semestral

Indicadores

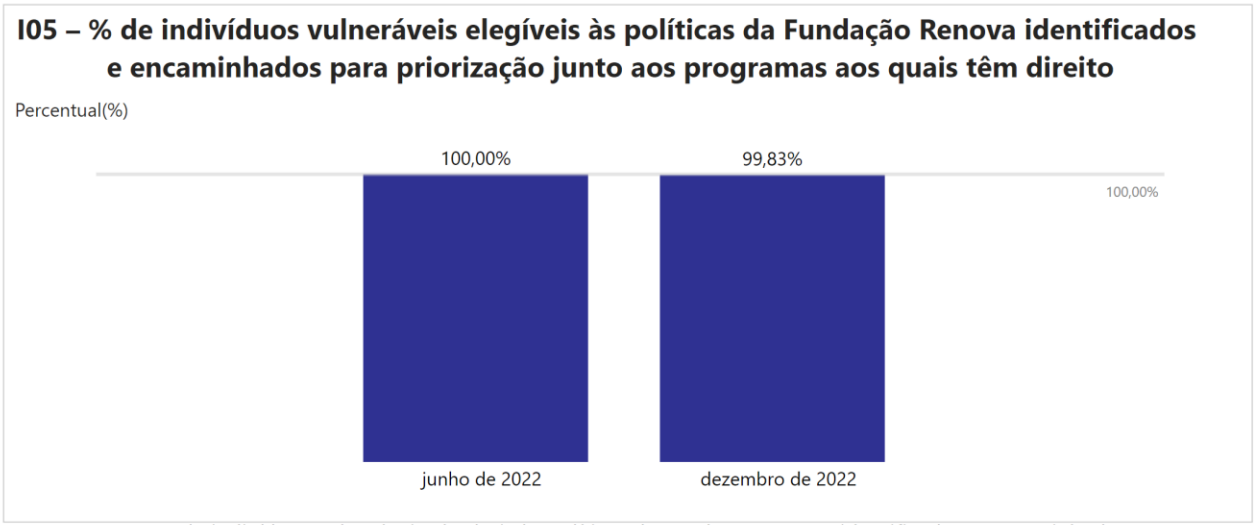


Gráfico 5: I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Frequência Semestral

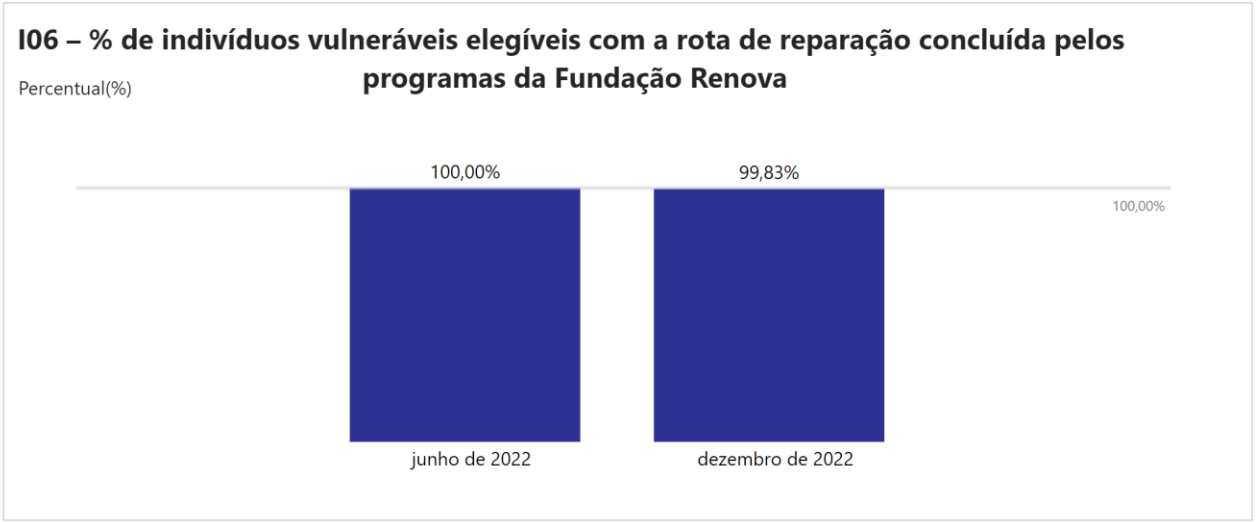


Gráfico 6: I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Frequência Semestral

Indicadores



Gráfico 7: I07 – % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - Frequência Semestral

PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.
(ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os atingidos e interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e compensação.
(iii) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no TTAC e deliberações do CIF.
(iv) Assegurar os processos de participação social e garantir espaços de diálogos em todos os programas, projetos e ações de reparação e compensação.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	506	2	Concluída Internamente
Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	Conclusão da análise Integrada por Território em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da aproximação junto às Partes Interessadas em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da articulação com programas para obtenção de informações e atualização do FAQ em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da atualização de informações sobre a tratativa e conclusão das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da compreensão do Território e Análise de Cenário em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da etapa de garantir periodicidade e assertividade dos canais permanentes de comunicação com a sociedade atingida: Momento Renova nas Rádios do trecho; boletim Jornada; Jornais da Comunidade em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da identificação de oportunidades de Controle Social junto aos públicos e programas em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da identificação e caracterização de oportunidades de Participação Social em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão do planejamento da Participação Social em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão do reconhecimento dos atingidos e demais partes interessadas , Ativos Locais e suas Redes em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão dos encaminhamentos das solicitações aos pontos focais dos programas em 2022.

Concluído Planejado Reprogramado

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	A ouvidoria encaminhará resposta final ao manifestante, observado o prazo de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período, nos termos do art. 16 da LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017 em 2022
dezembro de 2022	Conclusão do acolhimento de solicitações e ofícios junto aos públicos em 2022
dezembro de 2022	Conclusão do acompanhamento das tratativas e devolutivas (intermediárias e finais) aos públicos em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão do alinhamento interno e planejamento das Agendas de Diálogo em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão do mecanismo para monitoramento das ações de reparação e recebimento de denúncias e reclamações das comunidades impactadas em 2022
dezembro de 2022	Conclusão do monitoramento dos índices de satisfação com a Ouvidoria em 2022
dezembro de 2022	Conclusão do processo de identificar oportunidades e executar as melhores formas de repasse de conteúdos para aumentar conhecimento da sociedade sobre as entregas dos programas em 2022
dezembro de 2022	Conclusão do registro e classificação das solicitações no SGS e em controle de ofícios em 2022

Concluído Planejado Reprogramado

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	Conclusão da ampla divulgação nos canais institucionais em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da mobilização dos públicos e implementação dos Espaços Dialogais em 2022.
dezembro de 2022	Conclusão da publicação de relatórios trimestrais de atividades com dados estatísticos em 2022
dezembro de 2022	Conclusão dos encaminhamentos das Decisões, Acompanhamento das Tratativas e Devolutivas aos Públicos em 2022.

Concluído Planejado Reprogramado

DIÁLOGO

Grandes números do pilar

INDICADOR MÊS	nov/2022	dez/2022	ACUMULADO
Diálogo: Reuniões Realizadas – Espírito Santo (Mês)	20	2	1.192
Diálogo: Reuniões Realizadas – Minas Gerais (Mês)	17	8	3.908
Diálogo: Reuniões Realizadas – Outras Localidades (Mês)	0	0	11
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	-		133.405

Fatos relevantes do Ano

Apoio à divulgação e engajamento à participação nas ações promovidas pelos Programas da Fundação Renova.
A garantia da comunicação ampla aos territórios sobre as iniciativas promovidas pelos programas da Fundação Renova é condição essencial para o engajamento à participação dos públicos atingidos, bem como escopo prioritário das equipes de Diálogo Social.
Em 2022, algumas das iniciativas que focalizaram os esforços da equipe para a mobilização a participação: a equipe de Diálogo Social realizou apresentações sobre a plataforma "Recoloca Rio Doce" promovida pelo Programa de Estímulo à Contratação Local (PG020), voltada a disponibilização de cursos de capacitação e apoio à recolocação profissional; divulgação das ações da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e engajamento dos produtores rurais; divulgação das ações de Edital Doce, para fomento a projetos na área de Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de apoio técnico e material; divulgação do 1º Edital de chamamento público para seleção de Projetos para apoio a grupos produtivos na pesca e aquicultura; promoção de oficinas do projeto "Doce Vivo"; promoção de oficinas sobre Elaboração de Projetos para engajamento a participação em editais promovidos pela Fundação Renova.

Em Mariana (MG) foi dada continuidade as reuniões do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussão e informes acerca do Reassentamento Coletivo da Comunidade, abordando o alinhamento sobre o Plano Cultural de Paracatu de Baixo e informes sobre o reassentamento. Foram realizadas em Paracatu de Baixo (MG) fiscalização de obras do Reassentamento Coletivo. Foram realizados ao todo quatro Fóruns de Prestação de Contas.

Entrega dos Planos de Ação Territorial
O Plano de Ação Territorial orienta a atuação das equipes de Diálogo Social e Canais de Relacionamento do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG06) e tem como objetivo organizar e integrar as principais estratégias de atuação da área, como forma de permitir o alcance dos resultados esperados para a reparação/compensação, articulando programas e promovendo as ações de responsabilidade do PG06.
O Plano, produzido a partir da leitura contextual das necessidades e expectativas apresentadas pelos públicos de relacionamento nos diferentes espaços de participação e das estratégias promovidas pela Fundação Renova em conjunto a articulação com o escopo dos Programas, foi entregue à Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), e sistematiza o planejamento das ações do PG06 nos seus territórios de atuação, direcionadas à promoção de informação, transparência, participação e controle social em focos temáticos e agendas prioritárias da reparação e compensação. (ID 13025).

Foram realizadas ações junto a Pescadores Profissionais e Amadores para dar continuidade às ações de apoio do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras em Resplendor (MG) e em Aimorés (MG). Abordando esclarecimentos de dúvidas acerca do Programa e apresentação do curso de Capacitação para Condutor de Turismo e Pesca Esportiva.

No Baixo Rio Doce, foi realizado encontro junto estudantes do 8º ano da Escola Municipal João XXIII para apresentação do Projeto Biodiversidade no município de Baixo Gandu (ES).

No Espírito Santo, foi realizada 3º Oficina do Projeto de Biodiversidade da Fundação Renova na Escola Municipal Ensino Fundamental Maria Ortiz para apresentação do Projeto Biodiversidade no município de Colatina (ES).

Realização da Pesquisa Anual de Comunicação e Diálogo para avaliação das estratégias de engajamento, participação e comunicação junto às comunidades atingidas.

Fatos relevantes do Ano

Reassentamentos Coletivos e Familiares de Mariana (MG)
Em Mariana, a temática dos reassentamentos coletivos em Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo permanece com centralidade no território, em especial no contexto de estágio avançado das obras, com perspectiva próxima de início da mudança das famílias. Foi dada continuidade às visitas presenciais aos reassentamentos para acompanhamento do status e avanço das obras com a participação das Comissões de Atingidos além de reuniões periódicas do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo para discussões específicas sobre definições dos reassentamentos. (IDs 11916, 11296, 13026, 13351, 13520, 13881, 11425, 11595)

Realização dos Fóruns de Prestação de Contas
Como parte das estratégias de promoção de Controle Social pelos públicos de interesse do processo reparatório, os Fóruns de Prestação de Contas continuaram a ser promovidos durante 2022. Os encontros são voltados à apresentação dos resultados das ações de reparação e compensação da Fundação Renova nos territórios tem como objetivo promover o Controle Social por meio da instituição de espaços de diálogo que permitem a fiscalização, o acompanhamento, a avaliação e a prestação de contas sobre as ações desenvolvidas.
Ao todo foram realizados 83 Fóruns de Prestação de Contas ao longo dos territórios de atendimento com foco nos temas de Reassentamento (PG08) e Infraestrutura (PG10), Monitoramento Hídrico (PG38), Proteção Social (PG05), Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13), Conservação da Biodiversidade (PG28), Recuperação de Nascentes (PG26) e Ressarcimento e Indenização (PG02).

Realização da Pesquisa Anual de Comunicação e Diálogo
A avaliação das ações da Fundação Renova à partir da perspectiva da população impactada gera insumos importantes para reajustar ou aprimorar as estratégias de diálogo, relacionamento e comunicação, adequando as práticas atuais às necessidades e interesses dos públicos nos territórios, conferindo maior assertividade ao PG06.
Em 2023 foi realizada a 3º rodada da Pesquisa Anual de Avaliação de Diálogo e Comunicação, que busca: 1) identificar a percepção da população atingida acerca das estratégias de Diálogo e Comunicação desenvolvidas até o momento pela Fundação Renova; 2) identificar o atendimento Fundação Renova a seus propósitos de transparência, participação e controle social; e 3) produzir indicadores de resultado do programa, acordados com a CT-PDCS, baseados em pesquisa de opinião junto à população atingida.
A pesquisa, aplicada ao longo do mês de Dezembro/22, investigou aspectos referentes ao acesso, engajamento e percepções das pessoas atingidas sobre as ações de diálogo e comunicação da Fundação Renova, podendo ser organizadas em quatro dimensões analíticas principais: acesso à informação; diálogo social; comunicação com comunidades; informação sobre os PGs e expectativas

No território da Calha do Rio Doce, destaca-se ação realizada junto a moradores de Pingo D'Água (MG), para devolutiva sobre as ações do Plano Municipal de Reparação em Proteção Social e a formação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social da Fundação Renova. Em São José do Goiabal (MG) foi realizada também ação para esclarecimentos sobre o Plano Municipal de Reparação em Proteção Social e para ativação do Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção Social. No município de Bom Jesus do Galho (MG) foi realizada reunião com produtores rurais de Revés de Belém (MG) e Bom Jesus do Galho (MG), para esclarecimento de dúvidas sobre os serviços da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).

Indicadores

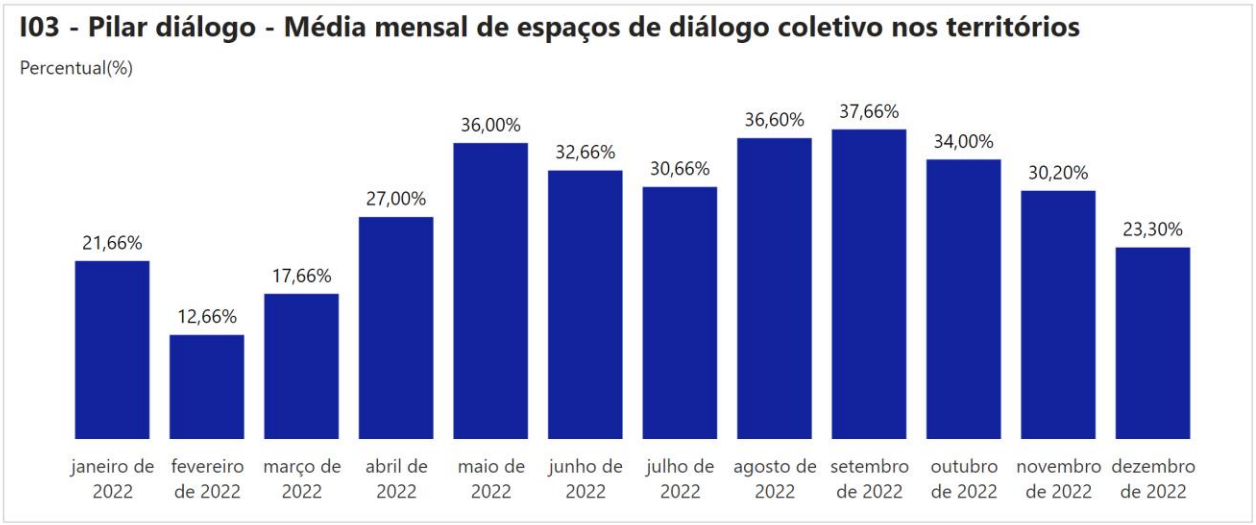


Gráfico 1: I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - Frequência Mensal

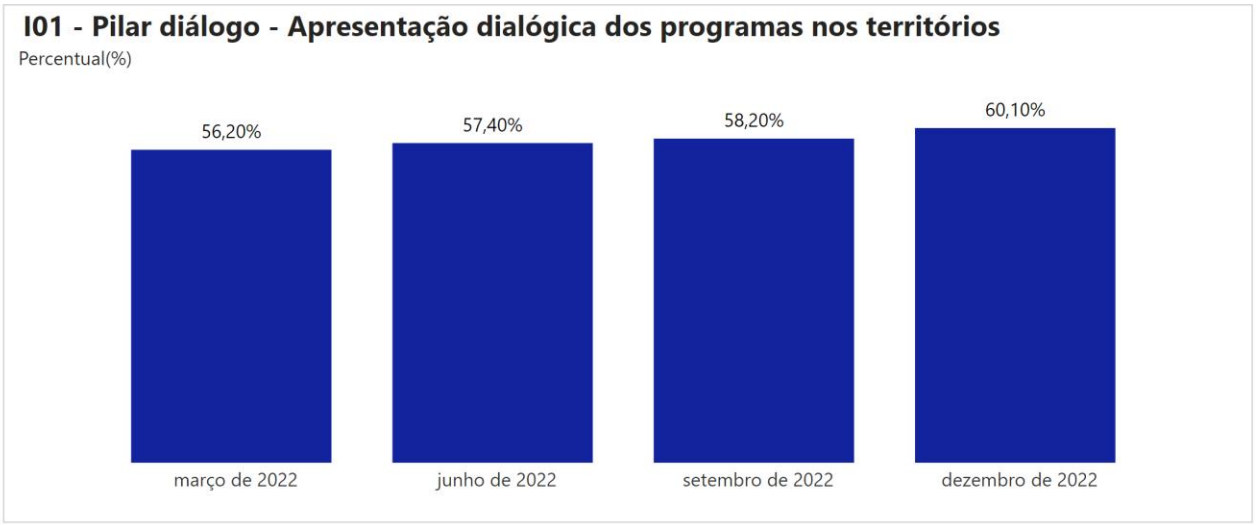


Gráfico 2: I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios- Frequência Trimestral

Indicadores

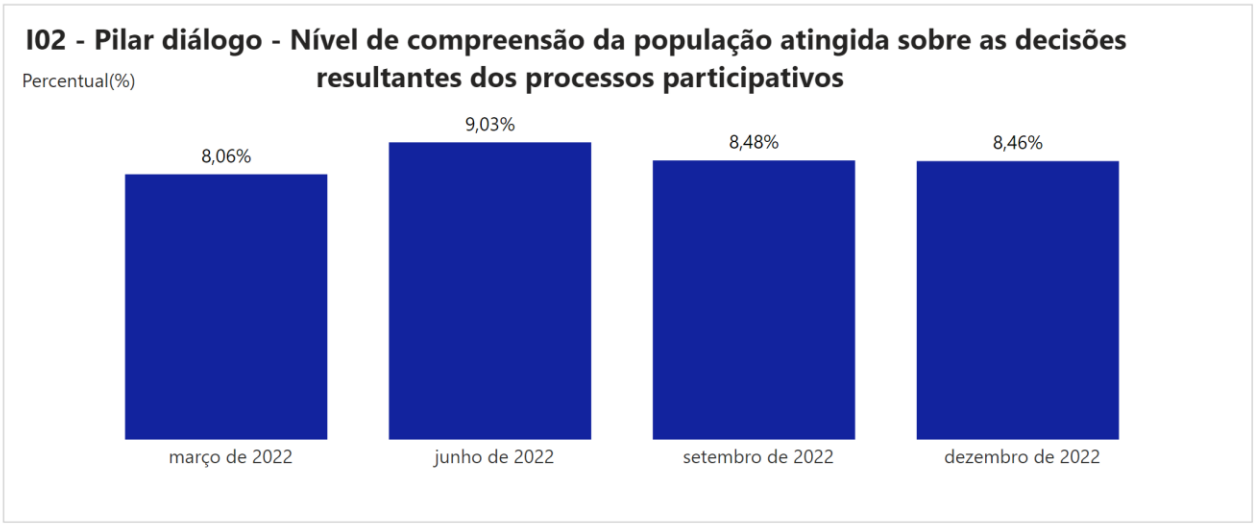


Gráfico 3: I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - Frequência Trimestral

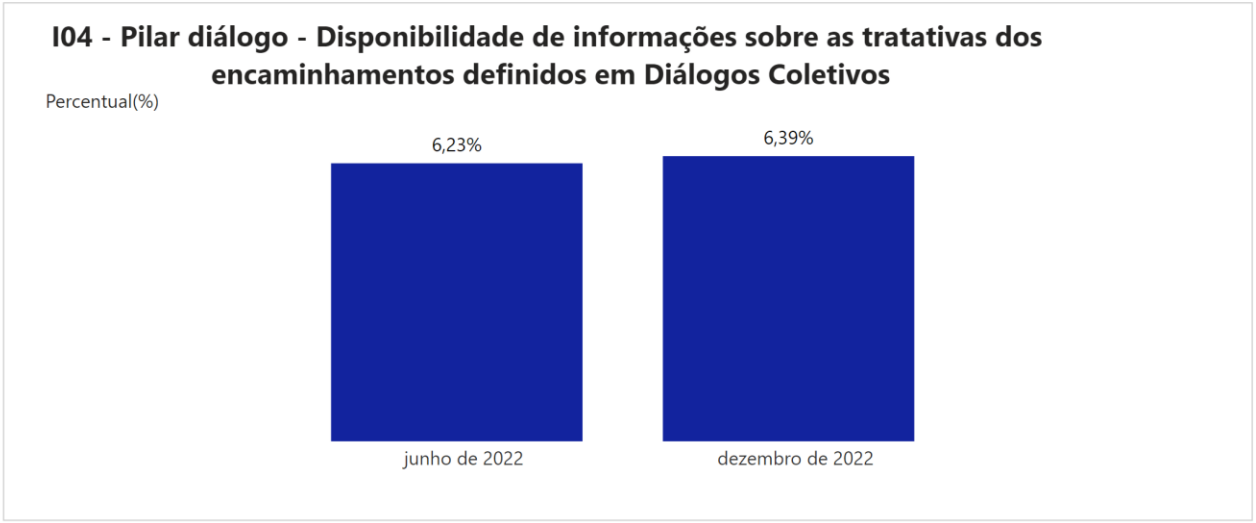


Gráfico 4: I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - Frequência Semestral

Indicadores



Gráfico 5: I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - Frequência Semestral

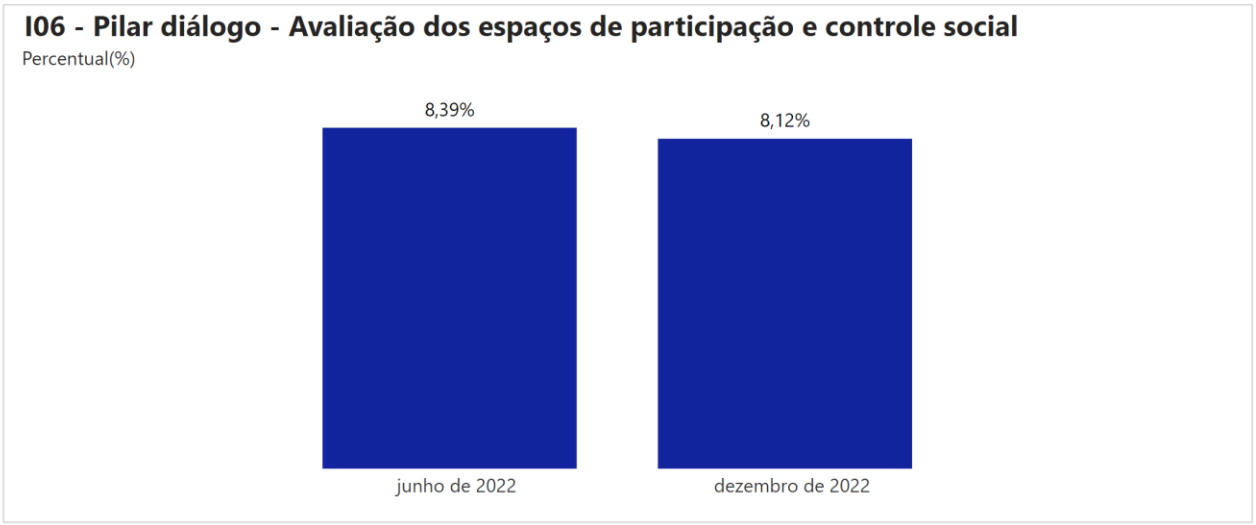


Gráfico 6: I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - Frequência Semestral

Indicadores

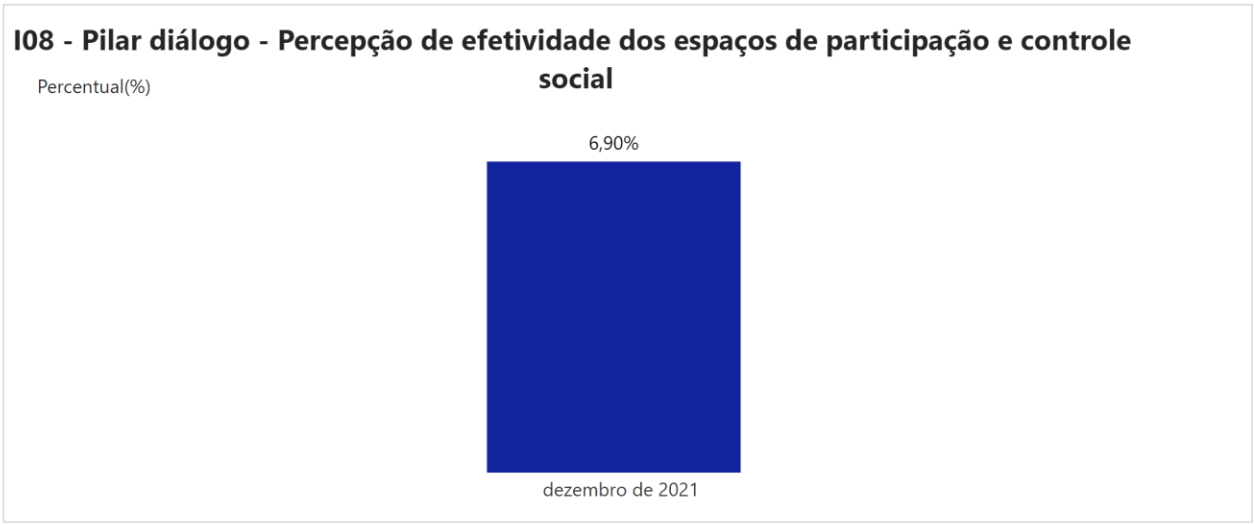


Gráfico 7: I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social - Frequência Anual

O atraso no envio dos resultados dos indicadores anuais do PG06, decorre da realização de uma complexa pesquisa que será concluída no final de dezembro. Após essa conclusão, há necessidade de ampla análise dos dados, limpeza de bases e compilação dos resultados obtidos. O prazo necessário para finalização desse processo não atende a data limite de entrega do relatório CIF de janeiro, portanto esses dados serão reportados no relatório subsequente.

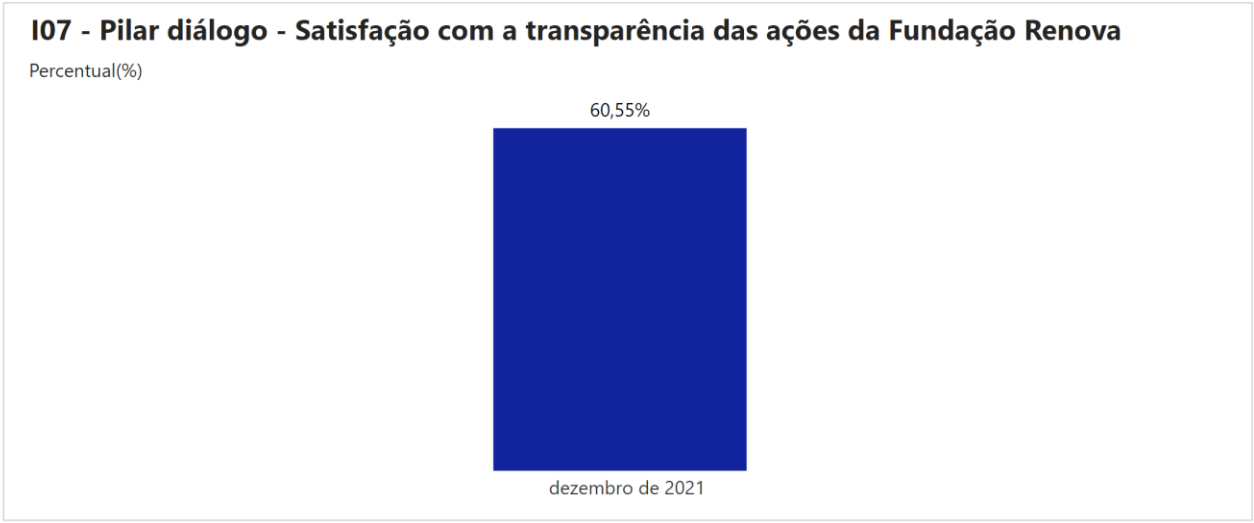


Gráfico 8: I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - Frequência Anual

O atraso no envio dos resultados dos indicadores anuais do PG06, decorre da realização de uma complexa pesquisa que será concluída no final de dezembro. Após essa conclusão, há necessidade de ampla análise dos dados, limpeza de bases e compilação dos resultados obtidos. O prazo necessário para finalização desse processo não atende a data limite de entrega do relatório CIF de janeiro, portanto esses dados serão reportados no relatório subsequente.

Indicadores



Gráfico 9: I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos - Frequência Mensal

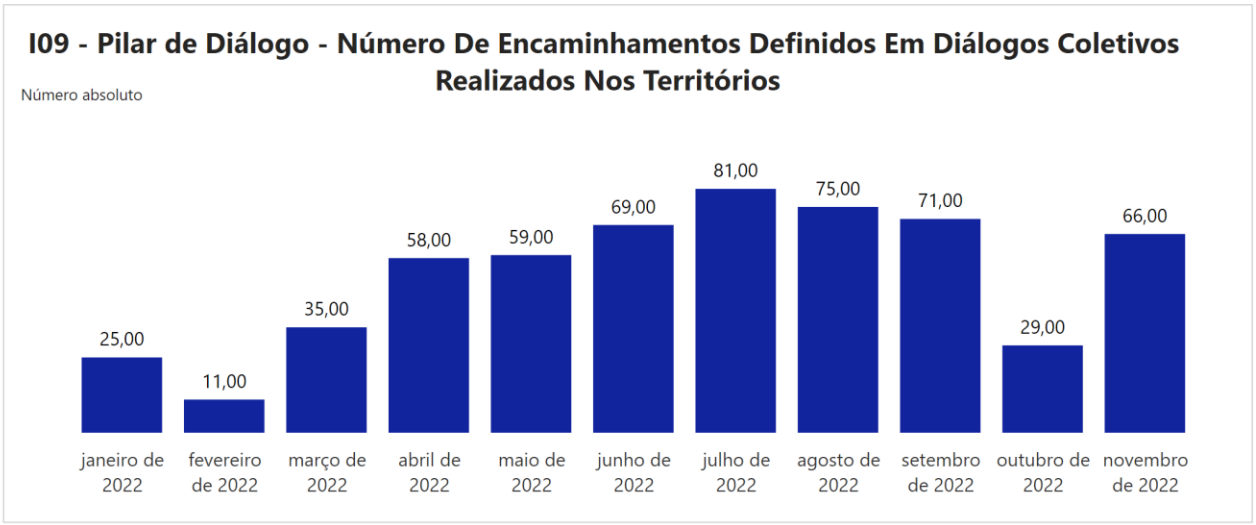


Gráfico 10: I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios - Frequência mensal

OUVIDORIA

Grandes números do pilar

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ACUMULADO	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS MÉDIA MENSAL ACUMULADA
15.947,00	185,43

Tabela 3. Manifestações recebidas.

MÊS/ANO	REALIZADO MENSAL	MÉDIA ACUMULADA ANUAL
janeiro de 2022	177	172,67
fevereiro de 2022	131	
março de 2022	210	
abril de 2022	206	207,33
maio de 2022	187	
junho de 2022	229	
julho de 2022	214	193,33
agosto de 2022	209	
setembro de 2022	157	
outubro de 2022	231	198,00
novembro de 2022	205	
dezembro de 2022	158	

Fatos relevantes do Ano

No ano de 2022 foram finalizadas um total de 2599 manifestações, no acumulado histórico são 15800 manifestações finalizadas para um total de 15947 registros, o que representa 99,07% de finalizações.

Indicadores

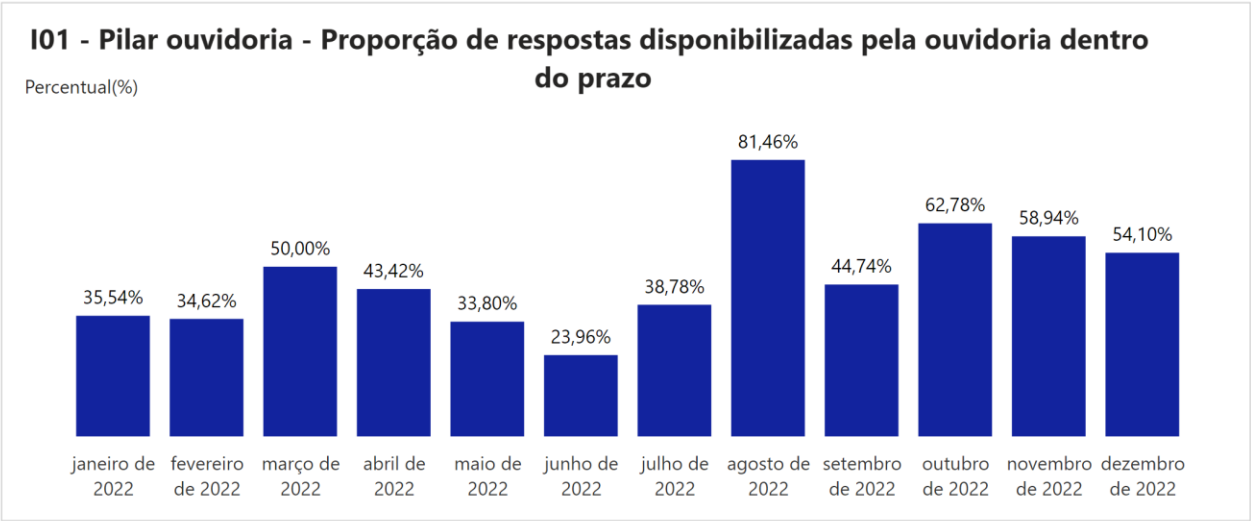


Gráfico 9: I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo - Frequência Mensal

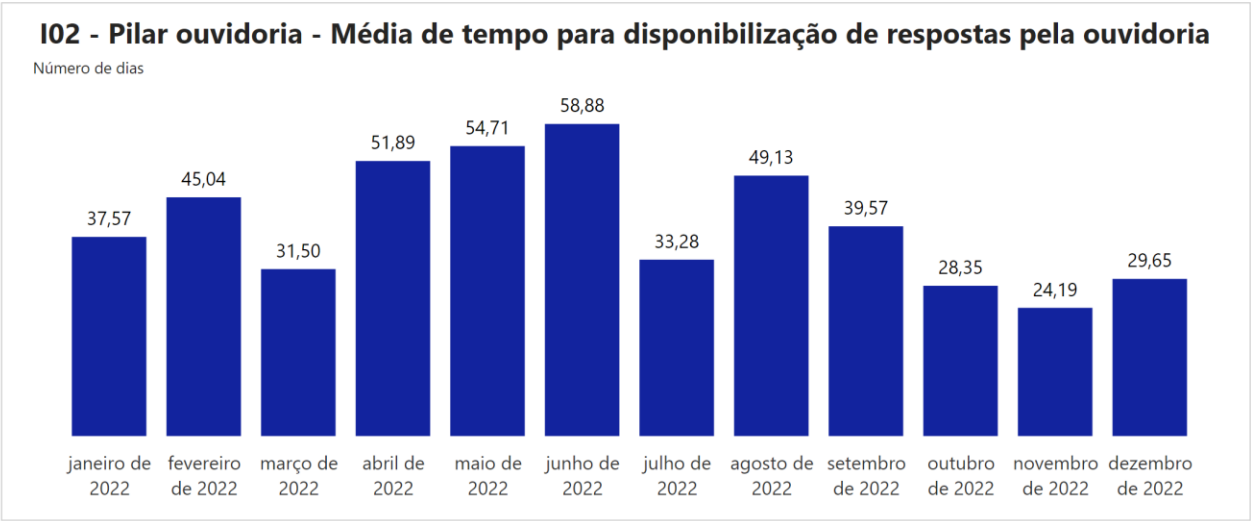


Gráfico 10: I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria - Frequência Mensal

Indicadores

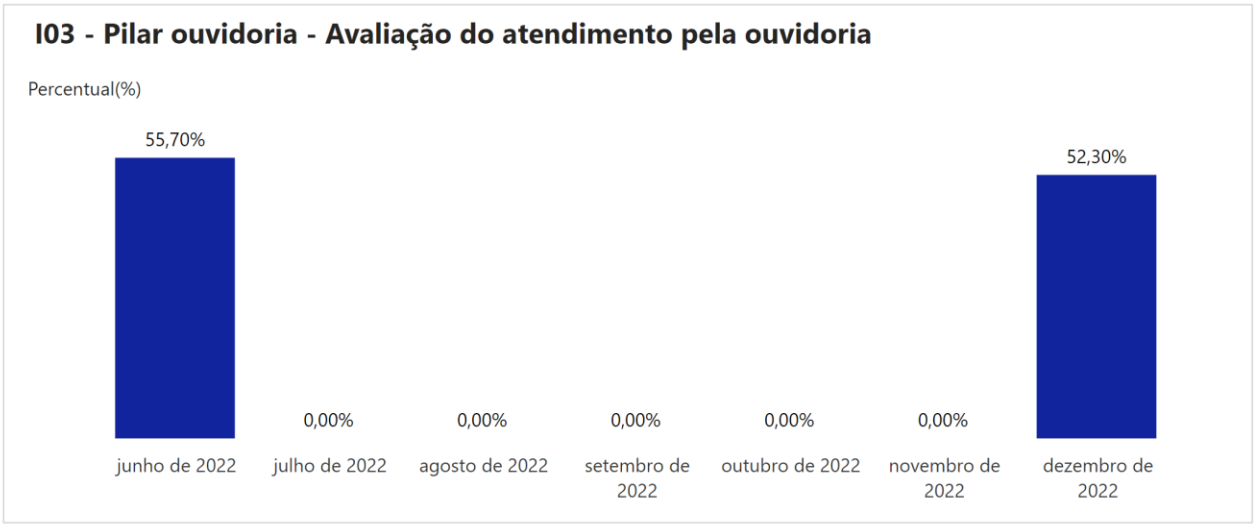


Gráfico 11: I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria - Frequência Mensal

O resultado apresentado em junho de 2022 refere-se a pesquisa realizada no primeiro semestre de 2022, avaliando o segundo semestre de 2021. O resultado apresentado em dezembro de 2022 refere-se a pesquisa realizada no segundo semestre de 2022, avaliando o primeiro semestre do mesmo ano.
Apesar de na definição do programa esse indicador constar com medições mensais, as pesquisas serão realizadas semestralmente. O programa está providenciando a formalização dessa informação com CTPDCS e CIF.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Grandes Números.

Grande Número	nov/2022	dez/2022
Canais: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais)	320.865	325.596
Canais: Número total de manifestações	1.261.775	1.301.975
Canais: Número de manifestações respondidas	1.201.459	1.231.096
Canais: Número de manifestações registradas pelos Centros de Informação e Atendimento (CIAs)	164.121	169.168
Canais: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário	81.379	87.477
Canais: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco	14.718	14.771
Canais: Número de manifestações registradas pelo 0800	937.068	965.111
Canais: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês	15	12
Canais: Número de manifestações em tratamento	60.316	70.879
Canais: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone)	64.489	65.448

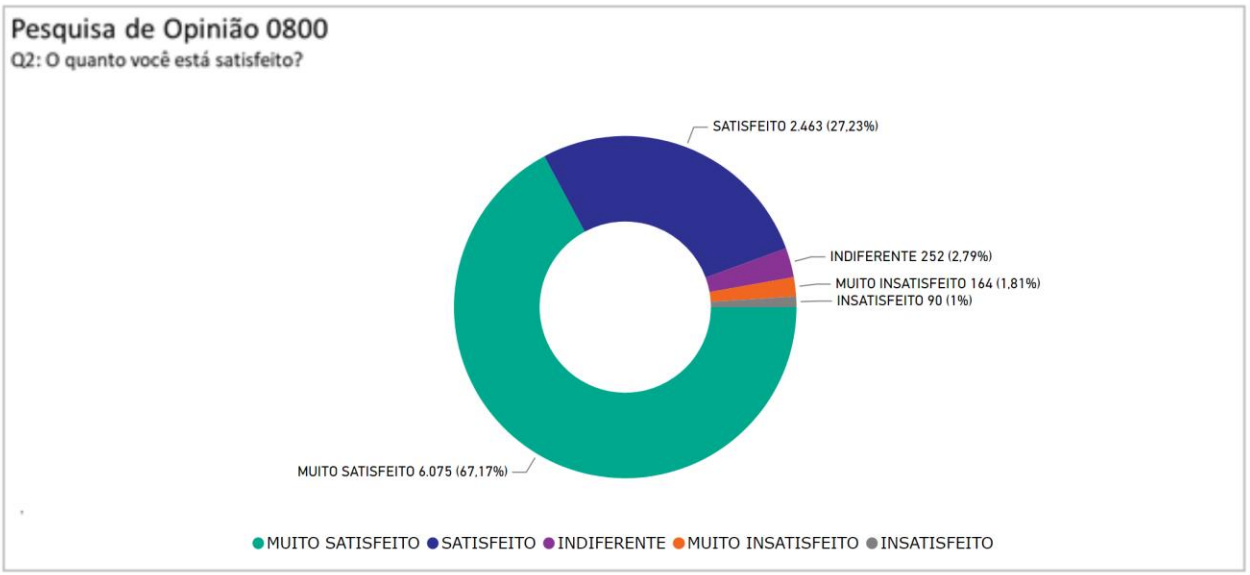


Gráfico 11: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2

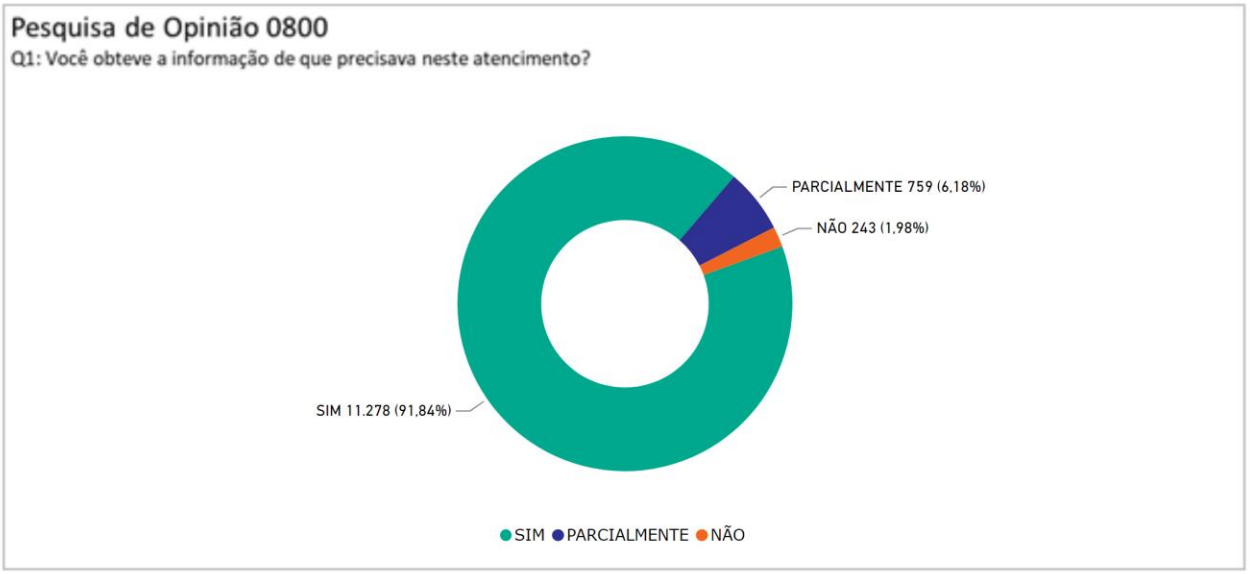


Gráfico 12: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q1

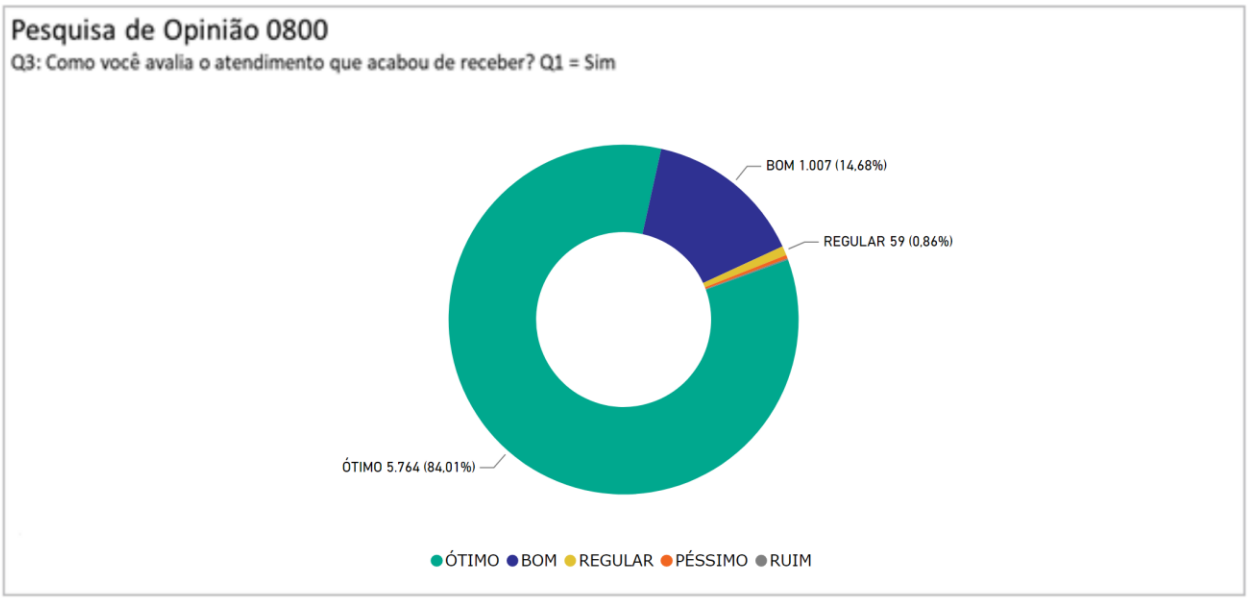


Gráfico 13: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3 , Q1 = Sim.

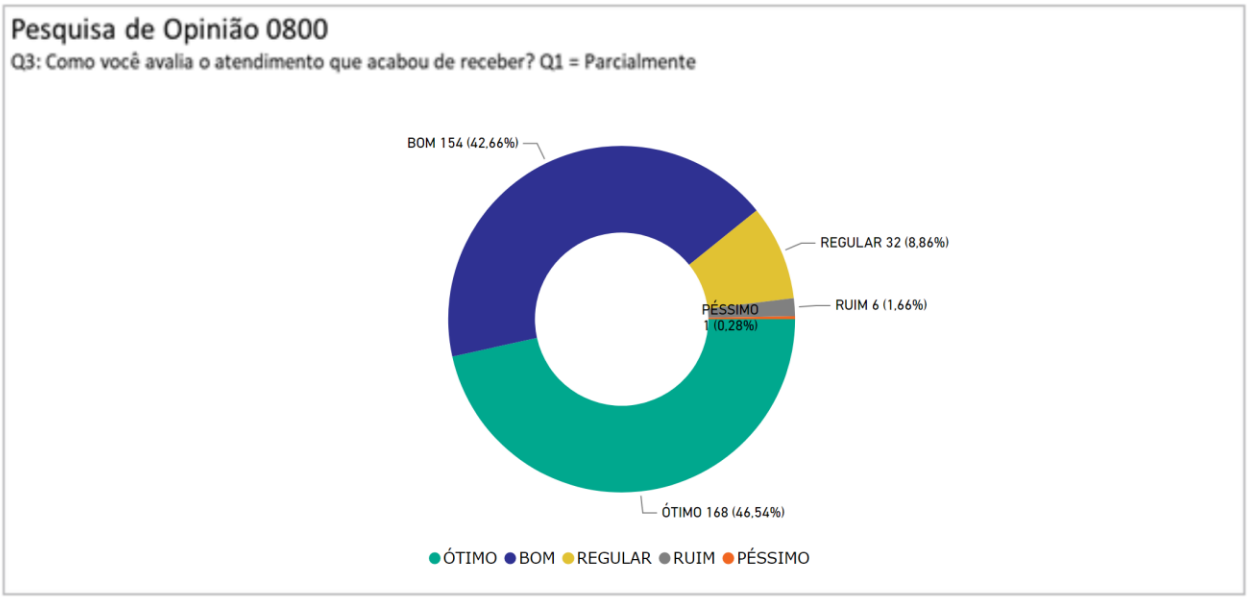


Gráfico 14: Pesquisas de Satisfação 0800 - Q3, Q1= Parcialmente.

Pesquisa CIAs

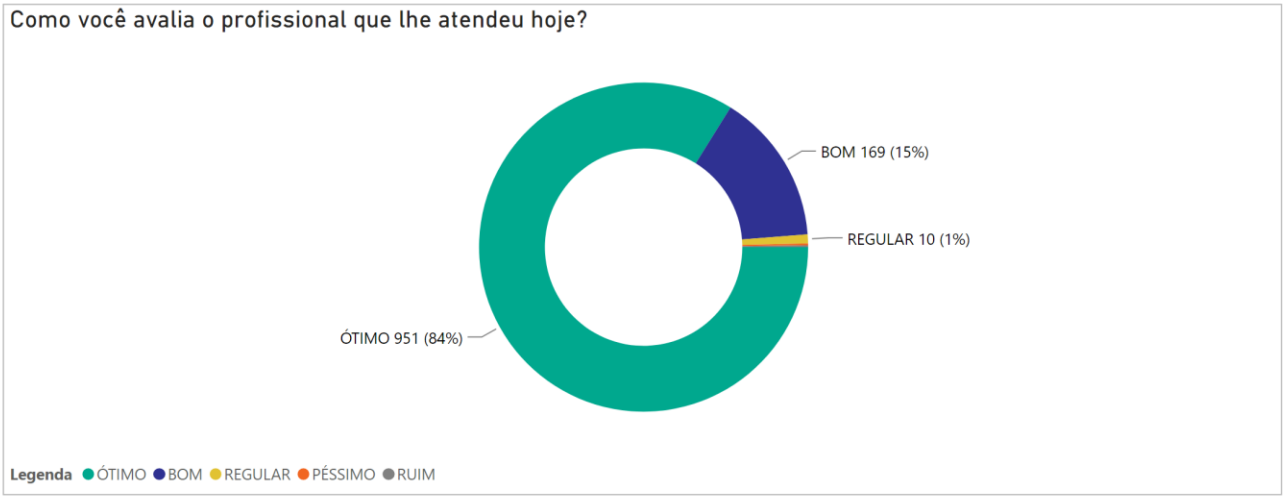


Gráfico 15: Como você avalia o profissional que lhe atendeu hoje? - Frequência Mensal

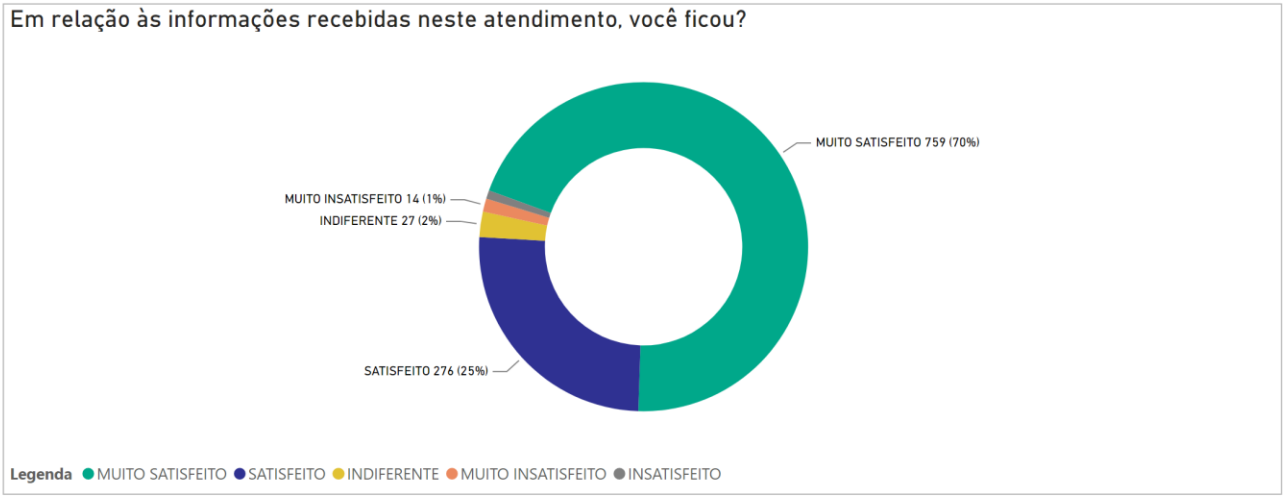


Gráfico 16: Em relação ás informações recebidas neste atendimento, você ficou? - Frequência Mensal

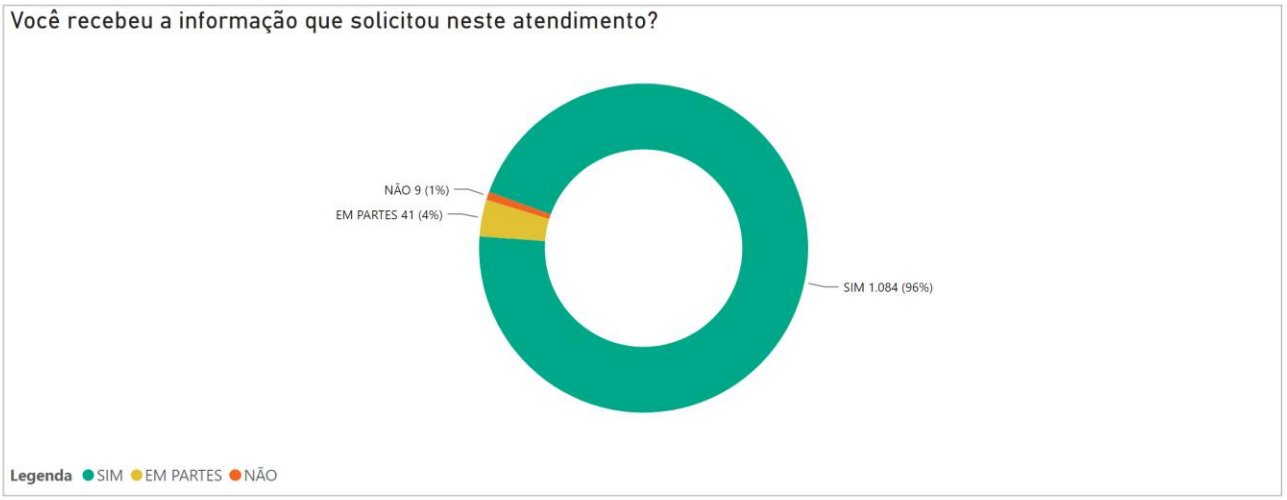


Gráfico 17: Você recebeu a informação que solicitou neste atendimento? - Frequência Mensal

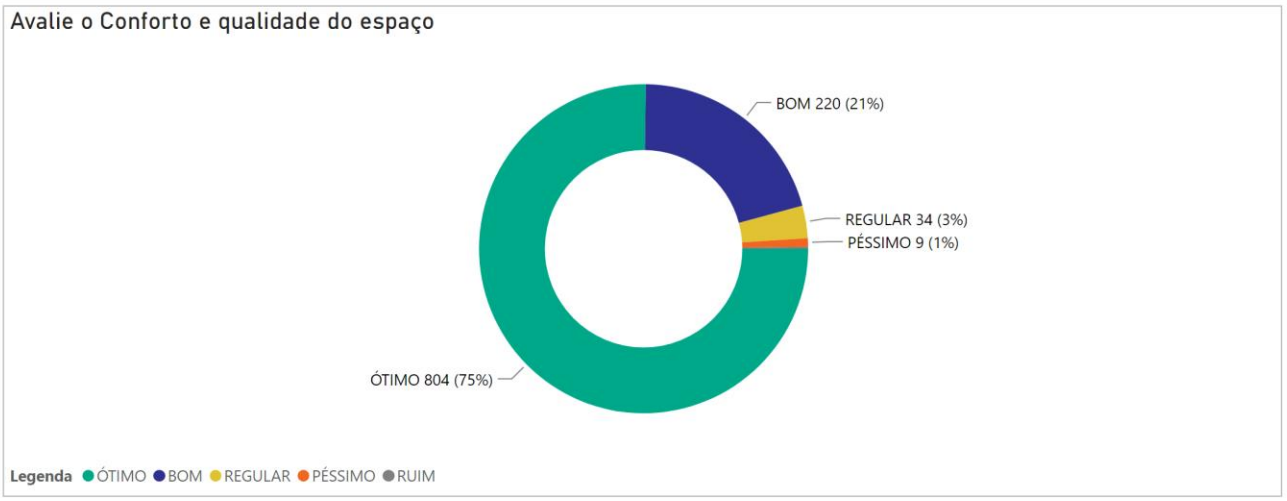


Gráfico 18: Avalie o Conforto e qualidade do espaço - Frequência Mensal

Fatos relevantes do Ano

Acolhimento e registro de manifestações para esclarecimento de dúvidas sobre o processo de revalidação do AFE, bem como recebimento de documentos de comprovação do exercício das atividades impactadas.

Apoio ao Programa de Cadastro Integrado para contato com não localizados e atualização de informações pessoais no SGS.

Considerando as novas diretrizes estabelecidas pela Fundação Renova, no mês de janeiro foi dado prosseguimento à reabertura dos Centros de Informação e Atendimento em suas unidades físicas e itinerantes.

Destaque para análise feita pela equipe do CIA, do território Alto Rio Doce, a pedido da equipe de Diálogo, com intuito de subsidiar o Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) a partir das manifestações no passivo do programa com foco no tema PASEA.

Execução e monitoramento do Plano de Ação, junto às equipes dos Programas de Recuperação da UHE Risoleta Neves (PG09), Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas (PG10), Ressarcimento e Indenização (PG02), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Programa de Reconstrução de Vilas ("Reassentamento" e "Moradia Temporária" - PG08), envolvendo análise, suporte à tratativa, capacitação e ajustes no fluxo de gestão e resolução de solicitações. O objetivo é gerir e dar respostas às manifestações pendentes vinculadas aos temas nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce. No Médio Rio Doce foi realizada análise, suporte à tratativa e devolutiva das solicitações relacionadas à Adutora de Governador Valadares (MG) em articulação com o Programa de Tratamento de Água e Captação Alternativa (PG32).

No mês de abril, destaque para a realização de 08 CIAs Móveis, estratégia itinerante dos Centros de Informação e Atendimento, para resolução de dúvidas e acolhimento de manifestações: em 05/04 e 19/04 foi realizado CIA Móvel na comunidade de Regência (Linhares); nos dias 07/04 e 20/04 na comunidade de Povoação (Linhares); em 05/04 em Ilha Brava e Baguari (Governador Valadares); em 04/04 em Periquito Sede; e no dia 06/04 no Assentamento Liberdade (Periquito). Os principais temas das manifestações registradas nos CIAs Móveis no mês de abril envolveram: questionamento ou esclarecimento de dúvidas a respeito do Sistema Indenizatório Simplificado, Lucro Cessante, Auxílio Financeiro Emergencial e Recuperação de Nascentes.

No mês de junho foram realizados 08 CIAs Móveis, estratégia itinerante dos Centros de Informação e Atendimento, para resolução de dúvidas e acolhimento de manifestações: em 07/06 e 21/06 foi realizado CIA Móvel na comunidade de Regência (Linhares); nos dias 02/06, 09/06 e 23/06 na comunidade de Povoação (Linhares); no dia 06/06 em Periquito (MG); em 07/06 na comunidade de Baguari (Governador Valadares); e em 08/06 atendendo a comunidades rurais da Fazenda Esmeraldas (Rio Casca).

No mês de maio, destaque para a realização de 06 CIAs Móveis, estratégia itinerante dos Centros de Informação e Atendimento, para resolução de dúvidas e acolhimento de manifestações: em 17/05, 24/05 e 31/05 foi realizado CIA Móvel na comunidade de Regência (Linhares); nos dias 19/05 e 26/05 na comunidade de Povoação (Linhares); e em 05/04 na comunidade de Ilha do Rio Doce, Caratinga.

No mês de março, destaque para a realização de 05 CIAs Móveis, estratégia itinerante dos Centros de Informação e Atendimento, para resolução de dúvidas e acolhimento de manifestações: em 23/03 foi realizado CIA Móvel na comunidade de Regência (Linhares) e no dia 24/03 em Povoação (Linhares) sobre os temas Portal do Advogado, Auxílio Financeiro Emergencial e entrega de Informe de Rendimentos; em 28/03 em Itapina (Colatina) para tratativa sobre os temas Portal do Advogado, esclarecimento de pagamento de indenização por Dano Água e Informe de Rendimento; em 23/03 a 24/03 em São José do Goiabal para esclarecimentos sobre Qualidade da água e do pescado, Auxílio Financeiro Emergencial, critérios de permanência e pagamento do Lucro Cessante, Cadastro Integrado e Sistema Indenizatório Simplificado.

Fatos relevantes do Ano

Ao longo do mês de outubro, destaque para a realização de 16 CIAs Móveis: nas comunidades de Patrimônio e Biboca (São José do Goiabal/MG) no dia 05/10; comunidades de Messias Gomes e Firma Araújo (São José do Goiabal/MG) no dia 06/10; no Assentamento Liberdade (Periquito/MG) no dia 08/10; comunidade de Ipabinha (Santana do Paraíso/MG) nos dias 25/10, 26/10 e 27/10; na comunidade de Baguari (Governador Valadares/MG) no dia 27/10; nas comunidades de Regência (Linhares/ES) nos dias 04/10 e 18/10; Povoação (Linhares/ES) nos dias 06/10 e 19/10; e Bebedouro (Linhares/ES) no dia 13/10; nas comunidades Maria Ortiz (Colatina/ES) 26/10 e Itapina (Colatinha/ES) dia 27/10; e em Mascarenhas (Baixo Guandu/ES) dia 25/10; comunidade Barra do Riacho (Aracruz/ES) no dia 27/10. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação, cumprindo o propósito de ser imagem e presença física da Fundação renova no território.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Cronograma Trimestral dos CIAs Móveis referente aos territórios da Calha do Rio Doce, Médio Rio Doce e Espírito Santo, com o intuito de subsidiar as ações a serem realizadas no último trimestre do ano de 2022.

Levantamento de Histórico de manifestações direcionadas aos Programas: PG01, PG02, PG05, PG06, PG14 e Ouvidoria

Levantamento e qualificação de informações do histórico de manifestações de atingidos de categorias diversas, que apresentam dificuldades para acessar o direito indenizatório via Fluxo Ágil.

Fatos relevantes do Ano

Ao longo do mês de dezembro, destaque para a realização de 04 CIAs Móveis: no município de Galileia (MG) dia 01/12; na comunidade de Santo Antônio do Rio Doce (Aimorés/MG) em 14/12 e na comunidade de Senhora da Penha (Fernandes Tourinho/MG) e na comunidade de Regência (Linhares/ES) em 15/15. Durante as ações realizadas foram atendidos diversos públicos das comunidades e regiões vizinhas, essas ações contaram com acolhimento, registro de manifestações e esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de reparação.

Continuidade do trabalho de acolhimento e esclarecimento de dúvidas nos Centros de Informação e Atendimento; monitoramento, pelos atendentes CIAs, de manifestações registradas em todas as unidades CIAs que estão pendentes de respostas intermediárias ou finais.

Participação dos Atendentes CIAs no treinamento "Alinhamento Sobre Novas Concessões de AFE", realizado no dia 28/12.

Planejamento de Ações
Foi realizado Cronograma Trimestral dos CIAs Móveis, referente aos territórios da Calha do Rio Doce, Médio Rio Doce e Espírito Santo, com o objetivo de subsidiar as ações a serem realizadas no último trimestre do ano de 2022.

Indicadores

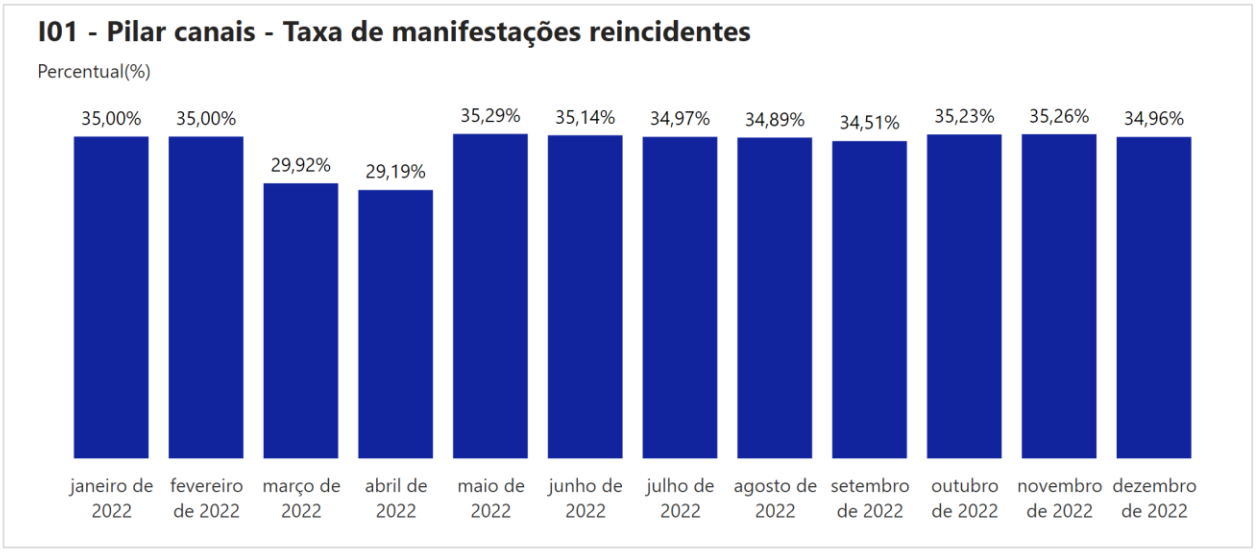


Gráfico 19:I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes - Frequência Mensal

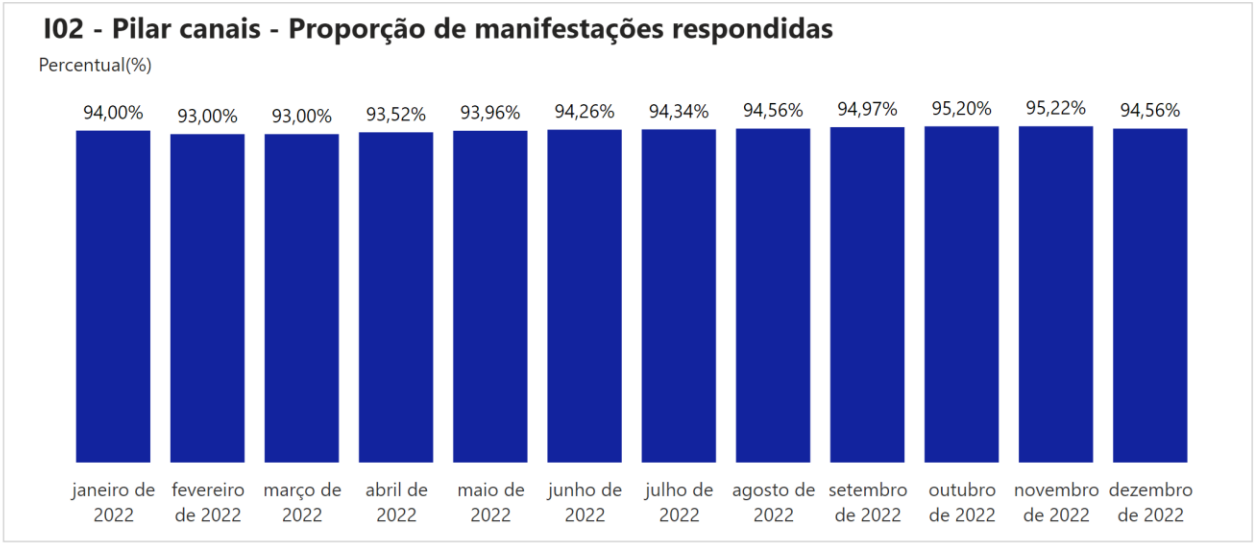


Gráfico 20: I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas - Frequência Mensal

Indicadores

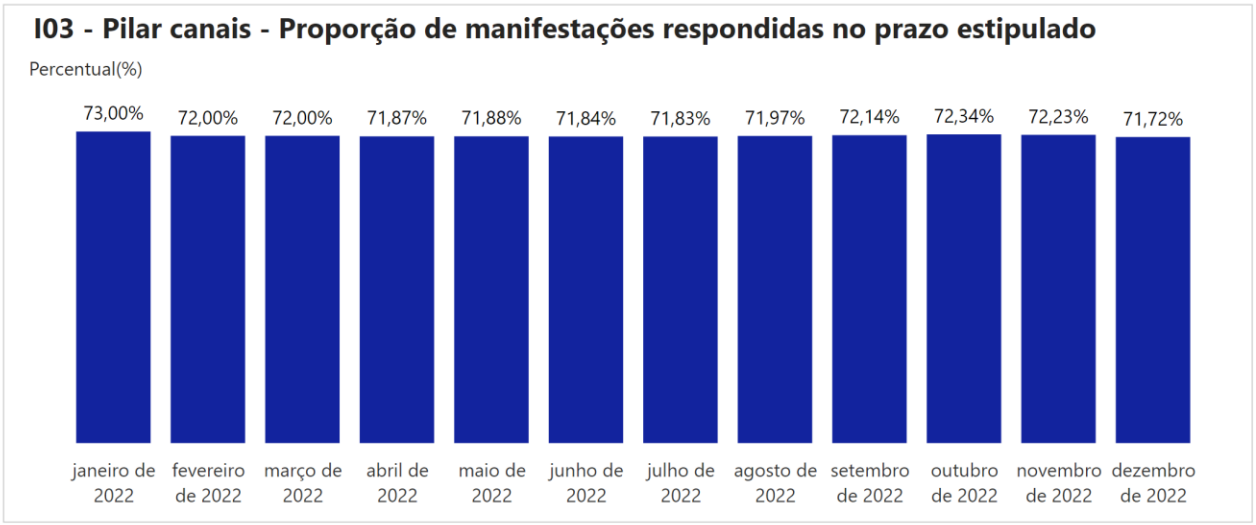


Gráfico 21: I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - Frequência Mensal

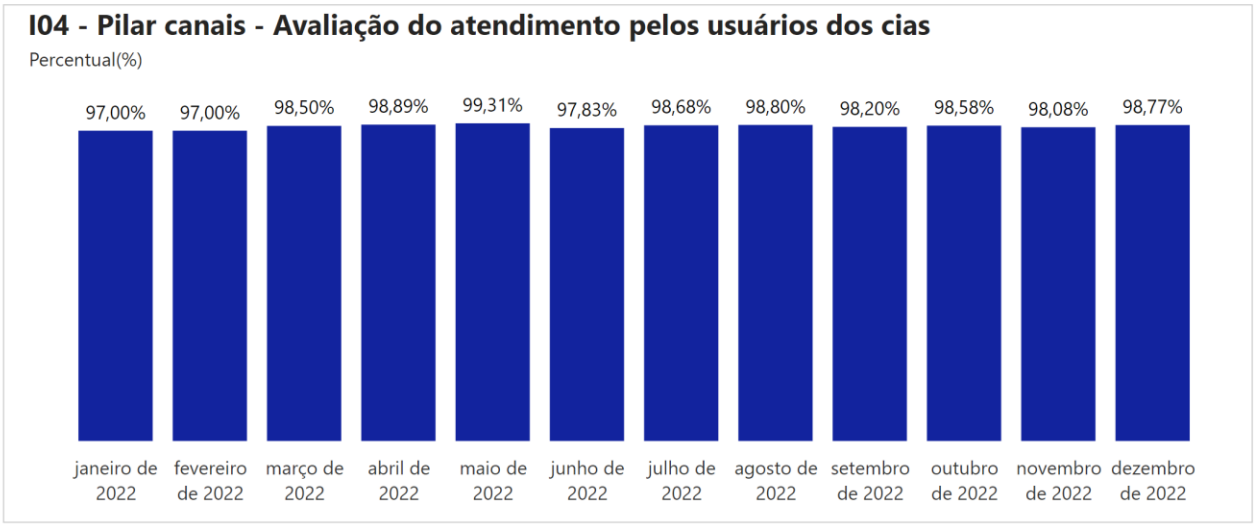


Gráfico 22: I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias - Frequência Mensal

Indicadores

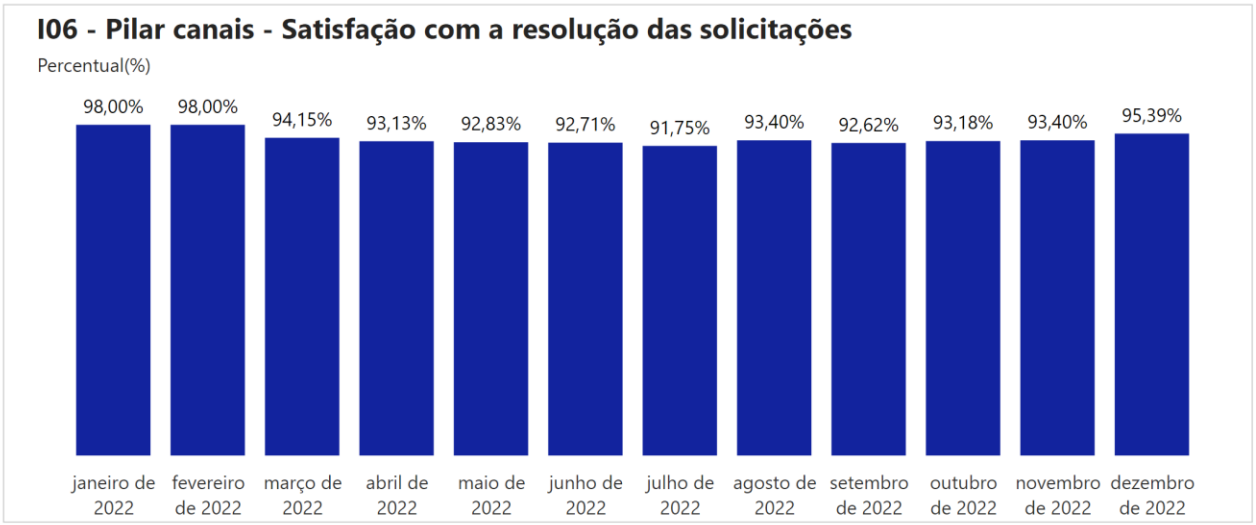


Gráfico 24: I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações - Frequência Mensal

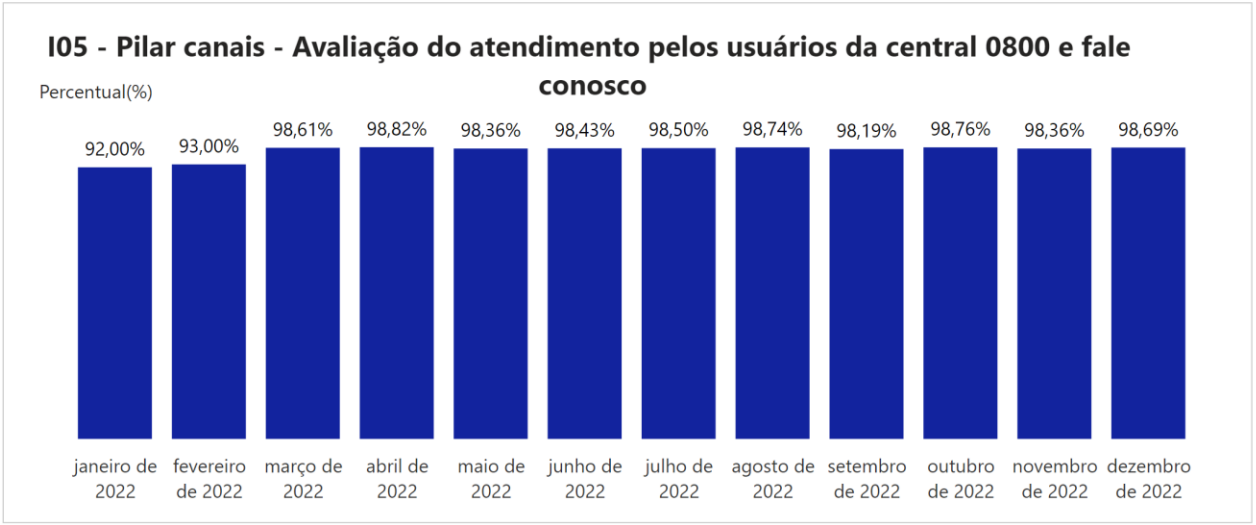


Gráfico 23: I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

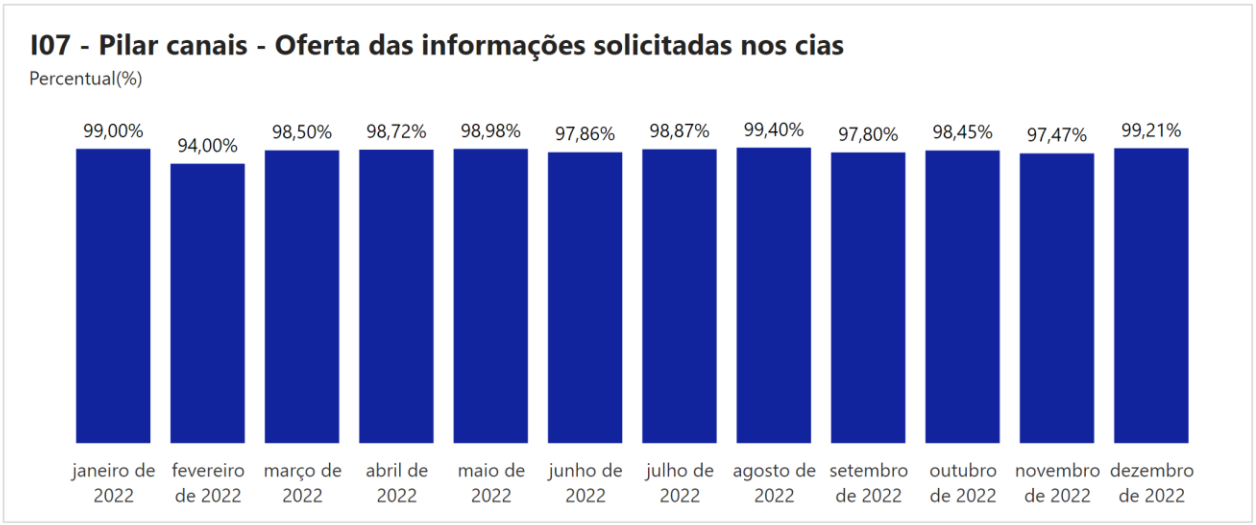


Gráfico 25: I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias - Frequência Mensal

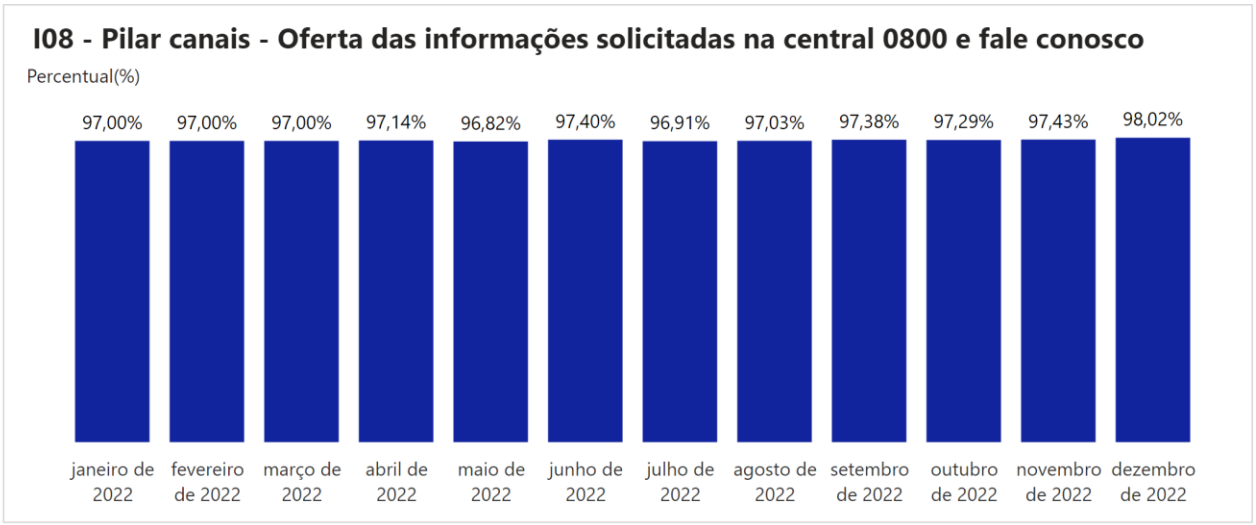


Gráfico 26: I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco - Frequência Mensal

Indicadores

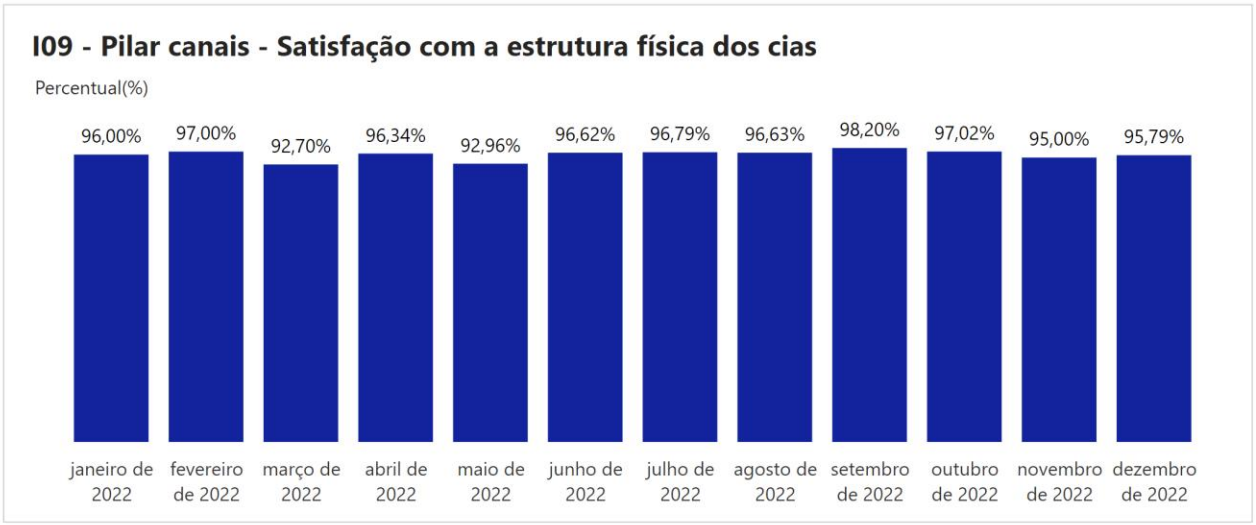


Gráfico 27: I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias - Frequência Mensal

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

1º Semestre de 2022

DADO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	0	0	1	0	0	**1**
Carros de som produzidos	4	1	3	0	2	0	**10**
Cartazes produzidos	0	0	4	0	3	0	**7**
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	2	0	**4**
E-mails de Marketing produzidos	0	1	5	2	0	2	**10**
Informes do Reassentamento produzidos	2	2	3	2	3	0	**12**
Jornais da Comunidade produzidos	5	0	20	0	16	0	**41**
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	15	33	10	33	0	**91**
Mídias Sociais produzidas	15	3	6	2	1	5	**32**
Newsletter produzidos	3	3	2	2	4	5	**19**
Outros itens produzidos	2	2	18	7	14	3	**46**
Panfletos produzidos	0	0	1	0	1	0	**2**
Pílulas de whatsapp produzidos	39	21	40	36	26	26	**188**
Rádios produzidos	18	20	41	40	48	39	**206**
Vídeos produzidos	1	0	1	1	15	2	**20**

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar


2º Semestre de 2022

DADO	jul	ago	set	out	nov	dez	Acumulado no ano
Áudios produzidos	0	6	7	21	11	0	**45**
Carros de som produzidos	7	0	2	3	7	0	**19**
Cartazes produzidos	1	1	0	0	0	0	**2**
Cartilhas produzidos	0	0	1	1	0	0	**2**
E-mails de Marketing produzidos	0	2	0	0	2	0	**4**
Informes do Reassentamento produzidos	2	3	3	1	0	0	**9**
Jornais da Comunidade produzidos	27	30	26	37	40	54	**214**
Matéria - Boletim Jornada produzidos	0	0	0	0	0	0	**0**
Mídias Sociais produzidas	1	6	1	0	2	0	**10**
Newsletter produzidos	11	3	3	0	1	3	**21**
Outros itens produzidos	48	11	13	1	13	0	**86**
Panfletos produzidos	1	1	0	0	3	0	**5**
Pílulas de whatsapp produzidos	34	33	16	22	20	11	**136**
Rádios produzidos	32	28	10	8	21	22	**121**
Vídeos produzidos	6	7	1	4	5	6	**29**

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Publicações por Território

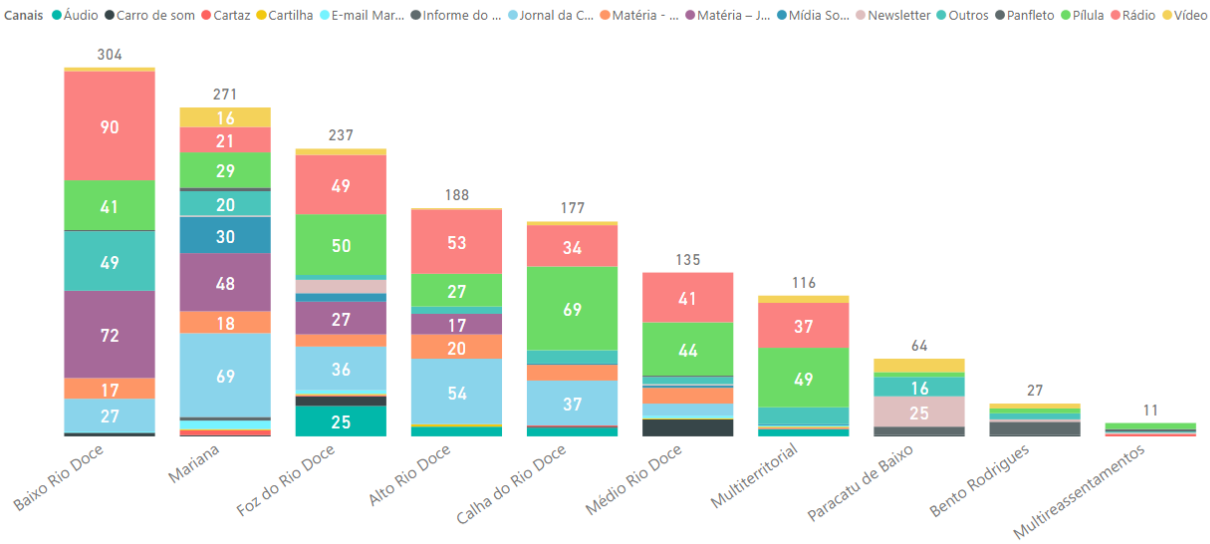


Observação: os números apresentados nas colunas dos reassentamentos de Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo não são contabilizados na coluna de Mariana. Os resultados apresentados são referentes ao ano de 2022.

COMUNICAÇÃO

Grandes números do pilar

Principais Temas Veiculados

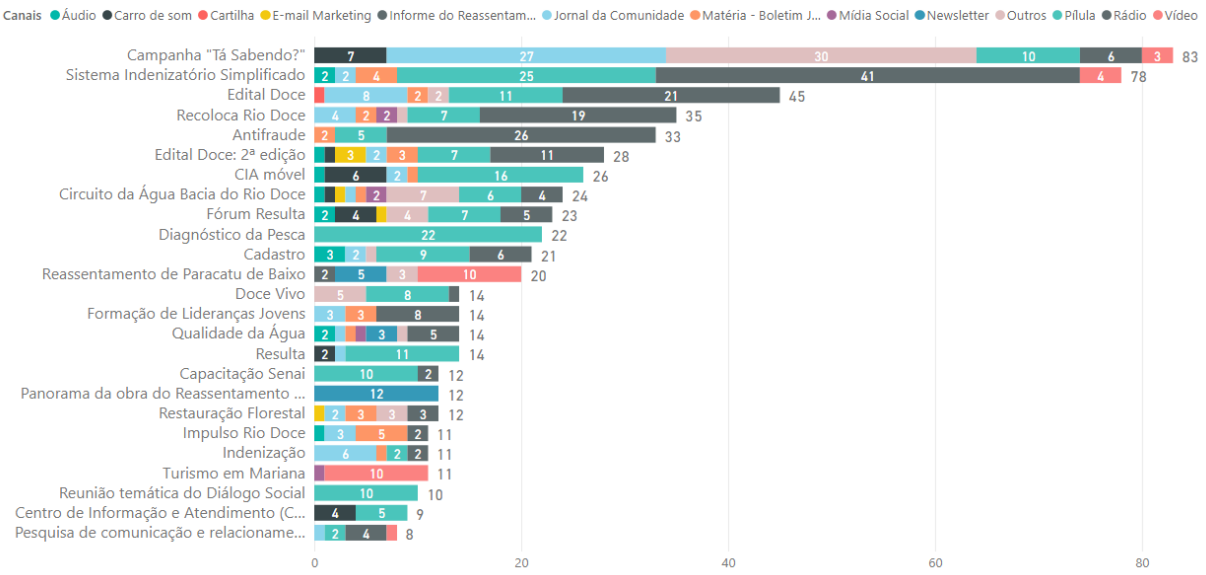

Observação: Os resultados apresentados são referentes ao ano de 2022.

Fatos relevantes do Ano

Imprensa

Saúde e Proteção Social: A Fundação Renova atuou pela ampliação do Samu Leste/Vale do Aço e segue disponibilizando recursos através da Agenda Integrada e do apoio à implementação de sistemas de tratamento de esgoto em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Reassentamento: O início da preparação do distrito de Bento Rodrigues para receber os novos moradores foi um dos destaques com a finalização da ETE e da ETA de Bento Rodrigues que foram entregues ao SAAE de Mariana. Além disso, 29ª edição do Iron Biker Brasil que trouxe o novo distrito de Bento Rodrigues como trecho inédito da prova também mereceu destaque.

Meio Ambiente: As soluções apresentadas pela empresa capixaba Aplysia para a recuperação do rio Gualaxo do Norte, os diversos editais e investimentos na recuperação de Áreas de Proteção Permanente e nascentes foram destaques na divulgação da Fundação Renova em 2022.

Indenização: Em 2022 a Fundação Renova seguiu dando visibilidade aos processos indenizatórios, seus pagamentos, a indenização aos indígenas e ao Sistema Indenizatório Simplificado.

Economia e Inovação: O Edital Doce permitiu o apoio a centenas de projetos em Minas Gerais e no Espírito Santo, ajudando a aquecer a economia local e o apoio a empreendedores e iniciativas ao longo da bacia. Em paralelo, a Plataforma Recoloca Rio Doce abriu milhares de oportunidades de contratação de mão de obra em diversas cidades nos dois estados. Ações de cidadania e empreendedorismo que levam importantes serviços à população também receberam destaque. Em outra frente o repasse de recursos vai permitir a implantação do Distrito Empresarial de Mariana.

Adutora de Governador Valadares: A Fundação Renova seguiu dando transparência para as obras de construção da nova captação de água de Governador Valadares que está em sua reta final. O Circuito das Águas realizado na cidade permitiu um processo imersivo no processo.

Fatos relevantes do Ano

Suporte aos Programas

Suporte ao PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados e ao PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Os processos indenizatórios e o Auxílio Financeiro Emergencial foram temáticas tratadas de forma recorrente nos territórios, inclusive com veiculação semanal nos programas de rádio a partir do segundo semestre de 2022.

Suporte ao PG008 Reconstrução de Vilas

A 29ª edição do Iron Biker Brasil, que reuniu mais de dois mil competidores de todo o Brasil em Mariana, este ano incluiu as ruas do novo distrito de Bento Rodrigues no trajeto. Essa iniciativa, junto com os avanços nas obras e as ações de convivência e engajamento das famílias dos reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo foram os principais temas divulgados em relação ao PG008.

Suporte ao PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

A 2ª edição do Edital Doce, que este ano contou com três modalidades, sendo uma exclusiva para o território de Mariana, foi o destaque nas divulgações referentes ao PG013. O edital apoia iniciativas, nas localidades impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, nas áreas de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura.

Suporte ao PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

A construção do novo sistema de captação alternativa de água de Governador Valadares, uma adutora com 38 quilômetros de extensão, foi um dos principais marcos do PG032 que recebeu destaque nas divulgações ocorridas na região do Médio Rio Doce.

Suporte ao PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

O lançamento da segunda edição da plataforma Expedição Rio Doce, que permite que qualquer pessoa navegue virtualmente por toda a bacia do rio Doce por meio do Google Street View, foi divulgado em todos os territórios com comunicações diversas como programas de rádio, matérias nos jornais das comunidades, entre outras.

Suporte à Economia e Inovação

As vagas de emprego disponíveis na Plataforma Recoloca Rio Doce e as ações de Empreendedorismo e Cidadania realizadas no Alto, Calha, Médio e Foz do Rio Doce também receberam destaque em nossos canais de comunicação dos territórios.

Fatos relevantes do Ano

Eventos

Outra estratégia importante para a comunicação com os atingidos sobre a atuação dos programas no processo de reparação em 2022 foram os eventos. Qualidade da água, restauração florestal, melhorias no sistema de abastecimento de água, tratamento de esgoto e o parque de exposições de Barra Longa foram os temas trabalhados em alguns ações como: Semana da Água em São José do Goiabal (PGs 031 e 038), Circuito da Água Bacia Rio Doce – edição Adutora GV (PGs 032 e 038), SOBRE – IV Conferência Brasileira Restauração Florestal (UST), comissionamento da ETE Bento Rodrigues (PG008), entregas da ETE, ETA e sistema de iluminação pública em Bento Rodrigues (PG008) e entrega do parque de exposições de Barra Longa (PG10).

Indicadores

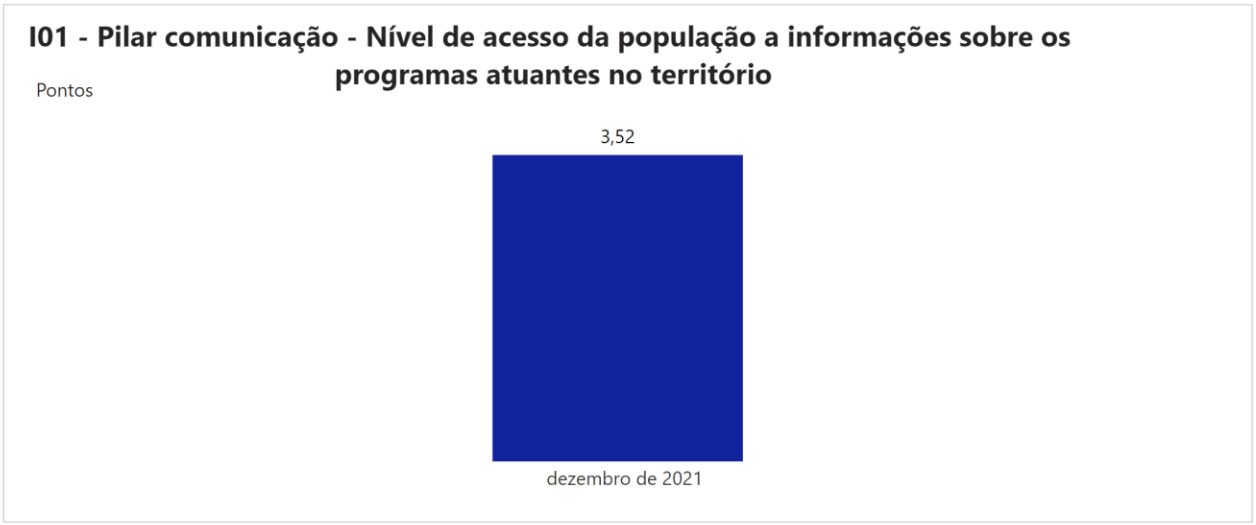


Gráfico 28: I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território - Frequência Anual

O atraso no envio dos resultados dos indicadores anuais do PG06, decorre da realização de uma complexa pesquisa que será concluída no final de dezembro. Após essa conclusão, há necessidade de ampla análise dos dados, limpeza de bases e compilação dos resultados obtidos. O prazo necessário para finalização desse processo não atende a data limite de entrega do relatório CIF de janeiro, portanto esses dados serão reportados no relatório subsequente.

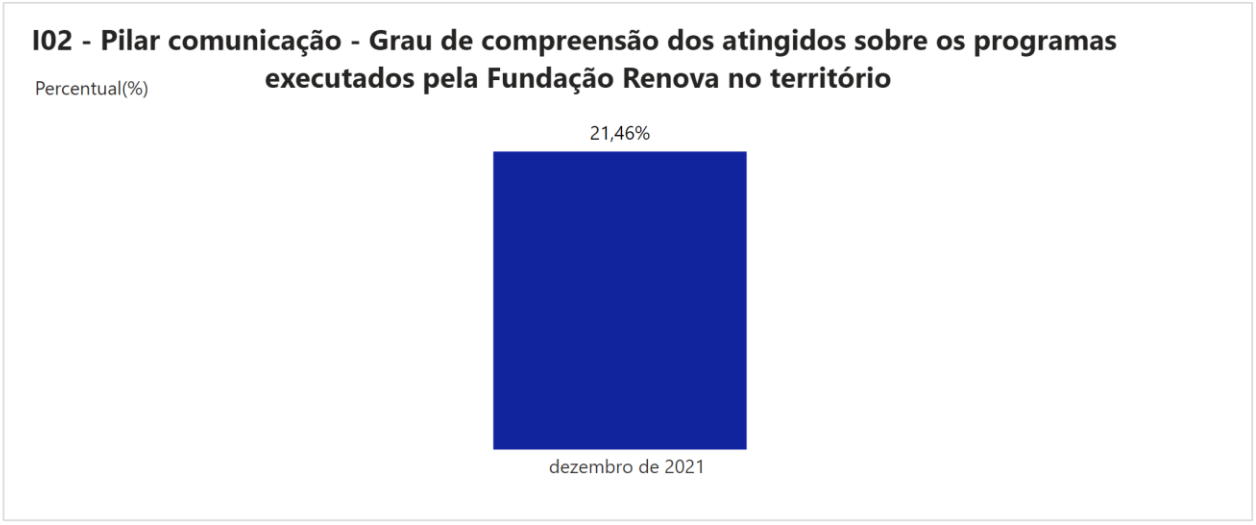


Gráfico 29: I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território - Frequência Anual

O atraso no envio dos resultados dos indicadores anuais do PG06, decorre da realização de uma complexa pesquisa que será concluída no final de dezembro. Após essa conclusão, há necessidade de ampla análise dos dados, limpeza de bases e compilação dos resultados obtidos. O prazo necessário para finalização desse processo não atende a data limite de entrega do relatório CIF de janeiro, portanto esses dados serão reportados no relatório subsequente.

Indicadores

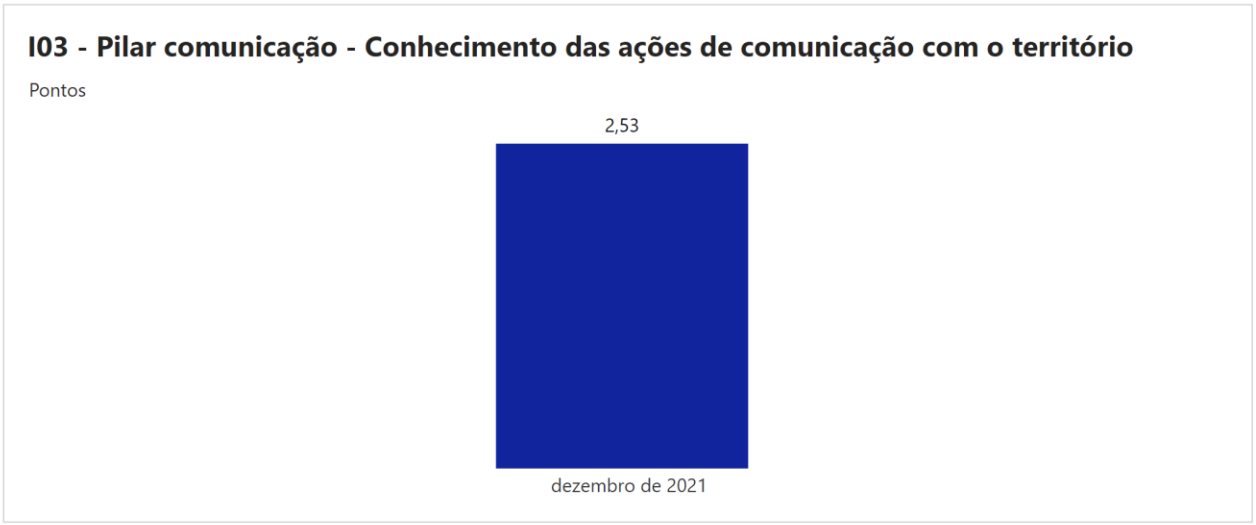


Gráfico 30: I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território - Frequência Anual

O atraso no envio dos resultados dos indicadores anuais do PG06, decorre da realização de uma complexa pesquisa que será concluída no final de dezembro. Após essa conclusão, há necessidade de ampla análise dos dados, limpeza de bases e compilação dos resultados obtidos. O prazo necessário para finalização desse processo não atende a data limite de entrega do relatório CIF de janeiro, portanto esses dados serão reportados no relatório subsequente.



Gráfico 31: I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território - Frequência Anual

O atraso no envio dos resultados dos indicadores anuais do PG06, decorre da realização de uma complexa pesquisa que será concluída no final de dezembro. Após essa conclusão, há necessidade de ampla análise dos dados, limpeza de bases e compilação dos resultados obtidos. O prazo necessário para finalização desse processo não atende a data limite de entrega do relatório CIF de janeiro, portanto esses dados serão reportados no relatório subsequente.

PG007 Programa de Assistência aos Animais

Eixo Terra e Água

Objetivo

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de rompimento da barragem de Fundão, na região de Mariana e Barra Longa, na forma prevista nas cláusulas 73 à 75 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do programa, visando o alinhamento entre Estrutura Analítica de Projetos e Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após 2022.

Grandes números do programa

- 1306 registros de prontuários de atendimentos interno, sendo 162 adoções, 455 restituições, 199 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 447 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova;

- Atualmente existem 337 bovinos, 65 equinos, 23 caninos, 18 suínos, 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2;

- No âmbito de atendimentos externos do programa, foram registrados 1837 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Restituição definitiva de 63 animais para produtora de zona rural do distrito de Paracatu (Mariana/MG)

05/2022 Realização de curso de capacitação em Doma Racional de Equídeos - Item 3 da Deliberação 328/2019 - CIF.

05/2022 Realização de curso de capacitação em Melhoramento Genético de Bovinos em parceria com Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17) e Emater Minas Gerais - Item 3 da Deliberação 328/2019 - CIF.

09/2022 Encerramento das alíneas "a", "b" e "e" da Cláusula 74 junto ao CIF - Deliberação nº 608/2022.

09/2022 Treinamento de equipe em manejo etológico de cães em situação de abrigo com objetivo de promover melhor socialização dos animais com outros animais e com seus tutores - planejamento de devolução final na etapa de reassentamento.

12/2022 Vacinação obrigatória de febre aftosa de bovinos, acompanhada por fiscal do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

12/2022 Visita semestral do Grupo Técnico de Monitoramento da CTOS, em cumprimento à Deliberação CIF nº 226/2018.

Indicadores

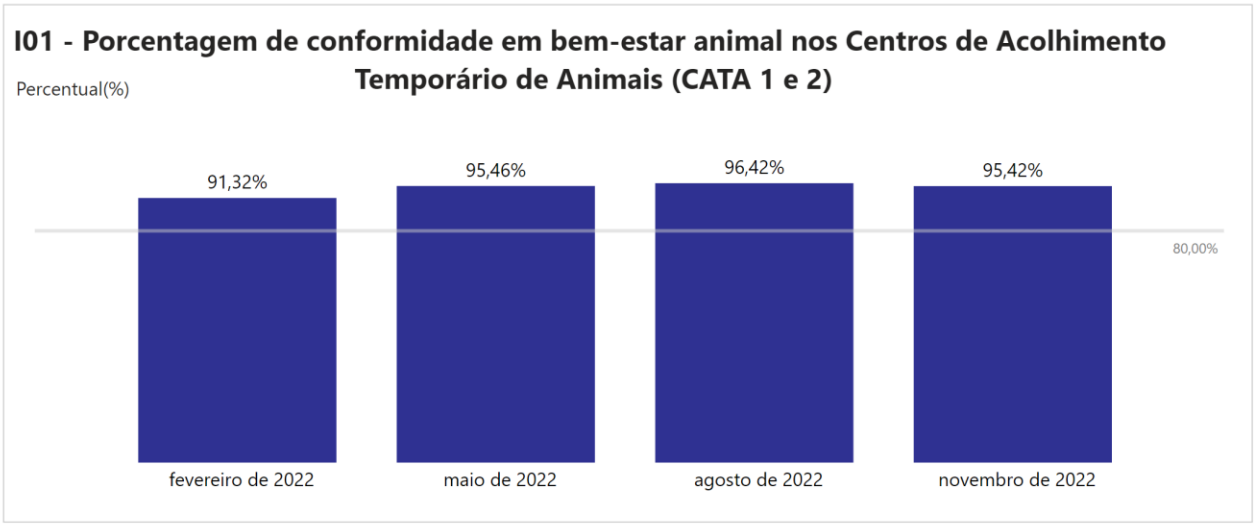


Gráfico 1: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

Os resultados apontados nos gráficos 1 e 2 são referentes à aferição do indicador de conformidade em bem-estar animal no período da estação de primavera (novembro de 2022).

O reporte de resultados deste indicador para a estação de verão 2022-2023 está previsto para o relatório de março de 2023 (ref. fevereiro/23).

Indicadores de Acompanhamento

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos CATA 1 e 2 está apresentado a seguir:

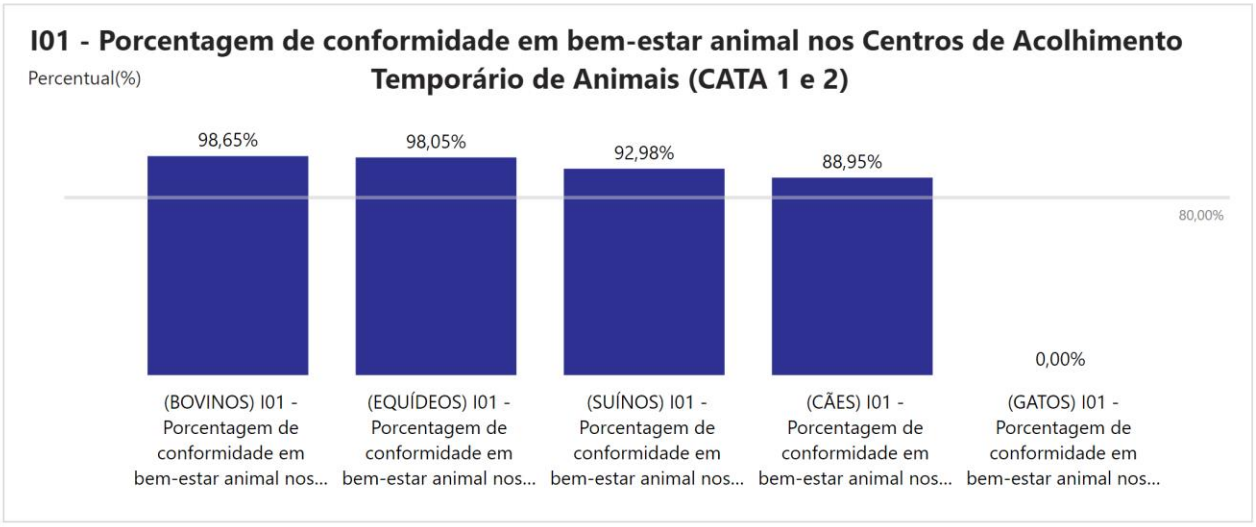


Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Frequência Trimestral

GRAU DE BEM-ESTAR	REFERÊNCIA EM %
Muito Alto	≥ 90%
Alto	≥ 80%
Regular	≥ 60%
Baixo	≥ 30%
Muito Baixo	≤29%

Quadro 1: Percentuais de referência para os 5 graus de bem-estar

Indicadores

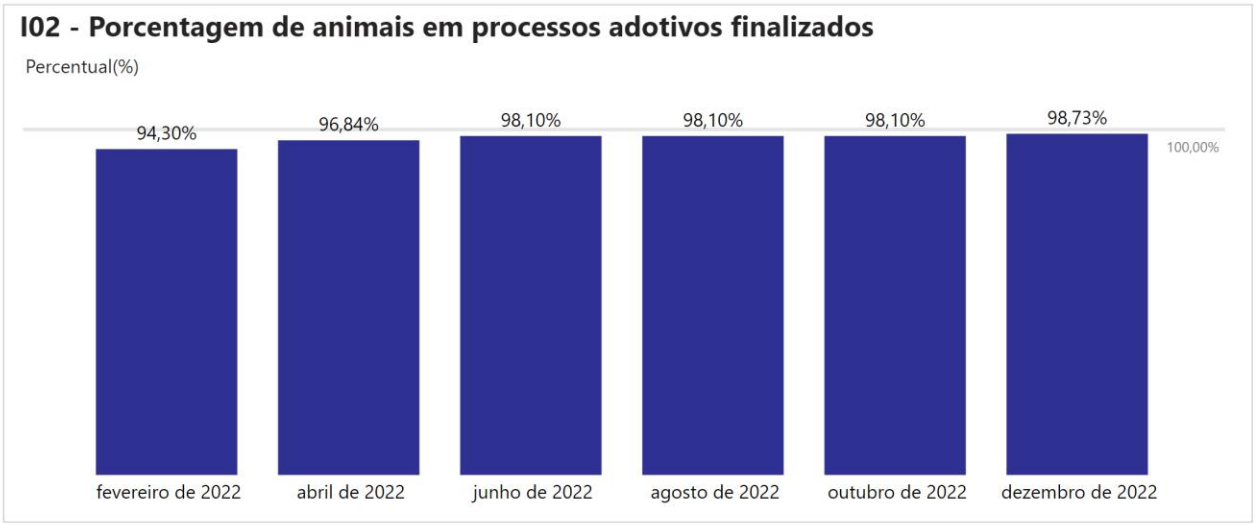


Gráfico 3: I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - Frequência Bimestral

No bimestre de novembro e dezembro de 2022 houve uma ocorrência de finalização de adoção, alterando o valor identificado no mês anterior para 98,7%. A próxima verificação deste está prevista para o mês de março de 2023 (referência ao bimestre jan./fev. de 2023).

Indicadores

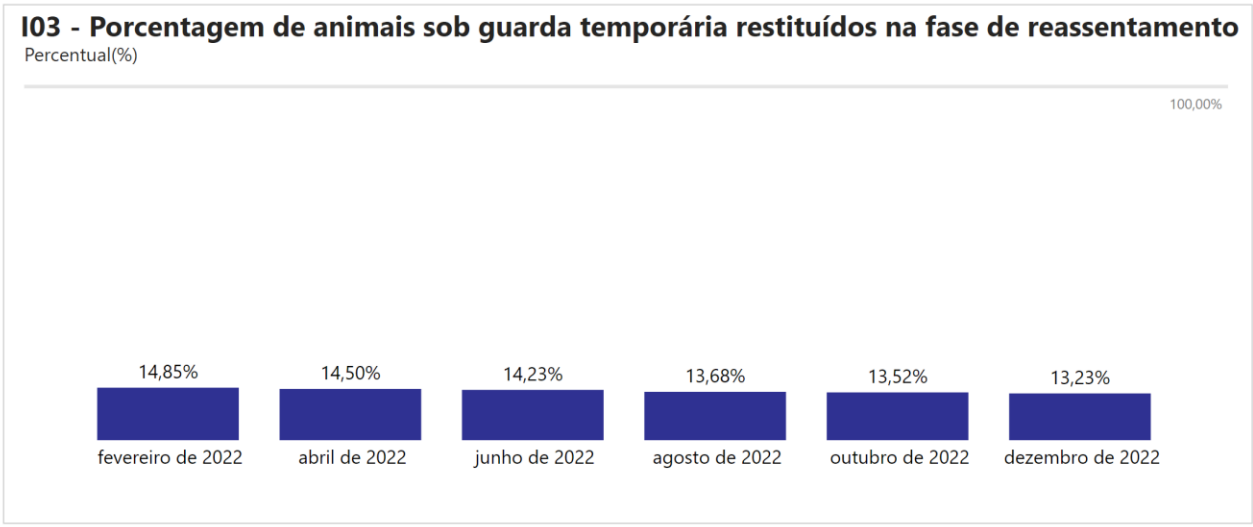


Gráfico 4: I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase de reassentamento- Frequência Bimestral

No bimestre de novembro e dezembro de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de março de 2023 (referência ao bimestre jan./fev. de 2023). A variação entre os dois últimos bimestres se deu em função de novos registros de animais sob guarda da Fundação Renova provenientes de nascimentos e/ou recolhimentos, conforme previsto no indicador.

Indicadores

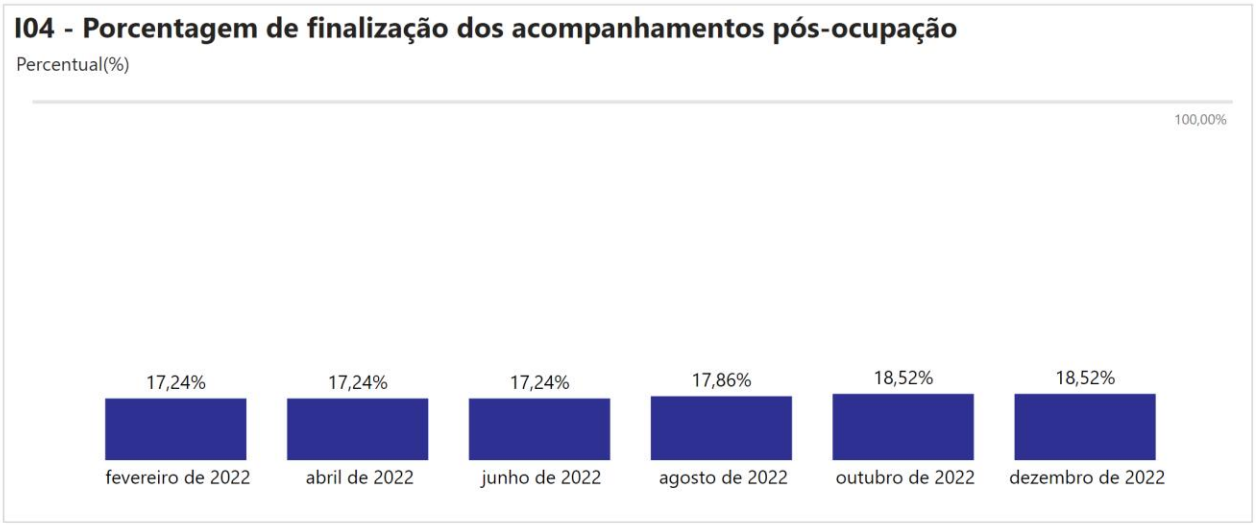


Gráfico 5: I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - Frequência Bimestral

No bimestre de novembro e dezembro de 2022, não houve ocorrências de novas restituições definitivas de animais. A próxima verificação deste está prevista para o mês de março de 2023 (referência ao bimestre jan./fev. de 2023).

PG008 Reconstrução de Vilas

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.


Projeto Reconstrução de Vilas

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas acumuladas até o ano de 2022

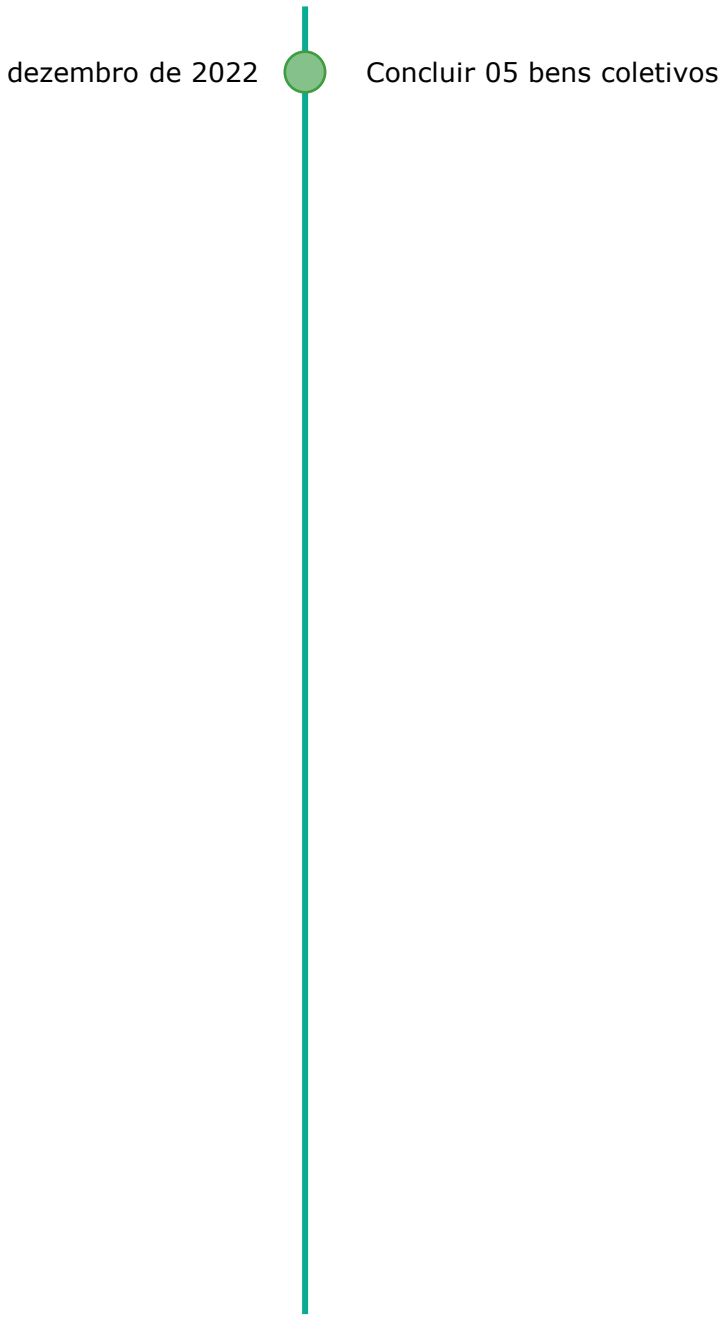

Concluído Planejado Reprogramado

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Entregas acumuladas até o ano de 2022

Os desvios entre os atendimentos se referem ao alto volume de chuvas acima da média histórica e à dificuldade na contratação de mão de obra qualificada, além é claro da baixa produtividade das empresas em alguns ID's. Entretanto os ID’s restantes estão com avanço físico acima de 80%.

As entregas faltantes foram reprogramadas para 1º Semestre de 2023.
Entregas: “Concluir 125 edificações” e “Concluir 22 lotes”.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Grandes números do projeto

Social:

- 195 famílias atendidas (Com Novos Núcleos).

Obras:

- 33 Construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos) com obra iniciada;
- 115 **Edificações** (Casas, comércios e mistos) concluídas;
- 3 Construções de **bens coletivos** com obras iniciadas;
- 7 Construção de **bens coletivos** concluídos;
- 9 Contratos assinados para construções de **edificações** (Casas, comércios e mistos;)
- 5 estruturações de **lotes vagos** com obras iniciadas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 182 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 181 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes vagos e 17 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 177 edificações (Casas, comércios e mistos), 25 lotes e 16 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 23 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 174 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 14 bens coletivos.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do Ano

08/2022	Finalização de obra do ID 185.
08/2022	Finalização de obra dos IDs abaixo: o 71-UH1 o 71-UH2
08/2022	Finalização de obra do ID 65.
08/2022	Finalização de obra do ID 110.
08/2022	Finalização de obra do ID 93C.
08/2022	Finalização de obra do ID 41.
08/2022	Finalização de obra do ID 96.
08/2022	Finalização de obra do ID 30.
09/2022	Finalização de obra do ID 147.
09/2022	Finalização de obra do ID 253.
09/2022	Finalização de obra do ID 93D1.
09/2022	Finalização de obra do ID 93D2.
09/2022	Finalização de obra do ID 126-2.
09/2022	Finalização de obra do ID 128.
09/2022	Finalização da obra do ID CC12.
09/2022	Finalização de obra do ID 11A.
09/2022	Finalização de obra do ID 17A.
09/2022	Finalização de obra do ID 38.
09/2022	Finalização de obra do ID 126-1.
09/2022	Finalização de obra do ID 42.
09/2022	Finalização de obra do ID 78.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Finalização de obra do IDs 160.

10/2022 Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 59A.

10/2022 Finalização de obra do ID 261.

10/2022 Finalização de obra do ID 35.

10/2022 Finalização de obra do ID 83.

10/2022 Finalização de obra do ID 77.

10/2022 Finalização de obra do ID CC.218.

10/2022 Finalização de obra do ID 218.

10/2022 Finalização de obra do ID 04.

10/2022 Finalização de obra do ID 207.

10/2022 Finalização de obra do ID 37.

10/2022 Finalização de obra dos IDs 135-UH1 e 135-UH2.

10/2022 Finalização de obra do ID 21D-UH2.

11/2022 Finalização de obra do ID 74.

11/2022 Finalização de obra do ID240.

11/2022 Finalização de obra do ID190.

11/2022 Finalização de obra do ID 93B.

11/2022 Finalização de obra do ID 79.

12/2022 Finalização de obra do ID18

12/2022 Finalização de obra do ID200

12/2022 Finalização de obra do ID28

12/2022 Finalização de obra do ID13

12/2022 Finalização de obra do ID150

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID126B

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID137C

12/2022 Finalização da estruturação do lote IDCD17

12/2022 Finalização de obra do ID43

12/2022 Finalização de obra do ID217B

12/2022 Finalização de obra do ID21C

12/2022 Finalização de obra do ID6

12/2022 Finalização de obra do ID61

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID187

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID2

12/2022 Finalização de obra do ID123

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID102

12/2022 Finalização de obra da Praça Central São Bento (Bens Coletivos) IDNA5

12/2022 Finalização de obra do ID205

12/2022 Finalização de obra do IDCC.41

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID95

12/2022 Finalização de obra da Praça do Encontro (Bens Coletivos) IDNA8

12/2022 Finalização de obra de edificação (Novos Núcleos) IDNN6

12/2022 Finalização de obra do ID113

12/2022 Finalização de obra do ID126A

12/2022 Finalização de obra do ID158

12/2022 Finalização de obra do ID180A-2

12/2022 Finalização de obra do ID197

12/2022 Finalização de obra do ID208-1.

12/2022 Finalização de obra do ID208-2.

Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Finalização de obra do ID100

12/2022 Finalização de obra do ID173

12/2022 Finalização de obra do ID180A-1.


12/2022 Finalização de obra do ID66

12/2022 Finalização de obra do ID97

12/2022 Finalização da estruturação do lote ID162

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas acumuladas até o ano de 2022

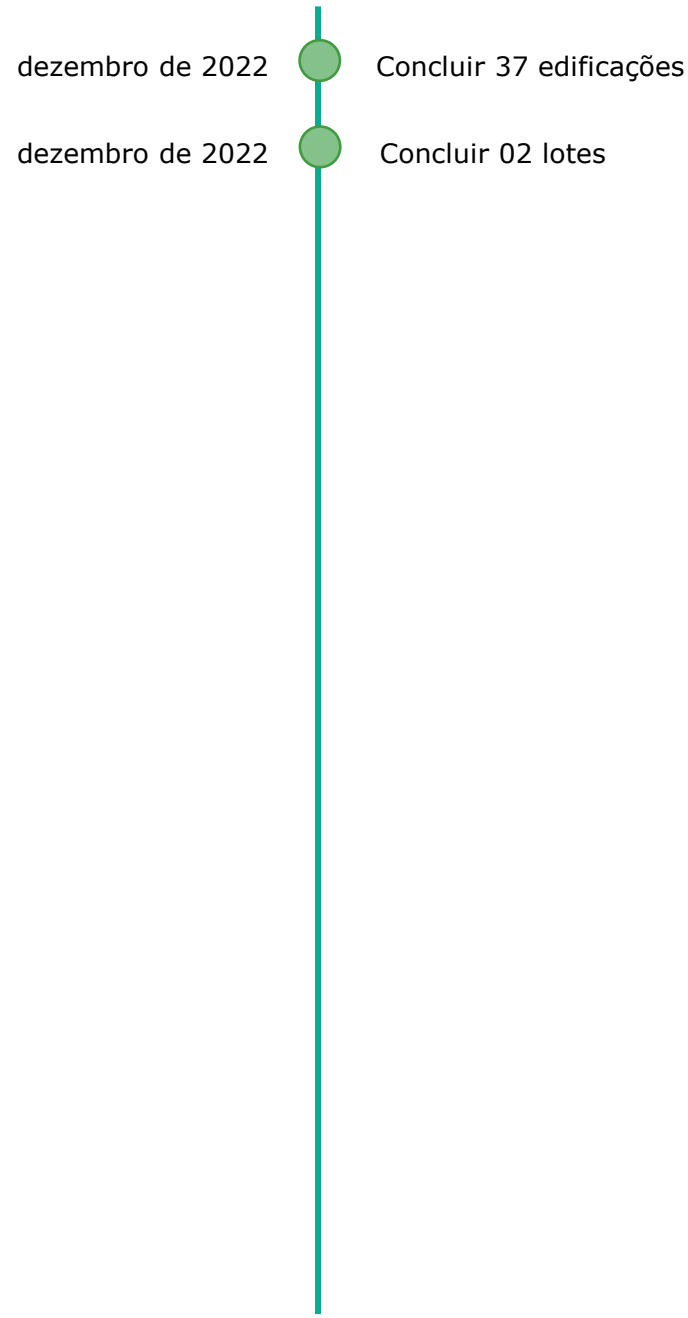

Concluído Planejado Reprogramado

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Entregas acumuladas até o ano de 2022

Os desvios entre os atendimentos se referem ao alto volume de chuvas acima da média histórica e à dificuldade na contratação de mão de obra qualificada, além é claro da baixa produtividade das empresas em alguns ID's.

Os projetos da ETE e ETA sofreram algumas alterações ao longo do andamento do contrato, que alteraram a entrega das mesmas.
PMM (Prefeitura Municipal de Mariana), em Out/22, solicitou alterações nas escolas causando impacto na produção e retardo no término. Além disso houve também uma produtividade inferior da planejada, por parte da contratada, que também promoveu atrasos nas entregas.

A entrega "Concluir 04 bens coletivos" faltante foi reprogramada para 1º Semestre de 2023.

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Grandes números do projeto

Social:

- 77 famílias atendidas (Com novos núcleos);

Obras:

- 17 Edificações (Casa, comércio e misto) com obras iniciadas;
- 10 Bens coletivos com obras iniciadas;
- 0 Lotes com obras iniciadas;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para 69 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para 70 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes vagos e 13 bens coletivos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para 63 edificações (Casas, comércios e mistos), 7 lotes e 12 bens coletivos;
- **Licenças simplificadas** ou não necessárias para 7 lotes vagos;
- **Alvarás** emitidos ou não necessários para 63 edificações (Casas, comércios e mistos) e para 12 bens coletivos.

Nota[1]: Edificações são correspondentes a "casas e pontos comerciais".

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Finalização de obra do ID65A

11/2022 Finalização de obra do ID40C.

11/2022 Finalização de obra do ID29CC.

11/2022 Finalização de obra do ID102.

12/2022 Finalização de obra do ID79

12/2022 Finalização de obra do ID126

12/2022 Finalização de obra do ID27

12/2022 Finalização de obra do ID32

12/2022 Finalização de obra do ID74

12/2022 Finalização de obra do ID85

12/2022 Finalização de obra do ID86

12/2022 Finalização de obra do ID131A

12/2022 Finalização de obra do ID145

12/2022 Finalização de obra do ID147

12/2022 Finalização de obra do ID36

12/2022 Finalização de obra do ID72B

12/2022 Finalização de obra do ID129

12/2022 Finalização de obra do ID146

12/2022 Finalização de obra do ID88

12/2022 Finalização de obra do ID140

12/2022 Finalização de obra do ID30

12/2022 Finalização de obra do ID40B (sítio)

12/2022 Finalização de obra do ID57A

12/2022 Finalização de obra do ID67

Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Finalização de obra do ID51CC

12/2022 Finalização de obra do ID71

12/2022 Finalização de obra da edificação (Novos Núcleos) IDNN30

12/2022 Finalização de obra do ID34

12/2022 Finalização de obra do ID41

12/2022 Finalização de obra do ID46

12/2022 Finalização de obra do ID47

12/2022 Finalização de obra do ID53

12/2022 Finalização de obra do ID56

12/2022 Finalização de obra do ID58

12/2022 Finalização de obra do ID69

12/2022 Finalização de obra do ID77A

12/2022 Finalização de obra do ID87

Projeto Reconstrução de Gesteira

Entregas para o ano de 2022

Devido a judicialização do Reassentamento de Gesteira, não há entregas previstas.

Projeto Reconstrução de Gesteira

Grandes números do projeto

Social:

- Atendimentos para 37 **famílias;**
- 31 famílias com acordo homologados;
- 24 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **com aquisição de imóvel;**
- 6 atendimentos finalizados para famílias que possuem acordo homologado, **sem aquisição de imóvel;**

Projeto Reconstrução de Gesteira

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Homologação do acordo ID N.A 31;

12/2022 Homologação do acordo ID N.A 81.

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Aquisição do imovel para o ID SGC 42359 (Id Autodelimitação 186)

02/2022 Aquisição do imóvel para o ID SGC 42446 (Id autodelimitação 110) data de entrega 24/01/22

02/2022 Aquisição do imóvel para o ID SGC 42510 (Id autodelimitação 108) data de entrega 24/01/22

08/2022 Familiar
Finalização de obra do IDs 130, 134 e 194.

08/2022 Reconstrução
Finalização de obra do ID 578.

09/2022 Finalização de obra do ID 220.

10/2022 Finalização de obra do ID 87.

10/2022 Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 151.

11/2022 Finalização de obra do ID202

11/2022 Finalização de obra do ID206


11/2022 Finalização de obra do IDNN66

12/2022 Finalização de obra do ID306 (reconstrução)

12/2022 Emitidos 16 habite-se para edificações (casa nova, reforma, comércios e mistos)

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Entregas acumuladas até o ano de 2022

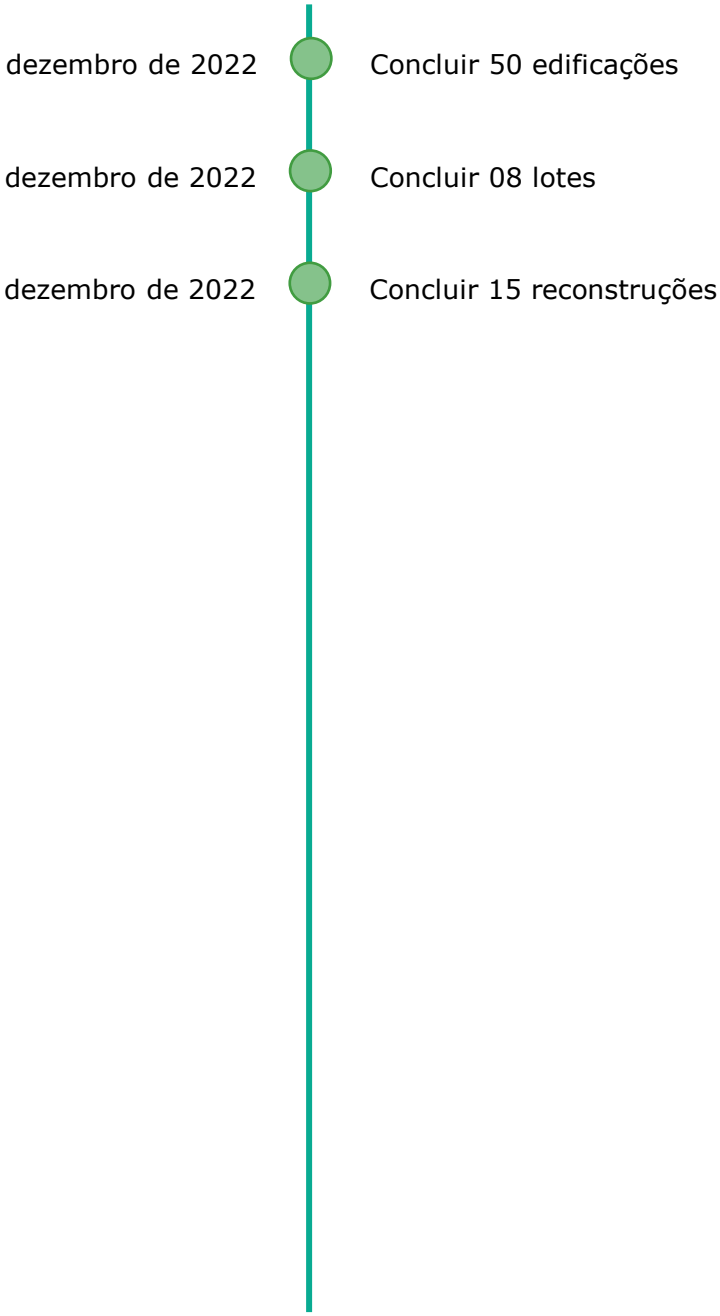

Concluído Planejado Reprogramado

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Obras:

- 14 construções de casas novas com obra iniciada;
- 1 reformas com obra iniciada;
- 0 estruturações de lotes vagos com obra iniciada;
- 0 reconstruções com obra iniciada;

Engenharia:

- **Projetos conceituais concluídos** ou não necessários para construções de 78 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 10 lotes vagos;
- **Projeto básicos concluídos** ou não necessários para construções de 80 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos) e 9 lotes vagos;
- **Projetos protocolados** na prefeitura ou não necessários para construções de 73 edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), e 9 lotes vagos;
- **Licenças, alvarás, dispensa** emitidos pela prefeitura ou não necessários para 71 construções de edificações (Casa nova, reforma, comércios e mistos), para 8 lotes vagos.

Projeto Reassentamento Familar e Reconstruções

Grandes números do Familiar

Social:

- 6 famílias atendidas (com novos núcleos);
- 94 edificações adquiridas para famílias que optaram por esta modaldiade de reparação do direito à moradia (com Novos Núcleos);
    - 50 construção de casas novas;
    - 35 edificações para reformar;
    - 10 lotes vagos (executar obra de adequação);
- Atendimento a 13 famílias na modalidade de reconstruções nas Comunidades Rurais;
- Reconstruções de 16 edificações;
- Reconstruções entregues para 15 **edificações**;

Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Aquisição do imovel para o ID SGC 42359 (Id Autodelimitação 186)

02/2022 Aquisição do imóvel para o ID SGC 42446 (Id autodelimitação 110) data de entrega 24/01/22

02/2022 Aquisição do imóvel para o ID SGC 42510 (Id autodelimitação 108) data de entrega 24/01/22

08/2022 Familiar
Finalização de obra do IDs 130, 134 e 194.

08/2022 Reconstrução
Finalização de obra do ID 578.

09/2022 Finalização de obra do ID 220.

10/2022 Finalização de obra do ID 87.

10/2022 Finalização do serviço de estruturação de lote - ID 151.

11/2022 Finalização de obra do ID202

11/2022 Finalização de obra do ID206

11/2022 Finalização de obra do IDNN66

12/2022 Finalização de obra do ID306 (reconstrução)

12/2022 Emitidos 16 habite-se para edificações (casa nova, reforma, comércios e mistos)

Indicadores de acompanhamento

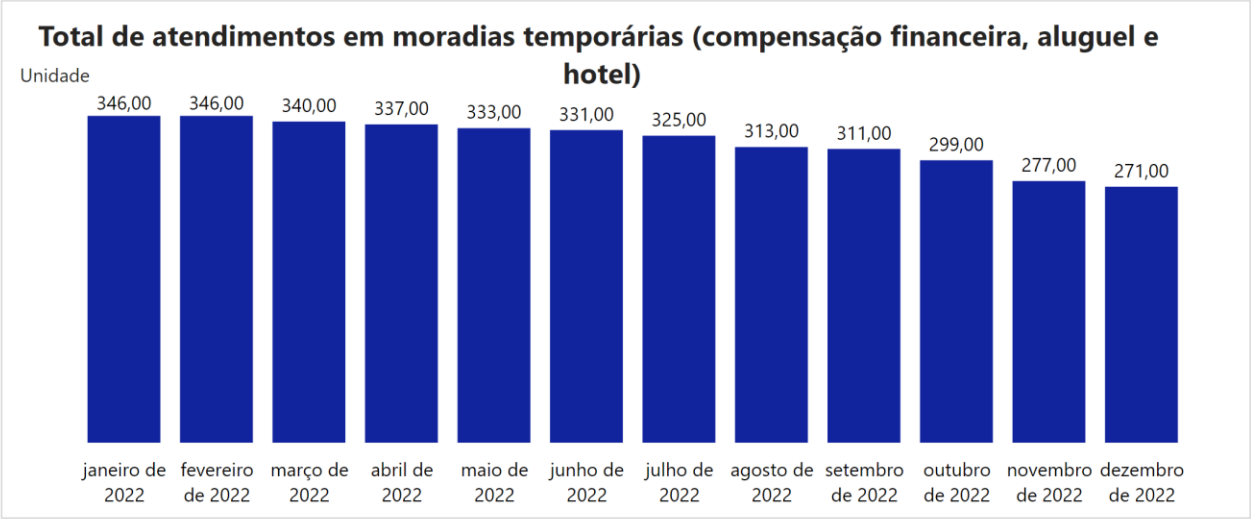


Gráfico 1: Total de atendimentos em moradias temporárias (compensação financeira, aluguel e hotel) - Frequência Mensal

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves

Eixo Terra e Água


Objetivo

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	79	Caput	Judicializado
Cláusula	150	§3º	Judicializado
Deliberação	30	N/A	Concluído internamente
Deliberação	80	2.1	Judicializado
Deliberação	80	2.2	Concluído internamente
Deliberação	80	4.1	Concluído internamente
Deliberação	80	4.2	Concluído internamente
Deliberação	225	2	Judicializado
Deliberação	286	3	Concluído internamente

Entregas do Ano de 2022

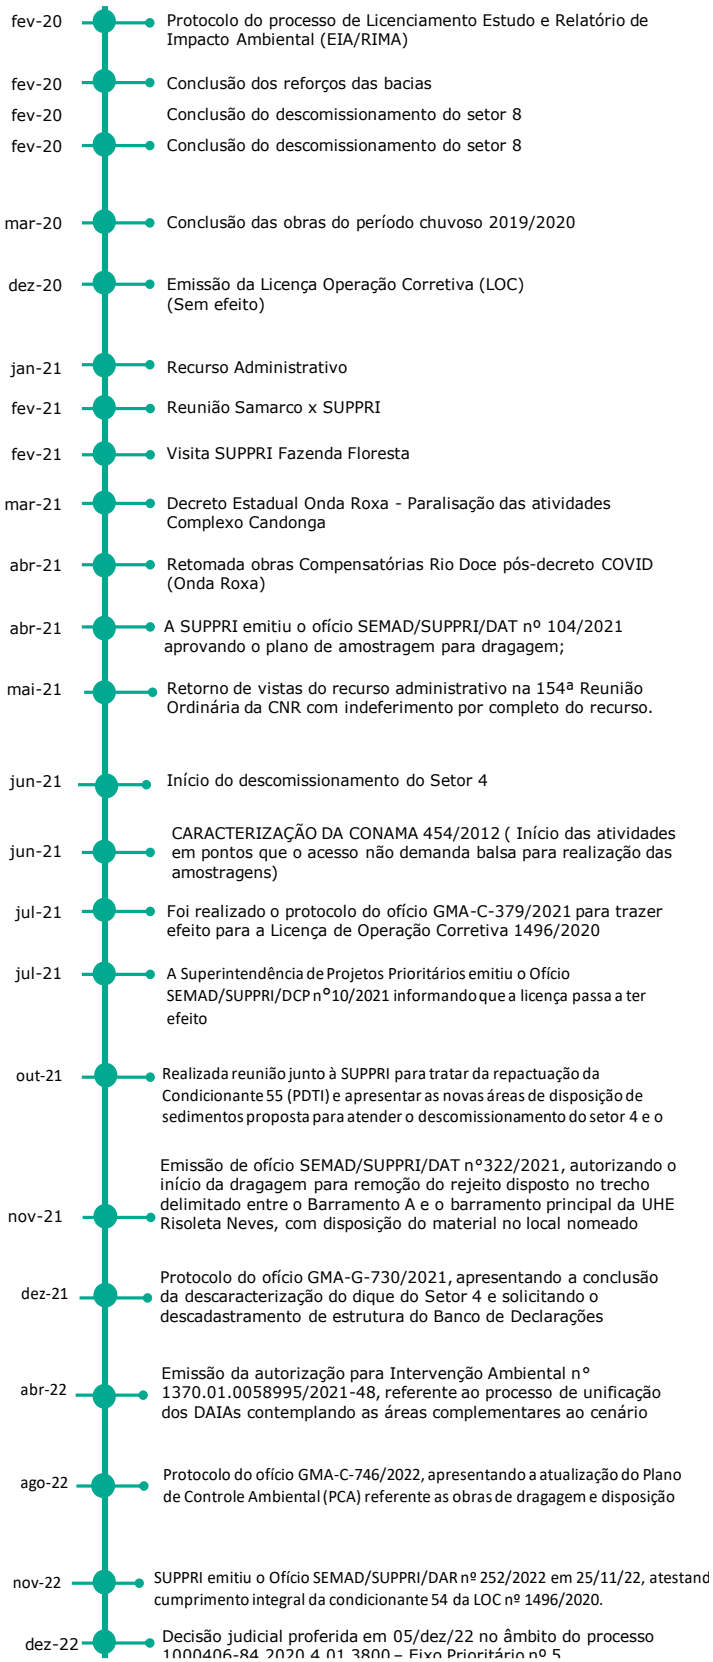

Grandes números do programa

- **1ª fase –** período emergencial 959 mil m3 de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição.

- **2ª fase** – Em cumprimento da LOC 1496/2020, após analisados resultados da cond. 38 (caracterização dos sedimentos conforme CONAMA 454/2012), foi autorizada pela SUPPRI a retomada na remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, considerando as informações conhecidas e descritas no EIA/RIMA, visando num primeiro momento a retomada da UHE Risoleta Neves.

  Até a data de 25/12/2022:

  - O volume de sedimentos removidos do reservatório foi de **505.837 m³**.
  - Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados **19.600 m³** de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML.

Fatos relevantes do mês

✓ Remoção de sedimentos – proximidades do barramento principal da UHE (na região dos 400M)

A remoção dos sedimentos nas proximidades do barramento principal, visando a retomada da UHE Risoleta Neves, foi encerrada no início de dez/22, seguida do reenchimento do reservatório, conforme anuência SUPPRI/SEMAD de 25/nov/22 (atestando cumprimento da Cond. 54) e decisão judicial proferida em 05/dez/22 no âmbito do processo 1000406-84.2020.4.01.3800 – Eixo Prioritário nº 5 (autorizando reenchimento).

✓ Disposição de Sedimentos Provenientes do Reservatório da UHE (área dos 400m)

- Áreas de desaguamento Primário e Definitivo



Figura 01 – Foto aérea das áreas de desaguamento primário e secundário do setor 11



Figura 02 – Foto área da ADME 2 e Bacia 4 – Região Pilha 2



Figura 03 – Disposição de Sedimentos Berma de Equilíbrio – Concluído (Vol. 33.647m³)



Figura 04 – Disposição de sedimentos Bacia 2

✓ Recuperação dos pontos de margens

✓ Encerradas as obras mapeadas para a recuperação de pontos de margens considerados danificados pela ação dos sedimentos e por efeitos do clima ao longo do período em que o reservatório esteve vazio, com o seguinte status:

Pontos já executados em recuperação	Obras Entregues	Obras em Andamento	Obras a Iniciar
• 0	• 77	• 0	• 0

Descrição	Total Previsto	Concluído	Saldo
Margem Direita	24	24	0
Margem Esquerda	53	53	0
TOTAL	77	77	0

Tabela 01 - Status 07/12 - Recuperação dos pontos de margens UHERN

- Destaques:



Figura 05 –Foto aérea ponto 36



Figura 06 –Foto aérea ponto 34



Figura 07 –Foto aérea ponto 124



Figura 08 – Foto aérea ponto 116

Plano de Chuvas 2022 / 2023



Figura 09 – Implantação de chincanes (Área de contrapilhamento à montante Dique Principal



Figura 10 – CP 01 Argamassado e Bioengenharia (ADME 1)



Figura 11 – CP / Sump / Bioengenharia



Figura 12 – Sistema de drenagem setor 11 – Vista à montante

➢ UHE Candonga

▪ Reenchimento reservatório – Fechamento das Comportas



Figura 13 – Foto aérea à montante barramento principal



Figura 14 – Foto aérea à jusante barramento principal

▪ Reenchimento reservatório – Fechamento das Comportas

Atividade Jusante	Avanço
Mergulho para Limpeza das ranhuras (Jusante)	100,0%
Dragagem do acesso aos tuneis saída d água (Jusante)	100,0%
Mergulho para Limpeza dos tuneis saída d água (Jusante)	100,0%
Dragagem do canal de fuga (Jusante)	55,1%
Geral	**87,6%**

Atividade Montante	Avanço
Mergulho para limpeza da tomada d'agua (Montante)	100,0%
Retirada das grades da tomada d água (Montante)	0,0%
Geral	85,4%

Tabela 02 – Avanço Atividade à jusante – Status 02/12/22

Status atual:

- Limpeza tomada d´água finalizada;
- Limpeza saída d´água finalizada;
- Limpeza canal de fuga paralisada pelo período de chuvas;
- Retirada das grades agendado para janeiro/2023.



Figura 15 – Fotos da limpeza jusante e montante

- Reabilitação das UG's

UHE CANDONGA	87,831%
Contrato Base	**84,12%**
Mobilização	
Canteiro	100,00%
Engenharia e Suprimentos	100,00%
Materiais de Fornecimento	100,00%
Limpeza do Tubo Sucção - UG01 a UG03	95,00%
BOP - Tubulação sistema do filtro autolimpante	100,00%
TA - Comporta vagão da tomada D`água - UG 01	95,00%
TA - Comporta vagão da tomada D`água - UG 02	90,00%
TA - Comporta vagão da tomada D`água - UG 03	56,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água - UG 01	0,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água - UG 02	0,00%
Grades e Comporta Ensecadeira da Tomada D`água - UG 03	0,00%
UG1- Atividades na Casa de Força	100,00%
UG2- Atividades na Casa de Força	99,00%
UG3- Atividades na Casa de Força	98,00%
Vertedouro	91,00%
Comissionamento sem água	53,00%
Comissionamento com água	0,00%
Comportas ensecadeiras montante - Tomada D`água	0,00%
Comportas ensecadeiras jusante - Tubo de Sucção	0,00%
OS Adicional	**99,95%**

Tabela 03 - Avanço Físico Reabilitação das UG´s – Status 09/12/22

Evento	Data Prevista
Montagem UG 01	(Concluído)
Pendências UG 01	14/01/23
Montagem UG 02	(Concluído)
Pendências UG 02	16/12/22
Montagem UG 03	06/01/23
Pendências UG 03	na
Vertedouro 01	(Concluído)
Vertedouro 02	30/10/23
Vertedouro 03	30/10/23
Término TA 01	05/01/23
Término TA 02	20/12/22
Término TA 03	10/01/23

Tabela 04 – Tendências de término reabilitação das Unidades de Geração

✓ **Status atual:**

- Tomada d´água (Comporta vagão e tala de inox);
- UG1 e UG2 (Pendências de montagem);
- UG2 (Finalização do comissionamento a seco);
- UG3 (Montagem)

➢ MONITORAMENTO DAS ESTRUTURAS

Nota: As informações apresentadas não coincidem necessariamente com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados.

Destaques:

- Foi iniciado o fechamento parcial das comportas para reenchimento do reservatório da UHE Risoleta Neves no dia 10 de dezembro de 2022.

- A atividade de recomposição das cotas à jusante do colchão reno na margem direita do Barramento B foi encerrada devido ao avanço das atividades do plano de reenchimento do lago. Importante destacar que, para o cenário de reservatório cheio, o barramento estará completamente submerso, com as pressões hidráulicas equilibradas entre montante e jusante e, portanto, a condição de carregamento será mais favorável. Além disso, não foi observado nenhum indício de instabilidade na estrutura nos monitoramentos e inspeções visuais até o início do reenchimento.

- Os sensores SAT dos Barramentos permaneceram em níveis normais de operação. Espera-se que, com a subida do nível d'água do reservatório, a instrumentação seja descomissionada devido à perca de sinal para envio dos dados.

- Os marcos superficiais do Barramento C foram retirados devido ao Plano de Enchimento do lago. Não houve variação em suas últimas leituras.

- Foi recomendado pela projetista dos barramentos que o monitoramento das estruturas quando submersas seja realizado através de levantamentos topobatrimétricos em um período inicial para calibração e, após esse período, serão definidas as premissas para monitoramento.

- O monitoramento dos níveis d’água e piezômetros segue apresentando redução dos níveis.

- Um marco da ADME OD permanece com tendência de recalque. Não houve variação na reabertura das trincas monitoradas no período.

- As trincas da ombreira direita do contrapilhamento foram seladas. Não houve variação significativa no monitoramento que possa caracterizar uma instabilização no talude no período.

- O monitoramento dos marcos da Bacia 8 permanece sem deslocamentos significativos após o fechamento da estrutura.

- O monitoramento dos medidores de nível d’água instalados no entorno da Bacia 4 não apresentou variação significativa.

- O monitoramento dos marcos superficiais da Bacia 2 não apresenta tendências de deslocamento. Os piezômetros permaneceram dentro dos níveis normais de operação.

- O monitoramento da tenda da Samarco permaneceu sem deslocamentos significativos. Foi selada a fissura no concreto do passeio lateral à tenda reportada pela auditora. A Casa do Colono permanece interditada.

- O monitoramento da Pedreira Corsini permaneceu estabilizado para os marcos e instrumentos medidores de nível d’água.

- Os instrumentos instalados no talude de Santana do Deserto não apresentaram variação significativa no período.

➢ Recomendações

- Acompanhar o comportamento dos Barramentos Metálicos durante o enchimento, com inspeções visuais e monitoramentos.
- Finalizar as campanhas de investigação geológico-geotécnicas da ADME OD e do talude da OD do contrapilhamento, que irão subsidiar as análises de estabilidade.
- Dar continuidade e acompanhamento do programa de inspeções, monitoramentos e manutenções preventivas e corretivas das estruturas.

➢ MONITORAMENTO AMBIENTAL

Nota: Informações de monitoramento e fotos apresentadas referem-se ao período da campanha, o qual não coincide com o mês de referência do reporte em função dos prazos necessários ao tratamento dos dados. As imagens visam representar os locais quando da realização das amostragens.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 2

- Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 2.

✓ Monitoramento de Efluentes – Bacia 1

- Entrada: Ponto seco, haja vista que não havia efluente chegando à bacia 1
- Saída: Bombeamento em 01/11. Sem desvios.

✓ Monitoramento Hídrico Superficial (Qualidade da água superficial)

Conforme relatado no relatório anterior:

Conclusões / considerações:

- O ponto de monitoramento Córrego Micaela Montante, proposto nos planos de monitoramento dos estudos de licenciamento localiza-se dentro da Área Diretamente Afetada (ADA). Por conceito esse ponto poderá sofrer impactos provenientes do empreendimento e a qualidade deve ser garantida à jusante da ADA (que se finda no Dique Micaela).

- Especificamente no que tange aos parâmetros Ferro, Manganês e Alumínio, Candonga está localizada a menos de 5 km do cinturão do grupo Dom Silvério, composto por rochas ultramáficas, o que reforça fortemente o indicativo de que os índices encontrados no monitoramento refletem o background da região.

- Os estudos de valores de referência concluirão sobre essas hipóteses.

- Síntese conclusiva – Córrego Micaela:
  - Desvios de Manganês e turbidez nos pontos de montante e jusante. O manganês se configura como Background da região e a tubidez foi devido ao alto índice pluviométrico do período.

- Síntese conclusiva – Córrego dos Borges:
  - Desvios de Manganês nos pontos de montante e jusante. Como houve desvio no ponto de montante onde não há influência do empreendimento conclui-se por não guardar nexo causal com o empreendimento.

- Síntese conclusiva – Rio de Peixe:
  - Desvios de Fósforo (Montante) e Manganês (montante e jusante). Como não há drenagens do empreendimento direcionadas para o rio de Peixe e portanto os desvios não guardam nexo causal com o empreendimento.

- Síntese conclusiva – Ponto de Monitoramento Fazenda Jerônimo:
  - Desvio de alumínio dissolvido. Este monitoramento é feito em área brejosa estagnada. Foi proposto na atualização do PCA a retirada deste da relação de pontos de monitoramento devido à interferência de áreas de terceiros entre a disposição passada e a área brejosa supracitada.

✓ Monitoramento Atmosférico

- Sem registros. Caso venham a ocorrer eventos que ultrapassem o limite permitido, será realizada análise de causa do incidente. Nestes casos, a Samarco irá comunicar a investigação do incidente via ofício à SUPRAM à FEAM/GESAR e também acusará o evento no relatório CIF.

✓ Monitoramento Subterrâneo



Figura 16 - Locação Nascente 2



Figura 17 – Nascente 2

✓ Conclusões / considerações finais

- A Nascente 2 apresentou desvios de Alumínio, Ferro e Manganês no período no monitoramento.

Nota: Os estudos em desenvolvimento avaliarão os valores de referência para se confirmar ou refutar a hipótese de background.

✓ Monitoramento futuro: Instalação dos Poços de Monitoramento

- Foram perfurados os 4 poços de monitoramento na Fazenda Fervedouro. (FER-PM-PROP-01, FER-PM-PROP-02, FER-PM-PROP-03 e FER-PM-PROP-04). As atividades de desenvolvimento desses poços está programada para fev/2023. Está em andamento as atividades de perfuração e instalação dos poços na Fazenda Floresta.

✓ Monitoramento de Ruídos e Vibração

- Não foram identificados registros de ocorrências de desvios dos níveis de ruído e vibração nas comunidades monitoradas (rurais: Viana, Gerônimo, Florestinha, Pedra do Escalvado, Marimbondo, Funil, Buraco, área rural de Rio Doce e área rural de Santa Cruz do Escalvado. Predominantemente residenciais: Santana do Deserto, Tapera, Sede Rio Doce, Pontal, Novo Soberbo e Porto Plácido).

INDICADORES

Os indicadores do PG009 que foram implementados e estão em medição, encontram-se apresentados nos gráficos a seguir:

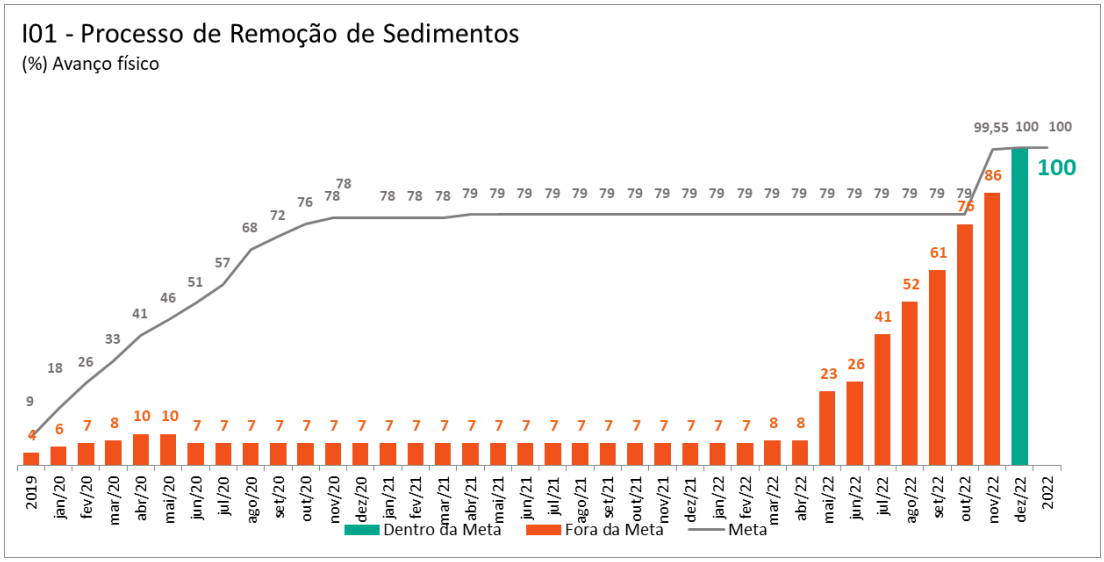


Gráfico 1 - Avanço físico do processo de remoção de sedimentos. Gráfico Acumulado.

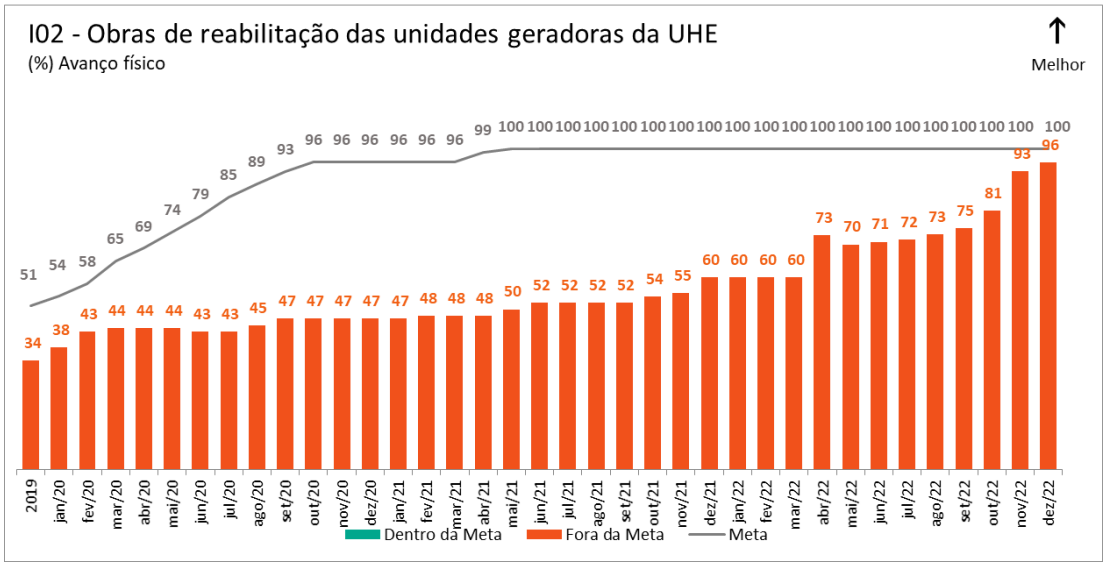


Gráfico 2 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE. Gráfico Acumulado.

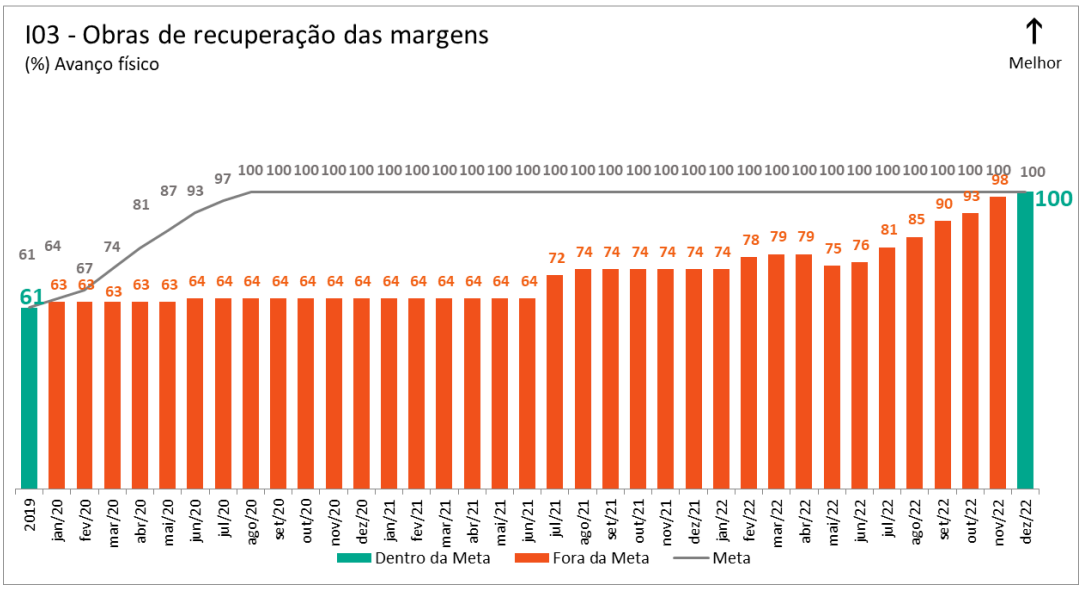


Gráfico 3 - Avanço físico as obras de recuperação das margens. Gráfico Acumulado.

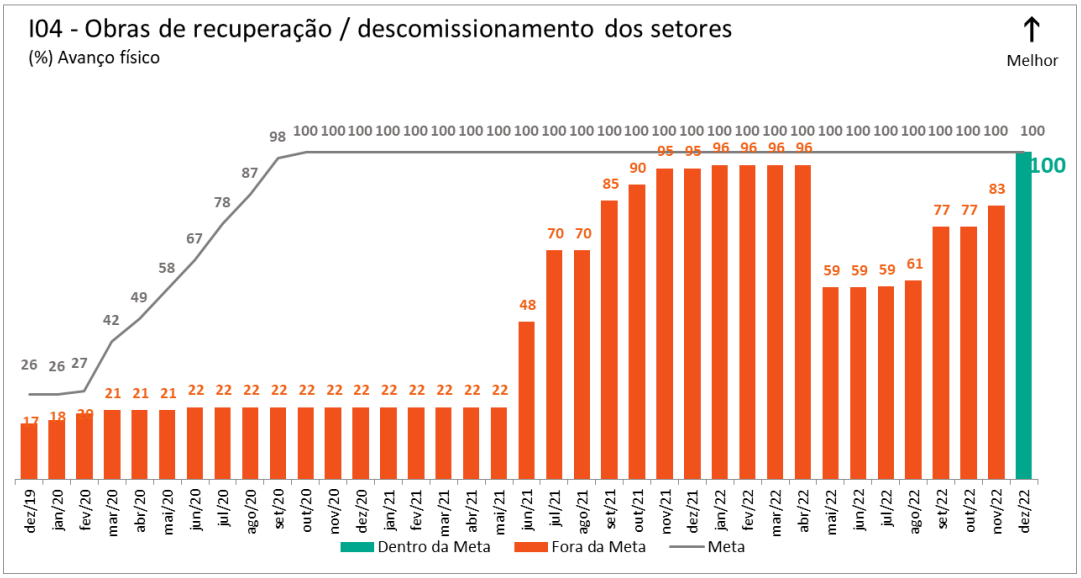


Gráfico 4 - Avanço físico obras de descaracterização/descomissionamento dos setores

Nota:: A partir do mês de maio/22, os indicadores apresentados são compatíveis com o Cronograma-Cenário de Retomada da UHE, no qual estão contempladas todas as atividades necessárias para que sejam atingidas as condições operacionais da UHE, tendo em vista que a LOC 1496/2020 autoriza prioritariamente todas as atividades previstas para retomada da usina.

PG010 Programa de recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre Fundão e Candonga

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas, recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. Cláusulas: 82 a 88.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022



Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.799 **obras concluídas** (projetos e processos), sendo que, desse total, pode-se citar alguns exemplos:

- 996 obras correspondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos que totalizam: 2.056 Km de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 213 km de cercamentos de propriedades rurais executados;
- 109 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 16 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 28 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

Barra Longa:

- 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 9 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 27 obras correspondem a comércios reformados;
- 189 obras correspondem a quintais e lotes reformados.

Mariana:

- 4 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas;
- 7 obras correspondem a casas reconstruídas;
- 1 obras correspondem a comércios reformados;
- 0 obras correspondem a quintais e lotes reformados;

<u>Termos de entrega para Moradias e Comércio</u>:

Moradias Barra Longa:

- Concluído com termo: 83
- Concluído sem termo: 6
- Paralisado: 3
- Pendente: 147
- Total: 239

Comércio Barra Longa:

- Concluído com termo: 17
- Concluído sem termo: 5
- Paralisado: 1
- Pendente: 4
- Total: 27

Fatos relevantes do Ano

01/2022	Alto índice de chuva na primeira quinzena de Jan/22 que impactou nas atividades em andamento no município de Barra Longa.
01/2022	Bens Públicos do Ponte do Gama encontra-se em fase de negociação comercial.
01/2022	Conclusão da montagem das placas (escamas) da contenção do muro em terra armado do acesso ao Parque de Exposição em Barra Longa.
01/2022	Em fase de negociação fundiária/Retirada formal de partilha - Campo de Futebol de Pedras
01/2022	O contrato RBAR foi acionado e mobilizado para finalizar 05 estruturas. A mobilização iniciou em 17/01/2022.
01/2022	Processo de contratação para execução de estruturas rurais complexas em fase de conclusão comercial PCT 1.
01/2022	Processo de contratação para execução de estruturas rurais complexas em fase de conclusão comercial PCT 2.
01/2022	Proteção de taludes estrutura rurais complexas - em fase de revisão de proposta técnica
02/2022	Bens Públicos Ponte do Gama - Em fase de validação de APRO
02/2022	Conclusão do aterro do acesso ao Parque de Exposição em Barra Longa.
02/2022	Contrato RBAR acionado e mobilizado para finalizar 05 estruturas. Mobilização Iniciada em 17/01/2022
02/2022	Formal de Partilha retirado em 23/02/22 - Em análise pela equipe do Fundiário a negociação para compra e venda do terreno.
02/2022	Paralisação das atividades em Barra Longa conforme ofício da Prefeitura entre os dias 03/02 a 14/02/22
02/2022	Processo de contratação para estruturas rurais complexas em fase de conclusão comercial PCT 2
02/2022	Processo de contratação para estutruras rurais complexas concluso - Em fase de validação de APRO - PCT 1
02/2022	Proteção de taludes estrutura rurais complexas - em fase de análise comercial

Fatos relevantes do Ano

03/2022	Conclusão da base e sub base da pavimentação do Acesso ao Parque de Exposição de Barra Longa;
03/2022	Conclusão das instalações dos tanques na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Parque de Exposição de Barra Longa;
03/2022	Conclusão de 5 estruturas rurais complexas pelo contrato RBAR acionado em 17/01/22. 3 estruturas concluídas em Março. *Estrutura D63 civil concluída, pendente de instalação de bebedouro.
03/2022	Realização de reunião de kick-off no dia 29/03/2022 com a contratada responsável pela execução das reconstruções das pontes em Mariana e Barra Longa;
03/2022	Solicitação de OS para instalação de bomba hidráulica na propriedade D014 – Estruturas Rurais Complexas;
05/2022	Bens Públicos Ponte do Gama - início da supressão vegetal;
05/2022	Início das obras nas pontes Tiara e Curvinas;
05/2022	Manutenção em 46,50 Km de vias não pavimentadas;
05/2022	Talude das Complexas - conclusão da D035
05/2022	Talude das Complexas - Início das atividades em campo;
06/2022	Conclusão do processo de contratação do novo contrato de Obras Civis (Kick Off realizado em 20/06/22) para continuidades dos atendimentos às edificações;
06/2022	Início das obras na passarela Campinas no município de Mariana;
06/2022	Talude das Estruturas Rurais Complexas - Conclusão de 01 propriedade no total de 04 - PG-10;
07/2022	- Proteção de Talude, Estruturas complexas - Conclusão das atividades propriedade D031;
07/2022	Proteção de Talude, Estruturas complexas - Conclusão das atividades propriedade D010;
08/2022	Bens Públicos Ponte do Gama - Conclusão do tratamento de faixas do campo
08/2022	Conclusão das obras do Bueiro Curvinas e Bueno em Barra Longa.
08/2022	Conclusão de 01 propriedade (D016) no projeto de proteção de taludes das estruturas complexas;
08/2022	Interdição das obras da ponte e passarela de Santa Rita pela arqueologia em 15/08/2022;
09/2022	- Proteção de Taludes, conclusão da bioengenharia em todas as propriedades.

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Campo de Pedras - Realizado pagamento do formal de partilha do requerimento de Retificação de área Rural no dia 31/10 para prosseguimento na aquisição do terreno.

10/2022 Retomada das atividades na ponte Santa Rita em 18/10/22 após liberação do IPHAN.

11/2022 Barra Longa

- Assinatura do termo de recebimento do Parque de Exposição;
- Evento de entrega do Parque de Exposição para a comunidade, realizado em 12/11/22;
- Conclusão das pontes Campinas, Juca Ponciano, Tiara e Borba;
- Assinatura do termo de recebimento das pontes Bueno, Curvinas, Campinas e Juca Ponciano;
- Abertura da SR 547746043 para processo de contratação do serviço de: Construção do Aterro de rejeitos João Tavares.

12/2022 Barra Longa:

-Instalação das longarinas e das pré lajes, armação e concretagem da laje da Ponte Bento Rodrigues.

12/2022 Mariana:

- Bens Públicos Ponte do Gama - Finalização da base de concreto do SAA da Ponte do Gama;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Instalação de cerca na delimitação do terreno;
- Bens Públicos Ponte do Gama - Finalização da estrutura metálica principal da quadra;
- Campo de Pedras - Pagamento da 1ª parcela referente a compra do terreno.

Indicadores

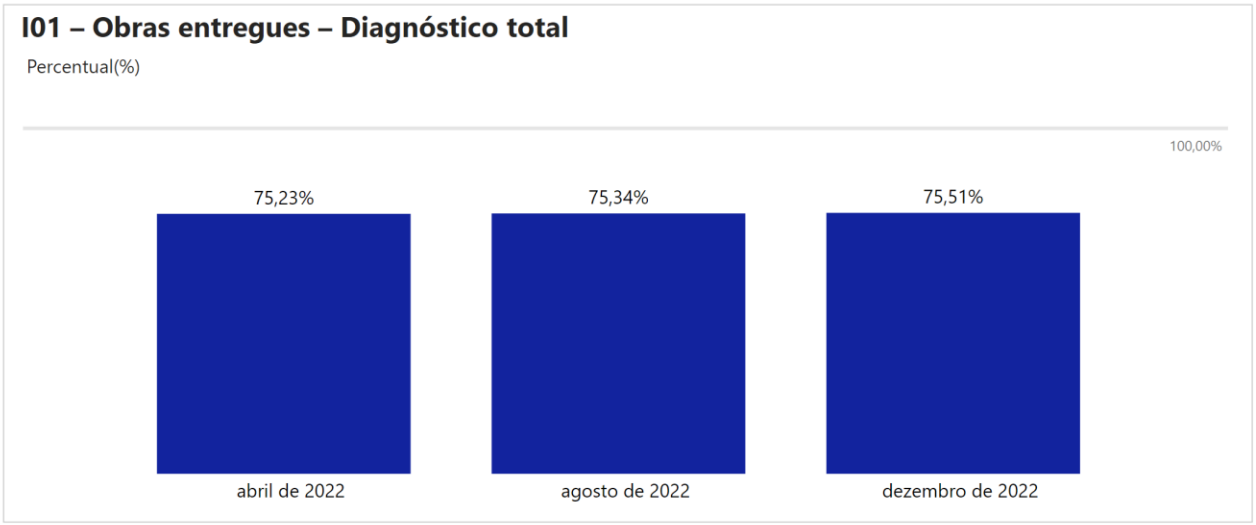


Gráfico 1: I01 – Obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

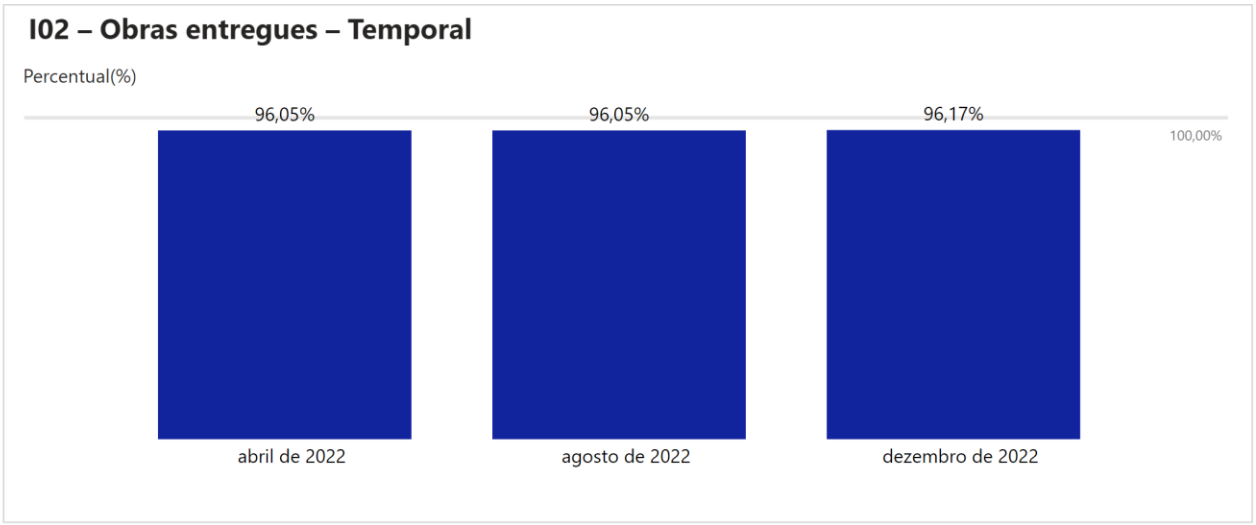


Gráfico 2: I02 – Obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

Indicadores

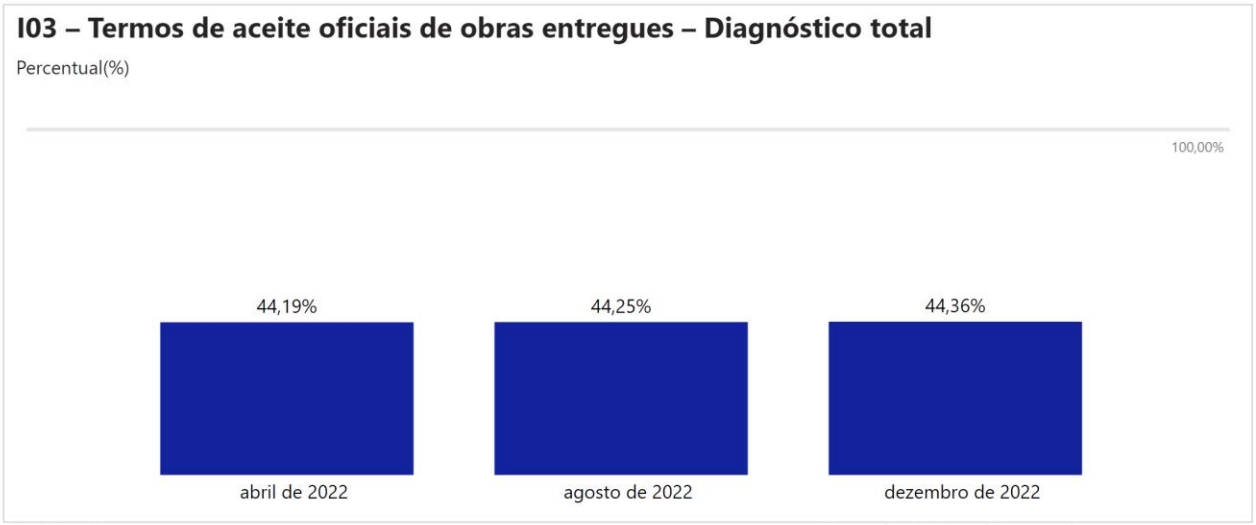


Gráfico 3: I03 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Diagnóstico total - Frequência Quadrimestral

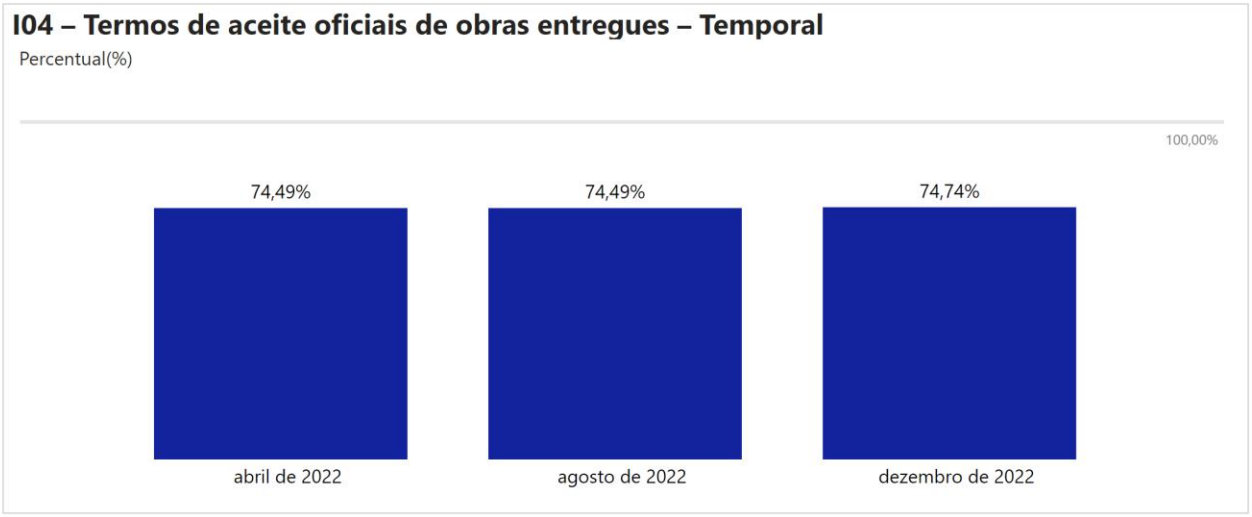


Gráfico 4: I04 – Termos de aceite oficiais de obras entregues – Temporal - Frequência Quadrimestral

PG011 Recuperação das escolas impactadas e reintegração da comunidade escolar

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	587	2	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

abril de 2022	Finalização dos PPPs nas 30 escolas da rede municipal de Mariana
outubro de 2022	Aceite da equipagem da Escola Definitiva de Bento Rodrigues no Reassentamento Coletivo
novembro de 2022	Conclusão da formação de pedagogos da rede municipal de Mariana
novembro de 2022	Finalização do projeto de apoio pedagógico para rede pública municipal de Mariana
dezembro de 2022	Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Barra Longa
dezembro de 2022	Conclusão do ciclo 2 do projeto psicopedagógico institucional de Mariana
dezembro de 2022	Cumprimento do calendário annual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa (2022)
dezembro de 2022	Cumprimento do calendário anual de eventos do projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2022)

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Finalização do ano letivo de 2022 nas escolas temporárias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, mantidas pela Fundação Renova até a entrega dos equipamentos definitivos nos respectivos reassentamentos. Além de assegurar estrutura e transporte adequados para a comunidade escolar impactada, o PG11 também realiza eventos e ações de socialização e apoio psicopedagógico que contribuem para a manutenção dos vínculos da comunidade escolar impactada.

Indicadores



Gráfico 1: I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.



Gráfico 2: I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

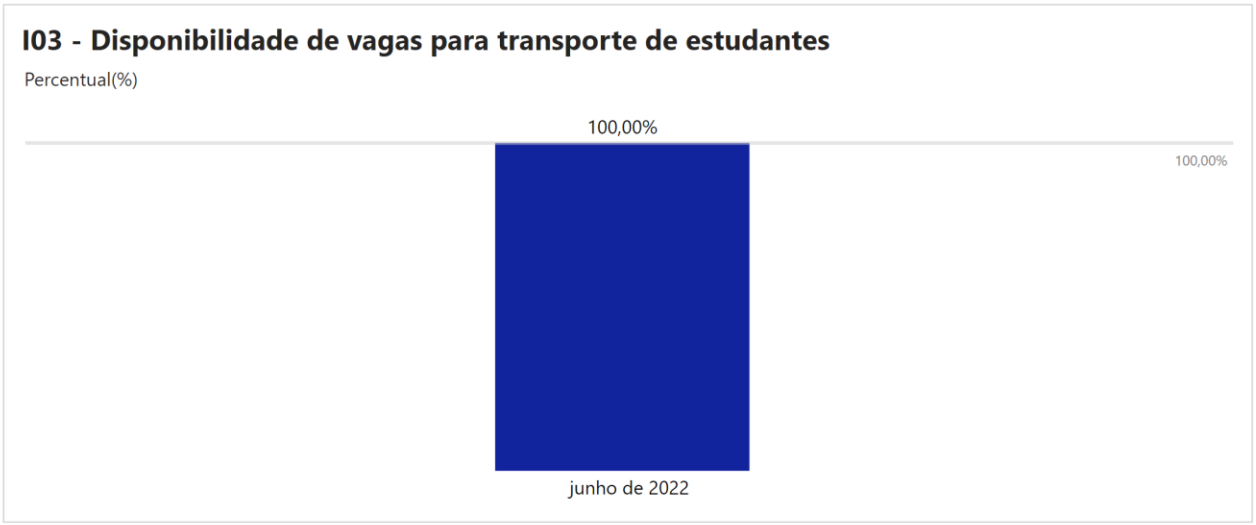


Gráfico 3: I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - Frequência Anual

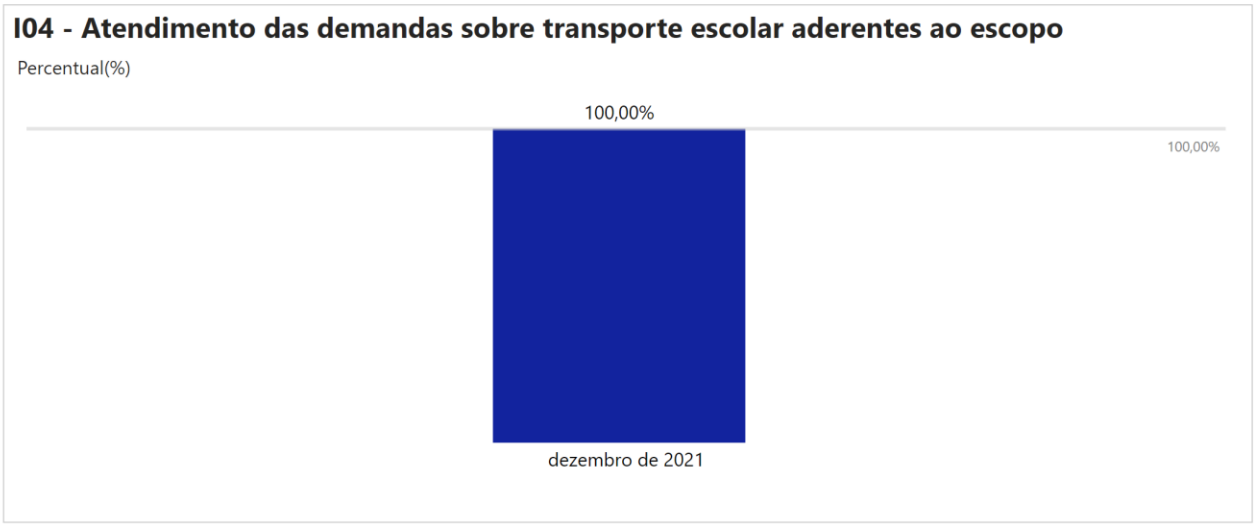


Gráfico 4: I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

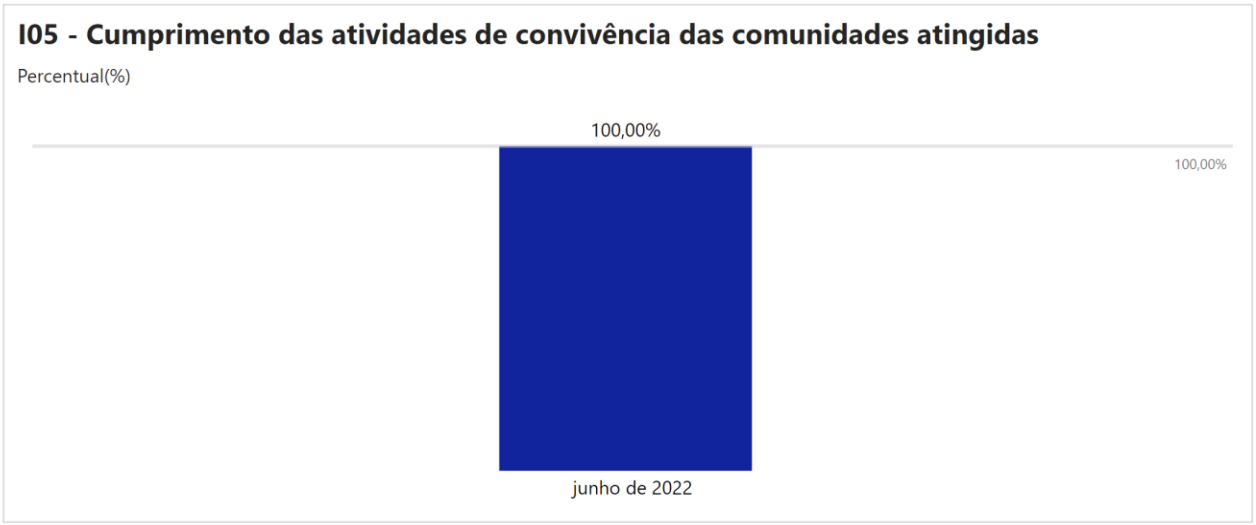


Gráfico 5: I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas - Frequência Semestral

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

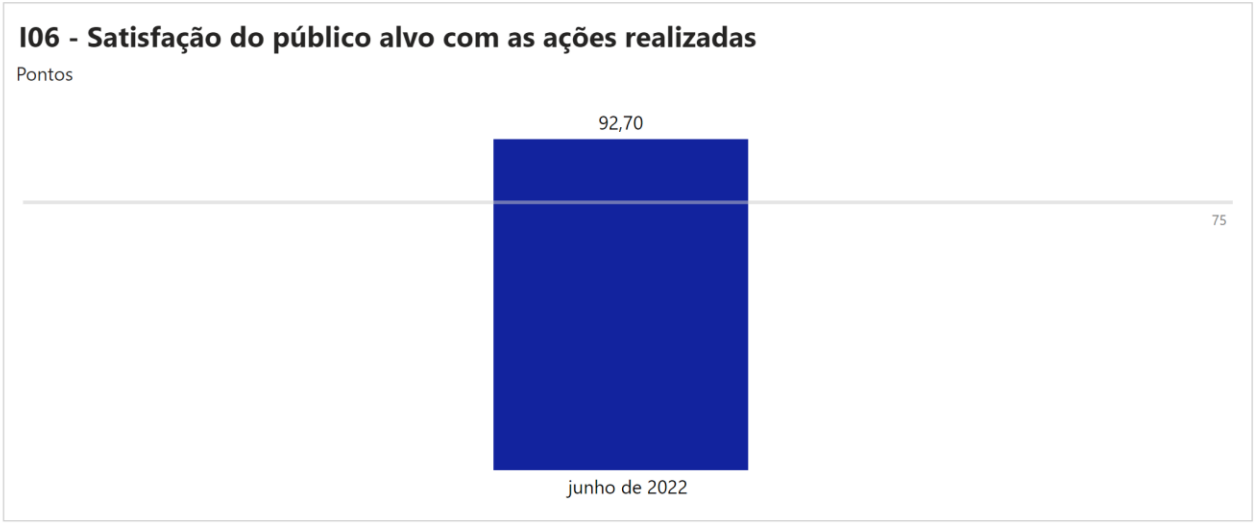


Gráfico 6: I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores



Gráfico 7: I07 - Atendimento ao público alvo - Frequência Semestral

A CTECLET enviará nota técnica ao CIF solicitando a retirada do I07 da lista de indicadores de monitoramento do PG11, conforme ofício FR.2023. 0047.

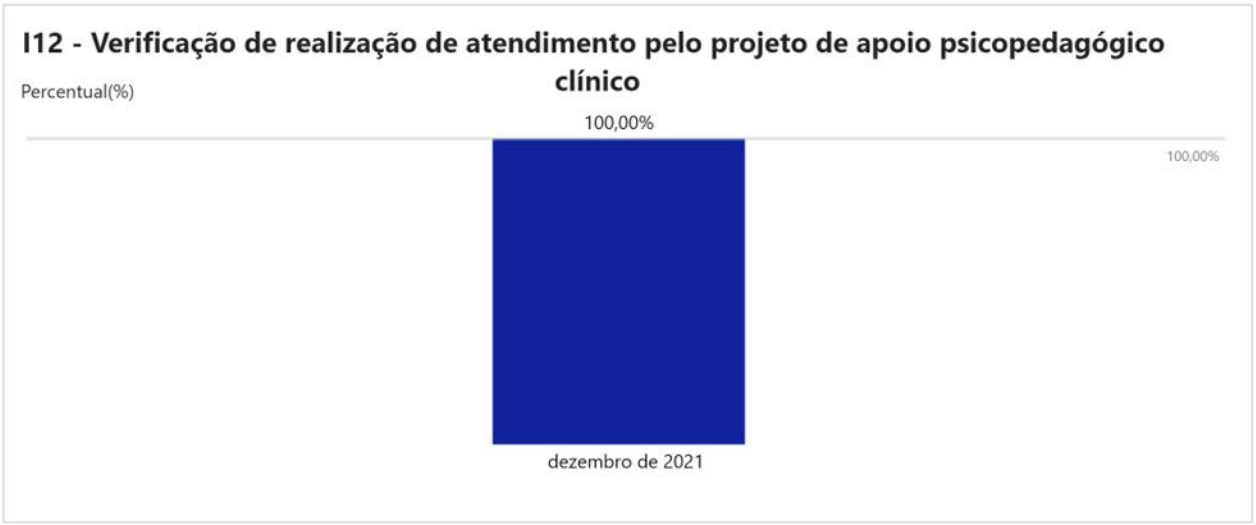


Gráfico 8: I12 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

Indicadores

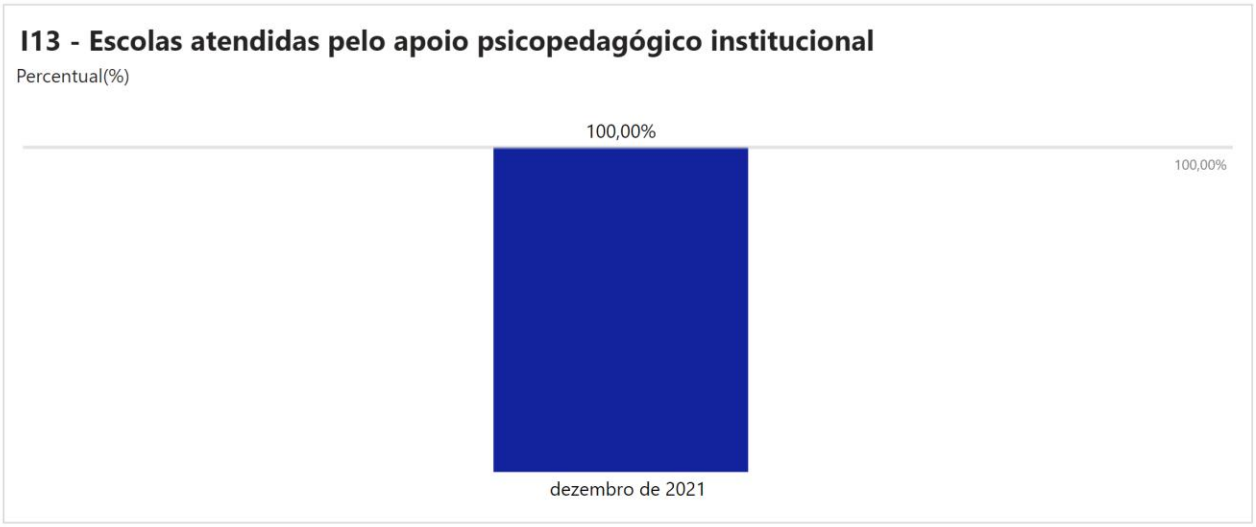


Gráfico 9: I13 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - Frequência Anual

A medição do indicador segue o calendário escolar, os dados serão consolidados em janeiro no retorno do recesso.

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Garantir, em parceria com a comunidade e poder público, a reparação, restauração, preservação, fortalecimento e restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, realização e reprodução autônoma, e criando espaços de sociabilidade, convivência e fortalecimento de vínculos comunitários.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

setembro de 2022	Segunda etapa de publicações dentro do Projeto de Educação Patrimonial
outubro de 2022	Segunda etapa de oficinas sobre Educação Patrimonial dentro do eixo 4 do plano de reparação da parceria com a UNESCO
dezembro de 2022	Validação do plano de destinação dos bens restaurados da Reserva Técnica
dezembro de 2022	Primeira etapa de atividades dos Eixos 1, 2, 5 e 6 do plano de reparação das manifestações culturais da Parceria com a UNESCO, para o resgate, transmissão geracional e a promoção das atividades culturais das comunidades[1]
dezembro de 2022	Conclusão do calendário 2022 das ações na Casa dos Saberes e Horta Comunitária 2022
dezembro de 2022	Primeira etapa de atividades dentro do Eixo 7, esporte e Lazer da Parceria com a Unesco, para promover o reestabelecimento de condições de sociabilidade para as populações atingidas

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

03/2022 Lançamento do Edital Doce com linha reparatória das Referências Culturais (com avanço no cumprimento da cláusula 99 do TTAC): previsão de investimento de 23 milhões de reais e apoio a cerca de 300 projetos. Pelo PG12, previsão de investimento de 2 milhões de reais e apoio a aproximadamente 20 projetos.

12/2022 Finalização da 1ª etapa do Plano de Reparação das Referências Culturais – Ano 2022. As atividades aconteceram por meio do planejamento realizado em cooperação entre a Fundação Renova, UNESCO, órgãos públicos e diversos fornecedores. Foram realizadas diversas ações do plano de reparação contidos em 8 eixos distintos. Podemos destacar:
-Projeto Abrindo Espaços - busca potencializar o espaço escolar para as comunidades, ampliando as alternativas culturais e a qualidade de vida local, com a realização de oficinas nas diversas linguagens culturais e artísticas, de esporte e lazer, educação patrimonial e agroecologia, presentes no plano de Reparação das Referências Culturais do Programa 12. Nas escolas estaduais "Claudionor Lopes" e "Pe. José Epifânio", em Rio Doce (E. E. Maria Amélia) e Santa Cruz/Nova Soberbo (E. M. José Gomes de Souza)
-Processo de formação continuada de 12 formadores e cerca de 40 monitores para atuarem como multiplicadores nas áreas de Música, Teatro e Dança, Esporte e Lazer, Artesanato, Educação Patrimonial e Ambiental do Programa Tempo Integral da Rede Pública Municipal de Mariana.
-Realização de percursos de patrimônio para o público escolar de Rio Doce e Barra Longa. Os Percursos do Patrimônio consistem em atividades culturais, educacionais, lúdicas e recreativas, que exploram os sentidos e a percepção da paisagem, e visam despertar um novo olhar sobre o patrimônio cultural das localidades impactadas onde o público-alvo está inserido.
-Produção de documentários sobre as Folias de Reais das comunidades mineiras de Pedras, em Mariana, e Barreto, em Barra Longa. Link para assistir na integra os vídeos: https://www.fundacaorenova.org/noticia/conheca-as-folias-do-menino-jesus-realizadas-em-mariana-e-barra-longa/
-Retomada da realização de diversas referências culturais impactadas pelo rompimento por meio de oficinas de reparo de instrumentos, oficinas de música continuadas, aluguéis de campo de futebol, retomada da tradição da capoeira em Barra Longa, realização de apoio às celebrações religiosas de todas as 20 comunidades impactadas, restituições de instrumentos e fardamentos, realização e entrega de calendário das manifestações, entre outras.
-Realização de Oficinas de Educação Patrimonial em parceria com as prefeituras e conselhos municipais em Santa Cruz do Escalvado, Mariana, Rio Doce e Barra Longa.

12/2022 Finalização do Calendário 2022 da Casa dos Saberes e Horta Comunitária. A programação contou com diversas oficinas para as comunidades deslocadas ao longo do ano para que possam contar com um espaço de sociabilidade para expressarem suas manifestações culturais e de lazer. Foram realizadas oficinas de artesanato, dança, corte e costura, costura criativa, música, desenho, culinária, eventos de confraternização, oficinas de preparação de solo, usos da terra e alimentação saudável.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Formalização de 50% dos projetos do Edital Doce- Modalidade 3.

12/2022 Plano Transição Cultural para o reassentamento de Bento Rodrigues e Paracatu- A programação contou com diversas atividades para as comunidades deslocadas ao longo do ano para que pudessem conhecer e se apropriar dos espaços dos reassentamentos. Aconteceram atividades como: rodas de viola no Centro de Apoio, Feira de mudas, oficinas de artesanato, cinema na escola, Roda de Conversa, Brincadeiras e Cantigas para crianças e Festa de Natal no Reassentamento.

12/2022 Restauro de 95 peças sacras das Igrejas impactadas pelo Rompimento da Barragem (Igreja de São Bento, Igreja de Santo Antônio, Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Gesteira).

Indicadores

Revisão dos indicadores do Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) em processo de aprovação pelo CIF (Deliberação CIF n° 547, de 22 de outubro de 2021.

PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	101	Caput	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

setembro de 2022	Divulgação dos projetos da 2ª edição do Edital Doce
outubro de 2022	Realização do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais
outubro de 2022	Encerramento da 1ª edição do Edital Doce
novembro de 2022	Execução de ações do plano de promoção dos polos turísticos
novembro de 2022	Realização de capacitações para empreendedores da cadeia do turismo em 2022
novembro de 2022	Realização de missão empreendedora para a cadeia de turismo dos polos em 2022
dezembro de 2022	Execução do plano de revitalização das bibliotecas públicas

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Encerramento da primeira edição do Projeto Fortalecimento de Organizações Locais, com a realização do InovaFol: rodadas de negócios entre representantes das 169 organizações sociais participantes do Projeto e quatro grandes empresas apoiadoras (Arcelor Mittal, Itaú Social, Instituto Usiminas e BTG Pactual), visando a sustentabilidade das organizações após o término do Projeto.

03/2022 Lançamento da Segunda edição do Edital Doce com linha reparatória do Lazer e apoio a 50% dos projetos aprovados (com avanço no cumprimento da cláusula 104d do TTAC): previsão de investimento de 9 milhões de reais e apoio a aproximadamente 60 projetos.

05/2022 Finalização do Projeto de Fortalecimento Institucional da Cultura e Esporte – FICE, com o encerramento dos módulos de capacitação dos gestores públicos da temática de Cultura e Esporte, e a elaboração de projetos de captação de recursos para fomento dessas temáticas nos municípios.

08/2022 Eixo de Turismo: Entrega do site e redes sociais do Polo da Foz. A ação faz parte do plano de promoção, foi definida como ação estruturante pelo APL e avança no cumprimento das cláusulas 104A e 104C, e do indicador I06 (Percentual de implementação do plano de promoção do destino).

09/2022 Eixo de Turismo: Realização de missão técnica 2022. A missão foi realizada na cidade de Brotas, no estado de São Paulo, entre os dias 19 e 23 de setembro. Os representantes dos 4 APLs de turismo (16 participantes dos municípios polo: Mariana, Governador Valadares, Marliéria e Linhares/Foz) puderam participar das vivências que envolveram a secretaria de turismo, operadoras de mercado, atrativos e principalmente a associação de turismo local. A ação faz parte do projeto de desenvolvimento do empreendedorismo turístico e avança no cumprimento das cláusulas 104A e 104C, bem como no indicador I05 (Percentual de implementação do plano de empreendedorismo).

Fatos relevantes do Ano

10/2022 A Fundação Renova, através do Programa 13 (Promoção da Qualidade de vida e do Turismo) e realizando ação de caráter compensatório nas regiões atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão em 2015, concluiu em outubro de 2022 o Edital Doce 1ª Edição.

O Edital atingiu o objetivo de fomentar e apoiar iniciativas sociais no Espírito Santo e em Minas Gerais, apoiando projetos nas áreas de cultura, turismo, esporte e lazer. Se inscreveram no pessoas físicas, microempreendedores individuais e coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas com fins lucrativos. Foram apoiados com recursos financeiros próprios, projetos inéditos ou iniciativas já existentes.

As inscrições ocorreram de forma online via plataforma Prosas por meio do preenchimento de formulários específicos e, ao todo, o Edital de Minas Gerais e o Edital do Espírito Santo distribuíram cerca de R$ 10 milhões entre os 202 projetos apoiados.

10/2022 Realização de Capacitações e do Torneio de Pesca Esportiva em Minas Gerais, em parceria com a APARD, em Governados Valadares.
As ações dos Projeto Torneio de Pesca Esportiva ocorreram pré e pós evento central, sendo ele o Torneio de Pesca Esportiva, com cerca de 250 participantes, além de toda movimentação econômica da cadeia turística da região (hotéis, restaurantes etc). Previamente ao evento de premiação, ocorreram as Oficinas e Torneio Infantil, contando com a participação de 100 crianças da rede municipal de ensino. Além disso, o projeto proporcionou a realização da 1ª Capacitação de Condutor de Turismo de Pesca, tendo na primeira turma o quantitativo de 14 participantes, dentre pescadores artesanais e esportivos e pessoas ligadas à cadeia do turismo.
Ocorreram ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro diversas capacitações, contribuindo para a recuperação de imagem, geração de renda e de atividades econômicas alternativas, desenvolvimento local e valorização do patrimônio imaterial.
o Torneio e as capacitações avançam no cumprimento das cláusulas 103h, 104f e 104g do TTAC.

12/2022 Em dezembro de 2022 iniciou-se a entrega dos itens de modernização das bibliotecas em São Domingos do Prata, Minas Gerais. Esta é uma importante etapa do projeto de Incentivo à Leitura, que atende a Cláusula 103E do TTAC que rege sobre a "modernização de bibliotecas municipais e criação de um Comitê Nacional de Incentivo à Leitura, de forma a fomentar ações de promoção da leitura."

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município - Frequência Anual
Indicador finalizado em dezembro de 2021.

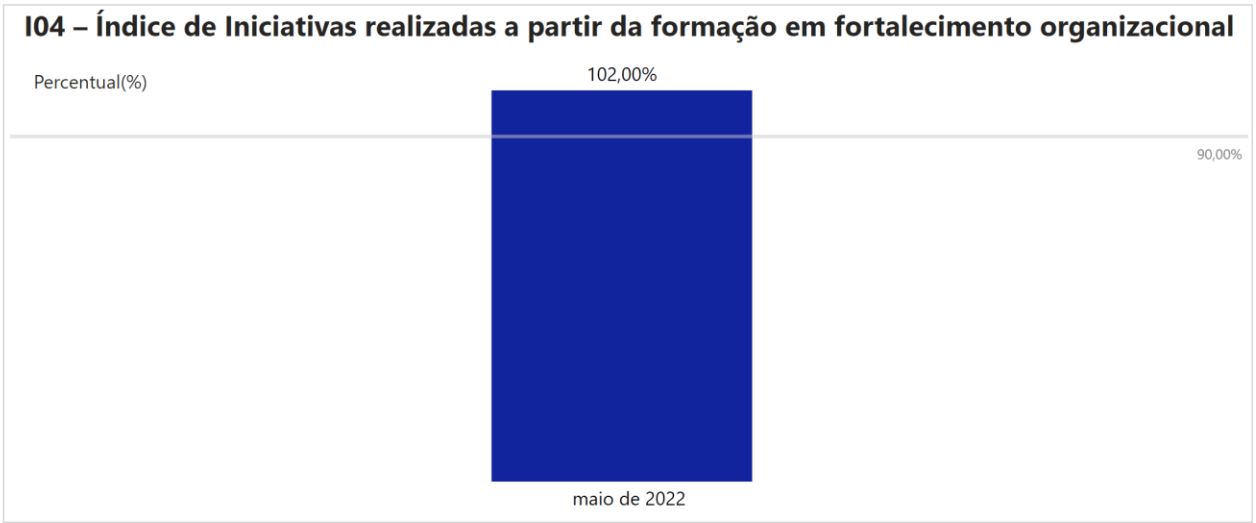


Gráfico 2: I04 – Índice de Iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional - Frequência Anual
Indicador finalizado em maio de 2022.

Indicadores

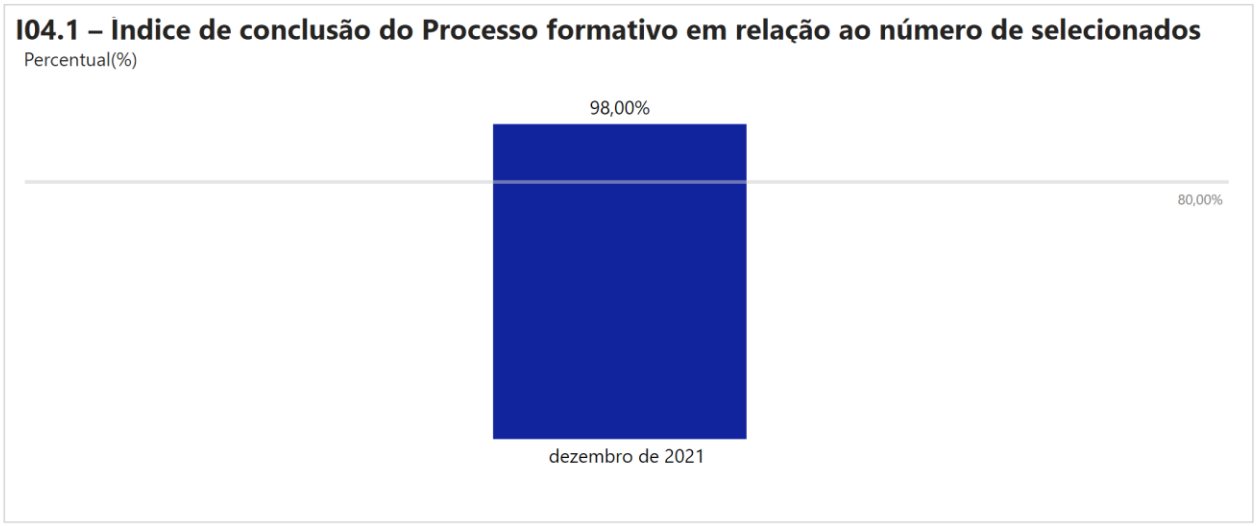


Gráfico 3: I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados - Frequência Anual

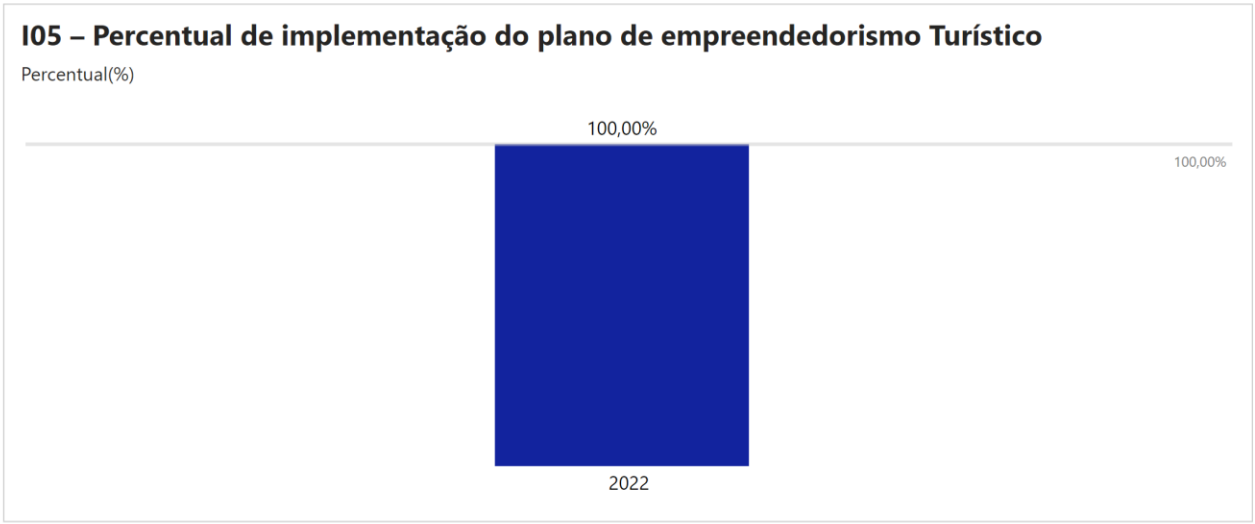


Gráfico 4: I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico - Frequência Anual

As metas de execução são anuais.

Indicadores

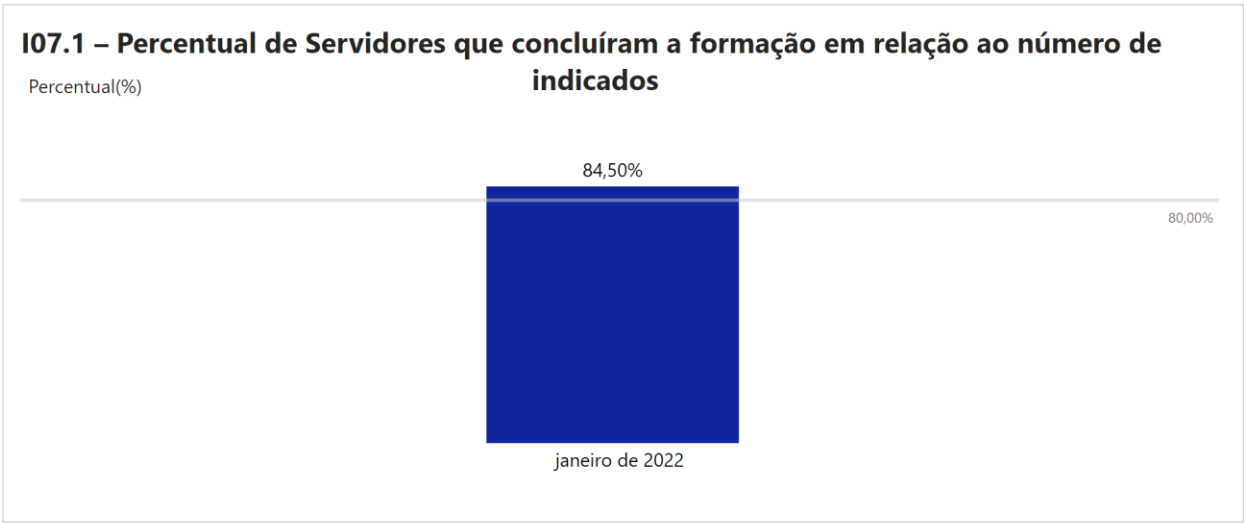


Gráfico 5: I07.1 – Percentual de Servidores que concluíram a formação em relação ao número de indicados - Frequência Anual

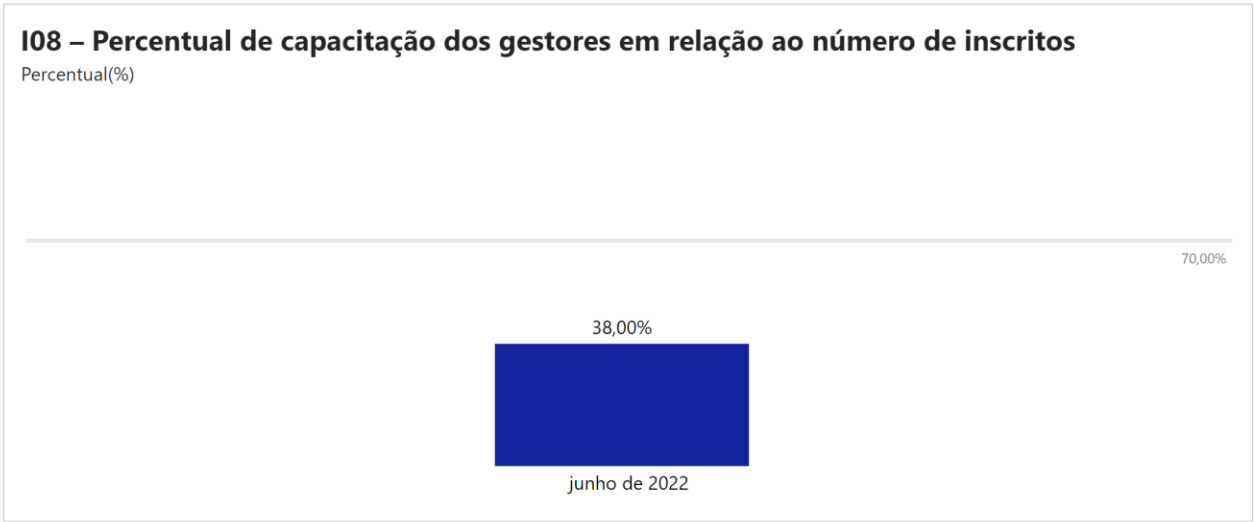


Gráfico 6: I08 – Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Frequência Anual

A ficha de indicadores do PG13 passou por revisão e atualização no indicador I07.1, sendo atualizado o resultado final do indicador e realizado novo report para atualização do mesmo.

PG014 Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Prestar apoio técnico à elaboração e implantação de estudos, dos protocolos de monitoramento da saúde da população exposta aos efeitos do rompimento e elaboração de programa para prestar apoio técnico para o atendimento às prefeituras de municípios atingidos na execução dos planos de ação de saúde ou das ações de saúde já pactuadas em função dos efeitos decorrentes do rompimento – conforme cláusulas 106, 107 e 111 do TTAC.

* A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo ("CIF") nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 ("TTAC") e com deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos seus subprogramas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	611	4	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 5º Repasse financeiro para contratação de RH
junho de 2022	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 6º Repasse financeiro para contratação de RH
julho de 2022	Acompanhamento do plano de Mariana – 3º Repasse financeiro para contratação de RH
setembro de 2022	Implementação e acompanhamento do plano de Barra Longa – 7º Repasse financeiro para contratação de RH e Conclusão dos repasses financeiros de RH para o município de Barra Longa
setembro de 2022	Finalização das Área temáticas de capacitação dos profissionais do SUS
outubro de 2022	Acompanhamento do plano de Mariana – 4º Repasse financeiro para contratação de RH

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa*

. 48 **profissionais** (entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras) atuaram nos municípios de Mariana/MG (34 **profissionais**) e Barra Longa/MG (14 **profissionais**).

* Os números serão melhores detalhados, no tópico seguinte.

Grandes números

Barra Longa

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Barra Longa tem recebido apoio ao SUS para atendimento à população atingida. Por meio de ACP homologada pela 12ª Vara para um período de 24 meses foram disponibilizados recursos financeiros para a contratação de 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros plantonistas, 2 técnicos de enfermagem, 1 médico psiquiatra, 1 psicólogo e, para o Departamento de Vigilância em Saúde, 2 profissionais de nível médio, 2 profissionais de nível técnico e 2 profissionais de nível superior.

A Secretaria de Saúde relatou o importante trabalho desenvolvido pelos profissionais da Vigilância em Saúde na atualização dos sistemas de informação do SUS (agravos de notificação, SIM, plataformas Covid-19, entre outros), monitoramento de dados do Sistema de monitoramento da qualidade da água para consumo humano (SISAGUA), fiscalização e orientação aos comerciantes e população referente medidas sanitárias a serem seguidas para combate ao COVID-19 e inspeção sanitária em estabelecimentos comerciais, dentre outras.

Para o apoio logístico, a Fundação Renova disponibilizou 02 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa, com os respectivos cartões-combustível, que são utilizados para o transporte de pacientes, atendimento à Estratégia da Saúde da Família, atendimento à equipe de Vigilância em Saúde para execuções de ações de prevenção, promoção e recuperação à saúde, entre outros.

A Fundação Renova também apoiou o município com o valor de R$ 175.000,00 (dois repasses anuais em 2020 e 2021) para complementação de exames e consultas especializadas, aquisição de material médico, insumos e medicamentos. Além disso, foram adquiridos 04 notebooks e 04 desktops e entregou Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes para o Departamento de Vigilância em Saúde.

O município de Barra Longa solicitou dilação de prazo da ACP com apresentação de plano de trabalho. O processo se encontra em análise pelo Jurídico da Fundação Renova.

Grandes números

Mariana

Desde o rompimento da Barragem de Fundão, o município de Mariana tem recebido apoio para atendimento à população atingida. A partir da primeira quinzena de janeiro/22, todos os profissionais atuantes pela empresa Contexto foram substituídos por profissionais contratados diretamente pela Prefeitura, com financiamento da Fundação Renova, conforme preconizado no Acordo Judicial homologado pela 2ª Vara Cível. Ao todo, como previsto no Plano de Trabalho, são 34 profissionais de saúde que atuam nos seguintes equipamentos municipais de saúde:

• Espaço Conviver, que presta serviços à população atingida na área de Saúde Mental, oferecendo atendimentos psicológicos e psiquiátricos especializados e acompanhamento psicossocial. O aluguel deste espaço é financiado pela Fundação Renova, que também financiou a compra de móveis e equipamentos para seu funcionamento adequado.

• CAPS e CAPSAD, nos quais os atendimentos são realizados por equipe multiprofissional que atua de forma interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas em sofrimento mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial.

• UBS de Bento Rodrigues e Paracatu, onde são oferecidos atendimentos com Nutricionista, Fisioterapeuta, Odontóloga, Médico ESF, Médico Psiquiatra, Enfermeiro e Psicóloga. O objetivo desta Unidade de Saúde é atender até 80% dos problemas de saúde da população atingida, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais. Nesta UBS, assim como em outras UBS do Município, as famílias atingidas podem ter acesso a ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, fazer curativos, inalações, tomar vacinas, coletar amostras para exames laboratoriais, ter tratamento odontológico, receber medicação básica e ser encaminhado para atendimentos com especialistas.

A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida, visando a reforçar o trabalho nas áreas de atenção primária, atenção especializada, saúde mental, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, entre outros.

Fatos relevantes do Ano

03/2022 5º Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 298.891,72 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.

03/2022 Conclusão da sexta oficina de capacitação dos profissionais do SUS dos municípios da Calha com exceção de Mariana (capacitação exclusiva) - Princípios e Conceitos da Toxicologia de Metais Pesados.

04/2022 Conclusão da sétima oficina de capacitação dos profissionais do SUS dos municípios da Calha com exceção de Mariana (capacitação exclusiva) - Princípios e Conceitos da Avaliação de Risco à Saúde Humana.

05/2022 Apresentação à Sala de Situação/Fundação Renova de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

05/2022 Finalização da capacitação "Levantamento do Histórico Completo de Exposição por Metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

06/2022 6º Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 398.762,07 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.

06/2022 Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

06/2022 Finalização da capacitação "Sinais e Sintomas Relacionados à Intoxicação por Metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

06/2022 Finalização da capacitação "Técnica em realização de exames para metal pesado" para o município de Mariana/MG.

07/2022 Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

07/2022 Depósito judicial para suplementação de RH em Mariana - 3º depósito.

07/2022 Finalização da capacitação "Exame Físico para Identificação dos Sinais e Sintomas Relacionados à Exposição a Metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

08/2022 Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

08/2022 Finalização da capacitação "Direcionamento e Interpretação de Testes de Laboratório para avaliação de intoxicação por metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

Fatos relevantes do Ano

09/2022 7º Repasse de recursos financeiros no valor de R$ 348.263,79 para contratação de recursos humanos na área de saúde em Barra Longa, em cumprimento à ACP.

09/2022 Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

09/2022 Finalização da capacitação "Diagnóstico, direcionamento e acompanhamento de intoxicação por metais" para os municípios da Calha do Rio Doce, com exceção de Mariana.

10/2022 Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

10/2022 Depósito judicial para suplementação de RH em Mariana - 4º depósito.

11/2022 Apresentação de 04 relatórios semanais sobre a Planilha COVID, Boletim Vacinal e Planilha de Óbitos e Novos casos dos municípios atingidos.

11/2022 Finalização da capacitação "Capacitação de Médicos e Enfermeiros para identificação diagnóstica, monitoramento e acompanhamento de pacientes com exposição a metal pesado" para o município de Mariana/MG.

Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão

PG015 Promoção da Inovação

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas impactadas pelo rompimento, por meio da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, fortalecimento de capital humano e internalização das tecnologias geradas para o processo de reparação, de acordo com as cláusulas 113 a 115 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das pesquisas mineiras da Chamada 09/2018
junho de 2022	Finalização do Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs
dezembro de 2022	Finalização do Empreendedorismo Universitário Campus Tech - Mariana
dezembro de 2022	Finalização do Projeto Rio Doce Digital - Mariana
dezembro de 2022	Finalização do Projeto de Capacitação de Gestores Públicos para Inovação

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Realização do Seminário de apresentação dos resultados parciais das 12 pesquisas mineiras da Chamada 09/2018 nos dias 09 e 10/02

04/2022 Realização de Demoday do Programa Mariana Labs (Hub de Inovação, Rodada I), no dia 28/04/22, com a apresentação do desenvolvimento e evolução dos negócios selecionados e participantes do projeto

06/2022 Finalização do processo de seleção de participantes e realização do evento de abertura do projeto Campus Tech em Mariana com seleção de 20 estudantes de ensino superior residentes em Mariana e Região.

06/2022 Finalização do processo de seleção de participantes e realização do evento de abertura do projeto Rio Doce Digital em Mariana com Seleção 30 Jovens, de 18 a 29 anos, e 15 empreendedores locais.

08/2022 Realização em 24/08/2022 de evento para início da Rodada Complementar do Hub de Aceleração Mariana Labs, voltado para os desafios e demandas da cidade de Mariana

10/2022 Início da execução do Projeto TRL - Serviço Especializado para criação de Escala de Nível de Maturidade

11/2022 Início das atividades de mobilização para execução das rodadas Médio e Foz do Hub de Inovação, voltado para a aceleração e desenvolvimento de negócios.

12/2022 Finalização do Projeto Campus Tech em Mariana

12/2022 Finalização do Projeto Capacitação de Gestores Públicos em Mariana

12/2022 Finalização do Projeto Rio Doce Digital em Mariana

Indicadores



Gráfico 1:I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa - Frequência Anual

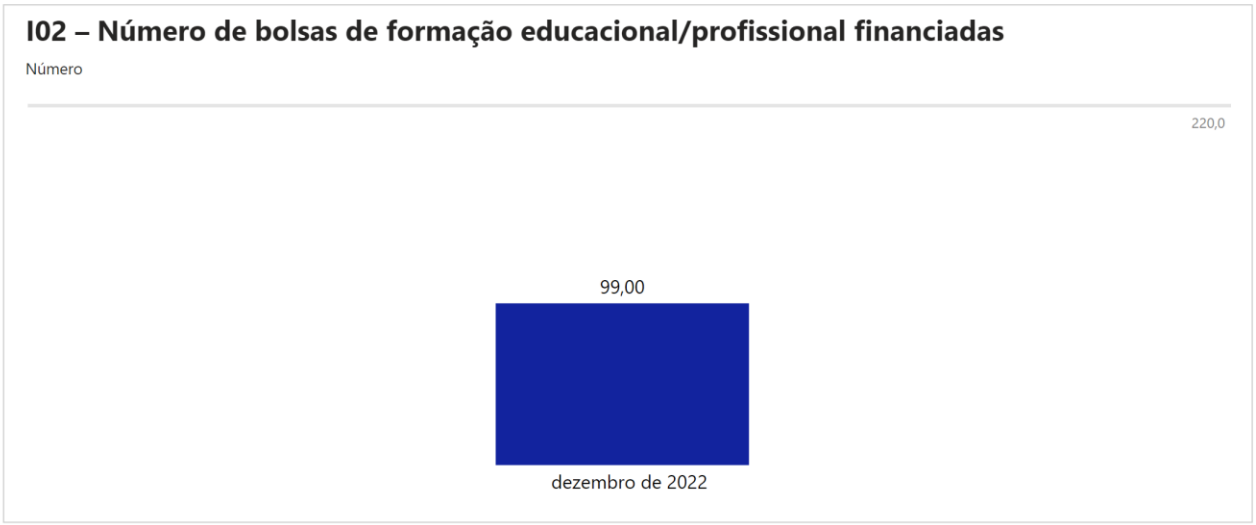


Gráfico 2: I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas - Frequência Anual

Indicadores

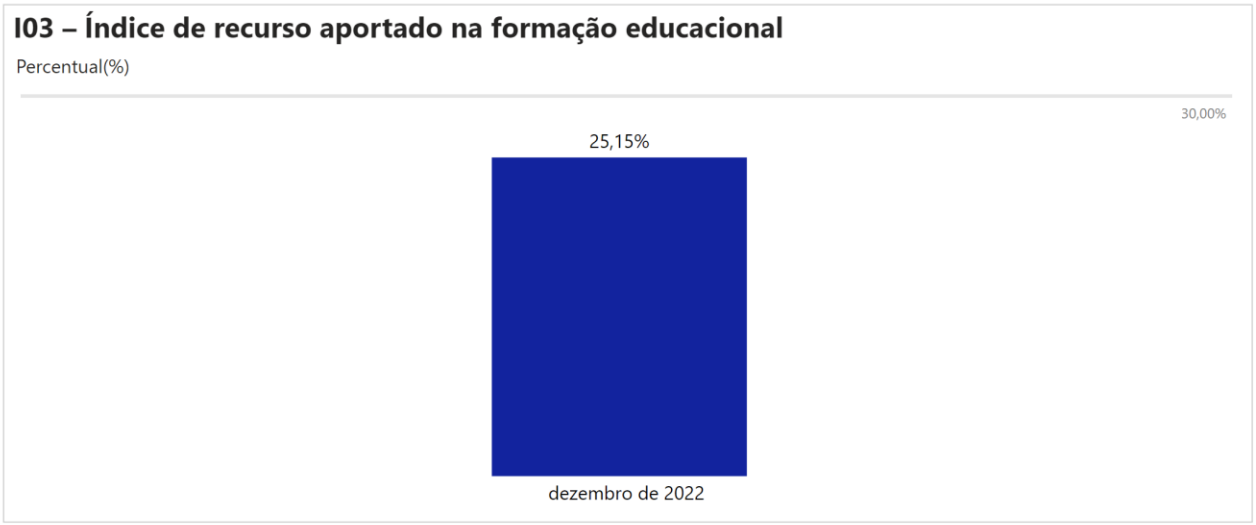


Gráfico 3: I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional - Frequência Bianual

Após Ciclo 2 da Auditoria da EY para o PG15, houve revisão no cálculo do I03 e o valor medido em 2020 e auditado posteriormente passou a ser de 13,77%.

Os indicadores I04 e I05 não são reportados neste relatório considerando serem indicadores não finalísticos somado ao fato de que a medição de ambos os indicadores é zero

Retificação Itens Analisados no Ciclo 2 de Auditoria Realizada EY

Item Analisado no Segundo Ciclo de Auditoria do Programa - EY	Ponto de Auditoria - EY	Comentários de Retificação – Fundação Renova
Indicador I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa **Fonte:** Relatório CIF Anual 2022.	**PG015.005:** Ausência de evidências de medição do indicador "I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo Programa" para o ano de 2021, em atendimento à frequência de medição estabelecida no documento de Definição do Programa (maio/2021).	Em resposta a recomendação da Auditoria da EY no Ciclo 2 para o PG15, retifica-se o período de medição do indicador (ano referência 2021 ao invés de 2020, tal como está) para a informação publicada no Relatório Anual de Atividades 2021 (janeiro/2022).
Indicador I02 – Número de bolsas de formação educacional e profissional financiadas **Fonte:** Relatório CIF Anual 2022.	**PG015.006:** Ausência de evidências de medição do indicador "I02 – Número de bolsas de formação educacional e profissional financiadas" para o ano de 2021, em atendimento à frequência de medição estabelecida no documento de Definição do Programa (maio/2021).	Em resposta a recomendação da Auditoria da EY no Ciclo 2 para o PG15, retifica-se o período de medição do indicador (ano referência 2021 ao invés de 2020, tal como está) para a informação publicada no Relatório Anual de Atividades 2021 (janeiro/2022).
Indicador I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas **Fonte:** Relatório CIF Anual 2022.	**PG015.008:** O recálculo do indicador "I03 – Índice de recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas", referente a dezembro de 2020, apresenta o percentual de 13,77%, divergente ao valor de 13,5% reportado pela Fundação Renova no Relatório Anual de Atividades (janeiro/2022)	Em resposta a recomendação da Auditoria da EY no Ciclo 2 para o PG15, retifica-se o valor deste indicador para a informação publicada no Relatório Anual de 2021. O valor corrigido passou a ser reportado nos Relatórios Mensais a partir de Março de 2022.

PG016 Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

Eixo Pessoas e comunidade

Objetivo

Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando oportunidades de renda e qualificação.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

March de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral IV
April de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral II
May de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Alto do Rio Doce
May de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Baixo Rio Doce
May de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Calha do Rio Doce
May de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Foz do Rio Doce - Litoral
May de 2022	Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura - Entrega do Relatório Territorial - Médio Rio Doce
June de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral V
July de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Anual I
September de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VI
October de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Relatório Semestral III
December de 2022	Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro - Informe Trimestral VII

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Eixo 1 - Processo para contribuir com a superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e atividades aquícolas:

- Articulação junto aos Órgãos Públicos e Comunidades
  - **3** Caravanas Devolutivas para apresentação de resultados ambientais nos territórios da Calha e Médio Rio Doce;
  - **246** Participantes das Oficinas Devolutivas nos municípios de Governador Valadares, Rio Casca e Ipatinga.
- Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro
  - **14.11K** formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores;
  - **7** informes trimestrais, **3** semestrais e **1** anual entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES.

Eixo 2 - Processo de Estruturação produtiva e alternativas de produção e Geração de Renda:

- Projeto Cultivando para Pescar:
  - **4** comunidades atendidas (Areal, Entre Rios, Regência e Povoação), sendo **170** pessoas beneficiadas;
  - **10** capacitações realizadas, **3** temas abordados (Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado);
  - **2** visitas técnicas em **1** Tema abordado (Piscicultura Superintensiva);
  - **187** Materiais Virtuais produzidos e disponibilizados no período de distanciamento social.

Grandes números do programa

▪ Fomento e Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo:

- **197** beneficiários atendidos nos estados de MG e ES;
- **3** municípios beneficiados, Rio Doce e Periquito em MG e Linhares no ES;
- **4** associações beneficiadas:
  - **30** ASPERDOCE (Rio Doce)
  - **77** ASPIPEC (Pedra Corrida)
  - **38** APIGUA (Guaxe)
  - **52** APAP (Povoação);
- **2** associações formalizadas em MG (ASPIPEC e ASPERDOCE);
- **40** capacitações em gestão e rotinas administrativas, funcionalidades e elaboração de plano de negócios, estratégias de vendas e negociação (APERDOCE e ASPIPEC);
- **4** Planos de negócio entregues.

▪ Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e Estudo de Mercado

- **3090** Entrevistas realizadas, para levantamento de dados primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e Ensino e Estabelecimentos Comerciais;
- **42** Books municipais com informações da cadeia produtiva da pesca e aquicultura nas comunidades;
- **5** Relatórios sobre a atividade pesqueira exercida nos territórios (Foz do Rio Doce, Baixo Rio Doce, Médio Rio Doce, Alto Rio Doce e Calha do Rio Doce) que irão fornecer subsídios para o programa.

Grandes números do programa

- Projetos da Foz

  - **114** associados beneficiados pela implementação da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

- Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira

  - **1°** etapa torneio de pesca esportivo realizado em Governador Valadares – MG em parceria com a Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce (APARD), sendo **4** pescadores profissionais beneficiados na capacitação de condutor de turismo de pesca.

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Conclusão da montagem do sistema de piscicultura e início dos testes na comunidade de Areal do Projeto Cultivando para Pescar.

02/2022 Conclusão das atividades de campo do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura, com participação de 405 pessoas nos DRPs, sendo:
240 - Foz do Rio Doce
68 - Baixo Rio Doce
62 - Médio Rio Doce
35 - Calha do Rio Doce

02/2022 Conclusão de 5 books municipais (Alpercata, Colatina, Marilândia, Fundão e Serra) do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.

03/2022 Conclusão de 10 books municipais (Baixo Guandu, Conceição da Barra, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Itueta, Marliéria, São Domingos do Prata, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe e Timóteo) - Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.

03/2022 Entrega do quarto informe trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

04/2022 Conclusão de 27 books municipais do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.

04/2022 Entrega do segundo relatório semestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

04/2022 Obtenção da dispensa de licenciamento para a obra da Micro Estação Fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência.

05/2022 Conclusão de 5 relatórios territoriais do Diagnóstico Complementar da Cadeia Produtiva da Pesca.

05/2022 Início da execução da 1ª fase da Micro Estação Fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência.

05/2022 Retomada das atividades de montagem na comunidade de Povoação do Projeto Cultivando para Pescar.

06/2022 Apresentação dos resultados do Monitoramento Pesqueiro ao Instituto Estadual de Florestas (IEF).

06/2022 Entrega do quinto relatório trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

06/2022 Visita ao grupo produtivo de Belo Oriente.

Fatos relevantes do Ano

07/2022 Entrega do Relatório Anual da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

07/2022 Realização da Oficina para identificação de capacitações voltadas as mulheres envolvidas no Projeto Cultivando para Pescar, em Areal.

09/2022 Entrega do sexto Relatório Trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

10/2022 Entrega da primeira fase da Micro Estação fotovoltaica na Associação dos Pescadores de Regência (ASPER).

10/2022 Entrega do terceiro Relatório Semestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

10/2022 Realização do torneio de pesca em Governador Valadares - MG, da linha de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira.

12/2022 Entrega do sétimo Relatório Trimestral da Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro referente a produção pesqueira no rio Doce e litoral do Espírito Santo.

Indicadores

Os indicadores não iniciaram suas medições, encontram-se em revisão na CTEI, onde foi encaminhada nova proposta de indicadores finalísticos.

PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias

Eixo Terra e Água

Objetivo

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da calha do rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público-alvo o restabelecimento da rotina produtiva em condição pré-existente ao evento. Ainda, para além da reparação propriamente dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

Em virtude do replanejamento do cronograma do Programa, visando o Alinhamento da Estrutura Analítica de Projetos e a Estrutura Analítica de Custos, os marcos previstos foram replanejados para após de 2022.

Grandes números do programa

. 246 propriedades elegíveis ao programa, sendo 49 direcionados ao reassentamento e 197 ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA), 197 são do PASEA planejados sendo que 196 devolutivas foram realizadas, e a diferença dos 1 refere-se à pendência de CAR ou problema fundiário. Até o presente momento, 162 propriedades aderiram à implantação do PASEA, 34 não aderiram e 0 estão em análise pelo produtor;

. 52.997,0 toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados, sendo 4,8 toneladas no mês;

. 22.312,9 horas de Assistência Técnica e Extensão Rural para 140 propriedades;

. 461 barraginhas realizadas;

. 900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas;

. 238 nascentes cercadas e 58 nascentes com plantio florestal realizado;

. 2.643 hectares de reestruturação produtiva executados.

. Elaborados e implantados os projetos de 79 hortas e 84 pomares, nos municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, no Alto Rio Doce.

Médio Rio Doce

. 8.154 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

. 15.440 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 3 – Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

. 2 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

. 159 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 3 – Tumiritinga/MG (1° Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e Periquito/MG (Liberdade);

. 65.861 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 1.913 toneladas no mês.

Baixo Rio Doce

. 1.000 horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus;

. 1.051 horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão social (ATES) no Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus;

. 1 feira de apoio à comercialização de produtos apara o Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus;

. 98 Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 – Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus;

. 7.272 toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados, sendo 216 toneladas no mês.

Parcerias

. 59 capacitações técnicas **presenciais** realizadas pela EMATER – MG;

. 30 capacitações técnicas online realizadas pela EMATER - MG;

. 18 Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no território Alto Rio Doce. Sendo 16 Unidades Demonstrativas implantadas em parceria com World Resources Institute (WRI), Fazenda Ecológica e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), e 2 Unidade Demonstrativa implantada em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG).

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Inundação de áreas reparadas, interdição de acessos, atraso na entrega de insumos e paralisação de atividades pelas contratadas, devido as fortes chuvas.

04/2022 Conclusão das atividades de Reestruturação Produtiva no município de Mariana.

04/2022 Realizado dia 19 de abril o 1° curso presencial para produtores rurais, pós pandemia - Curso de Melhoramento Genético em Tumiritinga.

06/2022 Realizada primeira entrega de insumos para produtores rurais do Lote 13 no ES, em ações de reparação dos danos no manejo do solo.

07/2022 Início das atividades de saneamento rural no Alto Rio Doce com instalação de mini ETEs.

08/2022 Realizada colheita do projeto feijão de Rio Casca, em parceria com Economia e Inovação, Diálogo da Calha e PG17.

10/2022 Conclusão da parceria da Emater com a Fundação Renova de apoio as ações de ATER em Minas Gerais.

Indicadores

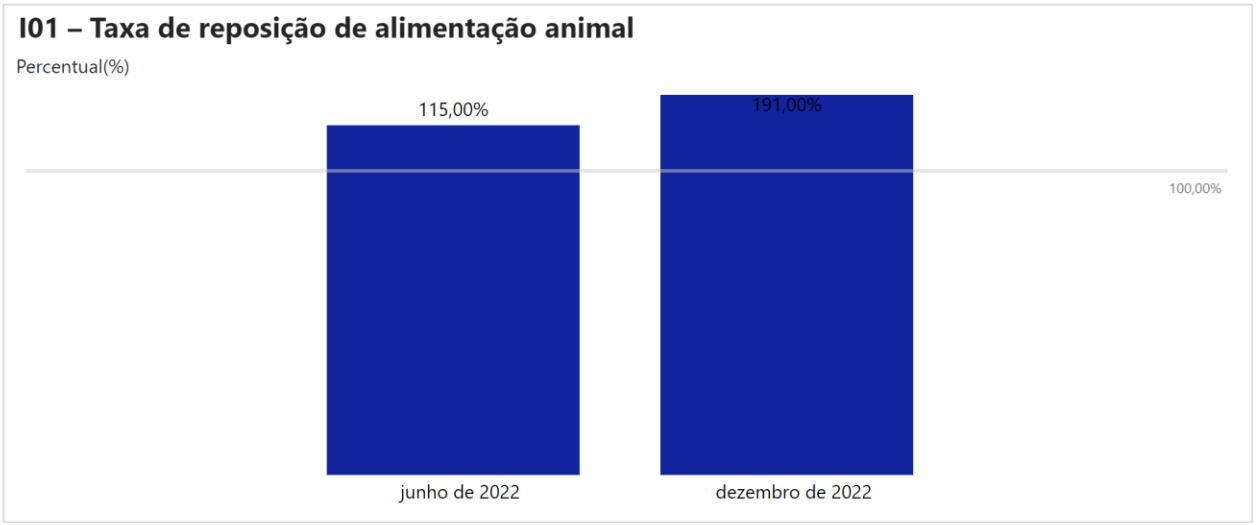


Gráfico 1: I01 – Taxa de reposição de alimentação animal - Frequência Semestral

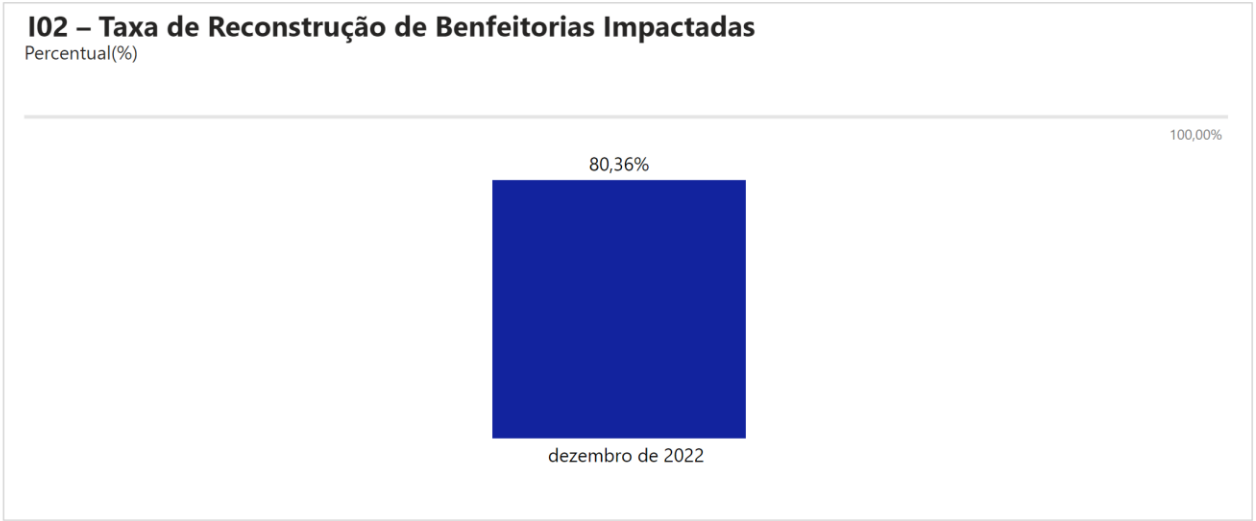


Gráfico 2: I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas - Frequência Anual

Indicadores

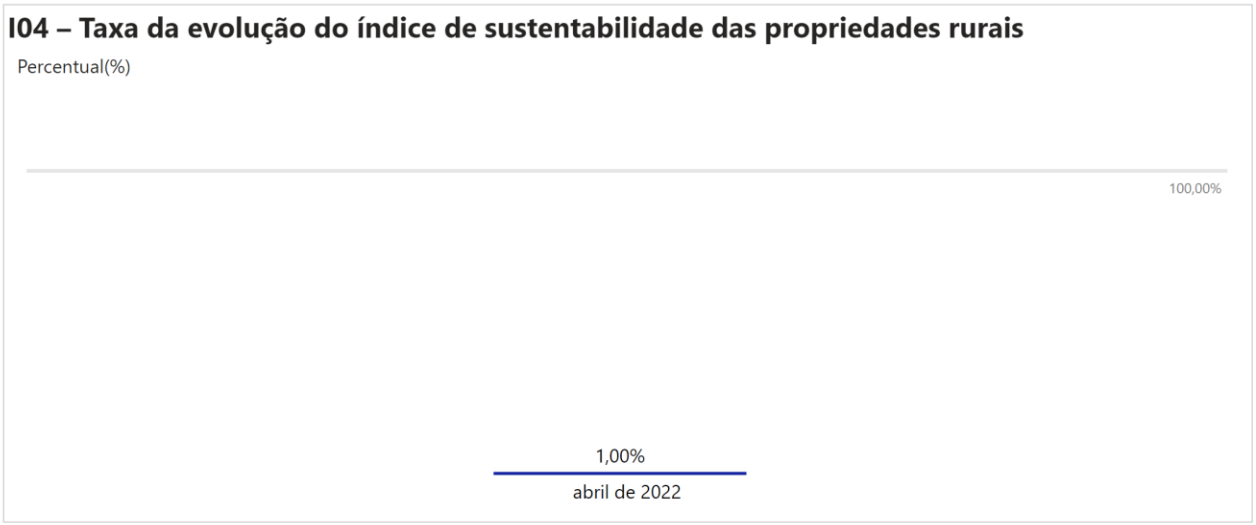


Gráfico 3: I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais - Frequência Semestral

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I01 – Taxa de reposição de alimentação animal	I01 – (Plantio Substitutivo (t/ano) + forragem fornecida (t/ano) + pastagem alugada (t/ano)) / produção de forragem impactada (t/ano)	%	janeiro/2017
I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	I02 – Quantitativo de benfeitoria Construídas/instaladas / Quantitativo de benfeitorias danificadas para adequação, de propriedades que aderiram ao Programa	%	setembro/2020
I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	I03 – número total de horas de assistência técnica e extensão rural para as famílias atendidas / Número de famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER	Horas	dezembro/2022
I04 – Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais	I04 – Número de propriedades com ISA maior ou igual a 0,7 / Número de propriedades participantes do Programa	%	março/2021
I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	I05 - Número total de horas de assistência técnica individual no ano de referência / Número de famílias atendidas participantes do programa e que aderiram a ATER	Horas/ano	junho/2022
I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	I06 - Número total de horas de assistência técnica coletiva no ano de referência / Número de famílias atendidas que aderiram a ATER	Horas	junho/2022
I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	I07 - Hectares reparados ou compensados dento da propriedade / Hectares atingidos em propriedades aderidas e atendidas pela ATER	%	agosto/2021
I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	I08 - Equipamentos recuperados ou repostos em imóveis atendidos pela ATER / Equipamentos danificados	%	agosto/2021

PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	463	3	Concluída Internamente
Deliberação	503	3	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

maio de 2022	Entrega das Colméias - Cadeia da Meliponicultura
agosto de 2022	Inauguração da sede do Banco Comunitário em Baixa Verde / Dionisio
outubro de 2022	Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (complemento)
outubro de 2022	Repasse do recurso Renova - BDMG - Distrito Empresarial (deliberado)
novembro de 2022	Capacitar famílias em atividades produtivas de fruticulturas, Sistemas Agroflorestais - Safs, Consorciação, tecnologias alternativas e irrigação
dezembro de 2022	Repasse Inicial de Recursos para o BDMG - Fundo Diversifica Mariana

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Fundo Desenvolve Rio Doce

- **R$** 99,82 **milhões** emprestados para negócio em Minas Gerais e Espírito Santo.

- Em **Minas Gerais**, R$ 79,29 milhões foram **desembolsados** para 1973 contratos e 1436 empresas.

- No **Espírito Santo**, R$ 20,53 milhões foram **desembolsados** para 559 contratos e 518 empresas.

Fundo Diversifica Mariana

- **R$** 55,00 **milhões** em linhas de crédito.

Fundo Compete Rio Doce

- Em **Minas Gerais**, R$ 7,20 milhões foram **desembolsados** para 225 contratos e 127 empresas.

Ref. Novembro/2022

Fatos relevantes do Ano

04/2022 Projeto Agroecológico em Assentamentos na Bacia do Rio Doce - ES
Conclusão da instalação da Unidade de beneficiamento de pimenta do reino no assentamento Zumbi dos Palmares em São Mateus

05/2022 Entrega de 100 colmeias para as famílias participantes do projeto Cadeia Produtiva da Meliponicultura

07/2022 Cadeias Produtivas - Cadeia do Cacau
Início do projeto. Kickoff realizado em 14/07/2022

08/2022 Prorrogação das condições do Fundo Desenvolve Rio Doce - Retomada até dez/22

08/2022 Inauguração do Banco Comunitário de Baixa Verde

09/2022 Projeto Feijão
Geração de renda para 32 famílias agricultoras da zona rural do município de Rio Casca/MG. Os três últimos anos de realização do projeto alcançou-se o montante de R$ 311.700,00, sendo R$ 137.420,00 em 2022.

10/2022 Assinatura do Acordo de Cooperação dos recursos do Distrito Empresarial de Mariana entre a Fundação Renova, BDMG e PMM. Movimentação de 25% do indicador I02 do PG 18

11/2022 Cadeia da Meliponicultura - Entregas das 786 caixas para multiplicação das colmeias e aumento de produção de mel

12/2022 Repasse dos recursos da linha Financiamento do Fundo Diversifica Mariana

Indicadores

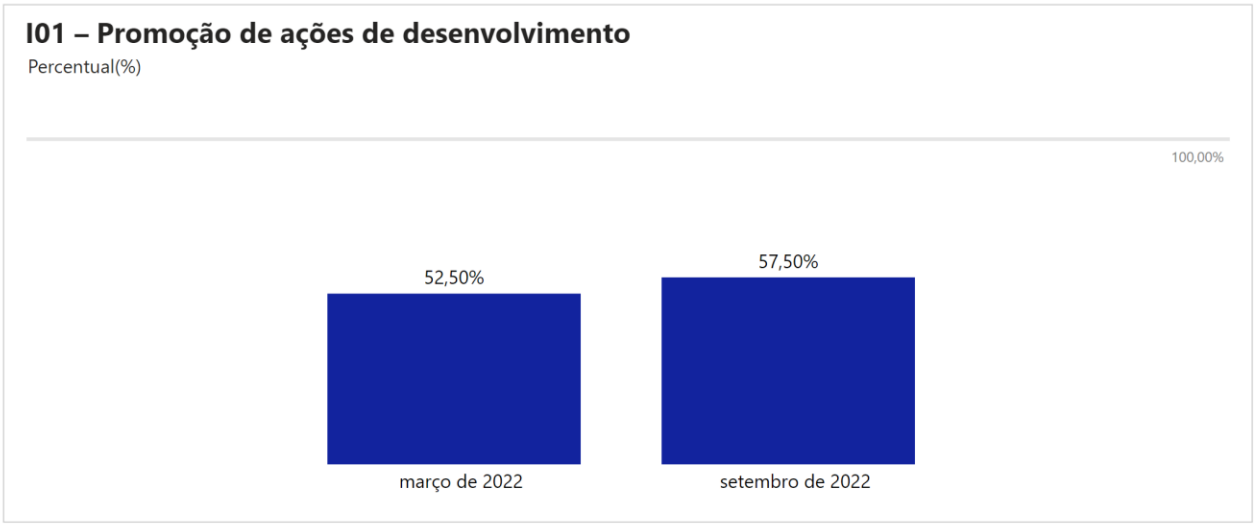


Gráfico 1: I01 – Promoção de ações de desenvolvimento - Frequência Semestral

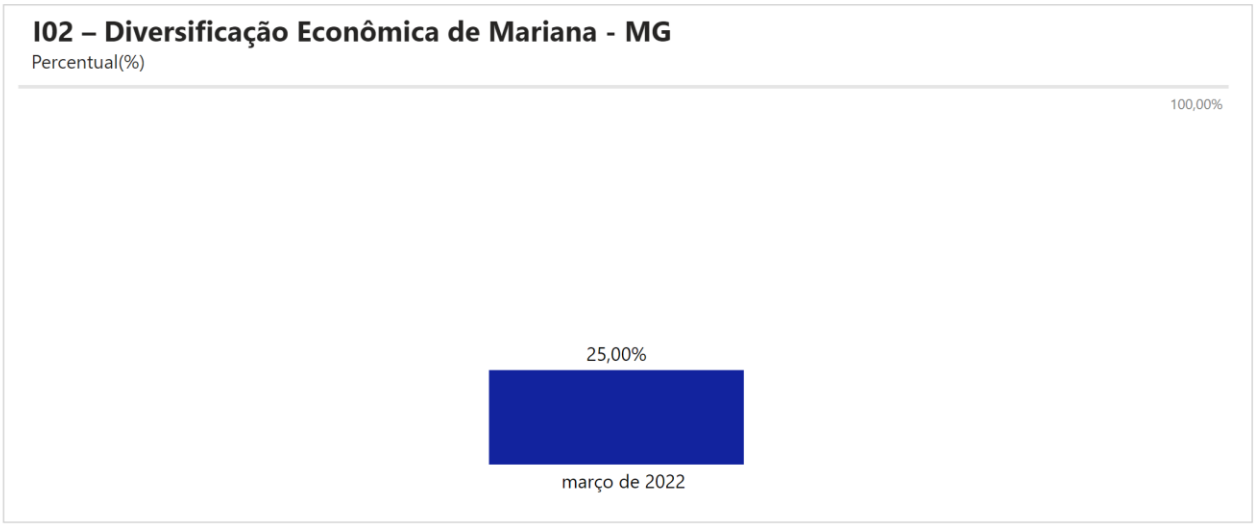


Gráfico 2: I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG - Frequência Anual

Indicadores

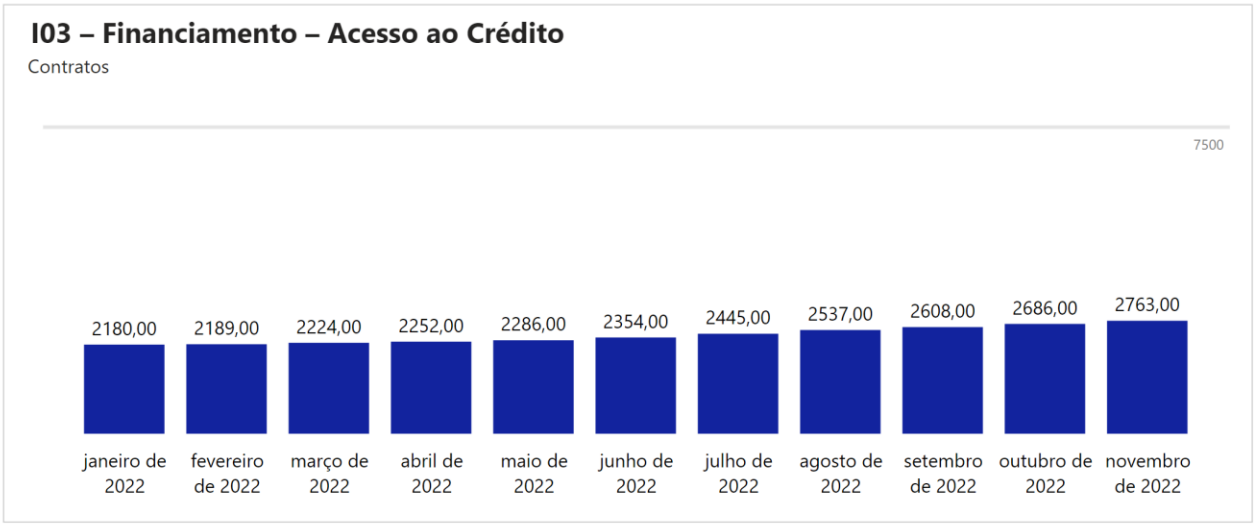


Gráfico 3: I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito - Frequência Mensal

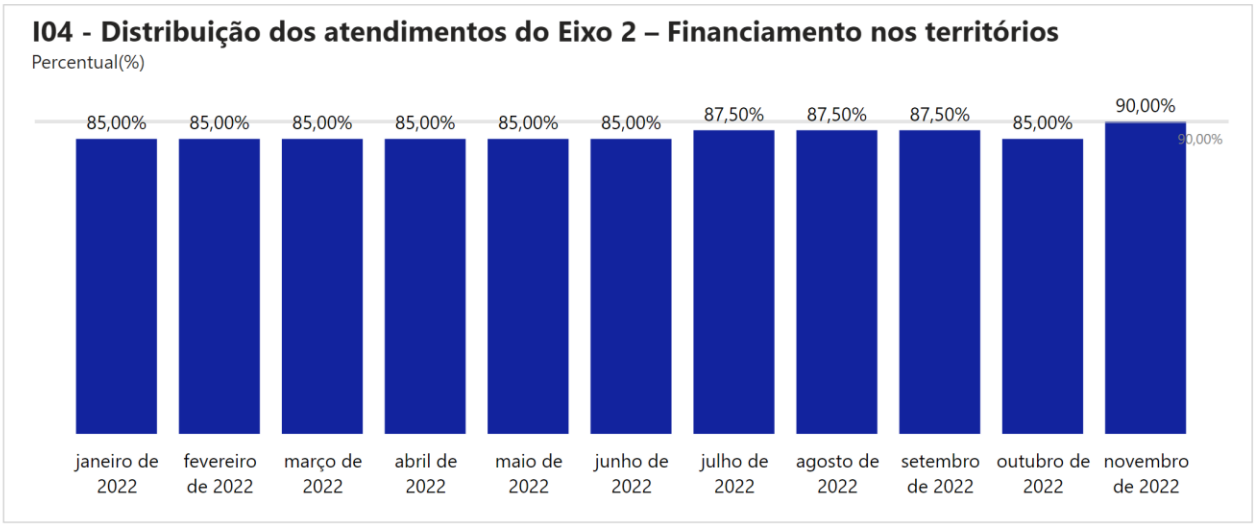


Gráfico 4: I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios - Frequência Mensal

Indicadores

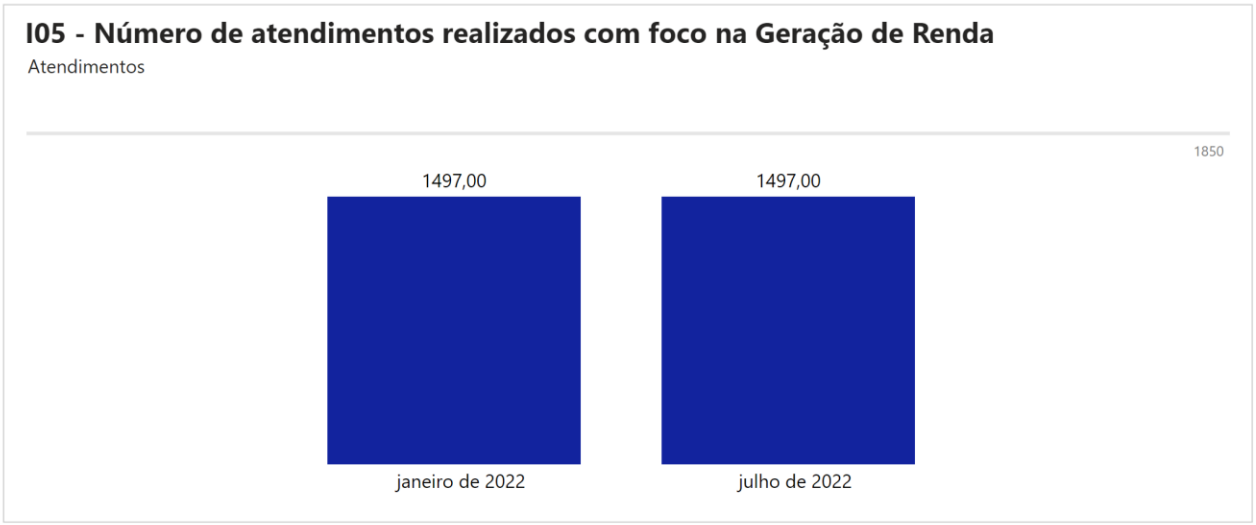


Gráfico 5:I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Frequência Semestral

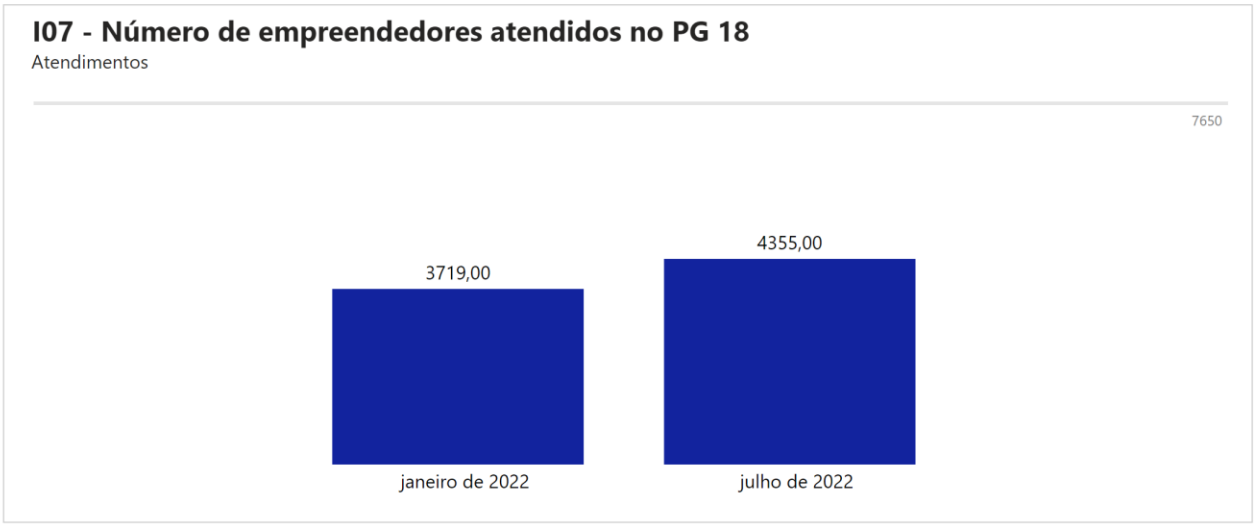


Gráfico 6: I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Frequência Semestral

PG019 Recuperação de Micro e Pequenos Negócios

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até Candonga em Minas Gerais, e Regência e Povoação no Espírito Santo, áreas diretamente atingidas pelo EVENTO (Cláusulas 132 a 133 do TTAC).

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

junho de 2022	Finalização - assessoria técnica e implementação de melhorias para 40 negócios impactados na Foz do Rio Doce, em Regência e Povoação.
julho de 2022	Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 50 negócios atingidos
julho de 2022	Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 50 negócios.
setembro de 2022	Finalização de assessoria técnica para 30 negócios impactados nos Reassentamentos e ARD.
outubro de 2022	Finalização da fase 1 do projeto de desenvolvimento de grupos produtivos de Regência e Povoação
novembro de 2022	Finalização - Reposição de insumos e equipamentos para 10 negócios impactados no Alto Rio Doce
dezembro de 2022	Finalização dos atendimentos de assessoria técnica para 10 negócios em Empreendedorismo Jovem do Reassentamento

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

976 **atendimentos realizados** a 457 **micro e pequenos negócios**, por meio de 697 **ações de assessoramento e planejamento de negócios**, 17 **locações de espaços comerciais**, 253 **reposições de insumos e equipamentos** e 9 **reformas e/ou adequação de infraestrutura**.

Fatos relevantes do Ano

03/2022	Lançamento Cartilha Acesso a Crédito em Março de 22.
03/2022	Lançamento Cartilha Formalização de Negócios em Março de 22.
05/2022	Lançamento do Projeto Rio Doce Doce Mar em Povoação/ES em maio de 22.
05/2022	Lançamento do Projeto Rio Doce Doce Mar em Regência/ES em maio de 22.
06/2022	Finalização do Projeto Impulso Rio Doce: Consultoria especializada de desenvolvimento de ideias e negócios com oferta de capacitação, assessoria, orientação e acompanhamento com realização de 2 eventos de encerramento (Barra Longa e Mariana)
07/2022	Criação do Marketing Territorial de Regência e Povoação - ... e o que dizem as águas - em julho de 22.
11/2022	Desenvolvimento de protótipos do projeto Rio Doce Doce Mar.

Indicadores

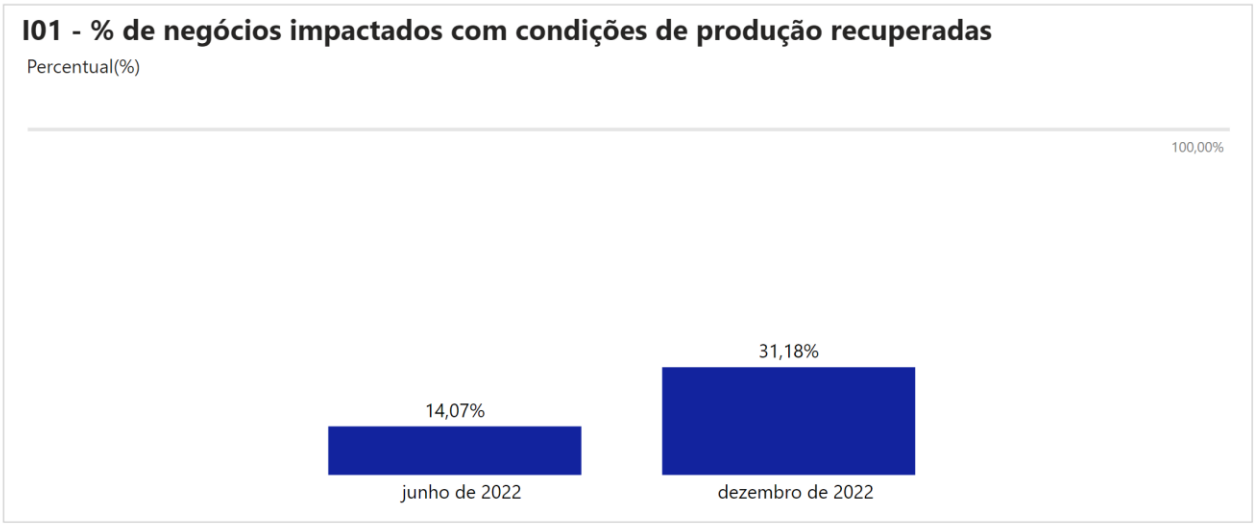


Gráfico 1: I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - Frequência Semestral

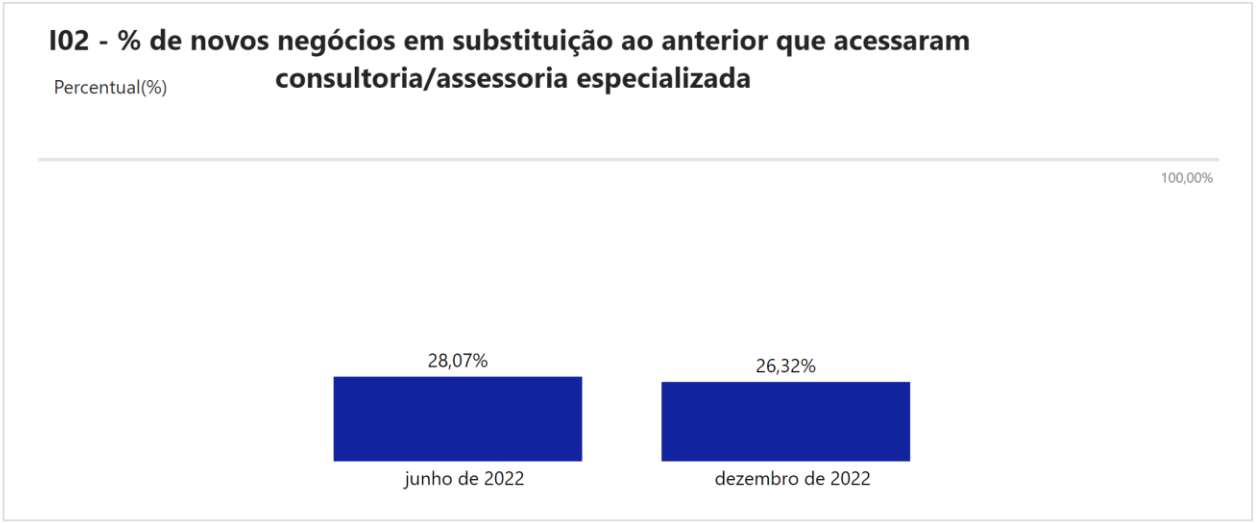


Gráfico 2: I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - Frequência Semestral

Indicadores

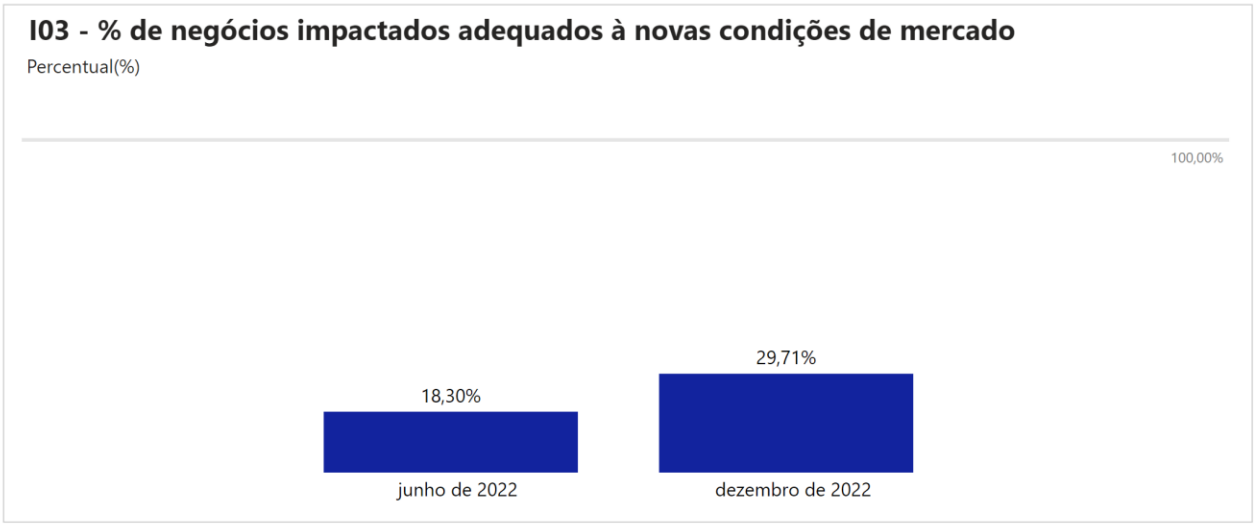


Gráfico 3: I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado - Frequência Semestral

PG020 Estímulo à Contratação Local

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Estabelecer e executar um processo de desenvolvimento de ações que auxiliem na priorização de contratação local, com ênfase na população atingida, visando capacitar e estimular o uso da força de trabalho e redes de fornecedores locais para as ações que forem desenvolvidas na área de atuação da Fundação Renova, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

julho de 2022 — Conclusão da execução da 2ª Turma do Programa de Desenvolvimento do Fornecedor no Espírito Santo (marco CIF- Planejamento 2022)

julho de 2022 — Conclusão das capacitações de preparação para o Mercado de Trabalho (Recoloca Rio Doce)

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes Números

Ações em andamento

- Nos cursos de qualificação presencial foram ofertadas 310 **turmas**, **abertas** 9.220 **vagas,** 8.326 **pessoas matriculadas**, 5.965 **concluintes**, 565 **reprovadas** e 1.627 **evadidos**.

Ações realizadas

- 10.504 vagas foram abertas nos cursos de qualificação on-line ofertadas pela Fundação Renova, 7.332 **pessoas matriculadas**, 1.566 **concluintes**, 1.218 **reprovadas** e 2.607 **evadidos**. Atividades dos cursos on-line foram encerradas em 27/08/2021.

- **R$** 3.466.398 de **Geração de Renda** para os atingidos, oportunizados pelo poder de compra da Fundação Renova.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Encerramento, em 18/01/2022, da 3ª turma de capacitação de empresas (eixo de desenvolvimento da competitividade de fornecedores) de Minas Gerais. 48 empresas concluíram o processo de capacitação. Dessas, 24 empresas são de Mariana, 05 de Barra Longa, 05 de Rio Doce, 04 de Santa Cruz do Escalado e 10 de Governador Valadares.

01/2022 Realizada a contração de 102 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova em janeiro/22, sendo 79 contratações locais e 23 não locais. Dessas contratações 96 profissionais são de Minas Gerais, 4 do Espírito Santo e 2 de outros estados.

01/2022 Validação, pela equipe técnica da Fundação Renova e fornecedor, das 20 empresas que irão participar da 2ª turma de capacitação de empresas (eixo de desenvolvimento da competitividade de fornecedores) do Espírito Santo.

02/2022 Em fevereiro/22 teve início a turma de capacitação profissional em Assistente Administrativo para a comunidade do Degredo - Linhares ES. Ao total foram ofertadas 25 vagas e tivemos 25 alunos matriculados.

02/2022 Realizada em ambiente online, no dia oito de fevereiro, a 1ª Palestra do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, da 2ª turma do Espírito Santo, com o tema: "O IMPACTO DA QUALIDADE NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES".

02/2022 Em fevereiro/22 iniciou uma turma de capacitação profissional com o tema Panificação na comunidade do Degredo – Linhares ES. Ao longo do curso, serão abordados os temas de boas práticas de higiene, metrologia da panificação, tecnologia de panificação, dentre outros. Ao total foram ofertadas 20 vagas e tivemos 21 alunos matriculados.

02/2022 Nos dias 22 e 23 de fevereiro, foram realizados dois treinamentos de "Preparação para o Mercado de trabalho", um em Rio Doce e um em Sem Peixe. 50 vagas foram ofertadas e 21 pessoas participaram das capacitações, 12 em Rio Doce e 9 em Sem Peixe.

02/2022 1. Realizada a contração de 201 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 127 contratações locais e 73 contratações não locais. Dessas 201 contratações, 167 profissionais são de Minas Gerais, 1 do Espírito Santo e 33 dos demais estados.

02/2022 Foram cadastrados 172 currículos e prospectadas 262 vagas de emprego na plataforma Recoloca Rio Doce. No acumulado, 3.474 currículos estão cadastrados e 2.745 vagas já foram captadas.

Fatos relevantes do Ano

03/2022 Capacitação Profissional Presencial:
Foram realizados sete treinamentos no mês de março com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana/ (Bento Rodrigues/ Paracatu), Linhares Sede, Regência, Povoação, Ipatinga e Governador Valadares.
175 vagas foram ofertadas, 134 inscritos e 72 participantes.

Em março iniciamos duas turmas de capacitação profissional em Assistente Administrativo para as comunidades de Regência e Povoação | ES. Foram ofertadas 50 vagas e tivemos 17 inscritos em cada distrito.

Em Mariana iniciamos uma turma de capacitação profissional em Eletricista de Instalações Prediais. Foram ofertadas 25 vagas e 23 inscritos.

03/2022 Contratação Local:
Realizada a contração de 428 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 231 contratações locais e 197 contratações não locais. Dessas 201 contratações, 341 profissionais são de Minas Gerais, 16 do Espírito Santo e 71 dos demais estados.

Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 158 currículos e prospectadas 58 vagas de emprego no mês. No acumulado, 3.632 currículos estão cadastrados e 2.803 vagas já foram captadas.

03/2022 Desenvolvimento de Fornecedores:
Realizadas no mês de março, as palestras com os seguintes temas: Gestão da Produtividade e Gestão Financeira com Foco em Resultados para as 20 empresas participantes da 2º turma do Espírito Santo.

04/2022 Capacitação Profissional Presencial:
Foram realizados nove treinamentos no mês de abril com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz, Sem Peixe, Governador Valadares, Aimorés, Colatina e Linhares.
Recoloca foram ofertadas 270 vagas, 186 inscritos e 65 participantes.
No SENAI em abril iniciamos cinco turmas de capacitação profissional em Mariana - MG. Foram ofertadas 145 vagas e tivemos 127 alunos matriculados.

04/2022 Contratação Local:
Realizada a contração de 180 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 138 contratações locais e 42 contratações não locais. Dessas 180 contratações, 138 profissionais são de Minas Gerais, 31 do Espírito Santo e 11 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 241 currículos e prospectadas 642 vagas de emprego no mês. No acumulado, 3.879 currículos estão cadastrados e 3.761 vagas já foram captadas.

04/2022 Desenvolvimento de Fornecedores:
Realizada no mês de abril, a palestra com o seguinte tema: Gestão contábil, tributária e trabalhista para as 20 empresas participantes da 2º turma do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, do Espírito Santo.

Fatos relevantes do Ano

05/2022 Contratação Local:
Realizada a contração de 168 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 124 contratações locais e 44 contratações não locais. Dessas 168 contratações, 119 profissionais são de Minas Gerais, 41 do Espírito Santo e 08 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 438 currículos e prospectadas 313 vagas de emprego no mês. No acumulado, 4.311 currículos estão cadastrados e 4.073 vagas já foram captadas.
Realizado nos dias 18 e 19/05 o cadastramento de fornecedores nas comunidades de Regência e Povoação no Espírito Santo. Ação viabilizada com o objetivo de orientar e tirar dúvidas dos empreendedores e negócios locais sobre o cadastramento para se tonar fornecedores ou subfornecedores da Fundação Renova.
Resultados:
47 empresas cadastradas em Regência
16 empresas cadastradas em Povoação

05/2022 Desenvolvimento de Fornecedores:
Realizada no mês de maio, as palestras e seminários com os seguintes temas: "SST e Responsabilidade Social" e "Gestão de Pessoas" para as 18 empresas participantes da 2º turma do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores | PDF, do Espírito Santo.

05/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o mercado de trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados sete treinamentos no mês maio com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana, Barra Longa, Santa Cruz, Governador Valadares, Antônio Pereira e Ponte do Gama distrito de Mariana. Onde foram ofertadas 318 vagas, 235 inscritos e 202 participantes.
SENAI: No mês de maio iniciamos duas turmas de capacitação profissional uma em Mariana (Eletricista Industrial) e outra em Ipatinga (Montador de Andaime), no total foram ofertadas 50 vagas e tivemos 35 alunos matriculados.

06/2022 Desenvolvimento de Fornecedor:
Realizada no mês de junho, palestra e seminário com os seguintes temas: "Gestão comercial, orçamentação e marketing" e "Inovação nos negócios".

06/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 302 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 239 contratações locais e 63 contratações não locais. Dessas 302 contratações, 225 profissionais são de Minas Gerais, 48 do Espírito Santo e 29 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 767 currículos e prospectadas 362 vagas de emprego no mês. No acumulado, 5.042 currículos estão cadastrados e 4.398 vagas já foram captadas.

06/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados dezessete treinamentos no mês de junho com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana, Governador Valadares, Colatina e Linhares . Onde foram ofertadas 928 vagas e 928 participantes.
SENAI: No mês de junho iniciamos três turmas de capacitação profissional uma em Mariana (Solda) e outras duas em Ipatinga (Montador de Andaime e Soldador), no total foram ofertadas 85 vagas e tivemos 81 alunos matriculados.

Fatos relevantes do Ano

07/2022 Desenvolvimento de Fornecedor:
Realizado o evento final para conclusão da turma de PDF do Espírito Santo.
Realizada no mês de julho o diagnóstico final e devolutiva nas 18 empresas que finalizaram o PDF no Espírito Santo.

07/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 448 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 335 contratações locais e 113 contratações não locais. Dessas 448 contratações, 369 profissionais são de Minas Gerais, 63 do Espírito Santo e 16 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 917 currículos e prospectadas 570 vagas de emprego no mês. No acumulado, 6.001 currículos estão cadastrados e 5.005 vagas já foram captadas.

07/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados dezoito treinamentos no mês de julho com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", no município: Mariana. Onde foram ofertadas 485 vagas e 485 participantes.
SENAI: No mês de julho iniciamos dez turmas de capacitação profissional duas em Mariana (assistente administrativo e solda eletrodo revestido), duas em Ipatinga (Montador de Andaime e Soldador), duas em Sem Peixe de (assistente administrativo), duas em Barra Longa de (assistente administrativo), uma em Governador Valadares (Iniciação Profissional em Saúde e Segurança do Trabalho) e uma em Regência (Costura Industrial Básica) no total foram ofertadas 285 vagas e tivemos 268 alunos matriculados.

Fatos relevantes do Ano

08/2022 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
1. Realização dos 4 eventos de lançamento do projeto +Gestão. Foram realizados 2 eventos presenciais (Ipatinga e Linhares) e 2 eventos online. Total de inscritos 162 e 81 participantes.
2. Conclusão dos diagnósticos iniciais em 200 empresas nos municípios de atuação do projeto, sendo eles: Mariana, Ipatinga, Governador Valadares, Resplendor, em Minas Gerais e Baixo Guandu, Marilândia, Colatina e Linhares, no Espírito Santo.
3. Realização do Encontro de Negócios em Colatina em 09/08/2022. O evento teve como objetivo criar oportunidades e gerar negócios contribuindo para o desenvolvimento das Empresas Capixabas localizadas nos municípios de Colatina e Linhares. Houve participação do Governo do Estado, na pessoa do Alessandro Gris Drumond, Gerente de Projetos Institucionais, apresentando os projetos do Governo, particularmente o projeto Compre do ES. A Rodada de Negócios foi realizada pela Fundação Renova em parceria com a Findes por meio do IEL (Instituto Euvaldo Lodi) e o Programa +Negócios. O evento contou com a presença de 5 empresas compradoras e 12 empresas vendedoras, totalizando 60 reuniões.

08/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 522 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 248 contratações locais e 274 contratações não locais. Dessas 522 contratações, 251 profissionais são de Minas Gerais, 16 do Espírito Santo e 255 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 733 currículos e prospectadas 446 vagas de emprego no mês. No acumulado, 6.734 currículos estão cadastrados e 5.451 vagas já foram captadas.

08/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados dezoito treinamentos no mês de agosto com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios: Mariana e Resplendor. Onde foram ofertadas 464 vagas e 464 participantes.
SENAI: No mês de agosto iniciamos oito turmas de capacitação profissional duas em Mariana (assistente administrativo e Instalador de Sistema Fotovoltaico), quatro em Ipatinga (Montador de Andaime e Soldador, Instalador Predial de Baixa Tensão) e uma em Regência (Montador de Andaime) no total foram ofertadas 195 vagas e tivemos 150 alunos matriculados.

Fatos relevantes do Ano

09/2022 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Realização do "Workshop de Nivelamento" com as empresas participantes do projeto +Gestão, com o objetivo de apresentar o cronograma de visitas das assessorias, apresentação do ambiente virtual e das ferrramentas de trabalho que serão utilizadas no desenvolvimento das atividades.
Realização das assessorias individuais nos temas Qualidade e Produtividade nas empresas participantes do projeto +Gestão.

09/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 306 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 158 contratações locais e 148 contratações não locais. Dessas 306 contratações, 197 profissionais são de Minas Gerais, 12 do Espírito Santo e 97 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 390 currículos e prospectadas 538 vagas de emprego no mês. No acumulado, 7.124 currículos estão cadastrados e 5.989 vagas já foram captadas.

09/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados onze treinamentos no mês de agosto com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios de Mariana Sem Peixe e Barra Longa. Onde foram ofertadas 231 vagas e tivemos 231 participantes.
SENAI: No mês de agosto iniciamos seis turmas de capacitação profissional, duas em Mariana (assistente administrativo), uma em Colatina (Costura Industrial Básica) uma em Povoação (Pintor Industrial) uma em Regência (Risco e Corte de Tecidos e uma em Governador Valadares (Informática Básica) no total foram ofertadas 167 vagas e tivemos 141 alunos matriculados.

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Encontro de Negócios do Projeto +Gestão realizado em Mariana com a participação de 70 pessoas que teve o objetivo de estabelecer relacionamentos entre grandes empresas que estão atuando no município com empresários locais para que tenham a oportunidade de se apresentar e de negociar seus produtos e serviços a partir desse contato. Grandes empresas participantes: Fundação Renova, Dinâmica, ERG, Gemma e Sapore.

10/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 281 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 162 contratações locais e 119 contratações não locais. Dessas 281 contratações, 186 profissionais são de Minas Gerais, 29 do Espírito Santo e 66 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 406 currículos e prospectadas 419 vagas de emprego no mês. No acumulado, 7.530 currículos estão cadastrados e 6.408 vagas já foram captadas.

10/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados treze treinamentos no mês de outubro com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", nos municípios de Ipatinga. Onde foram ofertadas 498 vagas e tivemos 498 participantes.
SENAI: No mês de outubro iniciamos quatorze turmas de capacitação profissional. No Espírito Santo foram ofertadas duas em Colatina (Iniciação técnicas de marcenaria) e (Noções de Rotinas Administrativas), uma em Baixo Guandu (Risco e Corte), duas em Linhares (Solda MAG) e (Fabricação de Salgados) e uma em Povoação (Iniciação técnicas de marcenaria). Em Minas Gerais foram ofertadas cinco turmas em Mariana (Aperfeiçoamento - Montador de Padrão), (Fundamentos de Gestão), (Instalador de Sistema Fotovoltaico), (Assistente Administrativo), uma turma em Ipatinga (Solda MIG), e quatro turmas em Governador Valadares/ Resplendor (Informática Básica), (Elétrica Predial), (Assistente Administrativo) e (Informática Básica). No total foram ofertadas 395 vagas e tivemos 318 alunos matriculados.

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Rodada de Negócios realizado pelo Projeto +Gestão em Linhares-MG no dia 08/11/2022, com a participação de 61 pessoas representando 35 empresas locais, 5 empresas compradoras. Foram realizados 102 atendimentos, além da participação do Gerente de Projetos Institucionais na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo – Sectides, Alessandro Drumond.
O objetivo do evento foi aproximar pequenas e médias empresas locais das grandes empresas (compradoras) que atuam na região, com a possibilidade de gerar novos negócios, contribuindo para a economia local.

11/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 215 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 119 contratações locais e 96 contratações não locais. Dessas 215 contratações, 167 profissionais são de Minas Gerais, 10 do Espírito Santo e 38 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 296 currículos e prospectadas 420 vagas de emprego no mês. No acumulado,7.826 currículos estão cadastrados e 6.828 vagas já foram captadas.

11/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados no mês de novembro/2022, seis (06) eventos com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", sendo (02) eventos em Mariana e quatro (04) eventos em Ipatinga . Onde foram ofertadas 296 vagas e tivemos 296 participantes.
SENAI: No mês de novembro iniciamos quatorze turmas de capacitação profissional. No Espírito Santo foram ofertadas duas turmas (Iniciação técnicas de marcenaria), em Colatina e Povoação, uma em Degredo (Fabricação de Salgados). Em Minas Gerais foram ofertadas duas turmas em Mariana (Rotinas Administrativas), (Controle de Qualidade), duas turmas em Ipatinga (Iniciação Profissional Eletricidade Básica), (Solda Eletrodo Revestido), duas turmas em Governador Valadares(Comandos Elétricos), (Informática Básica), duas em Itueta (Eletrica Predial), (Assistente Administrativo), duas turmas em Pedra Corrida (Assistente Administrativo), (Informática Básica) e uma em Cachoeira Escura. No total foram ofertadas 385 vagas e tivemos 260 alunos matriculados.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Desenvolvimento de Fornecedor | +Gestão:
Evento de encerramento, realizado no formato online, da turma 2022 do Projeto + Gestão.

Foram capacitadas 113 empresas localizadas em 8 municípios no estado de Minas Gerais e Espírito Santo.

O projeto +Gestão é uma iniciativa da área de Contratação e Empreendedorismo Local e tem como foco principal auxiliar o fortalecimento da gestão das pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no seu mercado de atuação. Em 2022 o projeto atuou nos municipios de Mariana, Governador Valadares, Ipatinga e Resplendor (MG) e Colatina, Linhares, Baixo Guandu e Marilândia (ES)."

12/2022 Monitoramento de Contratações Locais:
Realizada a contração de 238 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 139 contratações locais e 99 contratações não locais. Dessas 238 contratações, 164 profissionais são de Minas Gerais, 14 do Espírito Santo e 60 dos demais estados.
Por meio da Plataforma "Recoloca Rio Doce", foram cadastrados 279 currículos e prospectadas 154 vagas de emprego no mês. No acumulado, 8.105 currículos estão cadastrados e 6.983 vagas já foram captadas.

12/2022 Qualificação Profissional e Preparação para o Mercado de Trabalho:
RECOLOCA: Foram realizados no mês de Dezembro/2022, 02 eventos com o tema "Preparação para o Mercado de trabalho", sendo os 02 eventos em Mariana -MG. Onde foram ofertadas 41 vagas e tivemos 41 participantes.
SENAI: No mês de dezembro 192 pessoas concluíram os cursos de capacitação profissional. 154 foram alunos que iniciaram os cursos nos meses anteriores. No mês de dezembro foram ofertadas 02 turmas de capacitação em Governador Valadares, (Aperfeiçoamento em Excel) e Periquito - Assentamento Liberdade, (Bolos Artesanais). 45 vagas ofertadas, 41 alunos matriculados e 38 concluintes.

Indicadores

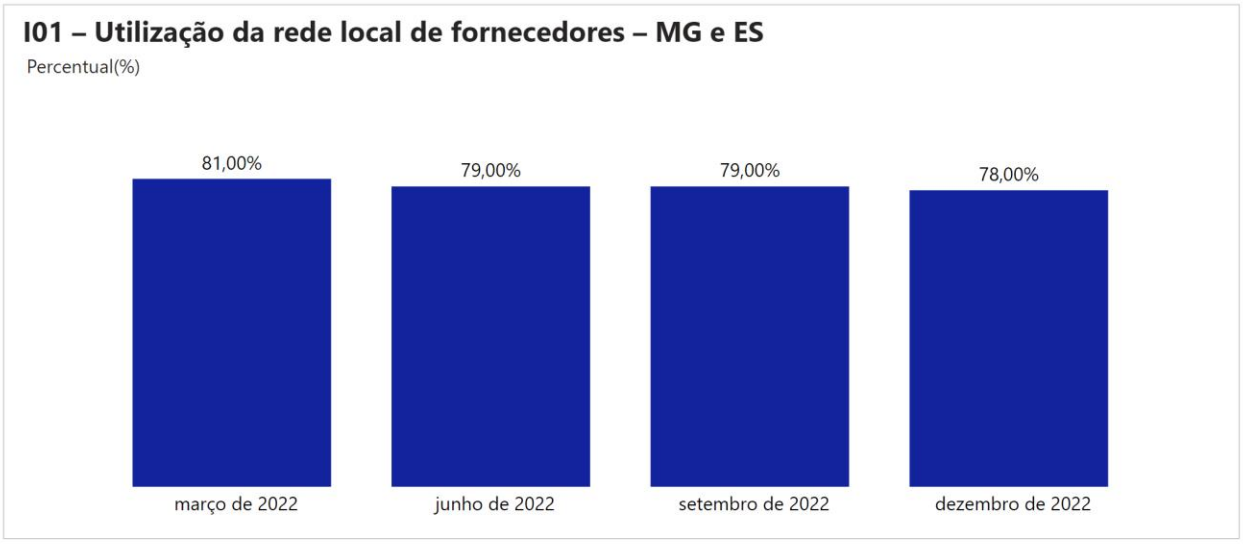


Gráfico 1: I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES - Frequência Trimestral

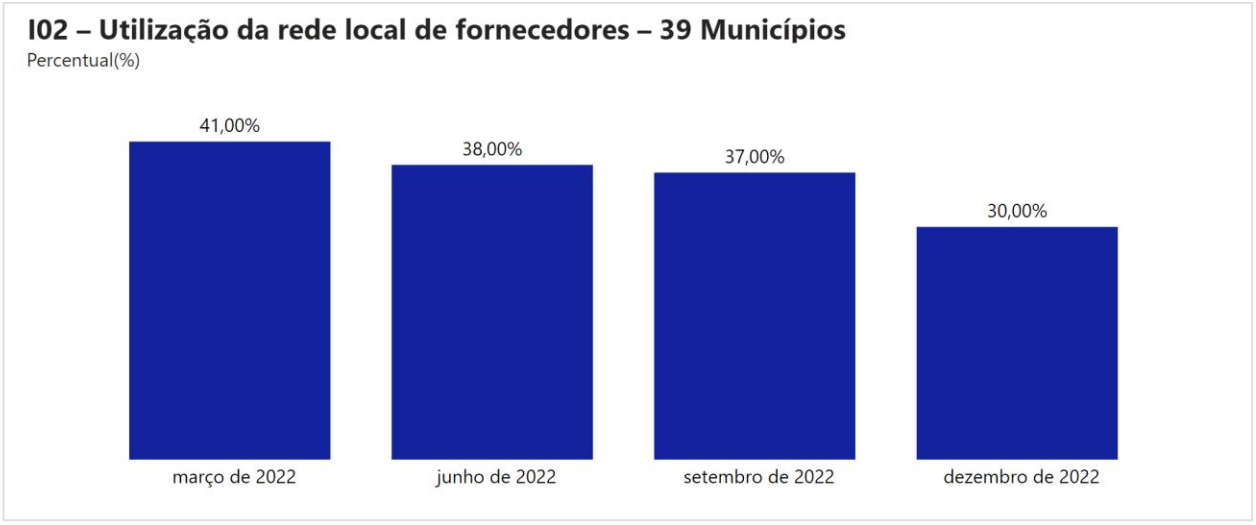


Gráfico 2: I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios - Frequência Trimestral

Indicadores

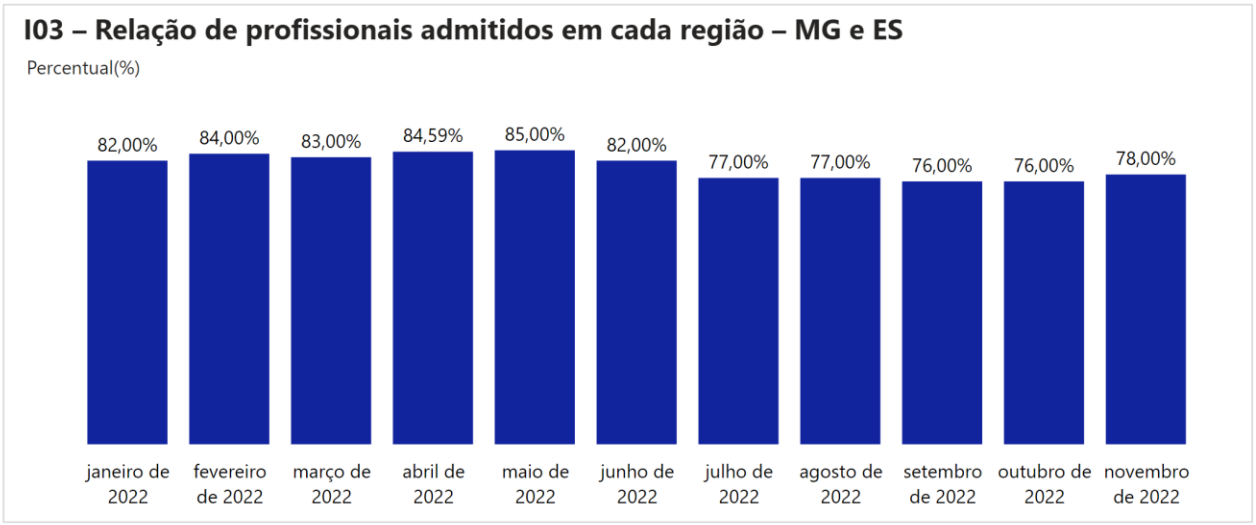


Gráfico 3: I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES - Frequência Mensal

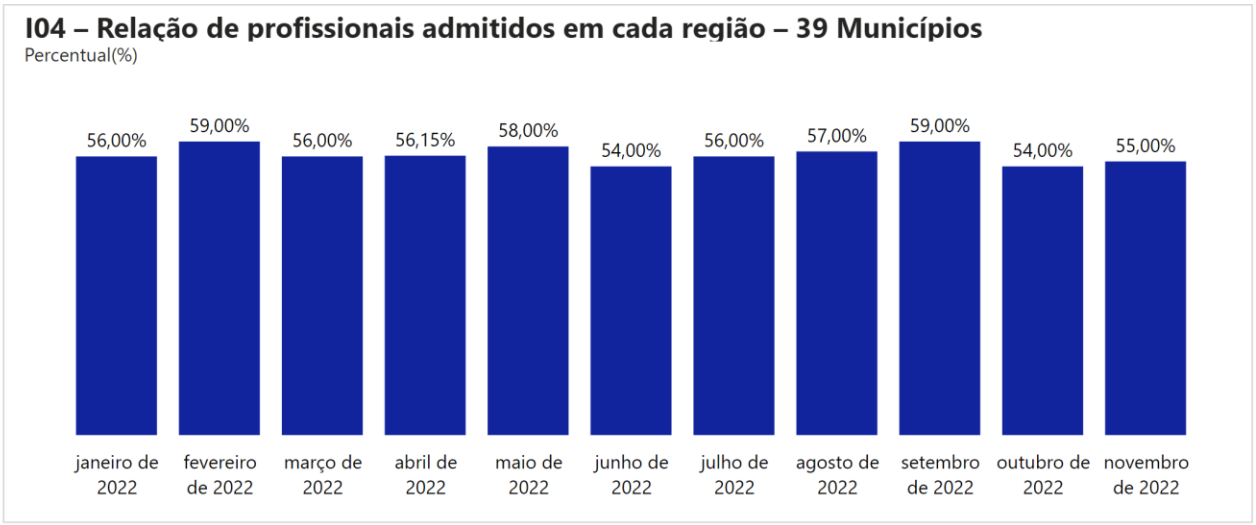


Gráfico 4: I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 39 Municípios - Frequência Mensal

Indicadores



Gráfico 5: I05 – Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Frequência Semestral

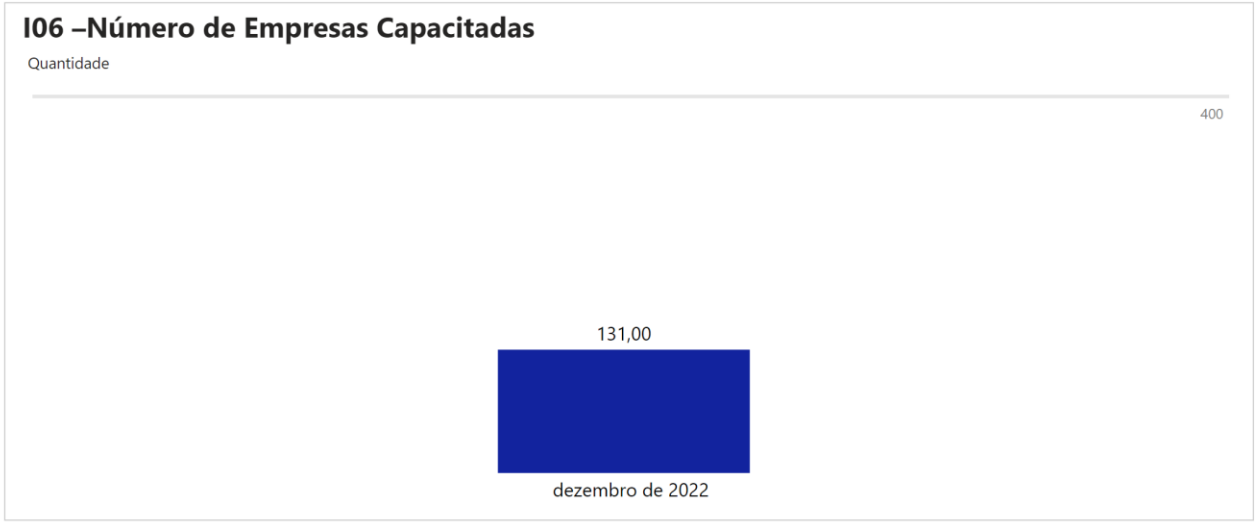


Gráfico 6: I06 –Número de Empresas Capacitadas - Frequência Anual

Indicadores

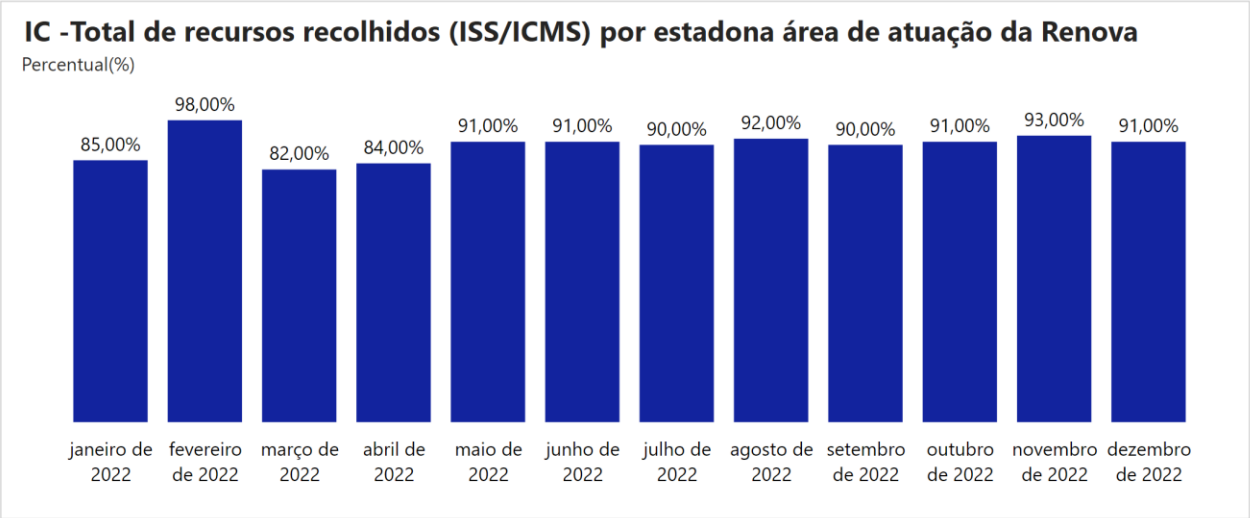


Gráfico 7: IC -Total de recursos recolhidos (ISS/ICMS) por estadona área de atuação da Renova - Frequência Mensal

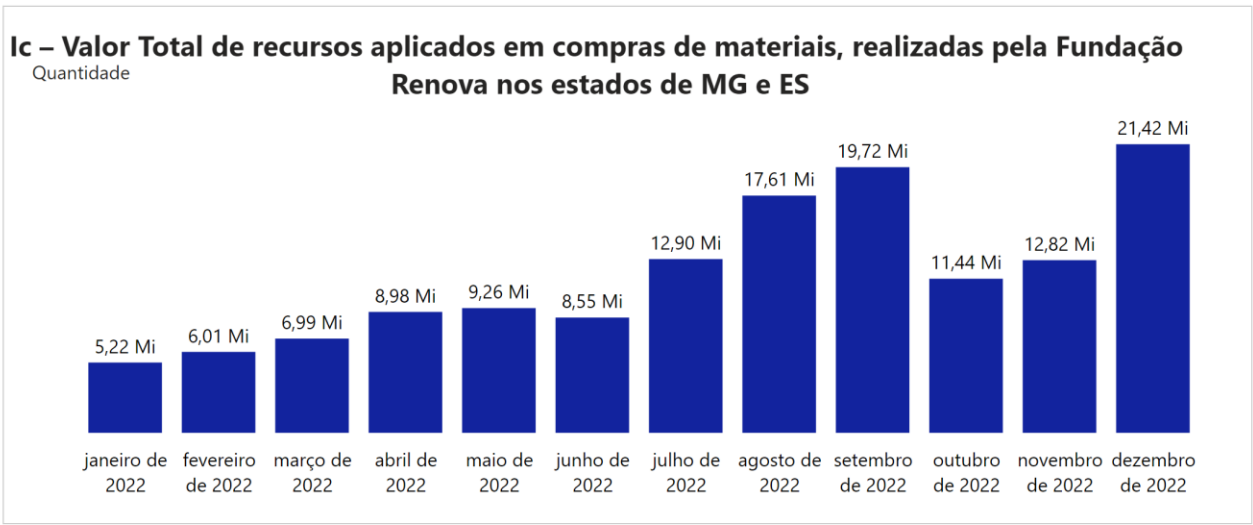


Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

Indicadores

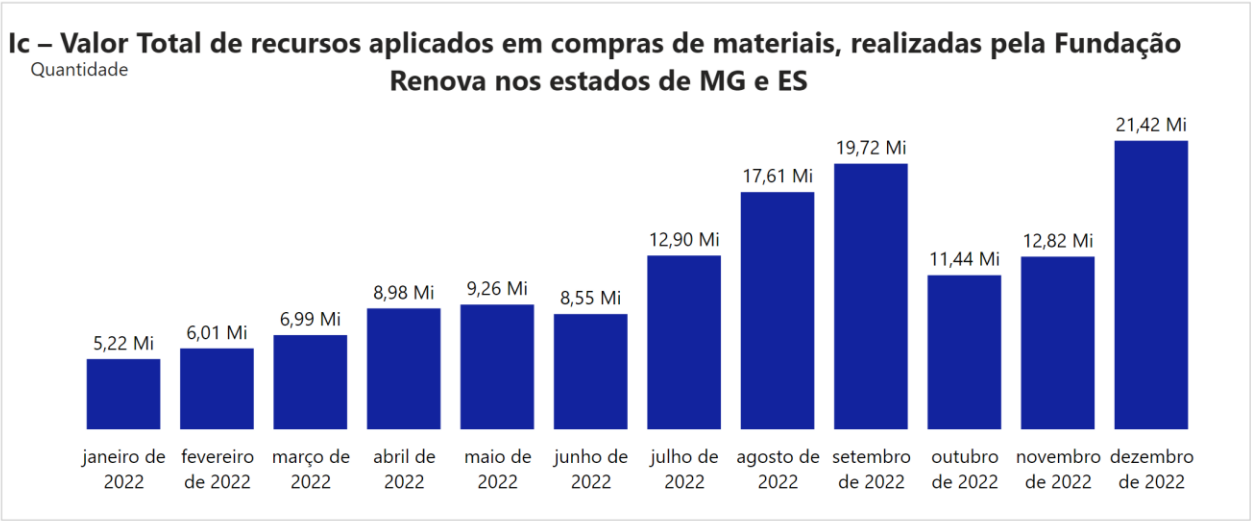


Gráfico 8: Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Frequência Semestral

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do Rompimento, conforme as Cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	307	2b	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30/11/2021), e, em função disso, não foi possível precisar o Planejamento 2022 em sede administrativa.

Grandes números do programa

- Atualmente há 14.423 **titulares** que recebem auxílio financeiro emergencial. Considerando titulares e dependentes, são 32.187 pessoas assistidas pelo Programa;

- Até o momento foram **pagos R$** 2.279,8 Mi .

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

01/2022 Exclusão de 276 auxílios.

01/2022 Inclusão de 12 auxílios.

02/2022 Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

02/2022 Exclusão de 684 auxílios.

02/2022 Inclusão de 5 auxílios.

03/2022 Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

03/2022 Exclusão de 684 auxílios.

03/2022 Inclusão de 2 auxílios.

04/2022 Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

04/2022 Exclusão de 158 auxílios.

04/2022 Inclusão de 1 auxílio;

05/2022 Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

05/2022 Exclusão de 230 auxílios.

05/2022 Inclusão de 6 auxílios.

06/2022 Continuação de cancelamentos dos auxílios vinculados à quitação definitiva do Sistema Indenizatório Simplificado previsto na decisão da 12ª Vara Federal.

06/2022 Exclusão de 54 auxílios.

06/2022 Inclusão de 0 auxílios.

07/2022 Decisão Judicial - Reativação AFE's da transição de subsistência de 4.831 auxílios.

07/2022 Exclusão de 77 auxílios.

07/2022 Inclusão de 16 auxílios.

08/2022 Exclusão de 176 auxílios

08/2022 Inclusão de 2 auxílios

Fatos relevantes do Ano

09/2022 Decisão judicial de reativação de alguns grupos de AFE's.

09/2022 Exclusão de 58 auxílios.

09/2022 Inclusão de 242 auxílios.

10/2022 Exclusão de 47 auxílios

10/2022 Inclusão de 7132 auxílios

11/2022 Exclusão de 73 auxilios

11/2022 Inclusão de 48 auxilios.

12/2022 Exclusão de 50 auxilíos

Indicadores

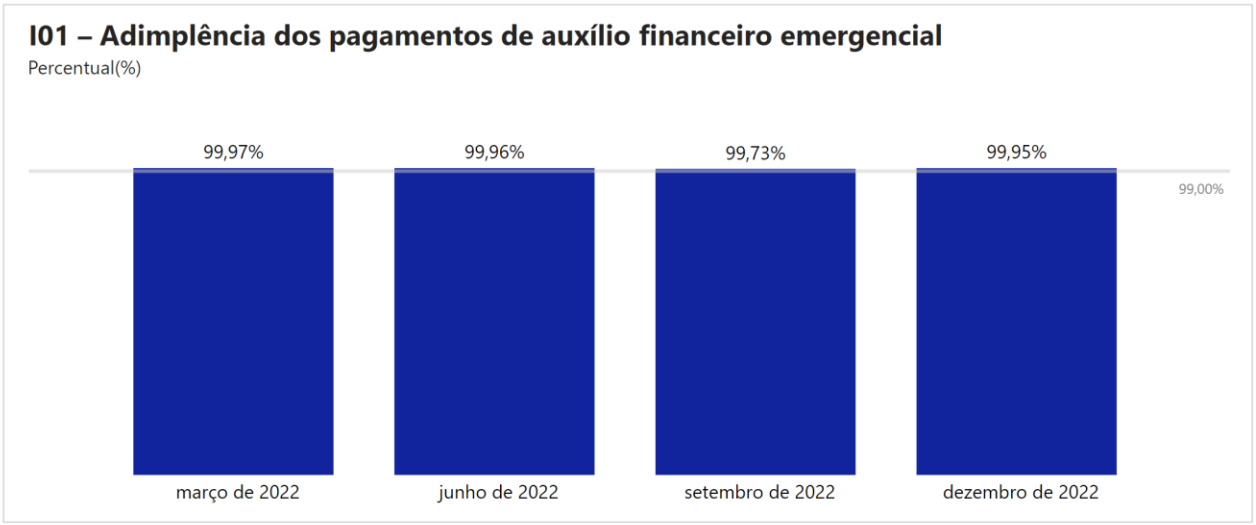


Gráfico 1: I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Frequência Trimestral

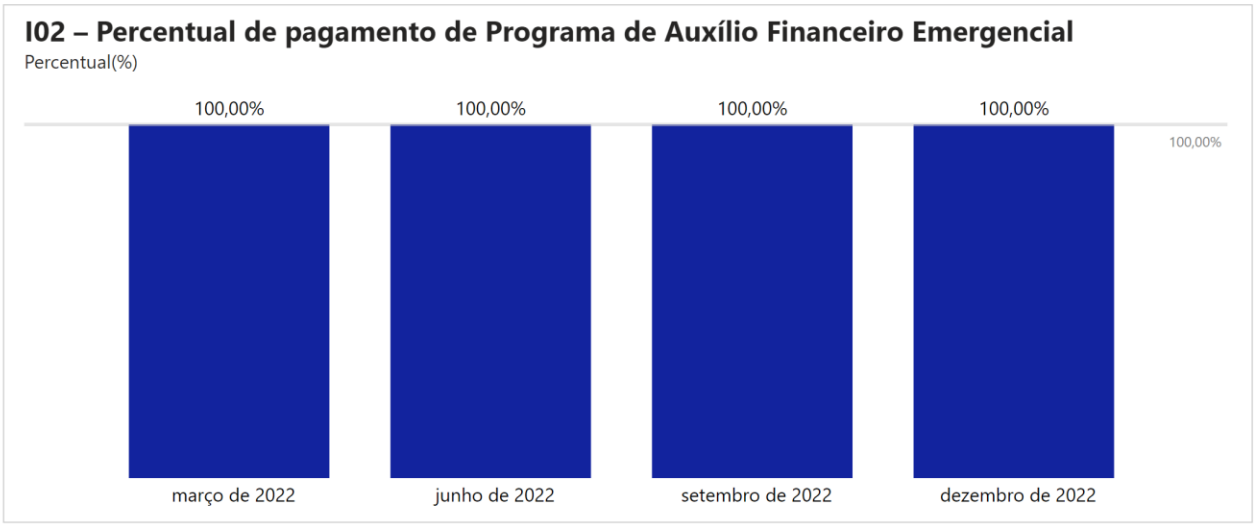


Gráfico 2:I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Frequência Trimestral

PG023 Manejo de Rejeitos

Eixo Terra e Água

Objetivo

Apresentar diretrizes, conceitos, metodologias, técnicas, critérios e indicadores para tomada de decisão quanto ao manejo dos rejeitos para elaboração e execução de projetos aplicáveis a cada fração territorial nas áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	165	1	Concluída Internamente
Deliberação	516	2	Concluída Internamente
Deliberação	516	3	Concluída Internamente
Deliberação	590	2	Concluída Internamente
Deliberação	592	2	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022



maio de 2022	Conclusão do 2º ano de estudos na região deltaica do Baixo Doce
novembro de 2022	Conclusão dos Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias (Monitoramento da Vegetação e Monitoramento de Processos Erosivos) - 4º Ano hidrológico

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

03/2022	Reunião GTBaixo Doce – fechamento de 2 anos de estudos na região deltaica do ES, em atendimento a NT CT-GRSA nº 05/2019.
05/2022	Entrega do relatório final dos dois anos de estudo da Região Deltaica.
05/2022	Instalação das duas novas estações de monitoramento da qualidade do ar em Acaiaca e Dom Silvério.
07/2022	Protocolo do Relatório Trimestral da Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar referente ao 2° trimestre de 2022.
07/2022	VimVer nos projetos de Restauração Florestal, Bioengenharia, retomada das atividades agropecuárias e Candonga nos dias 06, 07 e 08/07/22.
10/2022	Realizado protocolo do relatório de monitoramento da qualidade do ar, referente ao 3º trimestre, em 17/10/2022.

Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF n°230, os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 12ª Vara Cível e Agrária, na Ação Civil Pública (ACP) 69758-91.2018.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.

PG025 Programa de Recuperação da Área Ambiental 1

Eixo Terra e Água

Recuperação da área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão (ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, em atendimento as cláusulas 158, 159 e 160 do TTAC, bem como do distrito de Chopotó, localizado no município de Ponte Nova, que foi parcialmente impactado.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	613	2.2	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Conclusão do convênio UFV-SIF - Prof. Venâncio (Acompanhamento técnico, definição de indicadores, metas e monitoramento das ações de restauração florestal da Área Ambiental 1)
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Barra Longa- 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Mariana - 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Ponte Nova - 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Rio Doce - 2022
dezembro de 2022	Finalização da manutenção do restauro florestal em área impactada - Santa Cruz do Escalvado- 2022

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 808 **hectares** de plantio emergencial para controle de erosão;
- 113 **afluentes** recuperados;
- 542 **hectares** de restauração florestal implantados e em manutenção.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 As atividades de manutenção da restauração florestal vem sendo desenvolvidas nos municípios atingidos.

01/2022 Prejuízos e retrabalhos nas áreas em processo de restauração florestal decorrentes dos impactos das fortes chuvas que ocorreram na região.

07/2022 Conclusão do levantamento Aerofotogramétrico Período Seco 2022.

08/2022 Término da campanha de campo da 1ª fase do monitoramento ecológico.

Indicadores

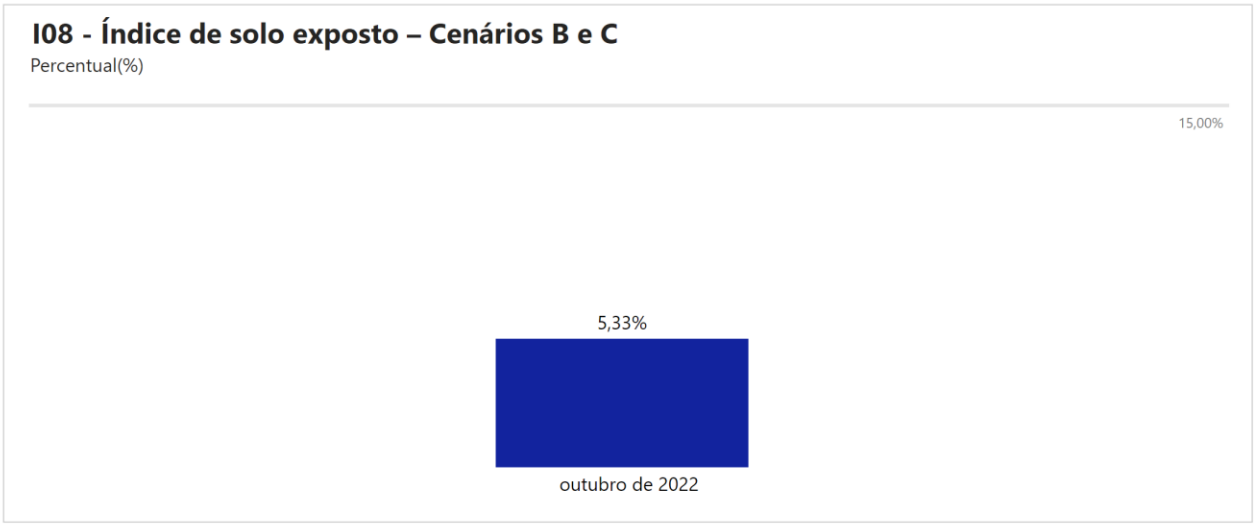


Gráfico 1: I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C - Frequência Bianual

Indicadores

Tabela 1. Indicadores do programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I01	Índice de Cobertura Vegetal	(Área total com cobertura vegetal herbácea – arbustiva/Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%
I02	Índice de Solo Exposto	(Área total com solo exposto/ Área total passível de revegetação emergencial/inicial) * 100	%
I03	Biomassa Total da Vegetação	(0,011*banda 2*NDVI2) + (-0,008 x Banda 3*NDVI2)	t/ha
I04	Índice de Redução de Perda de Solo	(Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento tratadas por bioengenharia/Perda de solo [t/há] nas parcelas de monitoramento e controle) * 100	%
I05	Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	(Diversidade de espécies nativas no sexto ano de intervenção/diversidade de espécies nativas do ecossistema de referência) x 100	%
I06	Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Número de indivíduos / área amostral	Nº de indivíduos/ha
I07	Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	(Área total com espécie invasora/Total das áreas em recuperação florestal (cenários B e C)) x 100	%

PG026 Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de APPs e áreas de recarga hídrica degradadas do Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo para os municípios e distritos listados nos parágrafos segundo e terceiro da CLÁUSULA 171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITÊ INTERFEDERATIVO, através da deliberação 196/2018, numa extensão de 40.000 ha em 10 anos.
Este programa será executado diretamente pela Fundação Renova e/ou em cooperação com os governos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Manhuaçu - 23/24
fevereiro de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
fevereiro de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas- 22/23
maio de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, TI Krenak, Uds e Ucs - 23/24
junho de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 24/25
junho de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 23/24
junho de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 22/23
junho de 2022	Conclusão das atividades de engajamento/validação nas propriedades para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 23/24
julho de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Corrente Grande - 22/23
julho de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para Sub-bacia Pontões e Lagoas - 22/23
novembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Doce - 24/25

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 11.671,4 **hectares** com o processo de recuperação iniciada;
- 338 **propriedades rurais** parceiras nas açoes de recuperaçao das área de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH);
- 31,9 Mil **hectares** inscritos no edital;
- R$ 746 Mil pagos de PSA aos produtores rurais.
- 26.329 hectares validados.

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Lançamento de edital com quatro lotes na bacia do Manhuaçu para recuperação de 720 ha, e orçamento de 26MM para cada lote. Visita técnica do edital teve a participação de 48 empresas proponentes.

03/2022 Assinatura do Termo de compromisso com o Governo do Estado do Espírito Santo para a Restauração de 5.190 hectares, sendo 2000 hectares em Baixo Guandu e Afonso Claudio e 3190 hectares para Afonso Claudio e Brejetuba.

04/2022 Evento Vim Ver em Governador Valadares, Plantio em Área de Nascentes, junto com Poder Público (GV) e Diretoria (Renova);

04/2022 Participação da equipe Desenvolvimento Sustentável no Agrishow em Ribeirão Preto;

04/2022 Visita técnica do edital de contratação com 54 empresas inscritas;

05/2022 Assinatura do termo de Compromisso entre Fundação Renova, IBAMA, SEMAD-MG, IEF-MG, CBH-Doce, CBH-Suaçuí e Prefeitura de Governador Valadares, garantindo aplicação de recursos, na ordem de R$58,5 milhões, para Restauração Florestal de 1.796 hectares na bacia hidrográfica do rio Corrente Grande_PG 26;

05/2022 Evento de lançamento do edital de restauração florestal em Manhuaçu, com investimento de R$300 Milhões_PG26;

05/2022 Participação na elaboração do Plano de ação para conservação e recuperação do Parque Estadual do rio Doce_PG26;

05/2022 Publicação de matéria no Valor Econômico, assinada pelo editor Ivo Ribeiro, a respeito dos investimentos em restauração florestal em MG e ES_PG's 26 e 27;

06/2022 Mobilização do viveiro CRM com 150 mil mudas prontas para plantio inclusive com as espécies pau-brasil e peroba-amarela_PG's 26 e 27;

06/2022 Participação no Workshop de Segurança promovido pelo Consórcio Reflore com participação de todos os colaboradores dos 3 contratos que tem com a Fundação_ PG's 26 e 27

06/2022 Recebimento do primeiro lote de sementes coletadas pelos indígenas Pataxós da Aldeia Geru Tucunã em Acucena - MG, totalizando aproximadamente 250Kg de sementes florestais nativas, valor total de aproximadamente R$ 20.000,00_PG's 26 e 27

06/2022 Vistoria para prospecção de áreas no Pico do Ibituruna junto com IEF, Prefeitura de GV e CIAAT_PG 26

07/2022 Definição de áreas amostrais para monitoramento dos plantios com drones_PG's 26 e 27;

07/2022 Instalação e reforma da casa de sementes concluída_PG's 26 e 27;

07/2022 Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Beija-flor (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES_PG's 26 e 27;

Fatos relevantes do Ano

08/2022 Apresentação dos programas 26 e 27 como ferramenta de aceleração do PRA (Programa de regularização ambiental) em MG. Palestra realizada em Ubá - MG no evento "PRA Produzir Sustentável" organizado pelo IEF_PG's 26 e 27;

08/2022 Mobilização de coletores de sementes na comunidade quilombola Maitacas em Sabinópolis_PG's 26 e 27;

08/2022 Reunião de Handover e Kickoff do edital da bacia do Guandu_PG 26;

09/2022 De 05 a 09/09, Participação da equipe (Karina, Tieppo e Leandro) na SERE2022 _PG's 26 e 27;

09/2022 Equipe de Restauração Florestal apresentou os trabalhos da Renova no Congresso Brasileiro de Sementes_PG's 26 e 27;

09/2022 Equipe de Restauração Florestal apresentou os trabalhos da Renova no II ETRAD, evento promovido pela Vale_PG's 26 e 27;

09/2022 Equipe Desenvolvimento Sustentável apresentando trabalho, em Berlim/Alemanha, sobre ganho de escala na validação de áreas usando os modelos matemáticos do estudo de áreas prioritárias, feito em parceria com a UFV e UFMG_PG's 26 e 27;

09/2022 No dia 07/09, apresentação do Leandro e Karina, no Simpósio da Temática Planejamento da Restauração, na SERE2022_PG's 26 e 27;

09/2022 Primeiros resultados do plantio direto das sementes da Rede expedidas para campo_PG's 26 e 27;

10/2022 A Rede se sementes e midas iniciou o segundo ciclo de retirada de sementes, foram 309 Kg de sementes oriundas do município Dionísio, coletadas próximo a zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce_PGs 26 e 27;

Fatos relevantes do Ano

11/2022	Apresentação sobre o projeto da Rede de Sementes e Mudas na Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, Vitória ÉS (PG 26 e 27);
12/2022	200KG de muvuca preparadas e enviada para plantio pelo CIAAT;
12/2022	Envio de 25 mil mudas para a empresa Inovesa - Viveiro Ouro Verde;
12/2022	Presença da equipe dos programas de restauração florestal da Fundação renova na apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes do NERE, Turma de 2022, a primeira turma a ser formada pelo contrato nº 4800032296;

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	I00 - Hectare recuperado	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG027 Programa de Recuperação de Nascentes

Eixo Terra e Água

Objetivo

Promover a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um período máximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce.
Este programa será executado diretamente pela Renova e/ou em cooperação com iniciativas correlatas na bacia do rio Doce.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22
janeiro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 21/22
junho de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Assentamentos MG e TI Krenak - 19/21
julho de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
julho de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 22/23
agosto de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Pancas - 21/22
setembro de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 19/21
outubro de 2022	Conclusão dos cercamentos/proteção nas propriedades para a sub-bacia de Suaçuí - 21/22
novembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Guandu - 22/23
novembro de 2022	Conclusão da mobilização dos produtores rurais para a sub-bacia de Pancas - 22/23
dezembro de 2022	Conclusão as atividades de engajamento / validação nas propriedades para a sub-bacia de Corrente Grande - 21/22

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 1710 **nascentes** com o processo de recuperação iniciada;
- 555 **propriedades rurais** parceiras nas ações de recuperação das nascentes;
- 4465 **nascentes** inscritas no edital;
- R$ 272423 pagos de PSA aos produtores rurais.
- 2773 Nascentes Validadas

Fatos relevantes do Ano

04/2022 Participação da equipe Desenvolvimento Sustentável no Agrishow em Ribeirão Preto;

04/2022 Reunião com IEF sobre restauração Florestal no Parque Estadual do Rio Corrente.

06/2022 Dia de campo em Pancas - ES, para a revisão do Protocolo de Qualidade, nas UT´s de Plantio Total e Plantio Total + Adensamento do Ano 1 e 2_PG's 26 e 27;

06/2022 Recebimento do primeiro lote de sementes coletadas pelos indígenas Pataxós da Aldeia Geru Tucunã em Acucena - MG, totalizando aproximadamente 250Kg de sementes florestais nativas, valor total de aproximadamente R$ 20.000,00_PG's 26 e 27;

07/2022 Definição de áreas amostrais para monitoramento dos plantios com drones_PG's 26 e 27;

07/2022 Visita aos Pataxós_PG's 26 e 27;

07/2022 Visita da equipe técnica da Rede de Sementes e mudas ao Assentamento Boa Esperança (Alto Rio Novo) bacia Pontões e Lagoa ES_PG's 26 e 27;

08/2022 Mobilização de coletores comunidade barra de Santo Antônio_PG's 26 e 27;

08/2022 Mobilização de coletores comunidade quilombola Santa Bárbara_PG's 26 e 27;

08/2022 Visita ao viveiro C4_PG's 26 e 27;

08/2022 Visita do conselho curador, comitê sócio-ambiental e diretoria nas atividades de campo do PG 26 e PG 27 em Colatina/ES_PG's 26 e 27;

09/2022 Equipe Desenvolvimento Sustentável apresentando trabalho, em Berlim/Alemanha, sobre ganho de escala na validação de áreas usando os modelos matemáticos do estudo de áreas prioritárias, feito em parceria com a UFV e UFMG_PG's 26 e 27;

09/2022 Preparo e envio de sementes para plantio direto pelo CIAAT, no córrego Melquiades_PG's 26 e 27;

09/2022 Retirada de Sementes no Assentamento Boa Esperança, em Alto Rio Novo - ES_PG's 26 e 27;

10/2022 Workshop Lições Aprendidas_PGs 26 e 27;

11/2022 Apresentação sobre o projeto da Rede de Sementes e Mudas na Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, Vitória ÉS (PG 26 e 27)

Fatos relevantes do Ano

12/2022 200KG de muvuca preparadas e enviada para plantio pelo CIAAT.

12/2022 Envio de 25 mil mudas para a empresa Inovesa - Viveiro Ouro Verde.

12/2022 Presença da equipe dos programas de restauração florestal da Fundação renova na apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes do NERE, Turma de 2022, a primeira turma a ser formada pelo contrato nº 4800032296.

Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO PREVISTO DE MEDIÇÃO
I00 – Nascentes recuperadas	I00 - Nascente Recuperada	ha	janeiro/2024
I01 - Riqueza de espécies	I01 - (riqueza de espécies nativas no sexto ano de intervenção / riqueza de espécies nativas do ecossistema de referência) * 100	%	janeiro/2024
I02 – Densidade de regenerantes	I02 - Número de indivíduos / total de área amostral	Nº indivíduos/ha	janeiro/2024
I03 - Cobertura do dossel	I03 - (total da área amostral com cobertura do dossel / total da área amostral) * 100	%	janeiro/2024

PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática

Eixo Terra e Água

Objetivo

Identificar, mensurar e monitorar os impactos agudos e crônicos sobre a biota e ambientes do rio Doce e tributários, da foz, costeiros, estuarinos e marinhos, implementar medidas para a recuperação e conservação desta biota nos ambientes potencialmente impactados pelo rompimento da barragem de Fundão e avaliar a efetividade dessas medidas.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	164	c (ação 1)	Concluída Internamente
Deliberação	578	2	Concluída Internamente
Deliberação	579	1	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Protocolo dos relatórios finais das linhas temáticas I a VI
janeiro de 2022	Protocolo do Relatório Anual do Ciclo 4 de Monitoramento Reprodutivo de Tartarugas Marinhas junto à CT-Bio
fevereiro de 2022	Conclusão do Ciclo 3 de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do Rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Área Ambiental 1, no Espírito Santo
março de 2022	Início da execução do Plano de Ação da Biodiversidade Aquática
abril de 2022	Protocolo do Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação Integrado para Conservação da Biodiversidade Aquática - Versão revisada
julho de 2022	Relatório de avaliação dos impactos para o ambiente marinho e costeiro - PAI
agosto de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto I - SIF/UFV
agosto de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto IV - SIF/UFV
agosto de 2022	Realização da Oficina I de Elaboração do PA Integrado
outubro de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto II - SIF/UFV
outubro de 2022	Protocolo do Relatório subprojeto III-B - SIF/UFV
dezembro de 2022	Realização da Oficina II de Elaboração do PA Integrado

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

02/2022 Apresentação do 4° Relatório Anual "Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Planície Costeira do Rio Doce – agosto/2020 a julho/2021" (4° ano de monitoramento) em atendimento à Cláusula 165, do Termo de Referência 4 do Anexo 6.

02/2022 Entrega do 3º Relatório Anual de Evolução de 2021 (RA2021) do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Capixaba do Rio Doce e Região Marinha e Costeira Adjacente (PMBA/FEST-RRDM).

02/2022 Protocolo do relatório revisado do processo de elaboração do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, de acordo com o Ofício SEI nº 12/2022/CTBio/DIBIO/ICMBio.

02/2022 Realização do 3° Seminário Técnico-científico de avaliação de Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Resultados dos 3 anos de PMBA.

03/2022 Aprovação do documento de definição do Programa de Conservação da Biodiversidade Aquática (PG28), Cláusulas 164 a 166 do TTAC, por meio da Deliberação CIF no 583, de 25 de março de 2022.

03/2022 Realização da 1a reunião com o GAT (Grupo Assessor Técnico) do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, dando início ao prazo de vigência de execução das ações.

04/2022 Em 07/04/22 - Protocolo do plano de trabalho do Plano de Ação Integrado, em atendimento ao item b da Deliberação 578

04/2022 Em 12/04/22 - Apresentação da Proposta de atualizações metodológicas para o PMBA nos ambientes Dulcícola e Marinho, sob Ofício FR.2022.0590

05/2022 Aprovação da proposta de atualizações metodológicas do PMBA para os ambientes Dulcícola e Marinho pela CTBio em 03 de maio de 2022, pelo Ofício SEI nº 30.2022/CTBio/DIBIO/ICMBio

06/2022 Realização da 2ª Reunião do GAT-PABA, no período de 02 a 07 de junho de 2022, referente à avaliação das ações do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática do Rio Doce, com revisão das ações pelo GAT para consolidação do Sumário Executivo, resultando em 50 ações distribuídas em 17 estratégias de conservação.

06/2022 Aprovação pela CT-Bio da Proposta de atualizações metodológicas para o PMBA/ES no ambiente Costeiro, através do Ofício SEI nº 46/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio, de 20 de junho de 2022.

Fatos relevantes do Ano

06/2022 Aprovação do Plano de Trabalho do Plano de Ação Integrado através do Ofício SEI nº 49/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio de 23 de junho de 2022, em resposta aos ofícios FR.2022.0558 e FR.2022.0902.

06/2022 Deliberação CIF nº 594 de 23 de junho de 2022 aprova relatório consolidado do processo de elaboração do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, versão de março de 2022, com ressalva, e considera concluída a alínea "b" da Cláusula 164.

06/2022 Deliberação CIF nº 595 de 23 de junho de 2022 aprova o 2º Relatório Anual da cláusula 165 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), referente ao Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, discutido no âmbito da Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade – CT-BIO/CIF.

07/2022 Em 29 de julho de 2022, em resposta ao ofício SEI Nº 21/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO, foi encaminhado o ofício FR.2022.1099 juntamente com o Sumário Executivo do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce, como parte do atendimento à Cláusula 164 alínea "c".

*A CTECLET enviará nota técnica ao CIF solicitando a retirada do I07 da lista de indicadores de monitoramento do PG11, conforme ofício FR.2023. 0047.

07/2022 Em 31 de julho de 2022 foi apresentado o relatório semestral referente ao Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas Marinhas na Foz do Rio Doce executado pela Fundação Projeto Tamar, no período de 01 de agosto de 2021 a 31 de janeiro de 2022.

08/2022 Em 12 de agosto de 2022 foi encaminhado o Livro do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cláusula 164 alínea c) para avaliação da CTBio, em atendimento à solicitação realizada na 64ª Reunião Ordinária da CTBio, de 06 de julho de 2022.

08/2022 Em 18 e 19 de agosto de 2022 foi realizada a Oficina presencial do Plano de Ação Integrado da Biodiversidade Aquática.

08/2022 Em 19 de agosto de 2022 foi protocolado o Ofício FR.2022.1206 referente à apresentação do relatório e dados brutos dos Subprojetos I (Índice de integridade biótica da bacia do Rio Doce após o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro de Fundão) e IV (Variações da dieta de peixes da bacia do Rio Doce). Esses Subprojetos compõem o "Estudo da Ictiofauna da bacia do Rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco", em atendimento à Deliberação CIF n° 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.

10/2022 Em 24 de outubro de 2022 foi protocolado o Ofício FR.2022.1631 referente à apresentação de relatório e dados brutos dos Subprojetos II (Avaliação dos efeitos da presença de poluentes sobre a ecologia trófica da ictiofauna da bacia do Rio Doce) e IIIB (Dinâmica populacional e evolutiva da ictiofauna na bacia do rio Doce - Análise populacional com uso de microssatélites). Esses Subprojetos compõem o "Estudo da Ictiofauna da bacia do rio Doce após o rompimento da barragem de rejeito da Samarco", como parte do atendimento à Deliberação CIF n° 521 de 05 de agosto de 2021 e à Cláusula 165 do TTAC.

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Em 08 de novembro de 2022, foi protocolado o ofício FR.2022.1746 e seus anexos referentes ao "Relatórios de Monitoramento de Metas Técnico-Científicos Parciais – Ano II" do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental I – Porção Mineira (Chamada 10/2018 FAPEMIG).

11/2022 Em 09 de novembro de 2022, foi encaminhado o ofício FR.2022.1745 referente à reapresentação de resultados do 3° Relatório Anual do PMBA pela Rede Rio Doce Mar, em resposta ao ofício SEI nº 66/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio.

11/2022 Em 11 de novembro de 2022, foi encaminhado o ofício FR.2022.1748 referente à reapresentação do "Sumário Executivo do Plano de Ação para Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Bacia do Rio Doce" (PABA), como parte do atendimento à Cláusula 164c.

12/2022 Em 07 e 08 de dezembro de 2022, foi realizada a oficina de elaboração do Plano de Ação Integrado para a recuperação e conservação da biodiversidade aquática.

12/2022 Em 14 e 15 de dezembro de 2022, foi realizado o 2º Seminário de Avaliação da CHAMADA 10/2018 – FAPEMIG/ Fundação Renova.

12/2022 Em 28 de dezembro de 2022, foi feito o protocolo dos resultados e registro das oficinas de construção do Plano de Ação Integrado da Biodiversidade Aquática.

Indicadores

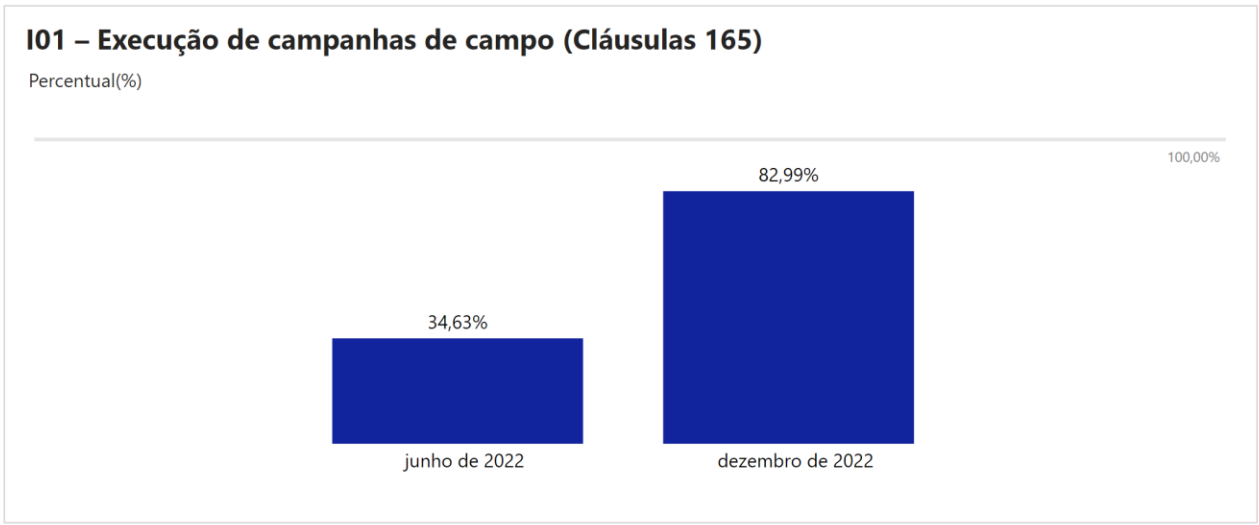


Gráfico 1: I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) - Frequência Semestral

PG029 Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

▪ Efetuar a construção e o aparelhamento de dois Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), um em Minas Gerais e outro no Espírito Santo; e
▪ Assegurar recursos para a manutenção operacional desses centros por um período de três anos, contados a partir de sua entrega, de acordo com o Plano de Gestão a ser estabelecido pelo órgão gestor responsável.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

Por solicitação do IBAMA, as atividades do CETRAS-MG estão paralisadas e as do CETRAS-ES foram retomadas, portanto não há entregas previstas para 2022.

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Recebimento de Ofício Nº 09/2022/SUPES-MG/IBAMA solicitando o sobrestamento das atividades referente ao planejamento de construção do CETRAS-MG, enquanto se processa o levantamento quanto a real viabilidade do local para atividades de manejo de fauna pelas análises de riscos iniciadas após o extravasamento do dique de Lisa da Mina Pau Branco da empresa Vallourec em 08/01/2022;

10/2022 Em 25/10/2022 foi enviado minuta de acordo de cooperação entre Renova, IBAMA ES e IEMA que irá definir papeis e responsabilidades nos processos de obtenção de autorizações e licenciamento ambiental.

10/2022 Em 04/10/2022 foi protocolado o Projeto Básico do CETRAS ES, conforme solicitações de alterações feitas pela equipe do IBAMA ES.

Indicadores

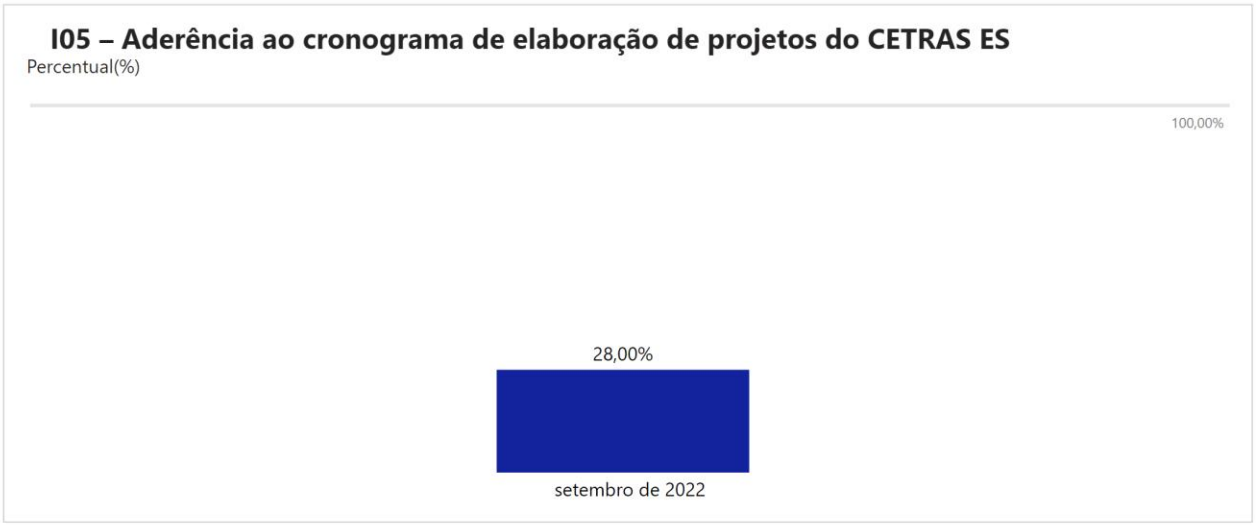


Gráfico 1: I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Frequência Semestral

O percentual de avanço do cronograma planejado para o período escalonado é de 28%. A meta de 100% de aderência ao cronograma foi cumprida.

PG030 Conservação da Biodiversidade Terrestre

Eixo Terra e Água

Objetivo

▪ Identificar e caracterizar os impactos do rompimento da barragem de Fundão sobre as espécies da biodiversidade terrestre na área de estudo;
▪ Apresentar e executar um plano de ação para conservação desta biota conforme resultados dos estudos de impacto;
▪ Demonstrar/indicar os efeitos da implementação do plano de ação sobre a biodiversidade terrestre.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

abril de 2022	Conclusão da campanha chuvosa do monitoramento
setembro de 2022	Protocolo do relatório anual de monitoria do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.
outubro de 2022	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de fauna
novembro de 2022	Protocolo do relatório da campanha chuvosa do monitoramento de flora

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- 10 **grupos faunísticos, além da flora terrestre**, monitorados na área de estudo;

- 49 **ações** definidas no **Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre.**

Fatos relevantes do Ano

04/2022 Em 29 de abril finalizaram as amostragens de fauna, flora e solos da campanha chuvosa do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre

05/2022 Como parte de execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade terrestre, foi concluído o acordo de parceria entre as Instituições de Ensino e UNESCO para o Projeto Piloto de Monitoramento Participativo da Biodiversidade:

1- UNIVALE - Curso de Eng. Civil e Ambiental – Governador Valadares/ MG
2- IEF/ Parque Estadual Sete Salões – Conselheiro Pena/ MG
3- EEEFM N. Sra da Conceição – Linhares/ES
4- CEEFMTI Bartouvino Costa – Linhares /ES
5 - IFES/ Campus Colatina - Curso Técnico em Meio Ambiente – Colatina/ES

06/2022 Em 01/06/22 foi firmada a parceria para execução do Projeto de Conservação e Manejo de espécies ameaçadas de extinção com a Universidade Federal de Viçosa - UFV e Centro de Conservação Saguis da Serra – CCSS, como parte da Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce.

06/2022 Em 15/06/22 foi firmada parceria com FBDS (Fundação Brasileira Desenvolvimento Sustentável) para realizar a avaliação do status de conservação das espécies e definir áreas prioritárias para a conservação e restauração na bacia do rio doce em atendimento aos Plano de ação da biodiversidade aquática e terrestre, PGs 28 e 30.

07/2022 Em 25/07/2022 iniciaram as atividades do Projeto Ciência Cidadã nas escolas EEEFM Nossa Senhora da Conceição e CEEFMTI Bartouvino Costa Linhares

08/2022 Em 02/08/22 ocorreu o encerramento do 2º ciclo de reuniões de monitoria do PABT

08/2022 Em 20/08/22 foi concluída primeira campanha do Projeto de Conservação e Manejo de espécies ameaçadas de extinção (UFV/CCSS)

09/2022 Em 19/09/22 foi protocolado junto a CTBio/CIF do Relatório da Oficina de Monitoria II do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre já aprovado pelo GAT.

09/2022 Em 30/09/22 houve a conclusão da amostragem de campo referente a campanha do período seco 2022 de Fauna do Monitoramento da Biodiversidade Terrestre.

10/2022 Em 15/10/2022 foi concluída a Campanha Seca de Flora e Solos 2022 com o encerramento das atividades de amostragem em campo.

10/2022 Em 17/10/2022 foi protocolado na CTBio o Relatório do Monitoramento de Fauna referente a Campanha Chuvosa 2021/2022.

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Em 09 de novembro de 2022 foi realizado o Workshop de apresentação dos resultados da Campanha Chuvosa de 2022 do PMBT - Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre.

11/2022 Em 29 de novembro de 2022 foi protocolado o Ofício FR.2022.1881 e seus anexos referentes ao Relatório de Monitoramento de Flora e Solos / Campanha chuvosa de 2021/2022, em atendimento à Cláusula 168.

12/2022 Publicação do relatório anual da UNESCO para o projeto Ciência Cidadão: Biodiversidade em 23/12/2022.

Indicadores

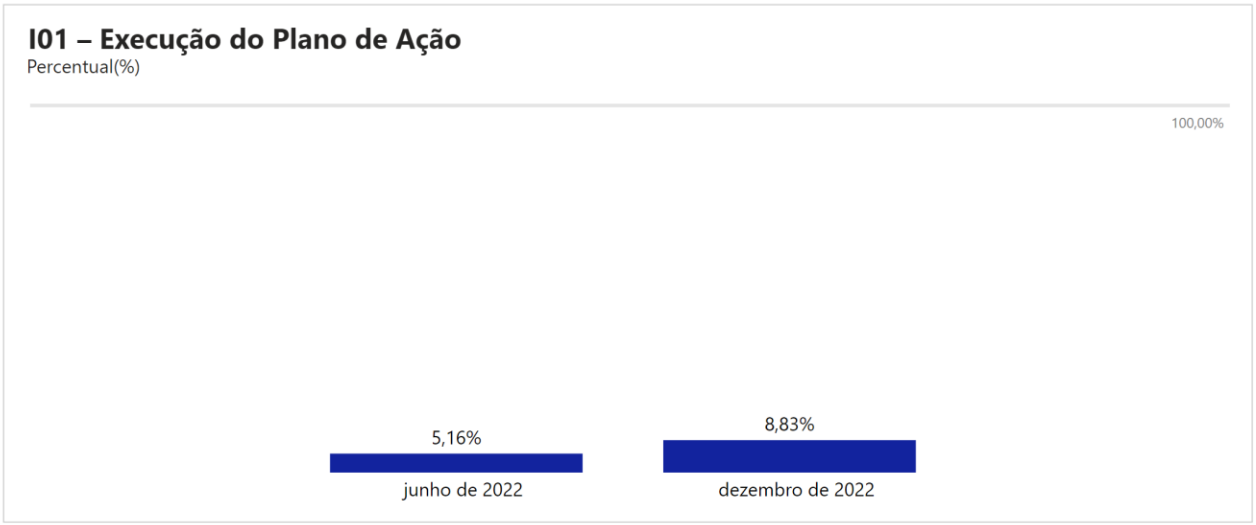


Gráfico 1: I01 – Execução do Plano de Ação - Frequência Sazonal

Em resposta ao questionamento apresentado no relatório de auditoria EY ACP.PG030.03 (Procedimento 4: Verificação de resultados e recálculo do indicador I01 aferido pela Fundação Renova), o respectivo indicador I01 será submetido a GMUD adequando o cálculo do indicador com a definição do programa a partir de 2023.

PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

Objetivo Geral:
O objetivo geral do Programa é contribuir para "acelerar o processo de recuperação da Bacia do Rio Doce, regiões estuarinas, costeiras e marinha, em especial a qualidade e a quantidade de águas nos tributários e assim na calha principal impactada"; em conformidade com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), por meio da disponibilização de recursos financeiros, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), provenientes da Cláusula nº 169 para os 39 municípios da Área Ambiental 2 e R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), provenientes da Cláusula 232 do TTAC, para atendimento ao pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE), para ações de esgotamento sanitário e de destinação de resíduos sólidos.
Objetivos Específicos:
• Disponibilizar os recursos financeiros aos municípios para as ações de elaboração ou revisão de planos municipais de saneamento básico; elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário; implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos; erradicação de lixões; implantação de aterros sanitários regionais; implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos e estações de transbordo;
• Contratar instituições financeiras públicas para realizar o repasse do recurso financeiro, para o custeio da elaboração das ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos urbanos;
• Fornecer apoio técnico aos municípios na formulação dos pleitos, na análise da relevância, viabilidade e aderência ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Plano de Gestão Integrada e Resíduos Sólidos (PGIRS); na elaboração de termos de referência e editais dos processos licitatórios, contratação e acompanhamento da execução das ações estruturantes e estruturais, bem como na prestação de contas físico-financeira das soluções implementadas;
• Fornecer capacitação aos municípios, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no andamento dos planos, projetos e obras previstos no programa.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022.

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

fevereiro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Alpercata ALPESPJ01 -Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova
abril de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Itueta ITUESPJ02-Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba
maio de 2022	Conclusão do repasse Pleito de Rio Casca RICESAO01-Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Ipaba IPBESPJ01-Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Casca RICESOB05-Complementação de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município
agosto de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Iapu IAPRSAB02-Aquisição de caminhão carroceria com caçamba basculante
setembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Naque NAQESPJ02-Elaboração de estudos de concepção, projeto básico, projeto executivo e licenciamento ambiental para a implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Sede do Município
outubro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB01-Construção de SES para o distrito de Matadouro
outubro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Rio Doce RIDESOB03-Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito do CIMVALPI CVPRSAB01-Aquisição de 29 contêineres caçamba tipo roll on off de capacidade mínima de 30m³
dezembro de 2022	Conclusão do repasse do Pleito de Galileia GALESPJ01- Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município

Nota:

Os pleitos a seguir constavam como ações no Planejamento Anual 2022 junto ao CIF, porém foram reprogramados junto aos municípios para concluir em 2023 e por isso não aparecem mais na *time line*.

AIMESCT02-Aquisição de terreno, CONESOB01-Execução de obras, PERRSOB02-Execução de obras, TUMESPJ01-Elaboração de projeto, DIOESOB03-Execução de obras, PIARSAB01-Aquisição de bens, SAPRSPM01-Planos de estudo, BUGESPJ02-Elaboração de projeto, RASESPJ02-Elaboração de projeto, AIMESPJ03-Elaboração de projeto, NAQESPM01-Planos de estudo, BALESCT01-Aquisição de terreno, MREESCT01-Aquisição de terreno, IPAESOB03-Execução de obras, GALESCT01-Aquisição de terreno, TIMRSPM03-Elaboração de plano de recuperação, DIOESCT01-Desapropriação/aquisição de área, DIORSAB01-Aquisição de equipamentos, BALRSPJ01-Elaboração dos estudos, RIDESOB02-Construção de SES para o distrito de Jorge e AIMRSPJ01-Elaboração de projeto.

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

- No ano de 2022 **foram repassados** R$ **21.981,97 Mil** para ações dos municípios*;
- No ano de 2022 foram ofertadas **0** **oficinas de capacitação** para os municípios da Área Ambiental 2;
- No ano de 2022 a equipe técnica realizou **1.028** **visitas e/ou reuniões de apoio técnico aos municípios.**

Grandes números do programa

Data	Nome do dado	Resultado	Observações
janeiro de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.611.907	Repasse para ações nos municípios de Aimorés; Córrego Novo; Dionísio; Santana do Paraíso; São Domingos do Prata; CONDOESTE.
fevereiro de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.194.123	Repasse para ações nos municípios de Alpercata; Barra Longa; Naque; Periquito; Rio Doce; CONDOESTE.
março de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.629.338	Repasse para ações nos municípios de Dionísio; Ipatinga; Rio Doce; São Domingos do Prata; CONDOESTE.
abril de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	566.078	Repasse para ações nos municípios de Bugre; Córrego Novo; Ipatinga; Itueta; Periquito; Pingo D'água.
maio de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	849.634	Repasse para ações nos municípios de Barra Longa; Bugre; Dionísio; Ipaba; Ipatinga; Periquito; Resplendor; Rio Casca; CONDOESTE.
junho de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.648.309	Repasse para ações nos municípios de Barra Longa; Dionísio; Resplendor; São Domingos do Prata; CONDOESTE.
julho de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.253.264	Repasses para ações nos municípios de Aimorés, Alpercata, Fernandes Tourinho,Galiléia, Governador Valadares, Naque, Resplendor, Rio Doce, São Domingos do Prata, Sobrália e consórcio Condoeste.
agosto de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	2.140.228	Repasse para ações nos municípios de Bugre, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Naque, Resplendor, Rio Casca, Santana do Paraíso, Timóteo e consórcio Condoeste.

Grandes números do programa

Data	Nome do dado	Resultado	Observações
setembro de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	4.849.913	Repasses para ações nos municípios de Colatina, Galiléia,Iapu,Ipatinga,Naque,Rio Casca,São Domingos do Prata, Sem Peixe e consórcio Condoeste.
outubro de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.884.319	Repasses para ações nos município de Governador Valadares, Itueta, Periquito, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, Sem Peixe e consórcio Condoeste.
novembro de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	1.661.455	Repasse para ações nos municípios de Córrego Novo, Iapu, São Domingos do Prata, Sem Peixe, Timóteo e consórcio Condoeste.
dezembro de 2022	Valores repassados para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos (mensal)	2.693.400	Repasse para ações nos municípios de Bugre, Bom Jesus do Galho, Colatina, Galileia, Fernandes Tourinho, Iapu, São Domingos do Prata e dos consórcios Condoeste e CIMVALPI.

Fatos relevantes do Ano

01/2022	Em janeiro de 2022, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 301.998,75, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
01/2022	Em janeiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R$ 247.000,00, referente a aquisição de bens;
01/2022	Em janeiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R$ 151.225,00, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
01/2022	Em janeiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R$ 502.208,48, referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário;
01/2022	Em janeiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R$ 24.845,54, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;
01/2022	Em janeiro de 2022, foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 384.629,39, referente a execução de obra para implantação da Central de Tratamento de Resíduos;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 76.252,60, referente a referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 57.291,76, referente a referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 34.859,32, referente a referente a execução de obra de sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Periquito no valor de R$ 64.823,12, referente a referente a execução de obra para melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R$ 43.500,00, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Barra Longa, no valor de R$ 38.611,61, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao município de Alpercata, no valor de R$ 50.058,23, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário;
02/2022	Em fevereiro de 2022, foi realizado repasse ao consórcio Condoeste, no valor de R$ 828.725,96, referente a referente a execução de obra para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos no município de Colatina;

Fatos relevantes do Ano

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao consórcio Condoeste, no valor de R$ 671.474,58, referente a execução de obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos;

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Dionísio, no valor de R$ 328.000,00, referente a aquisição de bens.

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R$ 130.023,06, referente a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário;

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 29.349,18, referente a execução de obras de sistema de esgotamento para o distrito de Jorge;

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 33.302,55, referente a execução de obras de sistema de esgotamento para o distrito de Matadouro;

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 96.714,72, referente a execução de obras de sistema de esgotamento para o distrito de São José de Entre Montes;

03/2022 Em março de 2022, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 340.473,83, referente a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário;

04/2022 Em abril de 2022, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R$ 200.000,00, referente a aquisição de terreno;

04/2022 Em abril de 2022, foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R$ 164.117,58, referente a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário;

04/2022 Em abril de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R$ 110.384,51, referente a execução de obras de sistema de esgotamento sanitário;

04/2022 Em abril de 2022, foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R$ 54.291,75, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

04/2022 Em abril de 2022, foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R$ 21.905,62, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

04/2022 Em abril de 2022, foi realizado repasse ao município de Pingo D'Água, no valor de R$ 15.378,60, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Rio Casca , no valor de 6.492,60, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obra;

Fatos relevantes do Ano

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Periquito , no valor de R$ 57.824,93 referente a execução de obras do sistema de esgotamento sanitário;

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipatinga , no valor de R$ 1.053,65, referente a execução de obras do sistema de esgotamento sanitário;

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Ipaba , no valor de R$45.670,65, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R$ 623.262,76 referente a execução de obras do sistema de esgotamento sanitário;

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Condoeste , no valor de R$80.319,73, referente a contratação de assessoria técnica para acompanhamento de obra.

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Bugre , no valor de R$ 19.200.10 , referente a elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário;

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Barra Longa , no valor de R$13.347,90, referente a elaboração de projeto de tratamento de resíduos

05/2022 Em maio de 2022, foi realizado repasse ao município de Resplendor , no valor de R$2.461,1, referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário;

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao município de São Domingos da Prata , no valor de R$139.965,23 referente a execução da obra de sistema de esgotamento sanitário.

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao município de Resplendor , no valor de R$108.658,34 referente a execução de obra para tratamento de resíduos sólidos.

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao município de Dionísio , no valor de R$213.834,63 referente a execução de obra do sistema de esgotamento sanitário.

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao município de Barra Longa , no valor de R$300.000,00 referente a aquisição de terreno para tratamento de resíduos sólidos.

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao município de Barra Longa , no valor de R$1.414,88 referente a elaboração de projeto de tratamento de resíduos sólidos.

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao CONSÓRCIO DO Condoeste , no valor de R$821.383,45 referente a execução de obra para tratamento de resíduos sólidos.

06/2022 Em junho de 2022, foi realizado repasse ao CONSÓRCIO DO Condoeste , no valor de R$63.052,43 referente a assessoria técnica para acompanhamento de obra para tratamento de resíduos sólidos.

Fatos relevantes do Ano

07/2022 Em julho de 2022, foram realizados os repasses referente ao pleito de elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva aos municípios do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável do Médio Rio Doce (CIMDOCE): Alpercata no valor de R$ 8.033,82, Fernandes Tourinho no valor de R$ 4.522,73, Galiléia no valor de R$ 8.033,82, Governador Valadares no valor de R$ 108.769,24 e Sobrália no valor de R$ 8.033,82.

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 143.256,01 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 98.442,10 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 66.435,74 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 140.362,30 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R$ 163.924,75 referente a execução de obras para implantação Central de Resíduos Sólidos;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R$ 143.368,93 referente a aquisição de terreno;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao município de Aimorés, no valor de R$ 38.227,35 referente a elaboração de projeto de ampliação do aterro sanitário e reforma da Usina de Triagem e Compostagem UTC;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 83.811,14 referente a assessoria de obra para implantação Central de Resíduos Sólidos;

07/2022 Em julho de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 238.042,24 referente a execução de obras para implantação Central de Resíduos Sólidos;

Fatos relevantes do Ano

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R$ 25.480,00 referente a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R$ 43.500,00 referente a Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R$ 49.215,68 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R$ 170.176,46 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R$ 5.500,00 referente a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R$ 84.390,10 referente a execução de obras de esgotamento sanitário;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Ipaba, no valor de R$ 45.670,75 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R$ 515.000,00 referente a aquisição de bens para a destinação de resíduos sólidos;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R$ 550.000,00 referente a aquisição de bens para a destinação de resíduos sólidos;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 63.052,43 referente a gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Colatina;

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 588.242,66 referente a execução das obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos de Colatina;

Fatos relevantes do Ano

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R$ 153.209,02 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 771.043,68 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R$ 1.155.743,13 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Naque, no valor de R$ 58.000,00 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Ipatinga, no valor de R$ 59.611,56 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R$ 1.241.178,39 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Galiléia, no valor de R$ 15.975,01 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R$ 17.225,39 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 63.052,43 referente ao gerenciamento da obra para implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

09/2022 Em setembro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 1.314.874,54 referente a execução de obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R$ 148.574,52 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 479.182,34 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R$ 155.000,00 referente a aquisição de bens.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 39.192,23 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de São José de Entre Montes.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 11.775,01 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Jorge.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Doce, no valor de R$ 11.418,82 referente a execução de obras de esgotamento sanitário para o distrito de Matadouro.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Rio Casca, no valor de R$ 409.058,70 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Resplendor, no valor de R$ 490.638,96 referente as obras emergenciais a serem executadas em conformidade com os projetos já aprovados para o empreendimento na fase de concessão.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Periquito, no valor de R$ 43.388,72 referente a melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Itueta, no valor de R$ 18.678,06 referente a obras para manutenção do aterro sanitário.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao município de Governador Valadares, no valor de R$ 14.359,00 referente a elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário.

10/2022 Em outubro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 63.052,43 referente ao gerenciamento da obra para implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Timóteo, no valor de R$ 6.552,00 referente a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano.

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Sem Peixe, no valor de R$ 183.529,32 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 421.100,51 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R$ 510.614,42 referente a execução de obras de esgotamento sanitário.

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao município de Córrego Novo, no valor de R$ 444.000,00 referente a aquisição de bens.

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 83.811,14 referente ao gerenciamento da obra para implantação da Central de Tratamento de Resíduos de Colatina.

11/2022 Em novembro de 2022 foi realizado repasse ao consórcio CONDOESTE, no valor de R$ 11.847,31 referente execução de obras para a implantação da Central de Tratamento de Colatina.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de São Domingos do Prata, no valor de R$ 264.783,44, referente a obra de construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de Iapu, no valor de R$ 765.193,51, referente a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de Galileia, no valor de R$ 36.905,08, referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de Fernandes Tourinho, no valor de R$ 100.000,00, referente a aquisição de terreno para a implantação do sistema de esgotamento sanitário para o distrito de Senhora da Penha;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de Colatina, no valor de R$ 59.036,64, referente a complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de Bugre, no valor de R$ 28.160,15 , referente a elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre (sede), São Lourenço, Livramento e São José do Bugre;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao município de Bom Jesus do Galho, no valor de R$ 14.339,45, referente a elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário para a sede do município e para o distrito de Revés do Belém;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao Consórcio Condoeste, no valor de R$ 63.052,43, referente ao gerenciamento da obra de implantação da primeira fase do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, no município de Colatina;

12/2022 Em dezembro de 2022, foi realizado repasse ao Consórcio CIMVALPI, no valor de R$ 1.361.933,48, referente a aquisição de 29 contêineres caçamba tipo roll on off de capacidade mínima de 30m³;

Indicadores de Resultados

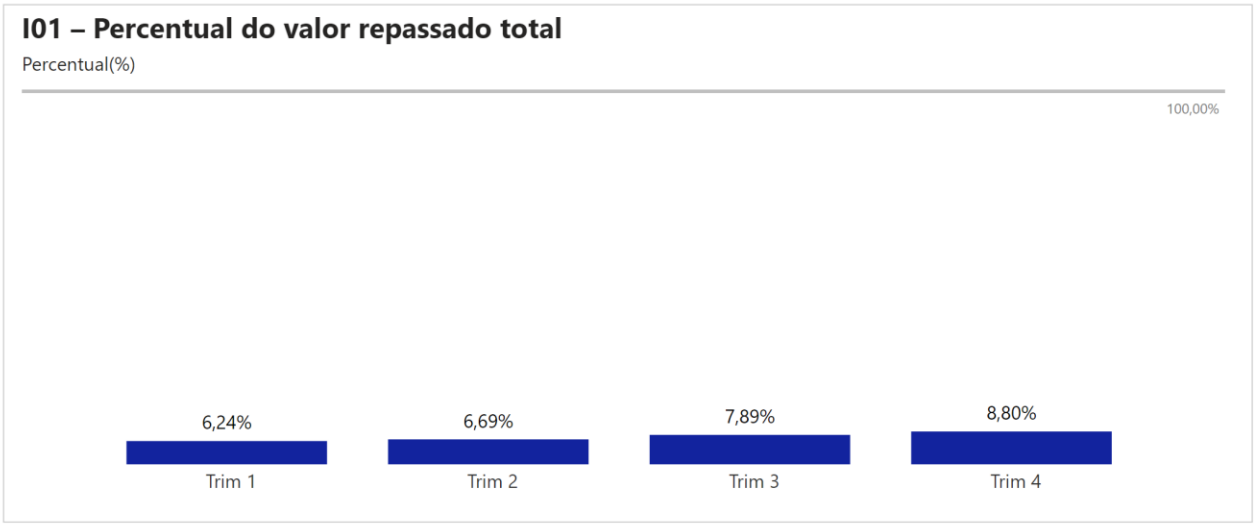


Gráfico 1:I01 – Percentual do valor repassado total - Frequência Trimestral

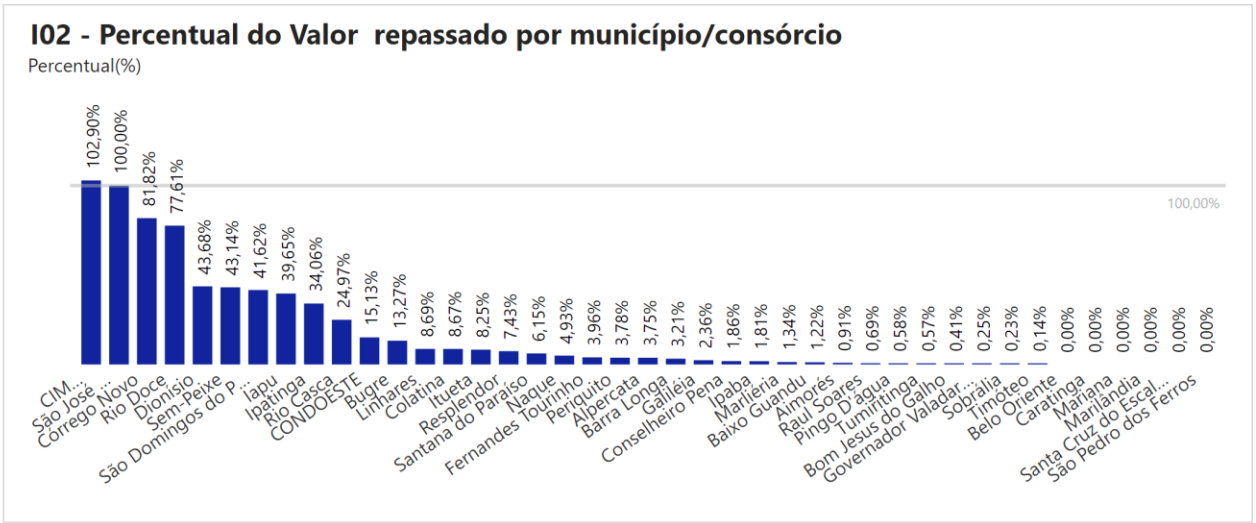


Gráfico 2: I02 - Percentual do Valor repassado por município/consórcio - Frequência Trimestral

Como premissa o valor de correção de IPCA utilizado para o cálculo foi do ano de 2021, o mesmo será atualizado na segunda quinzena de 2023, com relação ao ano de 2022.

Indicadores de Resultados

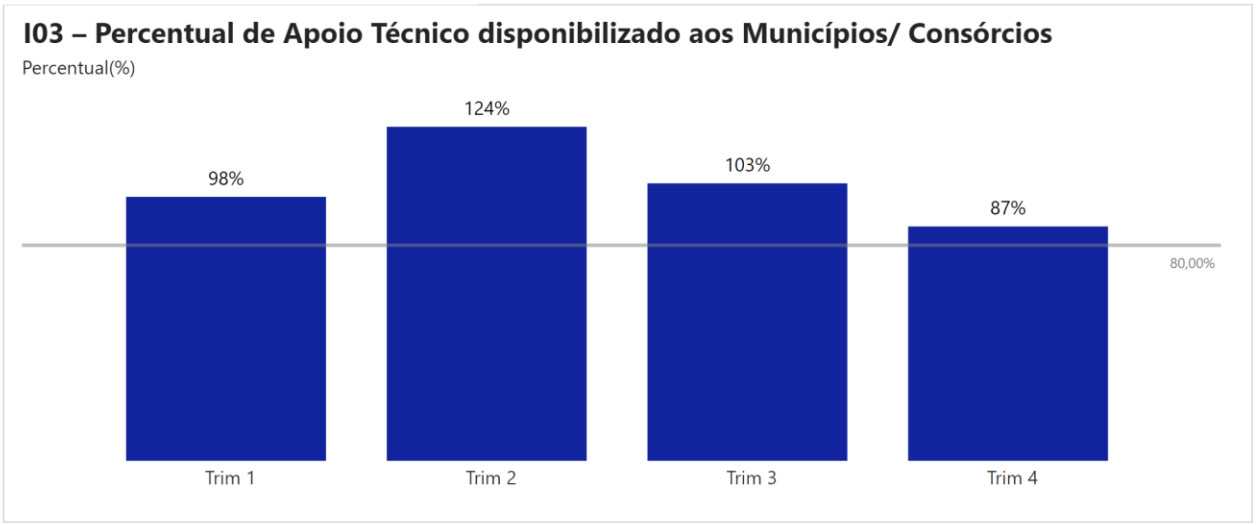


Gráfico 3: I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios - Frequência Trimestral

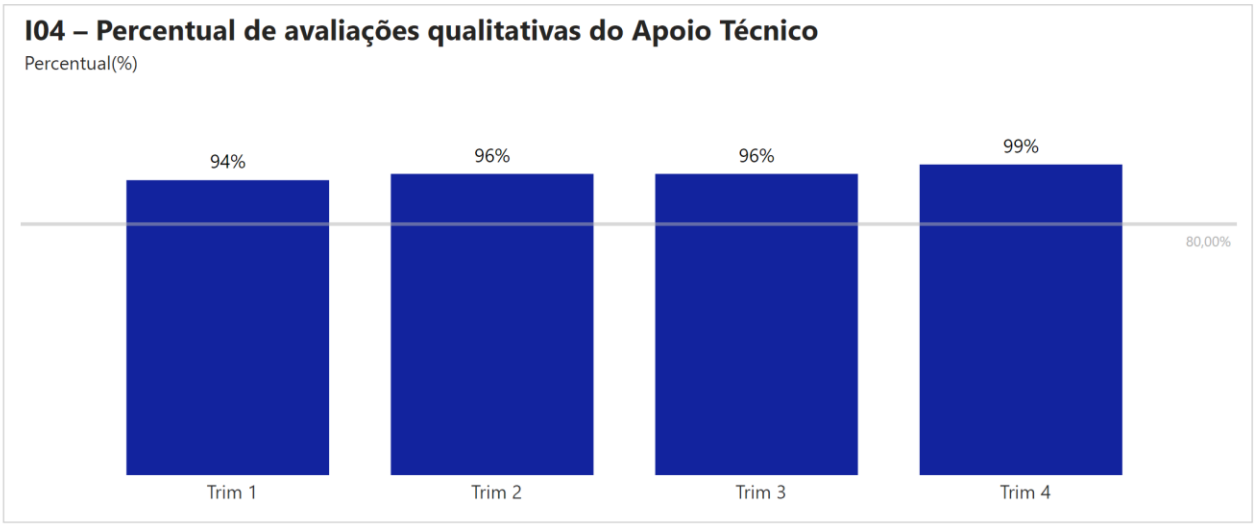


Gráfico 4: I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico - Frequência Trimestral

Indicadores de Resultados

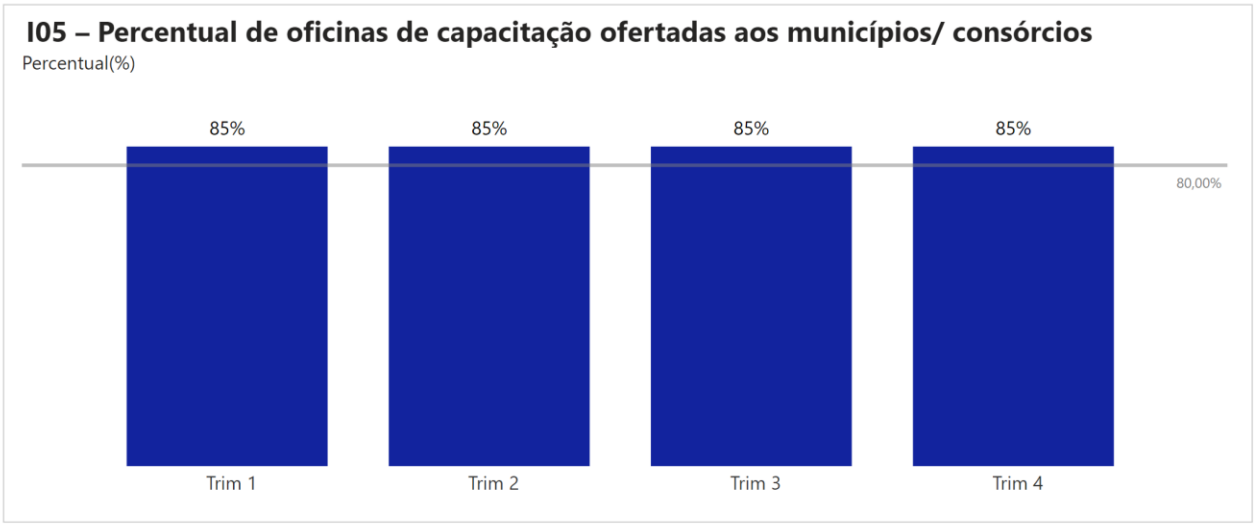


Gráfico 5: I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios - Frequência Trimestral

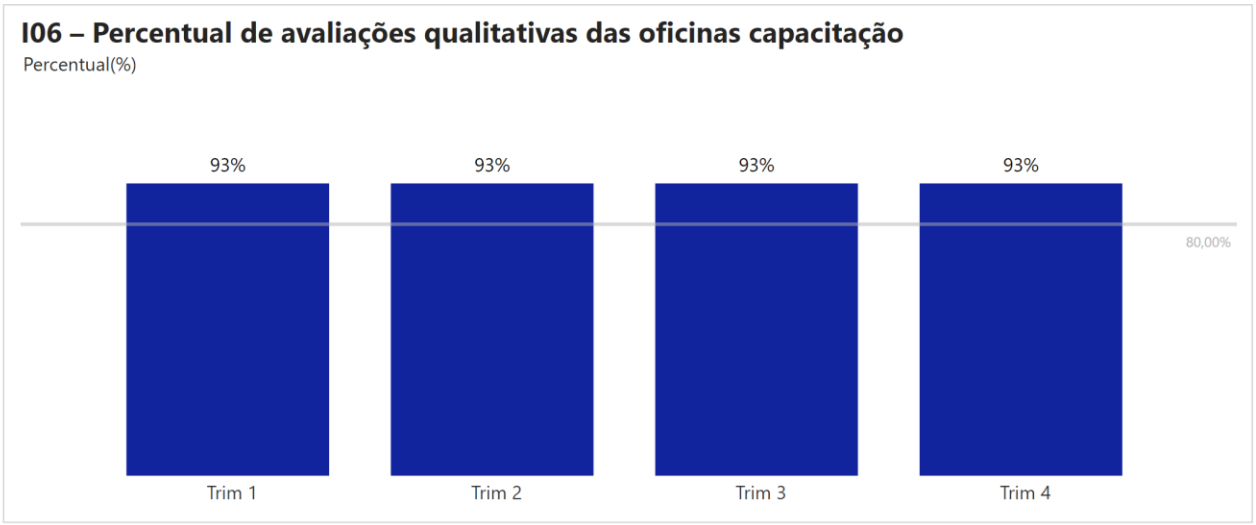


Gráfico 6106 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - Frequência Trimestral

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

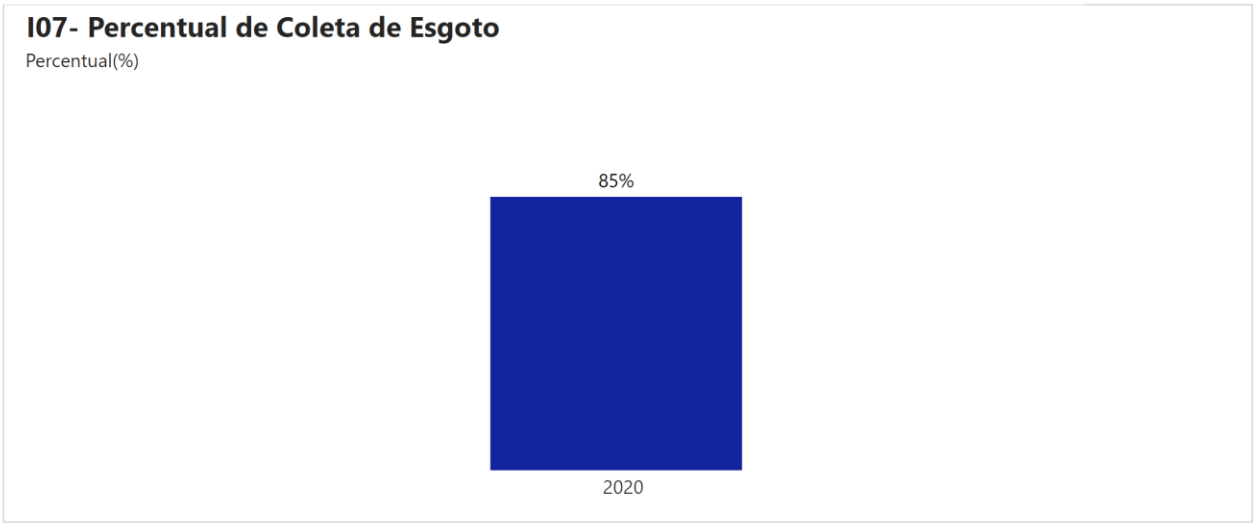


Gráfico 7: I07- Percentual de Coleta de Esgoto - Frequência Anual

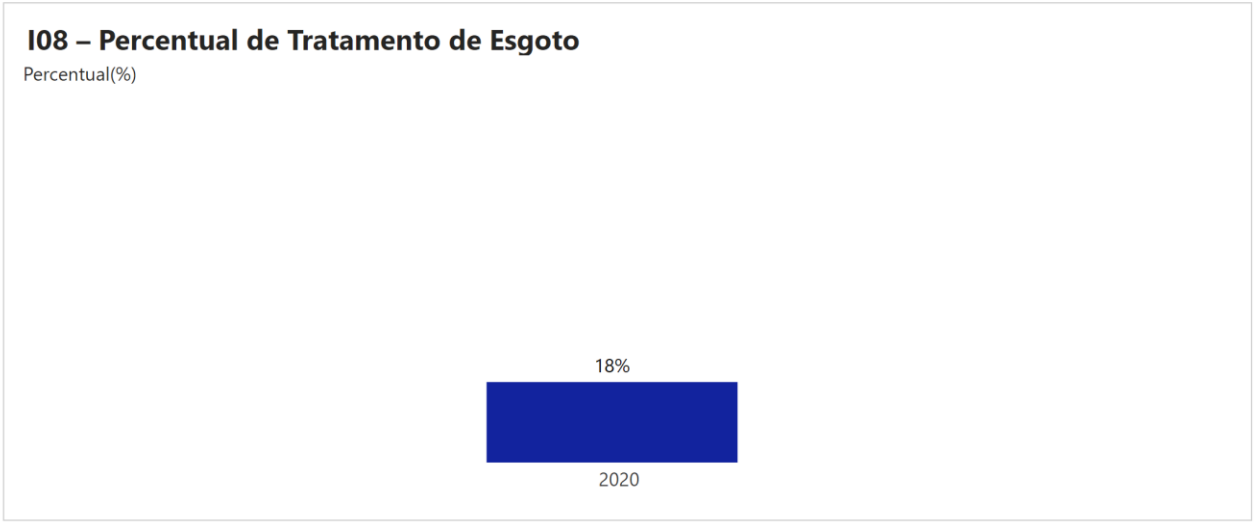


Gráfico 8: I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto - Frequência Anual

• Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento SNIS;
• I 07 No SNIS havia dados disponíveis de 11 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
• I 08 No SNIS havia dados disponíveis de 25 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

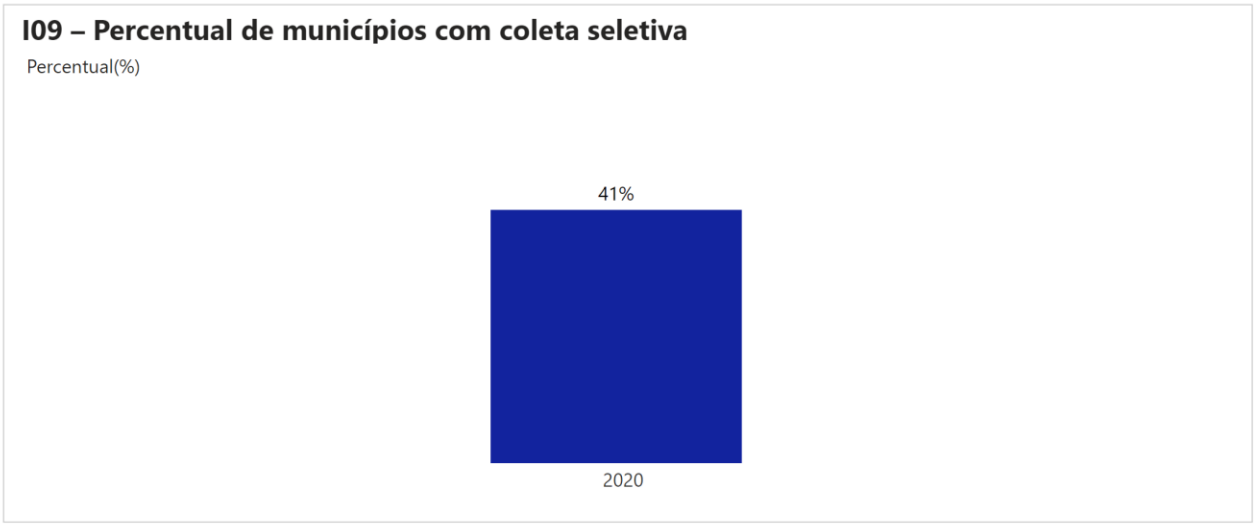


Gráfico 9: I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva - Frequência Anual

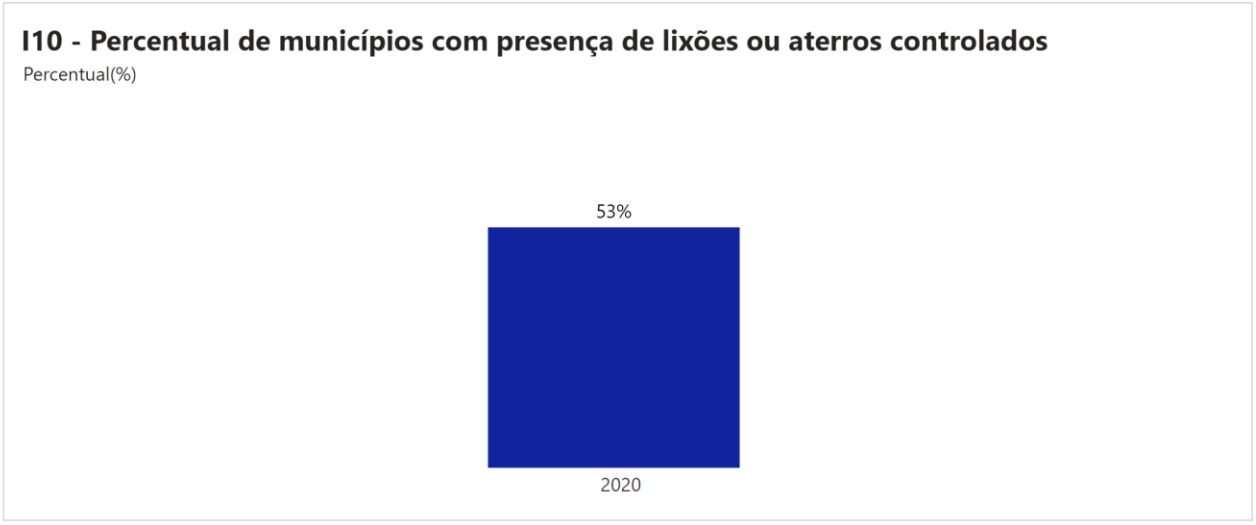


Gráfico 10: I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - Frequência Anual

• Data base 2020 Os dados referentes ao ano de 2021 ainda não foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento SNIS;
• I 09 No SNIS havia dados disponíveis de 32 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula;
• I 10 No SNIS havia dados disponíveis de 15 municípios, os demais não foram contabilizados na fórmula.

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

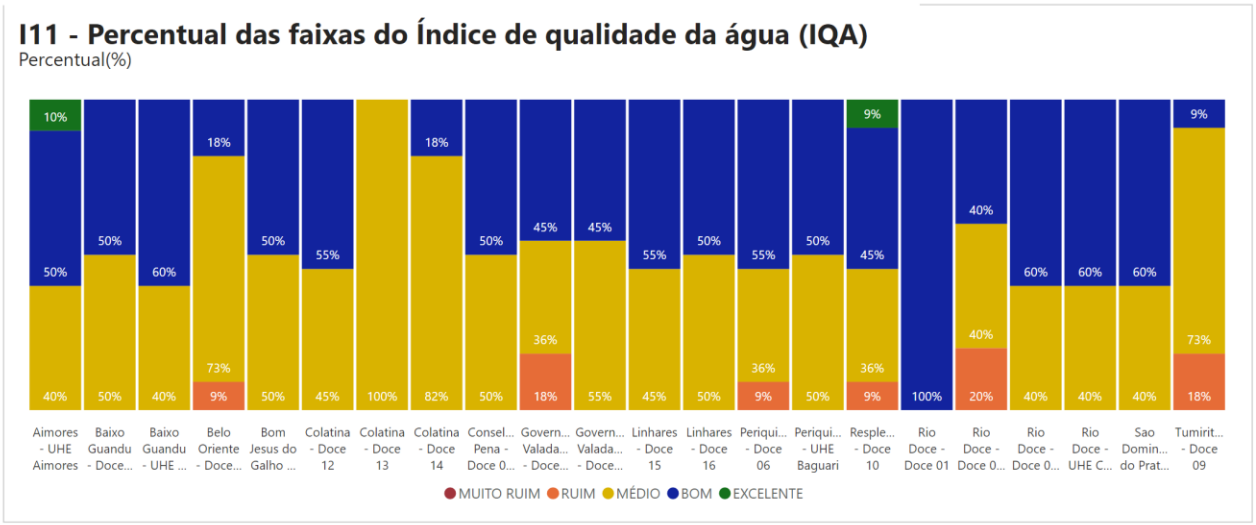


Gráfico 11: I11 - Percentual das faixas do Índice de qualidade da água (IQA)- Frequência Anual

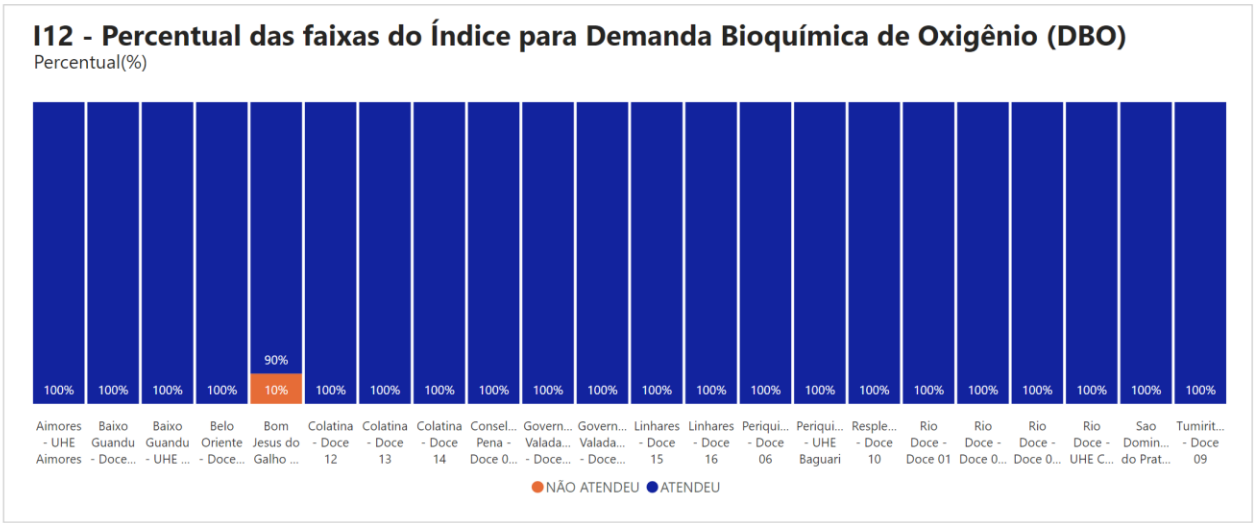


Gráfico 12: I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência Anual

Indicadores Físicos e Qualidade da Água

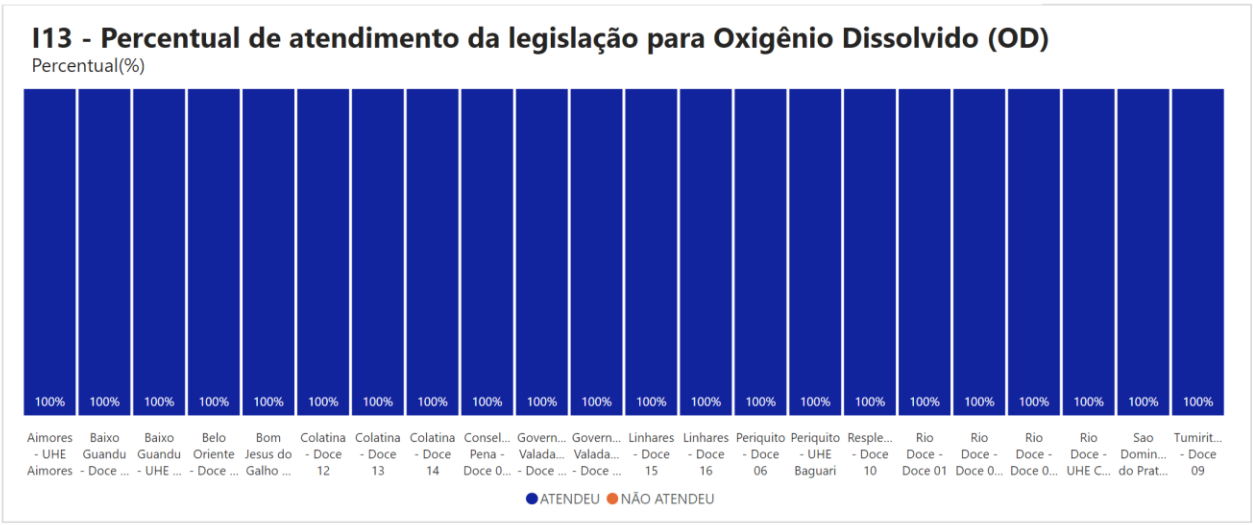


Gráfico 13: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência Anual

PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Promover alternativas de captação e adução de água, visando garantir, em parte, o reestabelecimento do abastecimento de água com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de cunhos reparatório e compensatório, em municípios/localidades que tiveram seus sistemas de abastecimento temporariamente inviabilizados.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022



Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

. 17 sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados;

. 18 adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas);

Fatos relevantes do Ano

As ações da Cláusula nº171 do TTAC, que embasam a atuação do Programa 32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento Público de Água, estão judicializadas desde março de 2020, no contexto do Eixo Prioritário nº 9, da Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais. As tratativas relativas às ações sob controle e supervisão judicial, inclusive as que se referem aos prazos, estão sendo orientadas nesse âmbito.

Em função da judicialização do Programa 32 foram realizadas visitas técnicas pela Perícia da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da SJMG, conforme descrito acima.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Na semana do dia 10 de janeiro de 2022 a equipe de perícia realizou visitas técnicas periciais nas localidades de Ipaba e Caratinga, em casas dos beneficiários atendidos com fornecimento de água.

01/2022 Na semana do dia 24 de janeiro de 2022 a equipe de perícia visitou as seguintes localidades, em casas dos atendidos com fornecimento de água Linhares, Ipaba, Caratinga, Santana do Paraíso, Aimorés, Itueta e Resplendor.

01/2022 Em 26 de janeiro de 2022 a equipe de perícia visitou estações de tratamento de água das localidades de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), município de Belo Oriente/MG, e São Vitor, município de Governador Valadares/MG, para entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em andamento e já realizados.

01/2022 Em 27 de janeiro de 2022 a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras em andamento da captação alternativa (adutora) na sede de Governador Valadares/MG.

01/2022 Em 31 de janeiro a equipe de perícia realizou visita técnica ao sistema de tratamento de água da localidade de Regência, município de Linhares.

02/2022 Na semana do dia 07 de fevereiro de 2022 a equipe de perícia realizou visitas técnicas periciais nas
localidades e casas dos beneficiários pelo abastecimento de água que constam no programa da
Fundação Renova dos municípios de Ipaba, Caratinga, Santana do Paraíso que correspondem ao
Território III do Item 2 da Decisão Judicial.

02/2022 Na semana do dia 14 de fevereiro de 2022 a equipe de perícia deu continuidade ao processamento
das informações coletadas nas visitas técnicas periciais nas localidades e casas dos beneficiários pelo
abastecimento de água que constam no programa da Fundação Renova dos municípios de Ipaba,
Caratinga, Santana do Paraíso que correspondem ao Território III do Item 2 da Decisão Judicial.

02/2022 Na semana do dia 21 de fevereiro de 2022, a equipe de perícia retornou as atividades referentes à Etapa 2.2, Situação Fática no Território IV do Item 2 da Decisão Judicial. A localidade visitada foi Pedra Lorena, no município de Aimorés.

02/2022 No dia 24 de fevereiro de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das
25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

Fatos relevantes do Ano

03/2022 No dia 07 de março de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

03/2022 No dia 08 de março de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Santo Antônio do Rio Doce, município de Aimorés/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

03/2022 Foi concluída a perfuração do poço de Baixo Guandu-Mascarenhas em 16/03.

03/2022 Foi concluída a perfuração do poço Marilândia- Boninsegna em 19/03.

04/2022 A equipe de perícia juntou nos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais (ID 1009718279) em 01 de abril , Etapa 2.2, Situação Fática, referentes ao Território IV, correspondente às comunidades de Córrego do Baixio, Pedra Ilha Lorena, Itueta Velha e Córrego Barra Provisória, dos municípios de Aimorés, Itueta e Resplendor/MG.

04/2022 Realizada sessão técnica mensal com a AECOM em 05 de abril para apresentação do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

04/2022 A equipe de Perícia deu continuidade às visitas técnicas periciais em 11 de abril, nas localidades e casas dos beneficiários contemplados no programa de abastecimento de água da Fundação Renova no Território V, que corresponde aos municípios de Baixo Guandu e Colatina

04/2022 Realizada sessão técnica com a AECOM em 11 de abril para apresentação do resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Sede do município de Baixo Guandu/ES e da localidade Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES.

04/2022 A equipe de perícia realizou visita técnica em 13 de abril na estação de tratamento de água da localidade Sede do município de Baixo Guandu/ES e da localidade Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

04/2022 Conclusão do teste de vazão e de interferência dos poços C-02 e C-03 de Cachoeira Escura em 14 de abril.

Fatos relevantes do Ano

04/2022 A equipe de perícia juntou nos autos do processo o Relatório Nº 13 – Desenvolvimento das Atividades de Monitoramento da Qualidade da Água (ID 1031876843)em 18 de abril

04/2022 Em 18 de abril foi entregue o relatório de perfuração do poço de Marilandia-Bonisegna.

04/2022 Em 18 de abril foi entregue o relatório de perfuração do poço de Baixo Guandu-Mascarenhas.

04/2022 Em 27 de abril foi entregue o relatório de qualidade de água do poço perfurado em Baixo Guandu- Mascarenhas.

04/2022 Em 27 de abril foi entregue o relatório de qualidade de água do poço perfurado em Marilândia- Bonisegna

05/2022 Nas semanas do dia 02, 09 e 23 de maio de 2022, a equipe de perícia realizou as visitas técnicas periciais nas localidades e casas dos beneficiários contemplados no programa de abastecimento de água da Fundação Renova no Território VI.

05/2022 No dia 04 de maio de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG (ID 1057863265).

05/2022 • No dia 09 de maio de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

05/2022 Nos dias 11 e 12 de maio de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

05/2022 No dia 20 de maio de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Relatório Nº15 – Desenvolvimento das Atividades de Monitoramento da Qualidade da Água (ID 1093544271), informando as atividades desenvolvidas pela equipe de perícia para o início do monitoramento da qualidade da água.

05/2022 No dia 31 de maio de 2022, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Gesteira, município de Barra Longa/MG.

Fatos relevantes do Ano

06/2022 No dia 02 de junho de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Gesteira, município de Barra Longa/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

06/2022 No dia 06 de junho de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

06/2022 Em referência ao Território V, composto pelos municípios de Baixo Guandu/ES e Colatina/ES, no dia 08 de junho de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais R00 (ID 1132910262) referente à Etapa 2.2 (Situação Fática) do Item 2 da Decisão Judicial correspondente às comunidades de Córrego Boa Esperança, Córrego Catita, Córrego da Piaba, Córrego do Lavra, Córrego Queixadão, Fazenda Fontenelle, Fazenda Porto Esperança, Fazenda Sapucaia, Ilha Bela Vista, Itapina, Maria Ortiz, Mascarenhas, Porto Belo e Santa Joana.

06/2022 Nos dias 08 e 09 de junho de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

06/2022 Realizada a assinatura do Termo de Compromisso do município de Marilândia/ES.

06/2022 No dia 20 de junho de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) referente à localidade Sede do município de Baixo Guandu/ES (ID 1154130763).

06/2022 Conforme conversado e acordado com a Prefeitura do município de Rio Doce, a Fundação Renova oficializa o acordo para desmobilização do caminhão pipa, tendo em vista que o mesmo se encontra a disposição, contudo, sem demandas naquela localidade.

07/2022 No dia 01 de julho de 2022 foi realizada a assinatura do Termo de Compromisso do município de Baixo Guandu-ES.

07/2022 No dia 05 de julho de 2022 foi realizada a sessão técnica mensal, onde é apresentada a atualização do resumo do dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

07/2022 Nos dias 06 e 07 de julho de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

Fatos relevantes do Ano

07/2022 Em referência ao Território VI, composto pelos municípios de Galiléia/MG e Governador Valadares/ES, no dia 08 de julho de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais R00 (ID 1200106249) referente à Etapa 2.2 (Situação Fática) do Item 2 da Decisão Judicial.

07/2022 No dia 12 de julho de 2022 foi realizada a sessão técnica com um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES.

07/2022 No dia 14 de julho de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

07/2022 No dia 19 de julho de 2022 foi realizada a assinatura do Termo de Compromisso da localidade de Gesteira Mutirão-município de Barra Longa-MG.

08/2022 No dia 03 de agosto de 2022 a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades do Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

08/2022 Nos dias 04 e 05 de agosto de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica nas obras da captação alternativa (adutora) da localidade Sede do município de Governador Valadares/MG, para avaliação e acompanhamento das atividades de execução de obra realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3, Obras, Comissionamento e Monitoramento.

08/2022 No dia 09 de agosto de 2022, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Ipaba do Paraíso, município de Santana do Paraíso/MG e da localidade Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho/MG.

08/2022 No 12 de agosto a Prefeitura de Tumiritinga assinou os Termos de Compromisso das localidades de São Tomé do Rio Doce e da sede de Tumiritinga.

08/2022 No dia 16 de agosto de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Ipaba do Paraíso, município de Santana do Paraíso/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

08/2022 Nos dias 16 a 19 de agosto de 2022, a equipe de perícia deu/dará continuidade às visitas técnicas periciais junto aos beneficiários cadastrados no programa de abastecimento de água da Fundação Renova para o Território VII, que corresponde à Comunidade Quilombola do Degredo (Linhares/ES) (ID 1260919781).

Fatos relevantes do Ano

08/2022 No dia 17 de agosto de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizadas.

08/2022 Em agosto de 2022 foi realizado repasse ao município de Santana do Paraíso, no valor de R$ 43.500,00 referente a Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

09/2022 No dia 15 de setembro de 2022, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimentos na região da localidade Sede do município de Tumiritinga/MG.

09/2022 No dia 16 de setembro de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos do Plano de Trabalho referente à localidade Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES (ID 1283468869).

09/2022 No dia 16 de setembro de 2022, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

09/2022 No dia 19 de setembro de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica na estação de tratamento de água da localidade Sede do município de Tumiritinga/MG, para o entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras em desenvolvimento e realizados pela Fundação Renova e subcontratados.

09/2022 Nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica para acompanhamento da execução de obras realizadas pela Fundação Renova e subcontratados, atividades correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, nas seguintes localidades: Sede do município de Governador Valadares/MG, São Tome do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG, Pedra Corrida, município de Periquito/MG e Sede do município de Galiléia/MG.

09/2022 No dia 20 de setembro de 2022, a equipe de perícia juntou nos autos do processo a revisão dos Laudos complementares (ID 1285105889) – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para as localidades Sede de Resplendor, Sede de Galiléia, Sede de Governador Valadares, Sede de Linhares, Pedra Corrida (Periquito), Sede de Itueta, Perpétuo Socorro (Belo Oriente) e Regência (Linhares), conforme previsto no Relatório Nº 19 (ID 1245437782).

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Em 03 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos referente à localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES (ID 1290321364).

10/2022 Em 05 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial a emissão inicial dos Laudos complementares – Esclarecimentos aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para as localidades Sede de Baixo Guandu/ES, Gesteira, município de Barra Longa/MG e Mascarenhas, município de Baixo Guandu/ES (ID 1291515362).

10/2022 Em 05 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial a revisão dos Laudos complementares – Esclarecimentos aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para as localidades São Vítor, município de Governador Valadares/MG, São Tomé do Rio Doce, município de Tumiritinga/MG e Santo Antônio do Rio Doce, município de Aimorés/MG (ID 1291515362).

10/2022 Em 06 de outubro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES (ID 1291959881).

11/2022 Em 03 de novembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Relatório Nº 23 – Acompanhamento de Obras 01 (ID 1301893878), referente às atividades periciais de acompanhamento de obras entre o janeiro e agosto de 2022, correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho, da localidade Sede de Governador Valadares/MG.

11/2022 Em 03 de novembro de 2022, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia um resumo do histórico, da situação fática, dos projetos, das obras e do programa de monitoramento de água e sedimento na região da localidade Sede do município de Alpercata/MG.

11/2022 Em 04 de novembro de 2022, em reunião por videoconferência via Microsoft Teams, a Fundação Renova apresentou para a equipe da perícia a atualização do resumo do status dos projetos e obras das 25 localidades relacionadas no Item 1 da Decisão Judicial do Eixo Prioritário Nº 9.

11/2022 Em 07 de novembro de 2022, a equipe de perícia realizou visita técnica pericial no sistema de abastecimento de água da localidade Sede do município de Alpercata/MG, para entendimento do histórico, situação fática e administrativa, projetos e obras realizados e em desenvolvimento.

11/2022 Em 09 de novembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos referente à localidade Senhora da Penha, município de Fernandes Tourinho/MG (ID 1304480877).

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Em 02 de dezembro de 2022, em referência à Etapa 2.2 – Situação Fática, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais Revisão R00_A (ID 1313768909), referentes ao Território IV, correspondente às comunidades de Itueta Velha, Fazenda Boa Esperança, Distrito de Santo Antônio do Rio Doce, Pedra Lorena, Fazenda Ilha Pedra Lorena, Córrego Barra Provisória e Fazenda Boa Vista, localizadas nos municípios de Aimorés/MG, Itueta/MG e Resplendor/MG.

12/2022 Em 06 de dezembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos referente à localidade Pedras, município de Mariana/MG (ID 1312244367).

12/2022 Em 06 de dezembro de 2022, em referência à Etapa 2.2 – Situação Fática, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais Revisão R00_A (ID 1314896374), Etapa 2.2 – Situação Fática, referentes ao Território III, correspondente às comunidades de Baixada Coronel Roberto e Ipaba do Paraíso, localizadas nos municípios de Ipaba, Caratinga e Santana do Paraíso/MG.

12/2022 Em 20 de dezembro de 2022, em referência à Etapa 2.2 – Situação Fática, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais Revisão R00_A, referente ao Eixo Prioritário Nº 9 – Abastecimento de Água para Consumo Humano, Etapa 2.2 (Situação Fática) do Território II, referente ao município de Linhares, Espírito Santo.

11/2022 Em 23 de novembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial Laudos Técnicos Periciais Revisão R00 referente ao Eixo Prioritário Nº 9 – Abastecimento de Água para Consumo Humano, Etapa 2.2 (Situação Fática) do Território VII, referente à Comunidade Quilombola do Degredo, no município de Linhares, Espírito Santo.

11/2022 Em 29 de novembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Complementar de Quesitos da localidade Ipaba do Paraíso, município de Santana do Paraíso/MG, referente aos esclarecimentos aos Quesitos das Partes Interessadas.

11/2022 Em 29 de novembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos referente à localidade Camargos, município de Mariana/MG.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Em 12 de dezembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Relatório Nº 25 – Acompanhamento de Obras 02 (ID 1316817352), referente às atividades periciais de acompanhamento de obras contemplando o período de referência de setembro e outubro de 2022, correlatas à Etapa 1.3 – Obras, Comissionamento e Monitoramento do Plano de Trabalho.

12/2022 Em 13 de dezembro de 2022, em referência à Etapa 2.2 – Situação Fática, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais Revisão R00_A (ID 1317159875), referentes ao Território I, correspondente às comunidades de Bento Rodrigues, Ponte do Gama, Gesteira, Sede de Barra Longa, Santana do Deserto e Camões, localizadas nos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Rio Doce/MG e Sem Peixe/MG.

12/2022 Em 14 de dezembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo complementar – Esclarecimento aos Quesitos das Partes Interessadas da Etapa 1.2 (Análise dos Cronogramas e Projetos) para a localidade Camargos, município de Mariana/MG (ID 1318057388).

12/2022 Em 14 de dezembro de 2022, em referência à Etapa 2.2 – Situação Fática, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial os Laudos Técnicos Periciais Revisão R00_A (ID 1318057376), referentes ao Território V, correspondente às comunidades de Córrego Boa Esperança, Córrego Catita, Córrego da Piaba, Córrego do Lavra, Córrego Queixadão, Fazenda Fontenelle, Fazenda Porto Esperança, Fazenda Sapucaia, Ilha Bela Vista, Itapina, Maria Ortiz, Mascarenhas, Porto Belo e Santa Joana, localizadas nos municípios de Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.

12/2022 Em 19 de dezembro de 2022 – Decisão judicial intimando as Partes para apresentarem manifestação clara, específica, pormenorizada e exaustiva a respeito de todos os quesitos em relação aos quais esclarecimentos sejam necessários, formando uma lista de quesitos e pedidos de esclarecimentos que abordem tanto a questão do mérito da perícia (solicitações de esclarecimentos sobre escopo, metodologia, encaminhamento dos trabalhos etc.), bem como também os honorários periciais, para todas as fases e etapas.

12/2022 Em 19 de dezembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Laudo Técnico Pericial da Etapa 1.2 – Análise dos Cronogramas e Projetos referente à localidade Sede do município de Tumiritinga/MG (ID 1319861347).

12/2022 Em 19 de dezembro de 2022, a equipe de perícia juntou aos autos do processo judicial o Relatório Nº 27 – Análise Complementar da Documentação de Projeto (ID 1319903893).

12/2022 No dia 15 de dezembro de 2022, a Secretaria Municipal de Obras da cidade de Baixo Guandu, estado do Espirito Santo, emitiu a autorização para início das obras para implantação da adutora de captação de água no Rio Guandu.

Indicadores

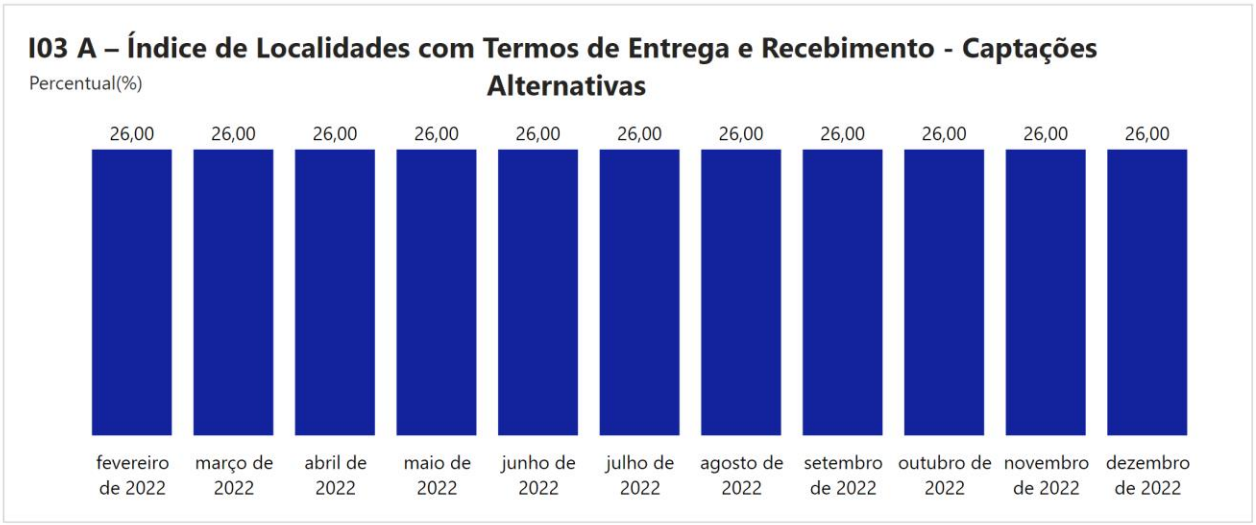


Gráfico 1: I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas - Frequência Mensal

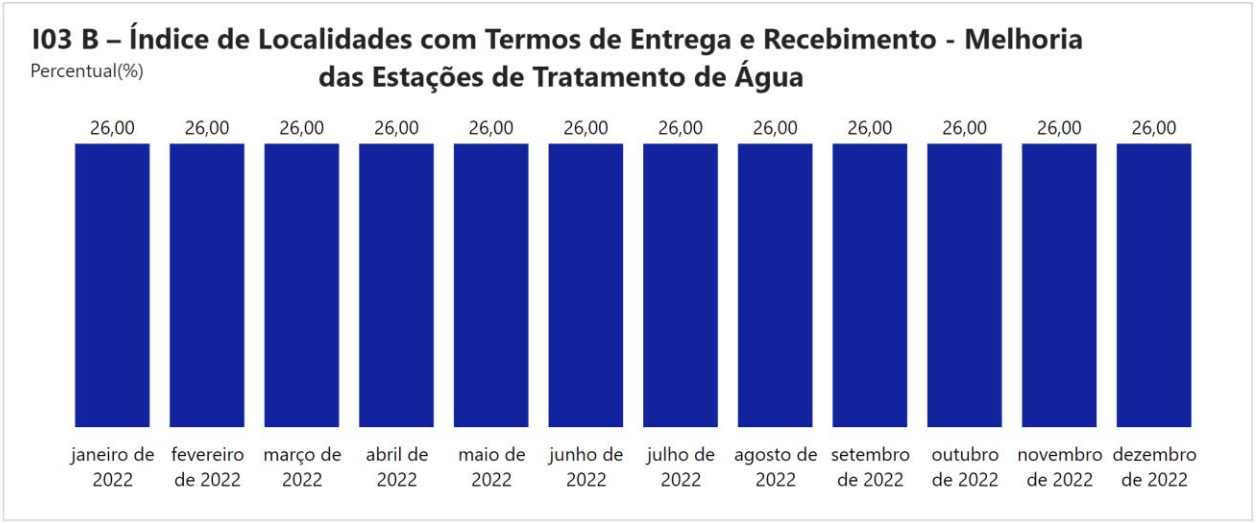


Gráfico 2: I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Frequência Mensal

Indicadores

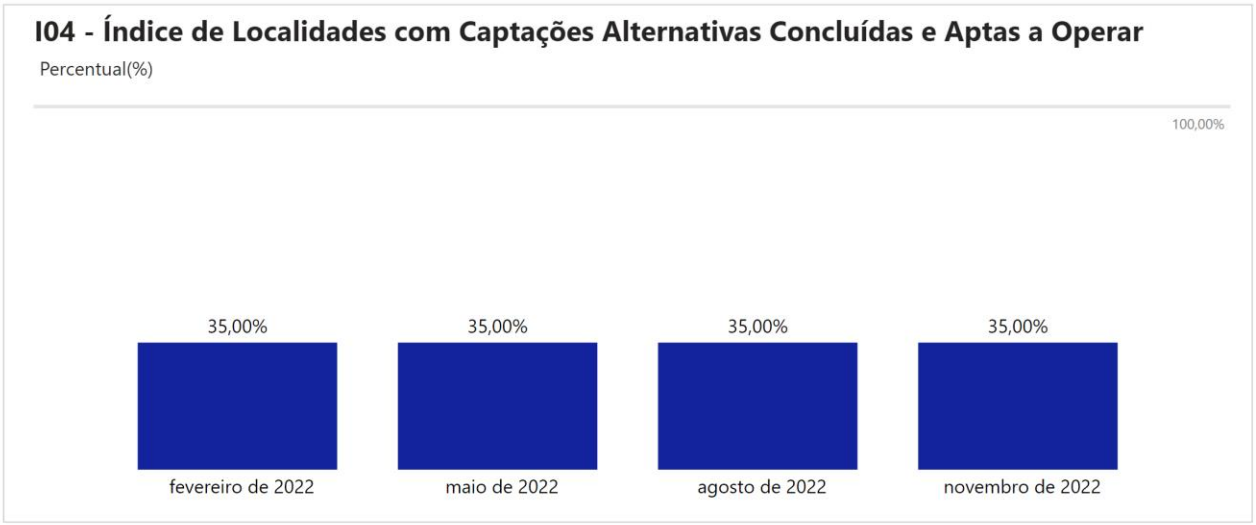


Gráfico 3: I04 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar - Frequência Trimestral

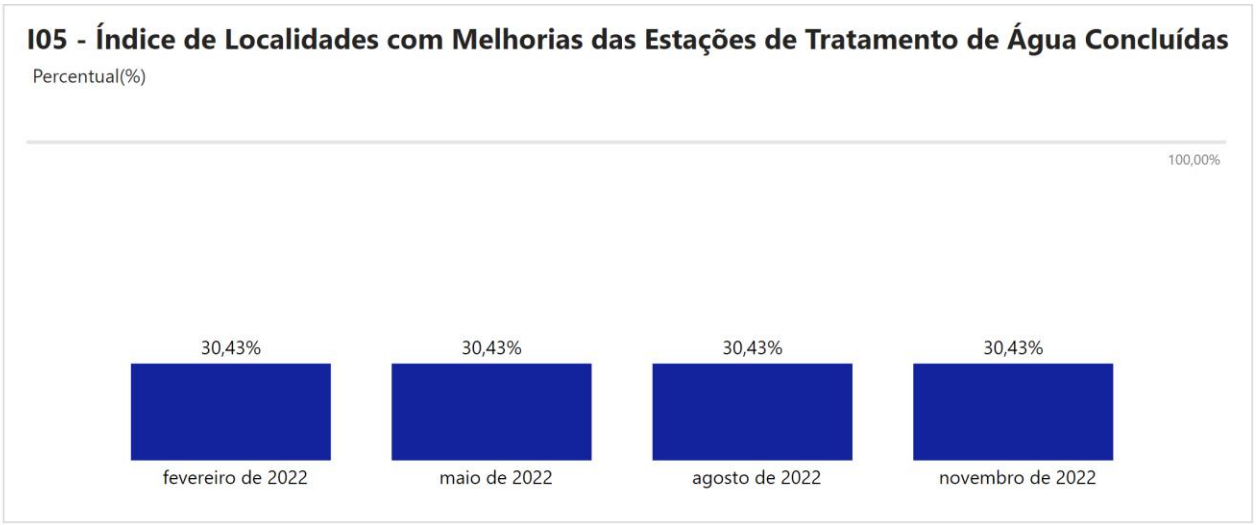


Gráfico 4: I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas - Frequência Trimestral

PG033 Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

janeiro de 2022	Conclusão da Formação em Agroecologia de Assentados da Reforma Agrária (Nível Formadores) – MG
julho de 2022	Finalização do 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens
dezembro de 2022	Finalização da realização do curso de aperfeiçoamento na Turma 1 com parceria da UFMG/UFOP
dezembro de 2022	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 2) de Assentados da Reforma Agrária - ES
dezembro de 2022	Conclusão do Curso de Formação de Base (Ano 3) de Assentados da Reforma Agrária - MG

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Conclusão da 4ª turma do curso de Formação de Formadores em Agroecologia em assentamentos da reforma agrária em Minas Gerais, finalizando, assim, essa modalidade de formação.

05/2022 Implementação dos projetos selecionados nas áreas 1(CPCD) e 5(LUMIAR) do projeto Lideranças Jovens.

06/2022 Implementação dos projetos selecionados nas áreas 2 (FGPA) e 4 (AMEFA) do projeto Lideranças Jovens.

07/2022 Implementação dos projetos selecionados na área 3 (CIEDS), assim finalizando o 1º Ciclo do Projeto de Formação de Lideranças Jovens.

12/2022 Conclusão da formação de base Agroecológica em assentamentos da reforma agrária em Minas Gerais, finalizando assim, essa modalidade de formação

12/2022 Conclusão da primeira turma do curso de aperfeiçoamento em Minas Gerais

Indicadores



Gráfico 1: I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Frequência Semestral

PG034 Preparação para Emergências Ambientais

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	173	§1º	Encerrada
Cláusula	173	§2º	Encerrada

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

março de 2022	Início do Ciclo de Formação Continuada - Cursos de longa duração
outubro de 2022	Elaboração dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) para Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
outubro de 2022	Conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de Riscos (CGR) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação do Projeto Escola Segura nas 10 escolas dos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG.
dezembro de 2022	Conclusão da Capacitação do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

03/2022 Validado pelas Defesas Civis a proposta do Plano de Trabalho para 2022, dos projetos Escola Segura, Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC e Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC

03/2022 Realizado Aula Inaugural dos Cursos de tecnólogos de Gestão Pública e Segurança Pública do projeto Ciclo de Formação Continuada das Defesas Civis

05/2022 Conclusão da etapa de Capacitação dos Técnicos municipais em Mapeamento e Gestão de Risco, dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado

06/2022 Realizado treinamento de primeiros socorros – Nível Básico/Intermediário nas escolas do projeto Escola Segura e comunidades do projeto Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil.

07/2022 Realizado o treinamento de Primeiros Socorros – nível avançado (2020 e 2021) - Projeto Comitê Gestor de Riscos, ministrado pela Cruz Vermelha.

Fatos relevantes do Ano

08/2022 Realizado a oficina de Ciclo da gestão de riscos e desastres, nas escolas do Projeto Escola Segura.

08/2022 Realizado a oficina de mídias sociais do Projeto Comunidade Conectada - nível básico, nos NUPDEC's de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.

08/2022 Realizado a oficina de Primeiro Socorros - Lei Lucas, nas escolas do Projeto Escola Segura.

10/2022 Conclusão e entrega dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR)

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Conclusão da realização dos Simulados Nível III (evacuação) do Projeto Escola Segura.

11/2022 Realização de cursos do projeto de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil/CGR
- Elaboração de Projetos e Captação de Recursos.
- Política de ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano.
- Básico de prevenção, controle e atendimento emergencial em acidentes com produtos perigosos.
- Treinamento em uso de ferramentas digitais para operacionalização da GRD – Aplicativo PROX.
- Atividade Prática/Visita Técnica – Intercâmbio de conhecimento Defesa Civil de Campinas – COMPDECS (Visita à Defesa Civil de Campinas.

12/2022 Apoio na realização de eventos voltados para os trabalhos de prevenção e preparação conforme atendimento a Defesa Civil de Marina por meio de disponibilização de 1.000 cartilhas sobre inundações e um tapete de jogos Perigolândia.

12/2022 Atividades práticas - Oficina de Memória do Desastre projeto Escola Segura e dos NUPDECs (Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil Comunitário).

12/2022 Implementação e encerramento do período de manutenção do Comitê Gestor de Risco (CGR).

12/2022 Workshops: Boas Práticas - Caminho percorrido do conhecimento às experiências práticas do projeto Escola Segura e dos NUPDECs (Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil Comunitário).

Indicadores

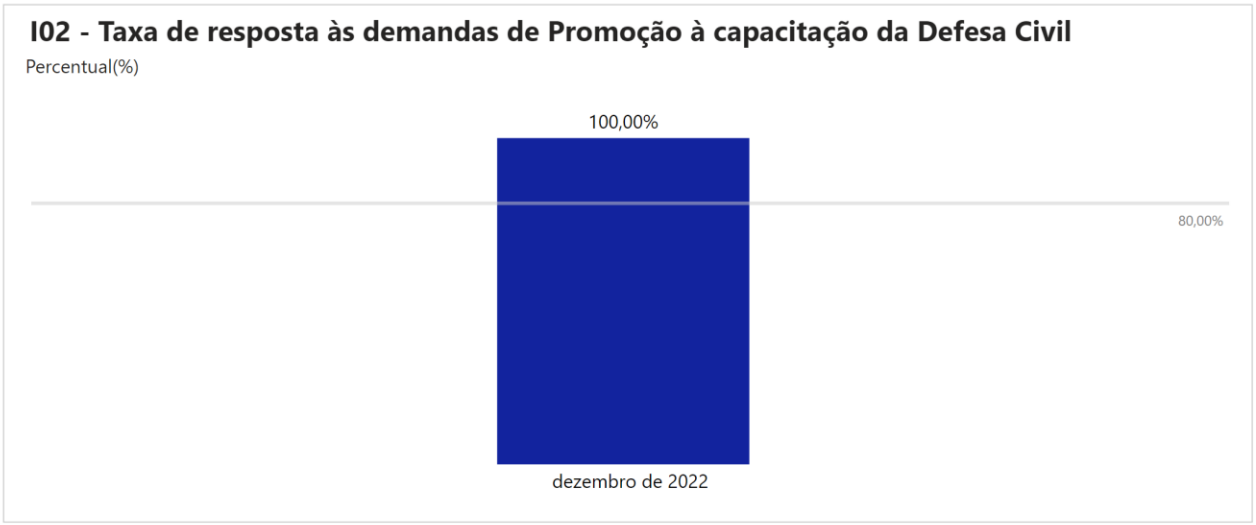


Gráfico 1: I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Frequência Anual

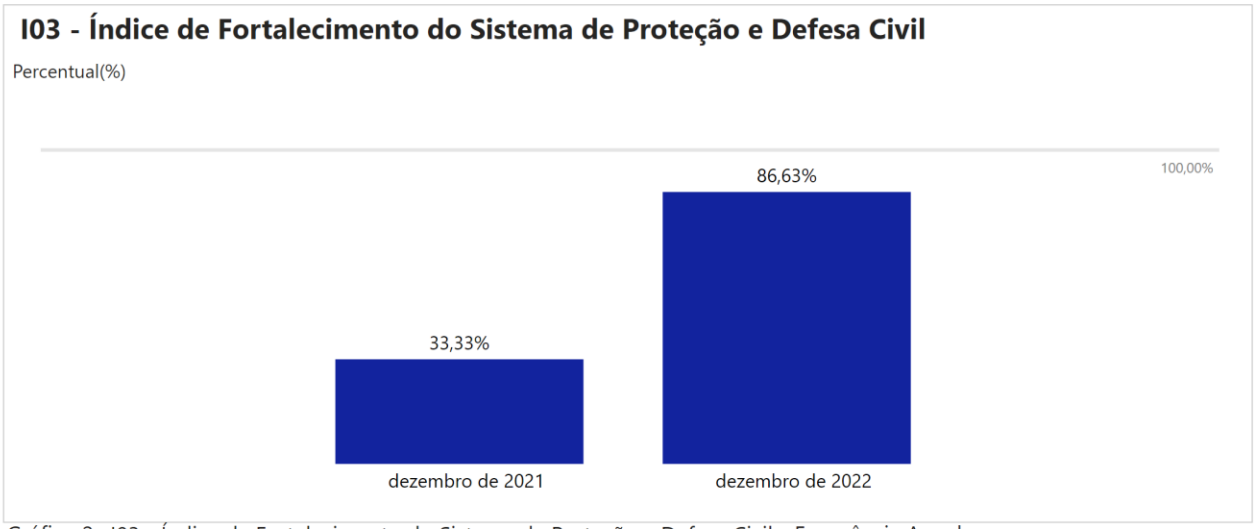


Gráfico 2: I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Frequência Anual

Indicadores

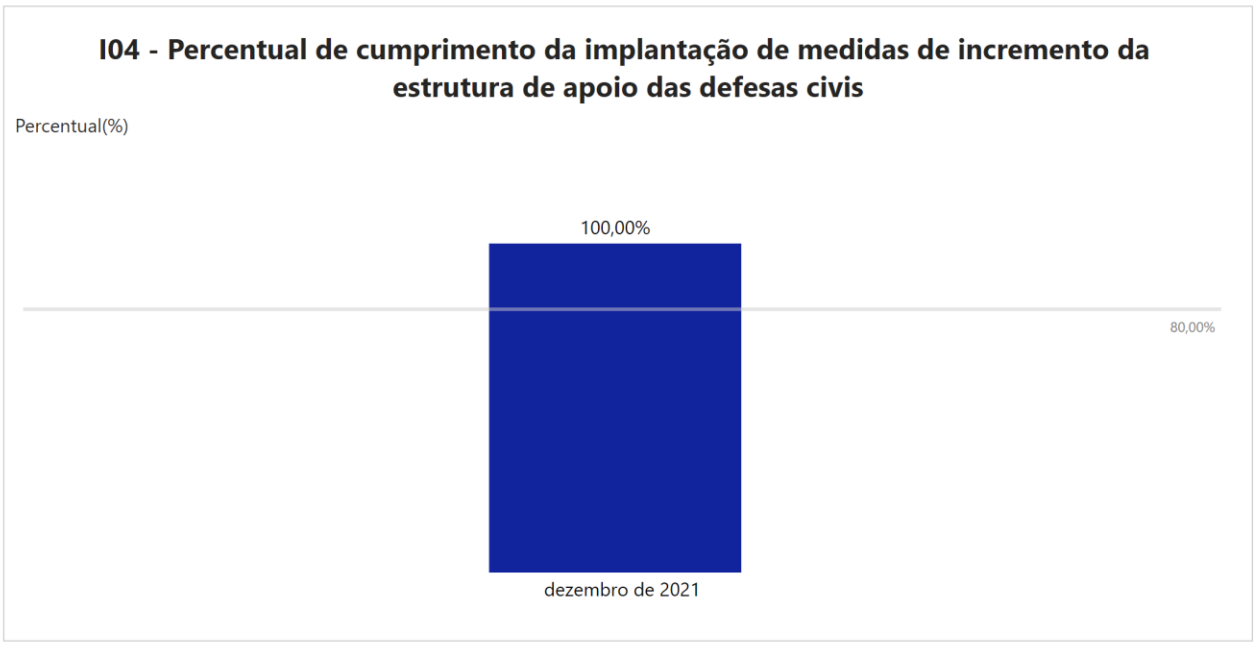


Gráfico 3: I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis -Frequência Anual

Os indicadores do programa foram aprovados pelo CIF, porém ainda estão fora do período de medição.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	INÍCIO DA MEDIÇÃO
I01	Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Junho/25

PG035 Programa de Informação para a População

Eixo Pessoas e Comunidade

Objetivo

O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus desdobramentos. O acervo deverá incluir: (i) a memória, o modo de vida e os processos socioeconômicos e socioambientais relacionados às comunidades e municípios atingidos; e (ii) estudos técnicos e ações de reparação e compensação. O acesso por moradores locais, pessoas atingidas, poder público, comunidade acadêmica e outros públicos será promovido por meio de espaços físicos e digitais e estratégias itinerantes que constituem o Centro de Informação Técnica.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

abril de 2022 — Elaboração do e-book com os artigos/trabalhos apresentados nos processos de itinerância e descentralização 2021

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Dado	nov/2022	dez/2022	Acumulado 2022
Quantidade de acessos à plataforma interativa	13174	16000	34272
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância	3	1	15

Notas

Nome do dado	Resultado	Observações
Quantidade de acessos à plataforma interativa	16000	A quantidade de acessos foi contabilizada até 23/12/2022 e a quantidade total apurada no mês de dezembro de 2022 será divulgada no próximo relatório mensal.

Fatos relevantes do Ano

02/2022 A equipe do PG35 e de Relações Institucionais da Fundação Renova reuniram-se, presencialmente, no dia 07 de fevereiro de 2022, com o Prefeito de Mariana, Sr. Juliano Gonçalves e assessores para apresentar o Projeto Conceitual do CIT no Terminal Turístico.

02/2022 Em 17 de fevereiro de 2022, a equipe técnica do PG35 esteve presente no Centro Ecológico de Linhares/ES para finalizar a instalação do Ponto de Acesso da Plataforma Interativa do CIT, conforme comunicado na 56ª RO da CT-PDCS e notificada por ofício.

02/2022 No dia 17 de fevereiro de 2022, foi instalado o Ponto de Acesso à Plataforma Interativa dentro da Unidade CIA, situado à Rua Bom Jesus, nº 196/A, Bairro Centro, Mariana/MG. A instalação foi comunicada na 56ª RO da CT-PDCS e notificada por ofício.

02/2022 No dia 24 de fevereiro de 2022, foi realizada uma reunião, online, entre a equipe do PG35 e o ICMBio com a presença do Relações Institucionais e a equipe de Engenharia da Fundação Renova. A reunião teve como pauta a aprovação final do Termo de Parceria entre as duas instituições, os últimos alinhamentos sobre o Projeto Executivo do CIT de Regência e a formalização da entrega do Ponto de Acesso à Plataforma Interativa no Centro Ecológico.

02/2022 No dia 25 de fevereiro de 2022, foram encaminhados, por email, a versão final para assinatura do Termo de Cooperação entre o ICMBio e a Fundação Renova e seu respectivo Plano de Trabalho para implantação do CIT em Regência.

02/2022 O Programa 35 finalizou a instalação dos Pontos de Acesso à Plataforma Interativa em todas as 3 localidades escolhidas para implantação das bases físicas do Centro de Informação Técnica – CIT, Mariana/MG, Governador Valadares/MG e Regência/ES. A instalação foi comunicada na 56ª RO da CT-PDCS e notificada por ofício.

03/2022 No dia 16 de março de 2022, a equipe técnica do PG35 e a equipe do ICMBio reuniram-se, online, para construírem em conjunto as ações do programa a serem realizadas no local este ano.

03/2022 O Programa 35 realizou, nos dias 17 e 18 de março, treinamento com os atendentes CIAs de Mariana e de Governador Valadares, respectivamente, com o objetivo de apresentar-lhes a Plataforma Interativa do CIT e os Pontos de Acesso, bem como, alinhar orientações e procedimentos gerais, de modo a capacitá-lo a oferecer aos usuários do CIA informações que os instrumentalizem a fazer uso destes recursos.

03/2022 Reunião realizada em 17 de março de 2022, às 10h, com o PG15 e PG38, para alinhamento sobre a proposta de parceria recebida do grupo "Enredeando Saberes" da Universidade Federal de Viçosa com vistas à construção conjunta de ações integradas de divulgação técnico-científica com o CIT – Centro de Informação Técnica.

Fatos relevantes do Ano

04/2022 No dia 26 de abril, foi realizada reunião com os coordenadores da equipe de Diálogo do Alto Rio Doce para o planejamento tático das ações de Descentralização e Itinerância naquele território.

05/2022 No dia 03 de maio de 2022, foi realizada uma reunião entre a equipe técnica do programa e a equipe de Diálogo Social do Médio Rio Doce para o planejamento tático das ações de Descentralização e Itinerância naquele território.

05/2022 A equipe técnica do PG35 reuniu-se com a equipe de Diálogo Social do Espírito Santo para o planejamento tático das ações de Descentralização e Itinerância no território, no dia 09 de maio de 2022.

05/2022 No dia 11 de maio de 2022, a equipe técnica do programa reuniu-se também, com o mesmo objetivo, com a equipe de Diálogo de Mariana.

05/2022 Em conformidade com o cronograma de manutenção e aprimoramento da Plataforma Interativa do CIT, a equipe técnica do programa realizou, no dia 25/05/2022, uma reunião com representantes da Digital Pixel e da Enable Venture com objetivo de implementar melhorias no conteúdo do site.

06/2022 Em conformidade com o cronograma de manutenção e aprimoramento da Plataforma Interativa do CIT, realizamos nos dias 1º, 08, 15 e 22 de junho, reuniões com a equipe da Digital Pixel com objetivo de implementar melhorias no seu conteúdo.

06/2022 Nos dias 1º e 08 de junho, o PG35 realizou reuniões com as coordenadoras da da Fundação Renova das equipes de Diálogo de Mariana e da Calha do Rio Doce, respectivamente, para o planejamento tático das ações de Descentralização e Itinerância naqueles territórios, conforme listas de presenças anexas.

06/2022 Reunião do Comitê Gestor do Ministério Meio Ambiente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, realizada em 14 de junho de 2022, registra a aprovação do Acordo de Cooperação Técnica para implantação do CIT – Centro de Informação Técnica em Regência entre o ente público (ICMBio) e a Fundação Renova.

06/2022 No dia 23 de junho, foi realizada uma reunião, presencial, entre a equipe técnica do programa e os representantes da Prefeitura de Mariana para mais uma rodada de conversas sobre a compatibilização entre os projetos do CIT e o projeto municipal para o Terminal Turístico.

06/2022 No dia 29 de junho, foi feito o lançamento na Plataforma Interativa www.citdoriodoce.org de todos os produtos resultantes do ciclo anterior de Descentralização e Itinerância, com o upload da versão final do Livro Trilhas de Memórias somando-se aos 5 vídeos já divulgados. O livro é um dos 6 materiais produzidos pelos moradores de comunidades atingidas durante as oficinas de Trilhas de Memórias.

Fatos relevantes do Ano

07/2022 No dia 07 de julho, o PG35 reuniu-se com o representante do programa Enredeando Saberes, da Universidade Federal de Viçosa, para dar continuidade dos alinhamentos entre as ações conjuntas de divulgação científica e consolidação do acervo do CIT.

07/2022 Nos dias 08 e 22 de julho, o PG35 realizou reuniões com as equipes internas da Fundação Renova para apresentação do CIT, divulgação da Plataforma Interativa e construção de estratégias conjuntas para fomento e consolidação das coleções do acervo. Foram envolvidos os seguintes programas: Programa Doce Vivo no dia 08 de julho; PG11 Recuperação das Escolas e Reintegração da comunidade escolar no dia 22 de julho.

07/2022 Tendo em vista mudança ocorrida no cenário político de Mariana com a nomeação de novo prefeito, o Programa 35 oficiou a atual gestão visando dar continuidade às tratativas para implantação do CIT no Terminal Turístico. No Ofício FR.2022.1040, endereçado aos senhores Ronaldo Alves Bento (Prefeito de Mariana); Newton Geraldo Godoy (Presidente COMAR); Dr. Marcílio Queiroz (Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer) e Marcelo Henriques (Secretário de Obras e Planejamento Urbano) é reapresentado o projeto para implantação do CIT no Terminal Turístico e solicitado o envio das demandas municipais de infraestrutura de modo a compatibilizar os usos do espaço com os dois projetos em pauta.

07/2022 No mês de Julho de 2022, os exemplares do livro "Trilhas de Memória - Relatos e construções afetivas dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão" foram enviados para os escritórios das equipes de Diálogo e CIAS nos Territórios para providenciarem a entrega, em mãos, aos participantes e autores. Já receberam as remessas, as equipes de Diálogo de Barra Longa e Mariana (em 20/07/2022). Em 21/07/2022 receberam as remessas as equipes de Diálogo de Ipatinga, de Governador Valadares e a equipe CIA de Governador Valadares. A equipe de Diálogo de Linhares recebeu os exemplares em 22/07/2022. Foram enviados para BH os livros a serem enviados, via correios, para outros públicos contemplados.

07/2022 No dia 22 de julho de 2022, o Programa 35 realizou uma ação de formação para atendentes do CIAS e equipes de Diálogo com o objetivo de atualizá-los sobre os novos conteúdos disponíveis na Plataforma Interativa do CIT e orientá-los quanto às oportunidades de divulgação e de construção do acervo no atendimento ao público atingido.

07/2022 O Programa 35 continuou a distribuição dos exemplares do livro "Trilhas de Memória - Relatos e construções afetivas dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão". Comprovaram o recebimento das remessas as equipes do CIA de Mariana/MG (26/07/2022); CIAs de Naque/MG e Aymores/MG (27/07/2022); CIAs de Tumiritinga/MG e Resplendor (28/07/2022).

Fatos relevantes do Ano

07/2022 Nos dias 25 e 26 de julho, o PG35 realizou reuniões com as coordenadoras da Fundação Renova das equipes de Diálogo do Espírito Santo, da Calha do Rio Doce e do Alto do Rio Doce, respectivamente, para desdobramento das ações de Descentralização e Itinerância naqueles territórios, conforme lista de presença anexa.

07/2022 Visando dar início à execução das etapas de contratação das obras para implantação do CIT em Governador Valadares, o Programa 35 enviou, em 25 de julho de 2002, o ofício FR.2022.1067 atualizando o sr. André Luiz Coelho Merlo, prefeito de Governador Valadares, sobre as tratativas em curso para implantação do CIT na Praça Getúlio Vargas e encaminhando o projeto conceitual para conhecimento. Na oportunidade, solicitou também a assinatura do Termo de Cooperação com as alterações realizadas conforme Ofício da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

08/2022 Nos dias 09 e 10 de agosto a equipe técnica do PG35 participou de reuniões de Diálogo Coletivo em Povoação/ES e Linhares/ES, respectivamente, para apresentação do CIT e da plataforma interativa visando promover os objetivos do CIT, demonstrar como o site funciona, as formas de participação da comunidade, bem como, para informar e convidá-los para participação e construção coletiva do acervo de Narrativas Territoriais.

08/2022 Produção do folder sobre o conteúdo da Plataforma Interativa do CIT – Centro de Informação Técnica como parte das ações de divulgação, publicização e consolidação do acervo.

08/2022 A equipe técnica do PG35 dividiu-se para participar, simultaneamente, de dois eventos presencias, no dia 20 de agosto, a saber: "Mostra de Projetos", realizadas na Unileste, em Ipatinga/MG e "Ação de Empreendedorismo e Cidadania" em Baixo Guandu/ES". A participação nos eventos teve como objetivo aproximar o CIT do público atingido e, também, fazer o mapeamento de potenciais colaboradores, materiais, conteúdos, depoimentos etc.

08/2022 O Programa 35 recebeu, em 25 de agosto de 2002, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares, o ofício OF/SMCELT/GAB-845/2022 formalizando a aprovação do projeto básico apresentado para implantação do CIT na Praça Getúlio Vargas.

08/2022 Em 23 de agosto de 2022, o PG35 recebeu do ICMBio, email de "De Acordo" para com o início das atividades do projeto que envolve a digitalização do acervo fotográfico disponível no Centro Ecológico de Regência, parte do escopo das ações do 2º Ciclo de Oficinas Trilhas de Memórias.

08/2022 O Programa PG35 deu início à divulgação da "Chamada Aberta" para o 2º Ciclo de Webinários do Conhecimento em Pauta convidando estudiosos e pesquisadores a se inscreverem, até 09 de setembro, para apresentarem suas pesquisas e estudos realizados sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos, cumprindo seu objetivo de difundir a produção técnico-científico sobre a temática, em curso.

Fatos relevantes do Ano

09/2022 O projeto de Lei 121/2022 - "Cessão de Uso Renova - Museu da Cidade" foi enviado pelo prefeito municipal, sr. André Luiz Coelho Merlo, em 28 de julho de 2022 à Câmara Municipal. O projeto foi aprovado nas seguintes comissões legislativas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR); Comissão de Serviços Públicos Municipais (SCPM); na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFF) e na Comissão de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (CTMADE). O projeto aguarda a sanção do executivo para validar a desafetação de parte da praça Getúlio Vargas, convertendo-a em área institucional, cedendo seu uso para que a Fundação Renova possa construir no local a edificação do Centro de Informação Técnica - CIT que abrigará parte do acervo do Museu da Cidade.

09/2022 O Programa PG35 finalizou a divulgação da "Chamada Aberta" para o 2º Ciclo de Webinários do Conhecimento em Pauta convidando estudiosos e pesquisadores a se inscreverem, até 09 de setembro, para apresentarem suas pesquisas e estudos realizados sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos. O Conhecimento em Pauta tem por objetivo difundir a produção técnico-científico sobre a temática. O evento foi divulgado em Redes Sociais da Fundação Renova como Instagram e LinkedIn. Como resultado das ações de divulgação, o programa recebeu 19 inscrições das quais 06 foram selecionadas para apresentação no novo Ciclo.

09/2022 Em 28 de setembro de 2022, as equipes técnicas do PG35 e do ICMBio reuniram-se, de modo remoto, para alinhamento sobre as ações de Descentralização e Itinerância que serão realizadas com a comunidade local, de modo conjunto, entre os 2 entes, no espaço do Centro Ecológico de Regência.

09/2022 No dia 28 de setembro de 2022, o ICMBio encaminhou, por email, para o PG35, o documento "SEI_ICMBio - 12634702 - Despacho Interlocutório do Ministério do Meio Ambiente", devolvendo o Termo de Cooperação entre as partes para ajustes a cargo da Fundação Renova, após a reanálise do documento pelas instâncias federais pelas quais tramita. O documento foi encaminhado para o departamento jurídico da Fundação Renova para avaliação e devolutiva.

10/2022 As equipes do Programa 35 e do ICMBio reuniram-se em 07 de outubro de 2022, às 15:00h para dar continuidade ao mapeamento de ações a serem realizadas, conjuntamente, com o objetivo de consolidar a atuação do CIT e a parceria com o ICMBio no território.

10/2022 Em 14/10/2022, a equipe técnica do Programa 35 realizou a reunião preparatória com a mediadora contratada, Maria Eugenia Salcedo, para o 1º Webinário do Conhecimento em Pauta a ser realizado em 31/10/2022.

10/2022 A empresa Arquivar, contratada pelo Programa, finalizou a digitalização do acervo fotográfico do Centro Ecológico de Regência em 26/10/2022. A digitalização é a primeira fase da metodologia de execução da oficina Trilhas de Memórias.

Fatos relevantes do Ano

10/2022 Em reunião realizada na cidade de Governador Valadares, em 27/10/2022, com a presença do prefeito, chefe de gabinete e secretário de cultura, além do presidente da Fundação Renova e equipe do Programa 35, equipe de Relações Institucionais e Obras, foi realizada a assinatura do Termo de Parceria entre a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal para implantação do Centro de Informação Técnica – CIT.

10/2022 Foi publicada, em 27/10/2022, nas páginas 3 e 4 do Diário Oficial do Município de GV, a sanção do prefeito à Lei 7.450 de 14 de outubro de 2022 que "DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO E A CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." A lei permite a construção do Centro de Informação Técnica - CIT na Praça Getúlio Vargas pela Fundação Renova.

10/2022 Visando o constante aprimoramento da plataforma interativa do CIT, uma versão aprimorada foi disponibilizada oferecendo melhorias em diversos quesitos como seguem abaixo. Ressaltamos que estas melhorias na plataforma foram feitas a partir de indicações da CT – PDCS, CIF e equipes internas dos Programas da Fundação Renova: Navegabilidade: reorganização dos menus de navegação, oferendo mais conteúdos em menos cliques; Acessibilidade: Implantação de tradução de Libras e recursos para pessoas com deficiências visuais; Amplitude de público: tradução para o Inglês; Interatividade: melhoria do sistema no upload de documentos; Design: melhorias nos elementos de design, favorecendo a legibilidade do site; Conteúdo: aumento do acervo com a disponibilização das gravações de todos os webinários Conhecimento em Pauta e da Oficinas Trilhas de Memórias, e novos conteúdos técnico-científicos.

10/2022 As novas facilidades e os aprimoramentos foram apresentados às equipes de Diálogo Coletivo de Mariana, Alto Rio Doce e Espírito Santo, de modo, a instrumentalizá-las a apoiar e dar suporte aos moradores dos territórios atingidos quando demandados.

10/2022 Realizado em 31/10/2022 às 19h, o primeiro Webinários do Conhecimento em Pauta com o tema: "Ciência cidadã na Bacia do rio Doce: Monitoramento Hídrico Participativo" a ser realizado em 31 de outubro de 2022, das 19h às 21h. O evento contou com a palestra da pesquisadora e consultora da Unesco Vera Lúcia de Miranda Guarda, Doutora em Ciências Farmacêuticas, e com a moderação da pesquisadora e consultora Maria Eugenia Salcedo, Mestranda em Artes e História da Arte.

11/2022 O CIT esteve presente em 2 Ações de Empreendedorismo e Cidadania, no mês de novembro, para convidar as pessoas a conhecerem a plataforma interativa e participarem da construção coletiva do acervo. Os eventos aconteceram em Barra Longa/MG em 12/11/2022 e Aracruz/ES em 19/11/2022.

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Em novembro, foram realizados 3 webinários do "Conhecimento em Pauta, em parceria com o Painel do Rio Doce (UICN). Estudos importantíssimos realizados no âmbito do processo de reparação dos impactos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão foram apresentados. Os palestrantes trouxeram reflexões importantes sobre a mudança climática na Bacia do rio Doce; a abordagem fonte-mar e governança responsiva. Os vídeos com as apresentações de todos os webinários estarão disponíveis na plataforma do CIT: www.citdoriodoce.org.

11/2022 21/11- Integração da perspectiva da mudança climática na restauração da Bacia do Rio Doce com: Christianne Maroun - Professora de Engenharia Ambiental da PUC-Rio. É especialista em mudanças climáticas e governança ambiental no Painel Rio Doce. Mora no Rio de Janeiro, Brasil. Peter May - Professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), especialista em recursos naturais e economia ecológica. Reside em Nova Iorque, EUA. 45 participantes.

11/2022 22/11 - Abordagens fonte-mar e de paisagem - integração da qualidade da água e conservação da biodiversidade na restauração da bacia do Rio Doce com: Maria Cecília Wey de Brito – Diretora de relações institucionais do Instituto EKOS Brasil, ex-secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. É especialista em gestão da paisagem e da biodiversidade no Painel do Rio Doce. Reside em São Paulo, Brasil. Francisco Barbosa - Vice-Presidente do Painel do Rio Doce, especialista em ecologia e conservação de ecossistemas. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mora em Belo Horizonte, Brasil. 28 participantes (Nota: a apresentação dos palestrantes consta com a data de 23/11 e não 22/11 pois foi feita uma alteração na data do evento, porém os pesquisadores não alteraram a respectiva data na apresentação).

11/2022 23/11 - Da restauração à governança responsiva: o Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão com:
Christianne Maroun - Professora de Engenharia Ambiental da PUC-Rio. É especialista em mudanças climáticas e governança ambiental no Painel Rio Doce. Mora no Rio de Janeiro, Brasil. Francisco Barbosa - Vice-Presidente do Painel do Rio Doce, especialista em ecologia e conservação de ecossistemas aquáticos. Professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mora em Belo Horizonte, Brasil.

11/2022 Dando continuidade às ações de divulgação da Plataforma interativa para o público interno e externo, o PG35 realizou dia 29/11, de 11h às 12h um webinário para todos os colaboradores da Fundação Renova, apresentando os aprimoramentos implementados e as novas facilidades do site.

11/2022 O CIT esteve presente durante um fórum de prestação de contas intitulado como "Resulta", referente às ações de reparação do rio Doce em Governador Valadares, no dia 30/11/2022.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Dia 1º de dezembro de 2022, foi realizado o 5º webinário "Conhecimento em Pauta com o tema "Monitoramento dos manguezais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão" com a professora Monica Maria Pereira Tognella. (Mônica Maria Pereira Tognella (UFES) - Oceanóloga (FURG) e Doutora em Oceonografia Biológica (IOUSP), Professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo. Responsável técnica pelo monitoramento dos manguezais sob influência dos rejeitos da barragem de Fundão. Integrante do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática.)

12/2022 Nos dias 20 e 21 de dezembro de 2022, foi realizada uma ação de coleta de depoimentos individuais no município de Barra Longa (MG). Essa ação está ancorada ao projeto Trilhas de Memórias e tem como intenção registrar por meio de vídeo, áudio ou depoimento transcrito relatos sobre a história e as memórias de moradores e como seus modos de vida foram atravessados pelo rompimento da barragem de Fundão. Foram registrados quatro relatos que irão compor o acervo do CIT e serão disponibilizados na plataforma interativa.

Indicadores

Os indicadores do Programa foram construídos, revisados e apresentados à CT-PDCS que não apresentou restrição ou divergência. A aprovação definitiva deles está condicionada à aprovação da Definição do Programa.

PG036 Comunicação Nacional e Internacional

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

• Estabelecer sítio eletrônico em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TTAC. (Cláusula 175 conforme anexo I, e Revisão Extraordinária número 3, de 30 de agosto de 2018);
• Comunicar à sociedade, às comunidades atingidas, aos órgãos reguladores e aos diversos públicos relacionados sobre as ações conduzidas pela Fundação Renova, também como forma de contrapor boatos e notícias de teor falso.
• Ampliar o alcance das informações e abrir espaço para discussão e construção coletiva de ideias relacionadas ao processo de reparação e compensação conduzidos pela Fundação Renova.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	506	2.2	Concluída Internamente
Deliberação	530	1	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

dezembro de 2022	Conclusão da atualização das entregas e fatos relevantes do mês, reportadas pelos demais programas no relatório mensal do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo do site, incluindo relatórios e documentos de interesse da sociedade e órgãos de validação em 2022
dezembro de 2022	Conclusão da atualização e manutenção de conteúdo e informações importantes para as comunidades atingidas e sociedade civil, via Redes Sociais em 2022
dezembro de 2022	Execução da manutenção periódica dos mecanismos e recursos relacionados à acessibilidade do site, conforme critérios estabelecidos a partir da referência das Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web, estabelecidas a partir do padrão WCAG.

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

Indicador	nov/2022	dez/2022	Acumulado 2022	Acumulado (2016 - 2022)
Acesso ao Site (mês)	83.628	88.048	2.866.577	10.012.559
Documentos no site (mês)	9	12	107	570
Notícias Publicadas (mês)	11	6	148	1.035
Vídeos (mês)	13	11	160	742

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Atualização das entregas e fatos relevantes do ano reportadas pelos demais programas nos relatórios mensais e anual do CIF (Comitê Interfederativo) e nas páginas dos programas hospedados no site, nas versões em português e inglês.

Indicadores

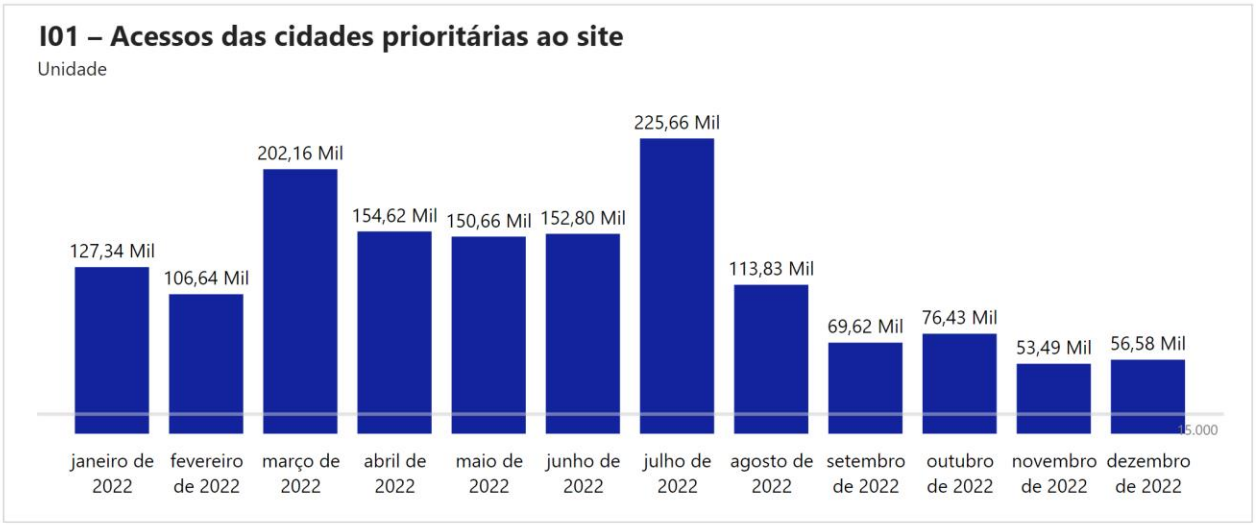


Gráfico 1: I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site - Frequência Mensal

Os números podem sofrer variações, tendo em vista que algumas localidades não são mapeadas/avaliadas no Google Analytics.

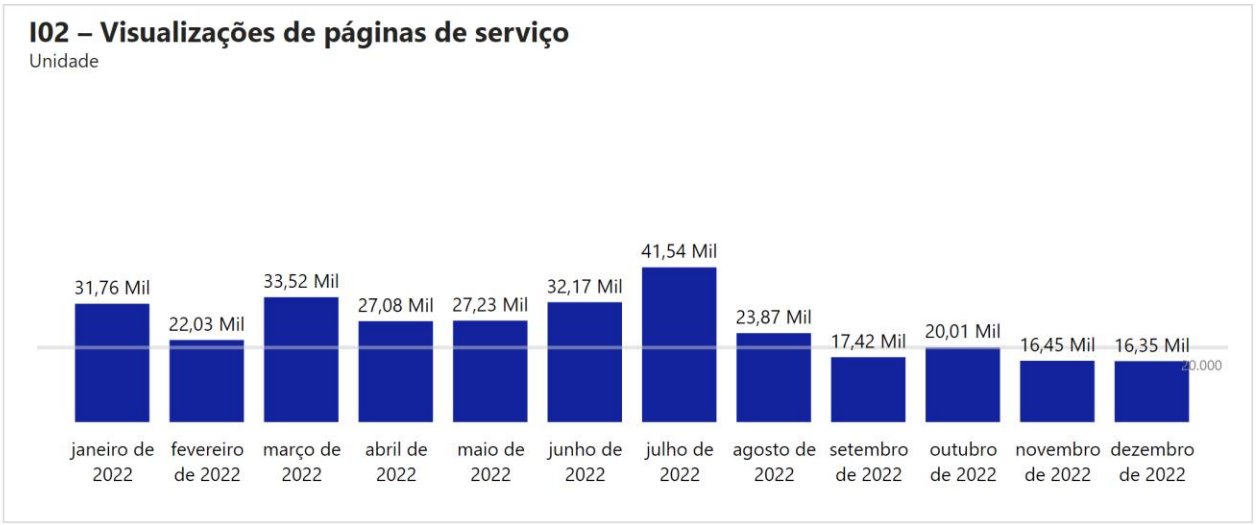


Gráfico 2: I02 – Visualizações de páginas de serviço - Frequência Mensal

Indicadores

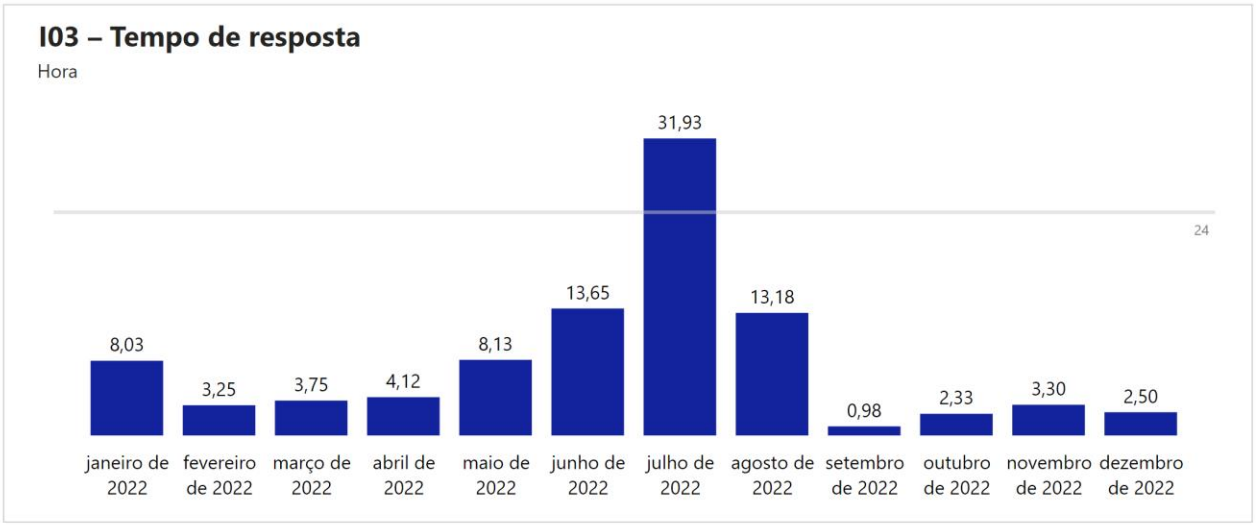


Gráfico 3: I03 – Tempo de resposta - Frequência Mensal

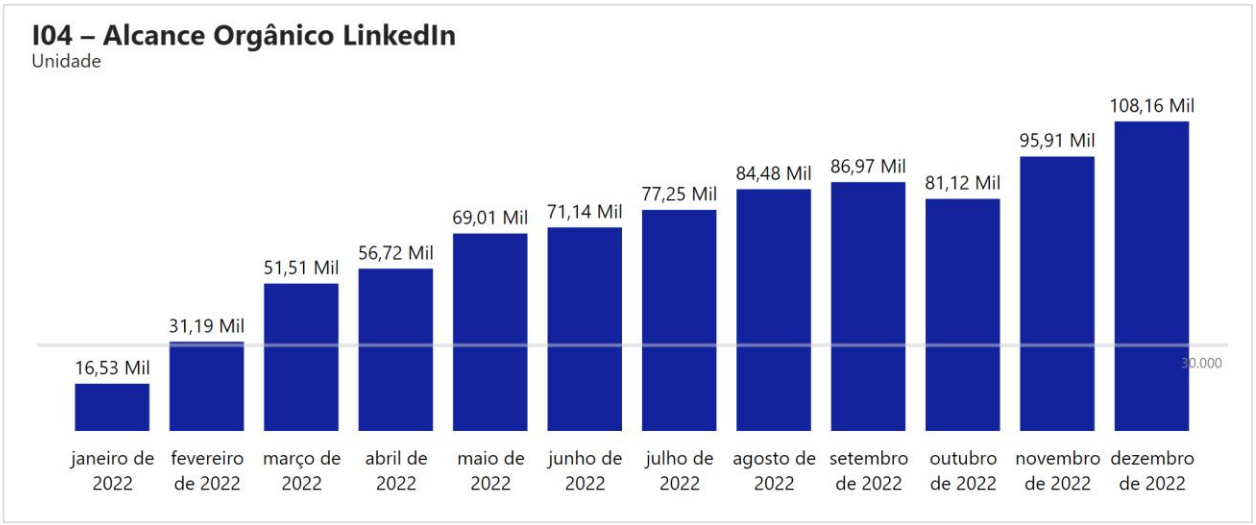


Gráfico 4: I04 – Alcance Orgânico LinkedIn - Frequência Mensal

O Linkedin disponibiliza apenas dados de impressões, não de alcance.

Indicadores

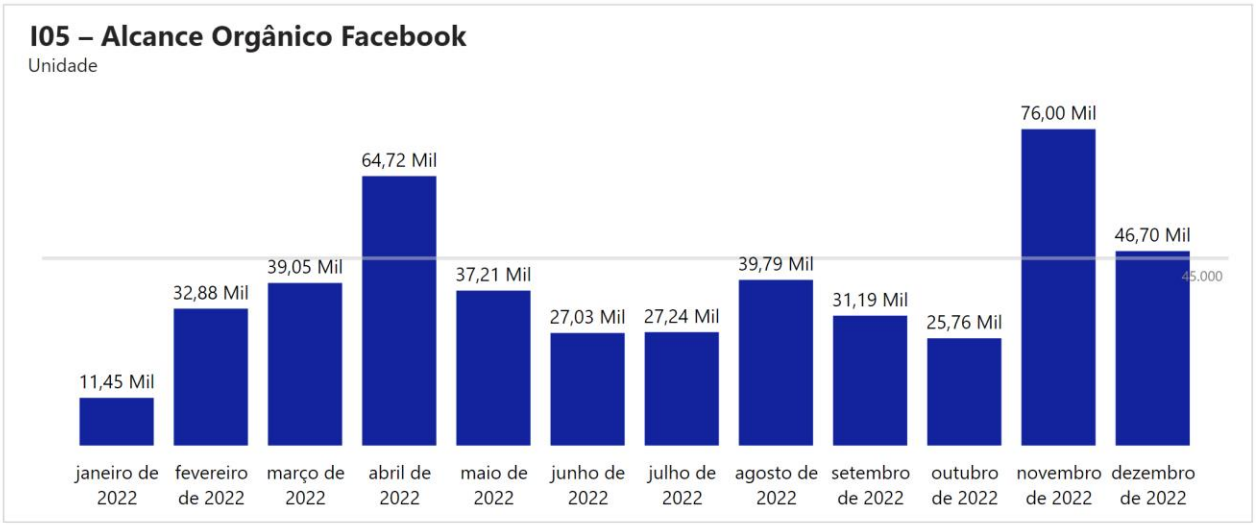


Gráfico 5: I05 – Alcance Orgânico Facebook- Frequência Mensal

Desde outubro de 2022 o Facebook não disponibiliza mais em seus relatórios os dados específicos sobre alcance orgânico. Por esse motivo, para chegar ao número desse indicador precisamos subtrair o número de alcance pago dos dados de alcance total diários somados (métricas que o Facebook ainda disponibiliza).

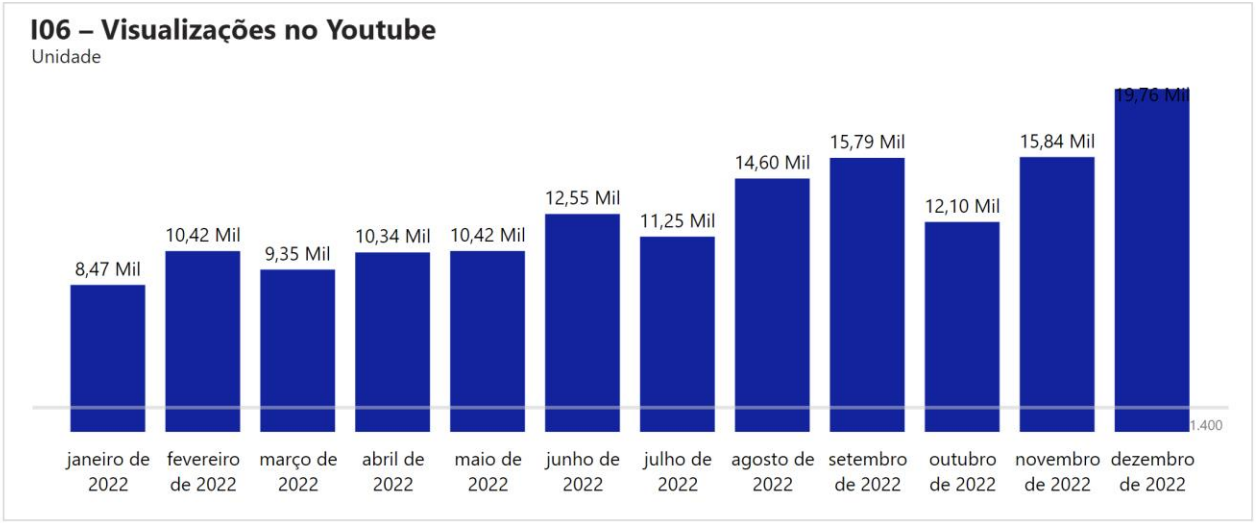


Gráfico 6: I06 – Visualizações no Youtube - Frequência Mensal

PG038 Monitoramento da Bacia do Rio Doce

Eixo Terra e Água

Objetivo

Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuarinas e costeiras (isóbata 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e ações correlatos.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	301	único	Concluída Internamente
Deliberação	310	3.2	Concluída Internamente
Deliberação	572	3	Concluída Internamente
Deliberação	572	4	Concluída Internamente
Deliberação	638	n/a	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

set/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Abr/22 a Jun/22
set/22	Protocolo do 6º Boletim PMQACH (Campanha 41, 42, 43 e 44)
set/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jun/22
set/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mai/22
out/22	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Abr/Mai/Jun 2022)
nov/22	Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce
nov/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jul/22
mar/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Out/21 a Dez/21
mar/22	Protocolo Relatório Final da Investigação Complementar da Análise de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso
mai/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Jan/22
jun/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jan/22 a Mar/22
jun/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Fev/22
jun/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Mar/22
jul/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Abr/22
jul/22	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Jan/Fev/Mar 2022)
dez/22	Protocolo do Relatório Trimestral de QA/QC - Jul/22 a Set/22
dez/22	Protocolo do relatório do Monitoramento de Água para Consumo Humano (PMQACH) - período de Julho 2021 à Junho 2022
dez/22	Publicação - Boletim das Águas-Rios Ago/22
ago/22	Finalização do Plano de Capacitação Presencial PMQQS
abr/22	Protocolo do 5º Boletim PMQACH (Campanha 37, 38, 39 e 40)
abr/22	Publicação - Boletim Trimestral das Águas - Estuários/Lagoas/Zona Costeira (Out/Nov/Dez 2021)

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

Em 2023 está aprovado um orçamento de **R$** 39.630,18 Mil para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina;

Plano de Monitoramento Quali-quantitativa Sistemático (PMQQS)

- Atualmente são gerados aproximadamente 1,7 milhão de dados pelo programa de monitoramento. Todos os dados e informações disponíveis em www.monitoramentoriodoce.org;
- 691 **quilômetros** de monitoramento de **rios**, 244 **quilômetros** de monitoramento ao longo da **zona costeira e estuarina**;
- 82 **pontos de monitoramento** distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina;
- 22 **estações automáticas** formam uma rede de alerta que gera informações em tempo real;
- 103 **parâmetros físicos, químicos e biológicos** são analisados na água e 38 nos sedimentos.

Grandes números do programa

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

- Atualmente são monitorados 102 pontos, sendo 31 com tratamento e 71 sem tratamento em 24 municípios. Os pontos com tratamento são monitorados quinzenalmente no período chuvoso e mensalmente no período seco. Os pontos sem tratamento são monitorados mensalmente.

Fatos relevantes do Ano

01/2022 Protocolo da Edição 4 do Boletim do Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) revisado

03/2022 Protocolo do Relatório Final "Plano de amostragem para o Monitoramento da Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4, barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte", em atendimento à Deliberação CIF nº 310

03/2022 Protocolo da Proposta de Escopo do Projeto de Monitoramento de Cheias do Rio Gualaxo do Norte, em atendimento ao Item 4 da Deliberação CIF nº 572

03/2022 Protocolo do Relatório Trimestral de consistência dos dados (QA/QC) do PMQQS referente aos meses de outubro a dezembro/21.

04/2022 Protocolo da revisão do Relatório do PMQACH 2020-2021, em atendimento ao Ofício 12/2022 da CT-Saúde e em cumprimento à Deliberação CIF nº 513 (e à Deliberação 301).

04/2022 Protocolo da Proposta de Escopo do Plano de Monitoramento Quali-quantitativo das Águas do Rio Doce e seus Tributários em Função das Intervenções – PMQQVAI, para atendimento ao Item 3 da Deliberação CIF nº 572

04/2022 Protocolo da Edição 5 do Boletim do Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano, referente ao período de 17 de setembro de 2021 a 16 de janeiro de 2022.

Fatos relevantes do Ano

06/2022 Realizada visita técnica dos membros da CT-Saúde ao laboratório contratado Tommasi responsável pela execução das coletas e análises do PMQACH.

06/2022 Protocolo do Relatório Trimestral de Controle e Qualidade (QA/QC) dos dados do PMQQS referente aos meses de janeiro a março de 2022.

07/2022 Protocolo das recomendações para 2ª Revisão Bianual PMQQS.

08/2022 Realizada a primeira etapa do Seminário de Revisão Bi-anual do PMQQS em BH

08/2022 Realizados treinamento do Plano de Capacitação do PMQQS de Descarga Líquida e Sólida com a participação das equipes da Fundação Renova, Terceirizadas e GTA-PMMQS

09/2022 Protocolo do Relatório de Controle e Garantia da Qualidade (QA/QC) Trimestral do PMQQS de abril a junho/22.

09/2022 Protocolo dos Boletins do PMQACH em atendimento à Deliberação CIF nº 513 e a NT54/2021 da CT-Saúde.

09/2022 Realizada a segunda e última etapa do II Seminário de Revisão do PMQQS em Vitória.

11/2022 Conclusão do Novo Portal Monitoramento Rio Doce.

Fatos relevantes do Ano

12/2022 Protocolo das ações de adequação da metodologia para análise de mercúrio total em água e sedimento , em cumprimento à Deliberação CIF n°625.

12/2022 Protocolo de ofício informativo sobre a prospecção de laboratórios que atendam os ensaios ecotoxicológicos em sedimentos com Chironomidae, em resposta à Nota Técnica n° 95 do GTA-PMQQS.

12/2022 Protocolo de resposta ao Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 118/2022 – Boletins do Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH).

12/2022 Protocolo do documento da Segunda Revisão Bianual do PMQQS, em resposta à Deliberação CIF nº 638.

12/2022 Protocolo do Relatório do Plano de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano – PMQACH – 2021-2022, em atendimento à Deliberação CIF nº 513/2021.

12/2022 Protocolo do Relatório Técnico de Descarga Líquida: Análise de Consistência e Curvas-Chave, referente ao segundo ciclo do PMQQS, fevereiro de 2021 a dezembro de 2021.

12/2022 Protocolo do Relatório Trimestral do Programa de Garantia e Controle de Qualidade (QA/QC) dos dados físico-químicos, hidrobiológicos, ecotoxicológicos, granulometria, MPS, descarga líquida e descarga sólida do PMQQS referente ao período de julho a setembro de 2022.

12/2022 Resposta ao OFÍCIO Nº 212/2022/CIF/GABIN - Solicitação de Plano de Ações para os Períodos Chuvosos.

Indicadores

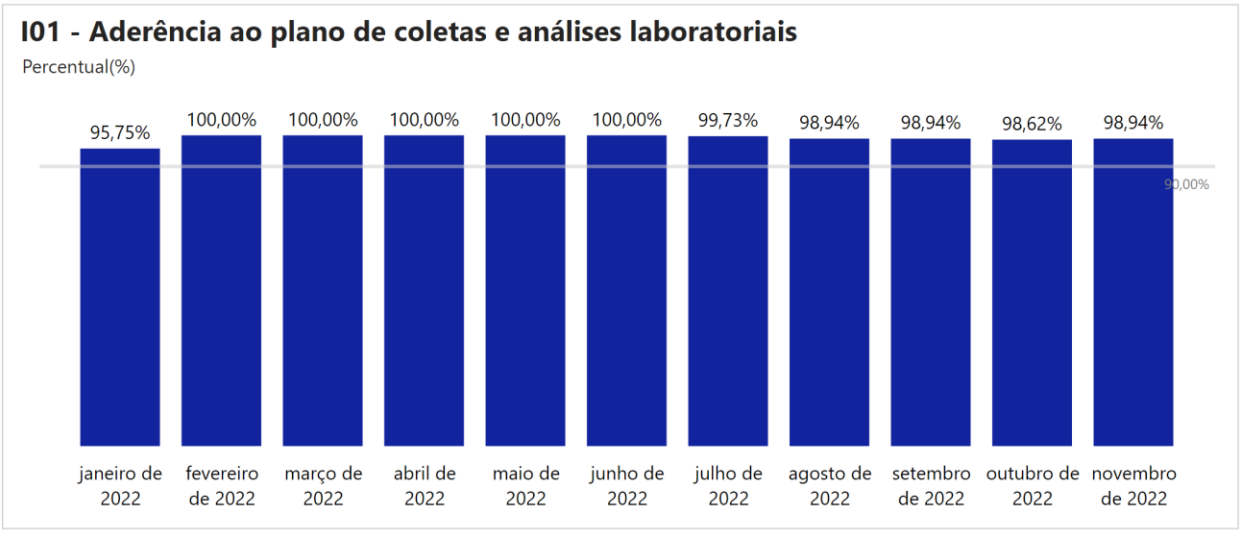


Gráfico 1: I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - Frequência Mensal

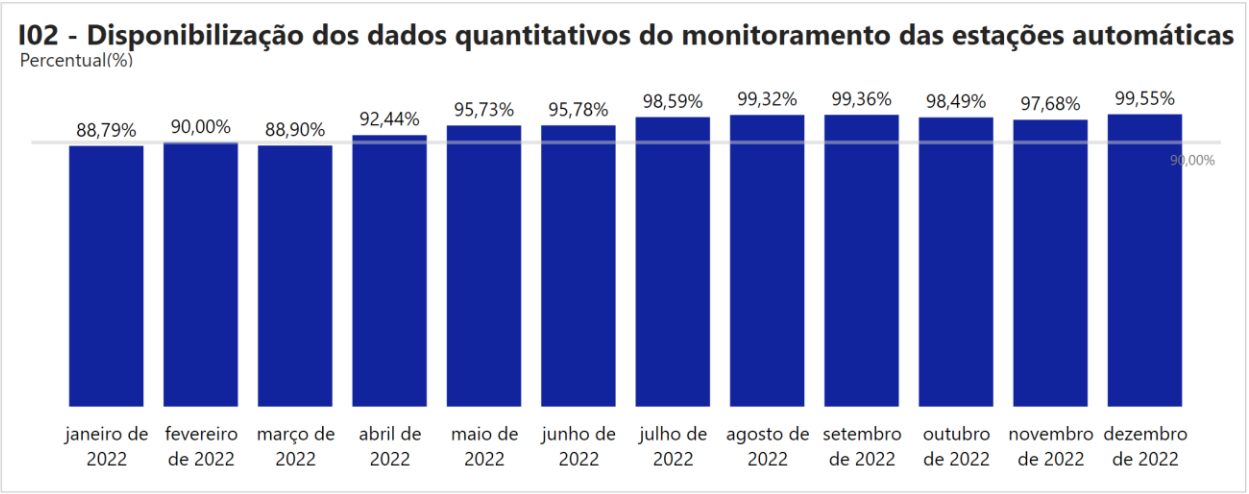


Gráfico 2: I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - Frequência Mensal

Indicadores

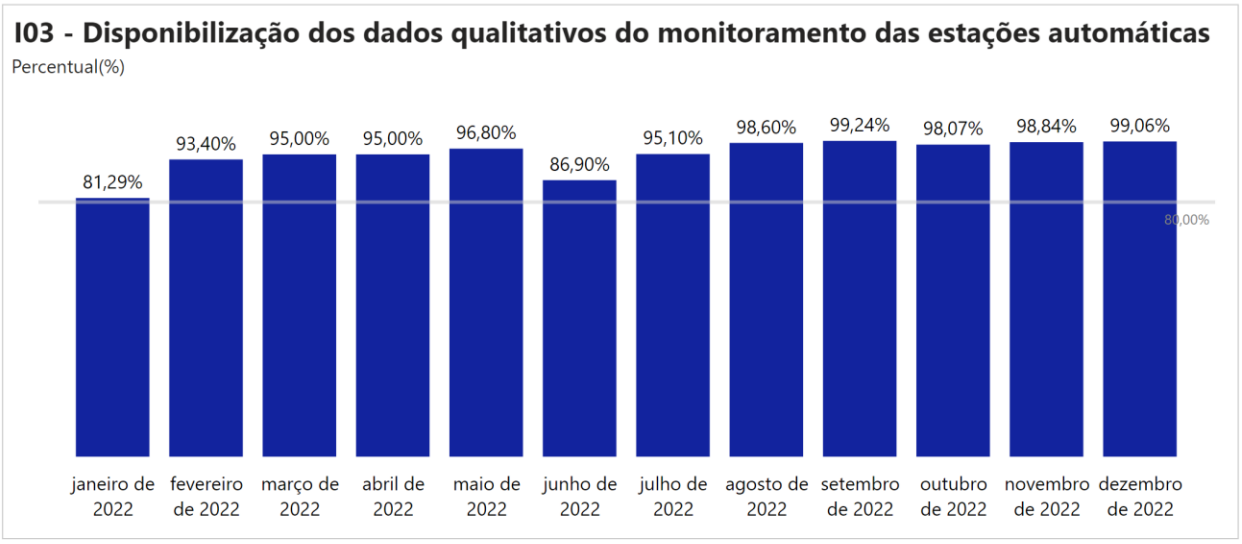


Gráfico 3: I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas- Frequência Mensal

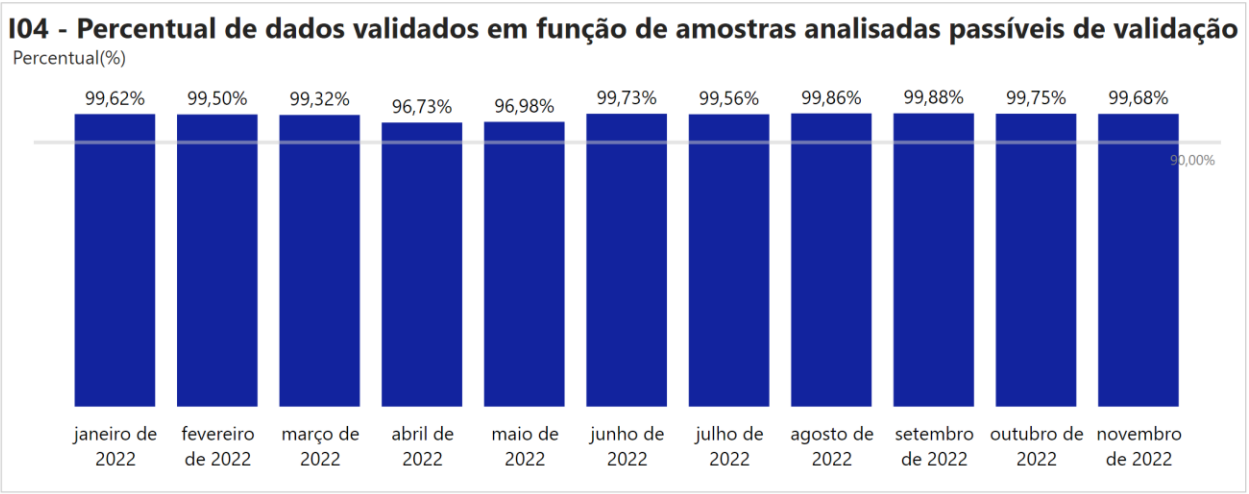


Gráfico 4: I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - Frequência Mensal

Indicadores

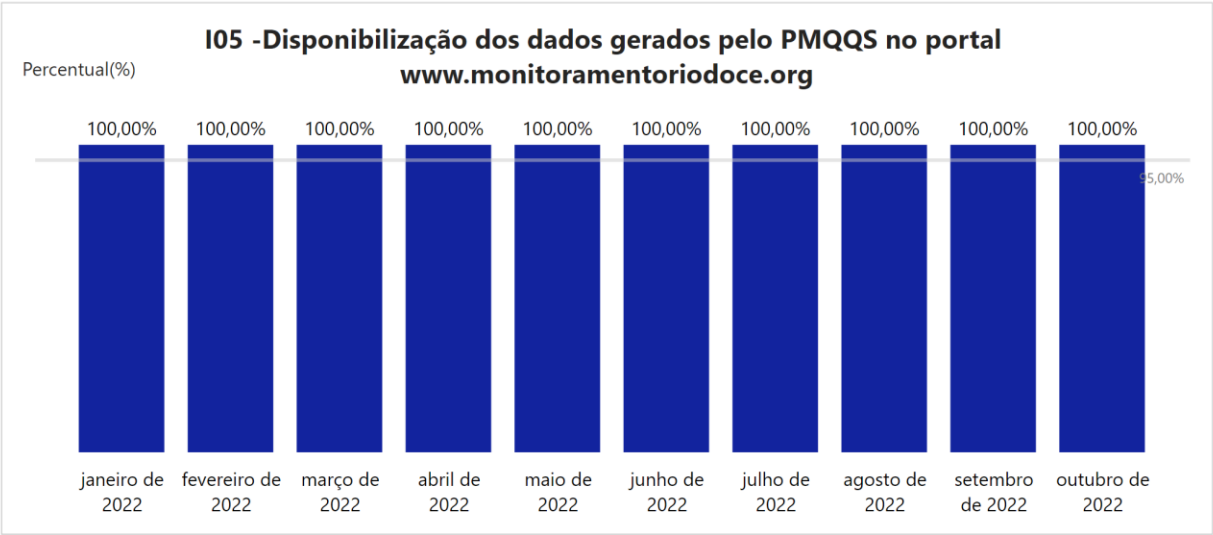


Gráfico 5: I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org - Frequência Mensal

PG039 Unidades de Conservação

Eixo Terra e Água

Objetivo

▪ Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão;
▪ Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto;
▪ Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, 12adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica n° 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e
▪ Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

Status de Cláusulas e Deliberações

Deliberação	584	2	Concluída Internamente
Deliberação	596	1	Concluída Internamente
Deliberação	596	2	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

jan/22	Conclusão da Execução do Repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
fev/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA REBIO Comboios
mar/22	Protocolo do Relatório Final AIA PERD
abr/22	Realização da Reunião Devolutiva AIA REBIO Comboios
abr/22	Finalização da contratação edital da equipe técnica e administrativa do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz
mai/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
mai/22	Protocolo do Relatório Final AIA REBIO Comboios
jul/22	Realização da Reunião Devolutiva AIA Grupo 3 e 4 - FBDS
set/22	Protocolo Plano de ação de reparação PERD
dez/22	Protocolar Plano de ação de reparação Rebio Comboios
dez/22	Realização da Reunião Devolutiva Grupo 6
dez/22	Protocolo do Relatório Preliminar AIA Grupo 1 - FBDS
dez/22	Protocolar Plano de ação de reparação APA Costas das Algas e REVIS

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

Fatos relevantes do Ano

01/2022	Em 21/01/2022, foi iniciado o processo de contratação do apoio técnico especializado do RVS
01/2022	Em 28/01/2022, foi concluída a execução do repasse referente ao Ano II - Consolidação PERD
02/2022	Em 14/02/2022, foi protocolado o Relatório Preliminar de Avaliação de Impacto Ambiental de REBIO Comboios (NT).
02/2022	Em 18/02/2022, foi aprovado o produto "Relatório Reuniões Prévias - Bloco 1" referente ao processo de elaboração do Plano de Manejo do RVS de Santa Cruz e da APA Costa das Algas, que vem sendo realizado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 18/2018, de acordo com o Ofício SEI nº 12/2022 - ICMBio Santa Cruz.
03/2022	Em 29/03/2022, foi aprovado o relatório de Avaliação dos Impactos do Rompimento da Barragem de Fundão nas Unidades de Conservação - Parque Estadual do Rio Doce, conforme deliberação 584.
03/2022	Entre os dias 14 e 18 de março, foram realizadas reuniões com o Setor Pesqueiro para coletar contribuições que possam subsidiar o manejo das UCs – Etapa de Elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas.
04/2022	Em 06/04/2022, foi realizada a Reunião Devolutiva de AIA da REBIO Comboios, com a CTBio e gestão da UC.
04/2022	Em 20/04/2022, foi aprovado o relatório de caracterização qualitativa e quantitativa e mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo nas UCs APA Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz, por parte do ICMBio, sob o Ofício SEI nº 37/2022
04/2022	Entre os dias 25 e 29 de abril, foram realizadas reuniões com as comunidades de Capuba - Rio Preto, Pontal do Piraquê, Açu - Barra do Riacho, Praia Formosa - Santa Cruz e os setores de Turismo, Industrial e Portuário, para coletar contribuições que possam subsidiar o manejo das UCs – Etapa de Elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Proteção Ambiental Costa das Algas.
05/2022	Em 24 de maio, a coordenação da CTBio/CIF, encaminhou a Nota Técnica nº 6/2022/CTBio/DIBIO/ICMBio em aprovação ao relatório de AIA de REBIO Comboios.
05/2022	Em 27 de maio, foi recebido pelo ICMBio, o termo de referência para contratação de aluguel de embarcações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.
05/2022	No dia 09 de maio, foram protocolados os relatórios preliminares de AIA das UCs dos grupos 3 e 4.
05/2022	Nos dias 11 e 12 de maio, foi realizada a oficina de validação do plano de ação para o PERD.
06/2022	Realização da Oficina Grupos Setoriais - Plano de Ação do PERD, em 02 de junho de 2022.

Fatos relevantes do Ano

06/2022 Deliberação 596 de 23 de junho de 2022 aprova com ressalvas a Avaliação dos Impactos do Rompimento da Barragem de Fundão nas Unidades de Conservação - Rebio Comboios, bem como estabelece prazo para encaminhamento do Plano de Ação para a implementação das ações reparatórias propostas.

06/2022 Finalização Etapa de Campo I - Parceria com UNESCO, em 23 de junho de 2022, com entrega do Relatório técnico com a sistematização dos resultados das oficinas de planejamento e integração do Monitoramento Participativo da Biodiversidade na bacia do Rio Doce.

07/2022 Realização de plenária final de validação do Plano de Ação do Parque Estadual do Rio Doce - PERD, em 11 de julho de 2022.

07/2022 Realização da oficina presencial do Plano de ação da REBIO COMBOIOS, em 13 de julho de 2022.

07/2022 Aprovação do produto final digital do projeto "Caracterização qualitativa e quantitativa e mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo nas unidades de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz e zona de entorno".

08/2022 Protocolo do ofício FR.2022.1168 referente à apresentação do produto final impresso do projeto "Caracterização qualitativa e quantitativa e mapeamento da vegetação e do uso e ocupação do solo nas unidades de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz e zona de entorno".

09/2022 Em 02/09/2022, foi feito o protocolo de Avaliação de Impacto Ambiental APA Costa das Algas e REVIS Santa Cruz

09/2022 Em 12/09/2022, foi feito o Relatório da Oficina de Elaboração dos Planos de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e Área de Proteção Ambiental Costa das Algas - Etapa do Plano de Consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.

09/2022 Em 16/09/2022, foi feito o protocolo do Plano de Ação do PERD – Parque Estadual do Rio Doce.

09/2022 Em 19/09/2022, foi feito o protocolo do Relatório Final dos Grupos 3 e 4 de UCs – Unidades de Conservação

09/2022 Em 30/09/2022, foi feito o protocolo do Relatório de AIA - Avaliação de Impacto Ambiental do Grupo 2.

10/2022 Recebido em 26/10/22 o termo de referência para aquisição de móveis e eletrodomésticos necessários para a consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e APA Costa das Algas

10/2022 Recebido em 26/10/22 o termo de referência para aquisição de serviços de reparo e manutenção preventiva de veículos para a consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e APA Costa das Algas

10/2022 Em 27/10/22, foi realizada a reunião devolutiva CTBio APA Costa das Algas e REVIS Santa Cruz.

Fatos relevantes do Ano

11/2022 Em 16/11/2022, foi realizada a Reunião Devolutiva Grupo 2.

11/2022 Em 17/11/2022, foi feita a revisão do Projeto Conceitual de construção e readequação da Sede do Refúgio de Vida Silvestres de Santa Cruz, atendendo aos comentários da equipe do ICMBio.

11/2022 Em 28/11/2022, foi encaminhado o ofício FR.2022.1867 referente à entrega do Relatório Preliminar Avaliação dos Impactos Ambientais do Grupo 6 das Unidades de Conservação.

12/2022 Em 02/12/2022 foi encaminhado o ofício FR.2022.1913 referente à entrega do Plano de Ação da REBIO Comboios, em atendimento à Deliberação CIF nº596.

12/2022 Em 07 e 08 de dezembro de 2022, foi concluído o protocolo dos resultados e registro das oficinas de construção do plano de ação da APA Costa das Algas e do REVIS S Cruz.

12/2022 Em 22/12/2022, foi realizada a Reunião Devolutiva Grupo 6.

12/2022 Em 27/12/22, foi encaminhado o ofício FR.2022.2087 referente à entrega do Relatório Preliminar Avaliação dos Impactos Ambientais do Grupo 1 composto pelas Unidades de Conservação: Área de Proteção Especial (APE) Ouro Preto e Mariana, Área de Proteção Ambiental (APA) Barra Longa e Monumento Natural (MONA) Rio Piranga , em atendimento à Cláusula 181 e às Deliberações 36/2016 e 535/2021.

12/2022 Em 28/12/2022, foi encaminhado o ofício FR.2022.2073 e anexos referentes ao Relatório de Facilitação e Matriz de ações preliminar do plano de ação da APA Costa das Algas e do REVIS Santa Cruz.

Indicadores

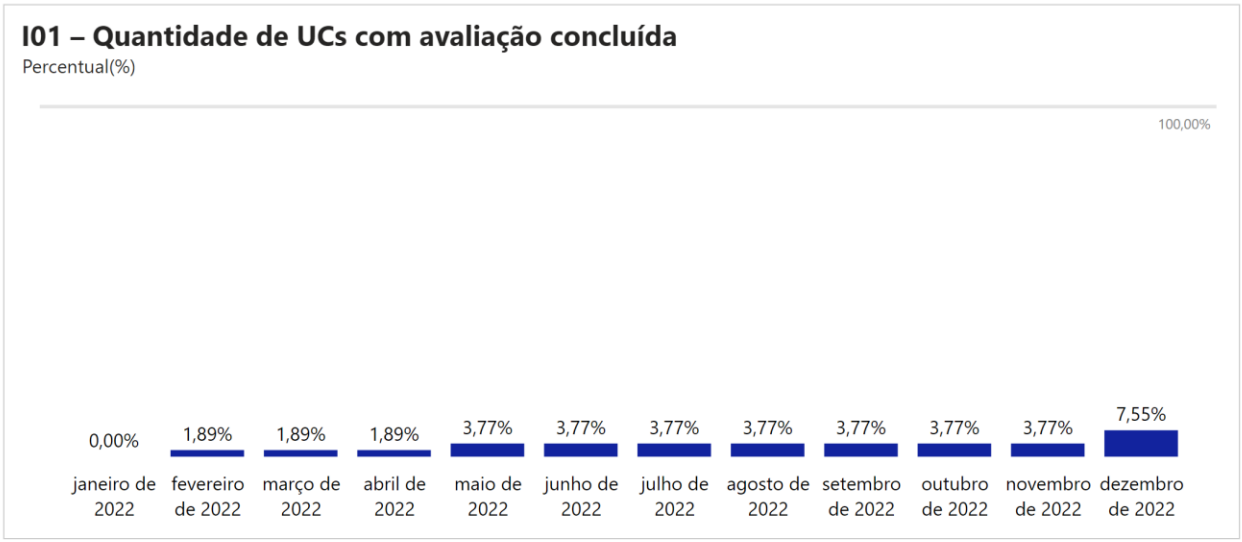


Gráfico 1: I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída - Frequência Mensal

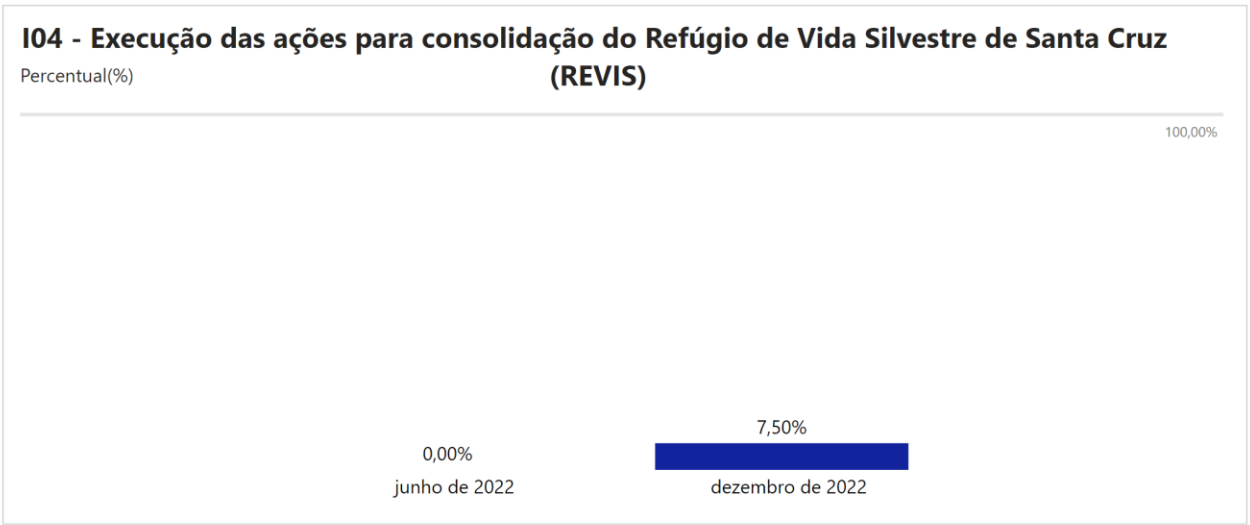


Gráfico 2: I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - Frequência Semestral

Indicadores

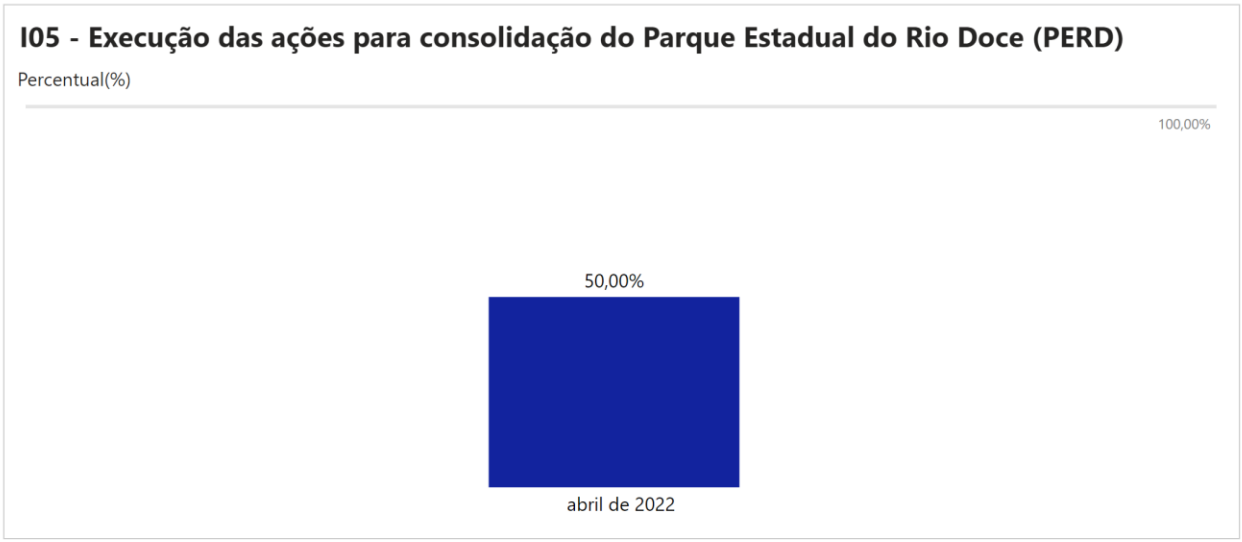


Gráfico 3: I05 - Execução das ações para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - Frequência Mensal

PG040 Programa de Fomento ao CAR e PRA

Eixo Terra e Água

Objetivo

Prestar suporte e apoio técnico para o cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos respectivos PRA's conforme previsto na Cláusula 183 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

O programa não possui cláusulas e deliberações concluídas internamente e/ou encerradas em 2022

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

julho de 2022 — Retificação e validação dos cadastros das propriedades objeto do PRA Piloto no Espírito Santo

Concluído Planejado Reprogramado

Grandes números do programa

598 imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR. Deste total, 63 (10,5%) imóveis declinaram e 534 (89,3%) aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais ainda dependem de retorno sobre a adesão. Dos aderidos, 444 CAR já foram retificados ou elaborados pela Fundação Renova.

Fatos relevantes do Ano

03/2022	Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) no Espirito Santo e participação em evento governamental sobre o tema.
05/2022	Publicação das Cartilhas do PRA no sistema do IEF - MG.
06/2022	Apresentação das experiências do PG40 para o Projeto Paisagens Rurais – Cerrado, do SENAR com financiamento do Banco Mundial.
10/2022	Finalização das ratificações do CAR nas propriedades aderidas ao PG40, nos municípios Naque, Belo Oriente, Periquito e Alpercata.
10/2022	Realização de treinamento em parceria com o IEF-MG para elaboração dos PRA's do PG40, conforme Acordo de Cooperação Técnica.
12/2022	Aprovado a contratação de Empresa especializada para consultoria na elaboração do marco legal da elaboração dos PRA's no Espírito Santo.

Indicadores

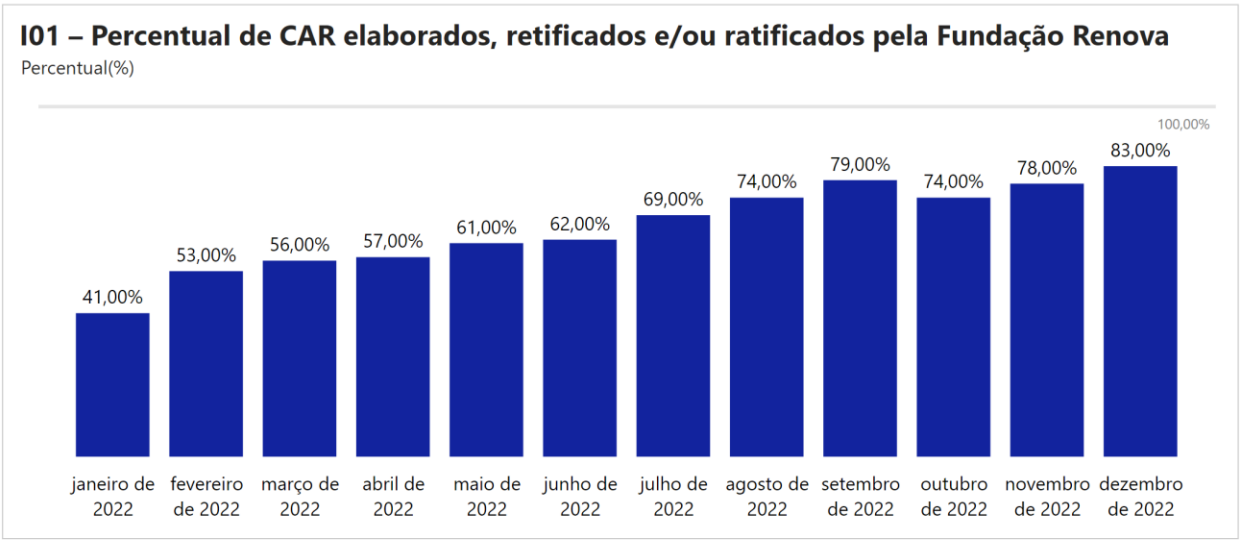


Gráfico 1: I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Frequência Mensal

Resultado do indicador ajustado em conformidade com os grandes números, considerando a variação mensal do número de aderidos ao programa.

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADE DE MEDIDA
I02	Percentual de Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADAs) elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de PRADAs elaborados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%
I03	Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/ posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Quantidade de Termos de Compromisso assinados / Quantidade de imóveis que aderiram ao programa	%

PG042 Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivo

Ressarcir os compromitentes do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais, observada a política de compliance da Fundação, conforme cláusulas 141 a 143 do TTAC.

Status de Cláusulas e Deliberações

Cláusula	141	Caput	Concluída Internamente
Cláusula	142	Caput	Concluída Internamente

Concluído Internamente - O item foi concluído pela Fundação Renova, mas ainda deverá ser validado pelo CIF.
Encerrado - O item já foi concluído pela Fundação Renova e validado pelo CIF.

Entregas do ano de 2022

O programa não possui entregas concluídas no ano de 2022. Os marcos previstos foram replanejados.

Grandes números do programa

- Até o momento foram ressarcidas 40 **Prefeituras** e 19 **Órgãos Compromitentes;**

- Os ressarcimentos somam **R$** 53,97 milhões pagos para às **Prefeituras** e **R$** 29,95 milhões pagos aos **Orgãos Compromitentes**.

- No âmbito da cláusula 143 do TTAC, foram ressarcidos um valor total de **R$** 654,7 Mil, referente a 2 **órgãos compromitentes** e 1 **município** (ressarcimento dos aluguéis sociais de Linhares).

Fatos relevantes do Ano

05/2022 Protocolada pela CT-EI Nota Técnica de aprovação do encerramento da cláusula 142 do TTAC em maio de 2022.

06/2022 Protocolada pela CT-EI Nota Técnica de aprovação do encerramento da cláusula 141 do TTAC em junho de 2022.

10/2022 Conclusão do ressarcimento de gastos públicos extraordinários ao Gabinete Militar (no âmbito da Cláusula 143 do TTAC).

Indicadores

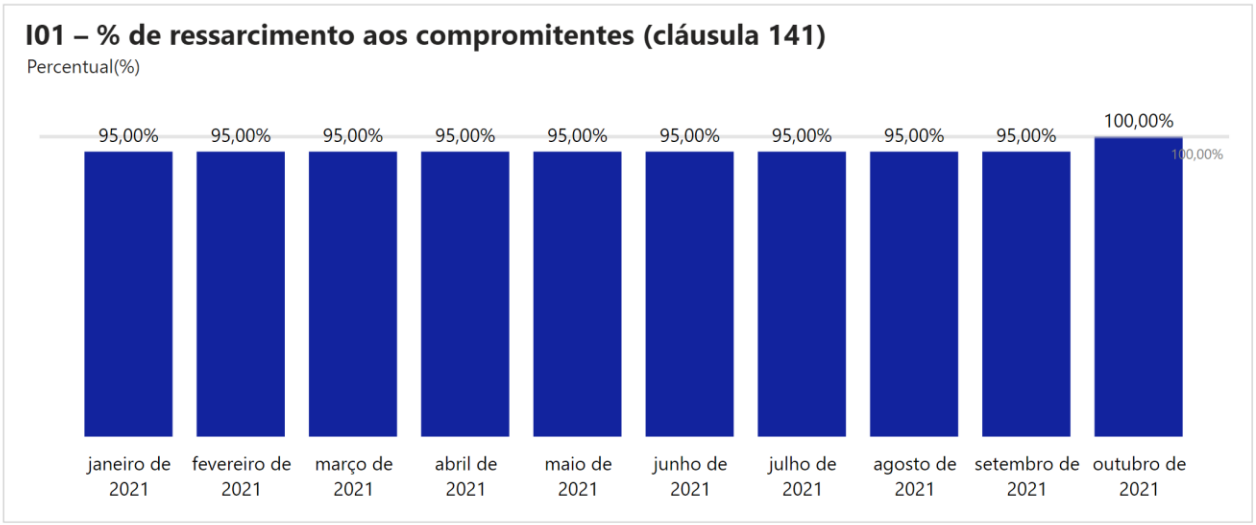


Gráfico 1: I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) - Frequência Mensal

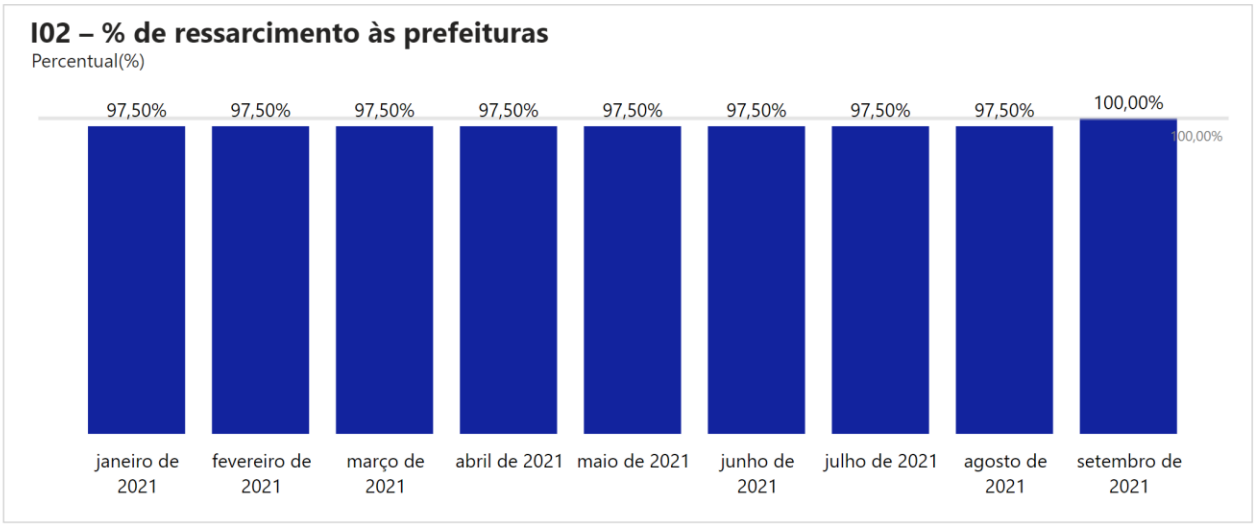


Gráfico 2: I02 – % de ressarcimento às prefeituras - Frequência Mensal

Indicadores

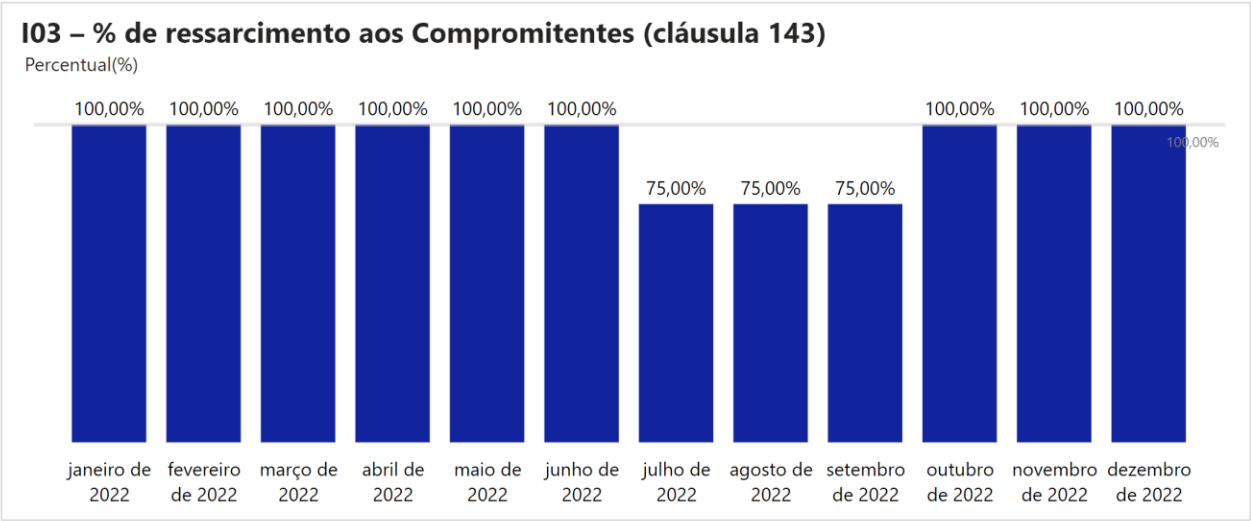


Gráfico 2: I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143) - Frequência Mensal

Glossário

I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades, que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:

a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por óbito ou por desaparecimento;

b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou mantinham relação de dependência econômica;

c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou perda da posse de bem imóvel;

d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem imóvel ou de parcela dele;

e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade extrativa ou produtiva;

f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência das quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo com áreas atingidas;

g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;

h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de populações;

i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que sofram limitação no exercício dos seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.

IV. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.

V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo (AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão, avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.

XXIII. Ação para itens cláusulas do TTAC e deliberações são as ações a serem cumpridas pela Fundação Renova, os status reportados no presente relatório são descritas a seguir:

a. Concluída internamente, o item foi concluído pela Fundação Renova mas ainda deverá ser validado pelo CIF ou já foi declarado seu descumprimento;

b. Em andamento, itens cujo atendimento já foi iniciado ou que possuem uma obrigação recorrente;

c. Encerrado, item concluído e aprovado oficialmente pelo CIF;


d. Judicializado, não houve consenso entre Fundação Renova e CIF sobre o atendimento ao item, que passa a ser acompanhado através das decisões na 12º Vara;


e. Pendente, a conclusão do item não depende somente da Fundação Renova, mas de outros fatores externos;

f. Planejada, itens que estão no prazo, porém o seu atendimento ainda não foi iniciado;

g. Reprogramado, item não foi concluído no prazo e precisou ser replanejado;

Taxa de acidentes registrados

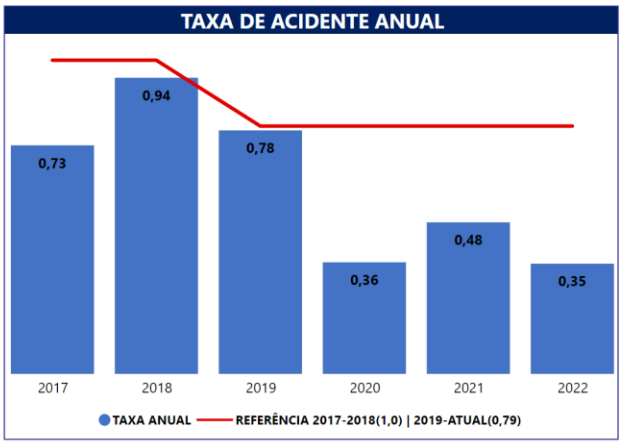

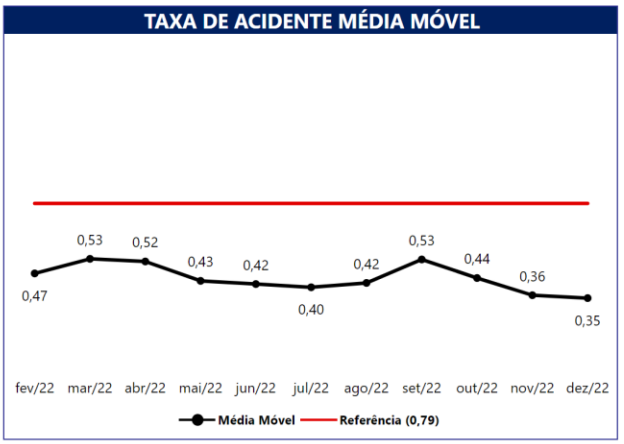

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa. A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas aumentem, esse valor pode cair.

Gestão Econômica*

		Anual Total				Anual Acumulado			
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Orçamento	Realizado	Variação	%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	17,2	13,4	-3,8	-22,0%	17,2	13,4	-3,8	-22,0%
PG15	INOVAÇÃO	4,0	3,6	-0,4	-11,0%	4,0	3,6	-0,4	-11,0%
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	21,3	26,5	5,2	24,2%	21,3	26,5	5,2	24,2%
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	5,7	7,1	1,4	24,5%	5,7	7,1	1,4	24,5%
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	97,3	102,6	5,2	5,4%	97,3	102,6	5,2	5,4%
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	25,0	18,8	-6,2	-24,7%	25,0	18,8	-6,2	-24,7%
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	9,3	5,6	-3,7	-39,4%	9,3	5,6	-3,7	-39,4%
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	45,0	26,9	-18,1	-40,3%	45,0	26,9	-18,1	-40,3%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	77,3	68,3	-9,1	-11,7%	77,3	68,3	-9,1	-11,7%
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	22,4	15,7	-6,7	-30,0%	22,4	15,7	-6,7	-30,0%
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	5,7	4,9	-0,8	-13,5%	5,7	4,9	-0,8	-13,5%
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	4,4	0,8	-3,6	-82,1%	4,4	0,8	-3,6	-82,1%
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	2,1	2,0	-0,1	-4,5%	2,1	2,0	-0,1	-4,5%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	10,7	8,4	-2,2	-21,0%	10,7	8,4	-2,2	-21,0%
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	1,9	1,8	0,0	-1,6%	1,9	1,8	0,0	-1,6%
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	41,0	1,6	-39,4	-96,1%	41,0	1,6	-39,4	-96,1%
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Total Compensatórios		390,5	308,1	-82,4	-21,1%	390,5	308,1	-82,4	-21,1%
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG01	CADASTRO	60,0	33,8	-26,2	-43,7%	60,0	33,8	-26,2	-43,7%
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	5569,4	4282,8	-1286,5	-23,1%	5569,4	4282,8	-1286,5	-23,1%
PG03	POVOS INDÍGENAS	119,7	115,7	-4,0	-3,3%	119,7	115,7	-4,0	-3,3%
PG04	POVOS TRADICIONAIS	44,5	5,8	-38,6	-86,9%	44,5	5,8	-38,6	-86,9%
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	15,2	12,8	-2,4	-15,8%	15,2	12,8	-2,4	-15,8%
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	99,2	95,6	-3,6	-3,6%	99,2	95,6	-3,6	-3,6%
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	9,8	8,4	-1,3	-13,5%	9,8	8,4	-1,3	-13,5%
PG08	REASSENTAMENTO	1556,1	1439,5	-116,7	-7,5%	1556,1	1439,5	-116,7	-7,5%
PG09	UHE CANDONGA	590,0	562,3	-27,7	-4,7%	590,0	562,3	-27,7	-4,7%
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	102,9	84,7	-18,2	-17,7%	102,9	84,7	-18,2	-17,7%
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	7,4	7,7	0,3	4,0%	7,4	7,7	0,3	4,0%
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	9,4	11,6	2,2	23,1%	9,4	11,6	2,2	23,1%
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	2,8	3,5	0,7	25,6%	2,8	3,5	0,7	25,6%
PG14	SAÚDE	6,1	8,5	2,4	40,1%	6,1	8,5	2,4	40,1%
PG16	PESCA	23,2	17,9	-5,2	-22,6%	23,2	17,9	-5,2	-22,6%
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	100,0	68,9	-31,1	-31,1%	100,0	68,9	-31,1	-31,1%
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	9,9	9,2	-0,7	-6,6%	9,9	9,2	-0,7	-6,6%
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	108,0	603,4	495,4	458,5%	108,0	603,4	495,4	458,5%
PG23	MANEJO DE REJEITOS	158,6	119,0	-39,5	-24,9%	158,6	119,0	-39,5	-24,9%
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	2,9	0,2	-2,7	-91,6%	2,9	0,2	-2,7	-91,6%
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	26,3	23,6	-2,7	-10,1%	26,3	23,6	-2,7	-10,1%
PG28	BIODIVERSIDADE	107,6	135,3	27,7	25,7%	107,6	135,3	27,7	25,7%
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	39,2	28,4	-10,8	-27,6%	39,2	28,4	-10,8	-27,6%
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	169,1	127,5	-41,6	-24,6%	169,1	127,5	-41,6	-24,6%
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	39,6	36,1	-3,5	-8,9%	39,6	36,1	-3,5	-8,9%
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	4,0	3,5	-0,5	-13,3%	4,0	3,5	-0,5	-13,3%
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	337,9	312,5	-25,5	-7,5%	337,9	312,5	-25,5	-7,5%
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	
PG99	CONTINGÊNCIA	64,8	0,0	-64,8	-100,0%	64,8	0,0	-64,8	-100,0%
Total Reparatórios		9383,6	8158,4	-1225,1	-13,1%	9383,6	8158,4	-1225,1	-13,1%
Total Programas		9774,1	8466,5	-1307,6	-13,4%	9774,1	8466,5	-1307,6	-13,4%
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	192,8	163,5	-29,3	-15,2%	192,8	163,5	-29,3	-15,2%
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	23,5	87,4	63,9	271,5%	23,5	87,4	63,9	271,5%
Total Despesas Administrativas		216,3	250,9	34,6	16,0%	216,3	250,9	34,6	16,0%
Total Geral		9990,4	8717,4	-1273,0	-12,7%	9990,4	8717,4	-1273,0	-12,7%

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	1,73	2,90	1,16	0,67	Economia Edital Doce: Econimia de (R$ 3,5MM) por projetos cancelados/desistentes ou prestação de contas reprovadas Plano de Ação: Utilização do saldo remanescente em edições futuras do Edital. Fatores Internos Postergação: (R$ 0,3 MM) Torneio de Pesca: postergação do cronograma de execução do projeto em virtude da turbidez da água e de recomendação do Relacionamento Institucional da FR. Plano de Ação: Antecipação de ações do Incentivo à Leitura a fim de compensar os desvios causados pelo projeto. Fatores Externos Sem fatores externos realcionados Plano de Ação: N/A.
PG15	INOVAÇÃO	0,43	0,85	0,42	0,98	Fatores Internos: (R$ 0,7 M) Chamada 09/2018: Atraso nas prestações de contas dos projetos vinculados a FAPEMIG para baixas de adiantamento da 1ª parcela dos projetos e execução dos convênios abaixo do planejado (<80%). Plano de Ação: Realizar de aditivo de prazo aos convênios. Prazo: 30/01/2023. + R$ 0,4 M Hub de Inovação: Antecipação de atividades. Plano de Ação: N/A. Fatores Externos: (R$ 0,1 M) Edital de Tecnologias Inovadoras: Atraso na Aprovação pelo CIF. Projeto postergado para 2024. Alterado Draft 20. Plano de Ação: Apresentar projeto e NT emitida pela CTEI em outras CTs conforme indicação do CIF. Prazo: 28/02/2023.
PG18	DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL	1,69	5,54	3,85	2,28	Fatores Internos: + R$ 6,5 MM Distrito Empresarial de Mariana: Antecipação do repasse dos recursos, realizado em parcela única. Plano de Ação: N/A. (R$ 1,1 M) Projeto Agroecológico MG: Negociação de data de prestação de fornecedor alterada para início de 2023. Plano de Ação: Acompanhar próximas prestações de contas junto ao parceiro. (R$ 0,2 M) Casa do Empreendedor: A obra foi concluída e o restante do valor será medido em janeiro/23. Plano de Ação: N/A.
PG20	CONTRATAÇÃO LOCAL	0,50	0,89	0,40	0,80	Fatores Internos: + R$ 1,1 M Empresa Especializada RH: Contrato CPHO. Aumento na procura capacitação para o mercado de trabalho. Plano de Ação: N/A. + R$ 0,7 M Qualificação Profissional: Contratos SENAI MG e ES. Antecipação das capacitações projetadas para o ano de 2023. Plano de Ação: N/A. + R$ 0,3 M Plano de Desenvolvimento Fornecedores: + Gestão. Contrato DVF. Aumento no número de empresas participantes. Plano de Ação: N/A. Fatores Externos: (R$ 0,6 M) Estudos e Mapeamento: Atraso no início do Mapeamento de mão de obra de Mariana (Contrato Expressão Socioambiental) por conta da demora do parecer da CTEI e Deliberação CIF. Não foi iniciado em 2022, o estudo Prospecção de Fornecedores (Contrato DVF) aguardando parecer da CTEI e Deliberação CIF. Plano de Ação: Aguardar Deliberação. Ajuste Draft 20 (concluído).

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPs	25,09	20,29	-4,80	-0,19	Fatores Internos R$ 5,2 MM: Processo de aceleração sendo implementado através de adiantamento das mobilizações. Priorização do processo de mobilização e engajamento de produtores rurais, validação de áreas, elaboração de projetos, estaqueamento e Cercamento. Início de novos contratos em setembro, com medição das mobilizações das contratadas. Plano de Ação: Efetivar as contratações necessárias para o ciclo (16 lotes em 2 editais). Contratação de 1 lote exclusivo para execução de cercamento. Reajustes nos valores dos contratos com atividades de cercamento. Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas.
PG27	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	4,92	1,96	-2,96	-0,60	Fatores Internos (R$ 6,17 MM): Priorização do PG26 em relação ao PG27. E não definição das nascentes do CBHdoce quanto as nascentes do Piracicaba, DO3 - Santo Antônio, DO4 - Caratinga. Plano de ação: Reforçar junto aos fornecedores contratados para plano de ataque as atividades do programa 27 para aumento da produção referente as atividades de Validação de Áreas dos Produtores Rurais, Elaboração de Projetos, Estaqueamento, Instalação de Cercamento, Preparo de Solo e Manutenção das áreas.
PG29	ESTRUTURA TRIAGEM	2,12	1,05	-1,08	-0,51	Fatores Externos: Atrasos devido a decisões externas (IBAMA) em função da indefinição da área de construção dos CETRAS. (R$ 3.67MM): Plano de Ação: Ajustes ao atual cenário realizados no DRAFT 20. Aguardando aprovação e GMUD prevista para final de Janeiro/23 do cronograma.
PG31	SANEAMENTO BÁSICO	8,17	0,55	-7,63	-0,93	Economia R$ 0,00 Plano de Ação: N/A Fatores Internos R$ 0,00 Plano de Ação: N/A Fatores Externos (R$ 18,15 MM) (Os municípios não apresentaram as medições conforme previsto em cronograma, e consequentemente, o repasse do recurso não foi realizado) Plano de Ação: Realizar reuniões periódicas com os municípios para alinhamento dos processos, entendimento dos atrasos, orientações e repactuação das entregas definidas em cronograma
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	15,34	12,51	-2,83	-0,18	Economia R$ 0 MM: Plano de Ação: Fatores Internos R$ -9,1 MM: A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento Plano de Ação: Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (expectativa de recuperação com a conclusão da montagem da estrutura metálica da captação). Fatores Externos R$ 0,0 MM: Plano de Ação: NA

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG33	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,76	2,11	1,35	1,78	Economia (R$ 0,47M): Referente a economia real no Projeto Liderança Jovens. Plano de Ação: valores redistribuidos na revisão orçamentária do Draft20. Fatores Internos Antecipaçãp (R$0,32M) Executado a maior no interfaces com intuito de reduzir a aderência negativa anual do PG33 Plano de Ação: Acompnahar a execução/aderência do projeto interfaces. Postegação (R$ 6,59MM): Sendo R$ 6,35MM referente ao pagamento da definitividade do IFES e R$ 0,16MM ao atraso no pagamento de bolsas para cursistas, professores e tutores pela UFMG/UFOP R$ 0,08MM referente referente ao Projeto de Fortalecimento de Redes e outros. Plano de Ação: Executar ações junto ao IFES e demais setores internos para conclusão da Definitividade. Fatores Externos Sem fatores externos realcionados Plano de Ação: N/A.
PG34	EMERGÊNCIA AMBIENTAL	0,97	0,44	-0,53	-0,54	Fatores Internos: Postergação da implementação dos projetos de Sistema de Proteção e Combate à Incêndio (SPCI) do Escola Segura. (R$ 0,8MM) Plano de Ação: Iniciar processo de contratação da execução dos Projetos pela Infraestrutura.
PG35	INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	0,81	0,02	-0,79	-0,98	Fatores Externos: Demora dos agentes externos (ICMBio e Prefeituras Municipais) para assinatura dos termos de parcerias. Postergação: R$3,6MM - CIT Mariana - Em fase de re-negociação da parceria com a Prefeitura Municipal para instalação do equipamento no Terminal Turístico. - CIT GV - Projeto executivo finalizado, formalização da parceria com a PMGV realizada, aguardando início da contratação de obras para instalação do equipamento. - CIT Linhares - Termo de Parceria em processo de finalização de assinatura pelo ICMBio. * Implantado os pontos de acesso a Plataforma Interativa em todos as três localidades. Plano de Ação: O Programa está ampliando os pontos de acesso para mitigar o atraso na instalação dos CITs e melhorar ambiência com CT-PDCS. Devido aos atrasos decorrentes da não formalização da pareceria com os entes, os orçamentos serão reprogramados no Draft 20.
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL INTERNACIONAL	0,18	0,34	0,16	0,89	Economia: R$ 0,1 MM: Processo concorrencial do fee mensal negociado abaixo do orçamento previsto. Plano de ação: revisão da estimativa no Draft20

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,59	0,09	-0,50	-0,84	Fatores Externos (R$ 2,2MM) Causa: Atraso no recebimento dos termos de referência, impossibilitaram as contratações previstas no período e, consequentemente, geraram a postergação de atividades/medições do RVS. Plano de Ação: Executar as contratações referentes aos termos recebidos.
PG40	IMPLANTAÇÃO CAR E PRAS	0,28	0,72	0,44	1,54	Fatores Internos +R$ 0,11MM - Avanço nas atividades de elaboração do CAR, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada (PAR) a jusante, com antecipação das entregas. Plano de ação: N/A (R$ 0,22MM) - Gerenciamento execução a menor. Plano de ação: Replanejamento. +R$ 0,41MM - Atividades de implantação dos pilotos iniciada. Plano de ação: N/A. (R$ 0,23MM) - Atraso na contratação de consultoria para o marco legal em atendimento ao ACT-IDAF, devido necessidade de revisão dos valores previstos e necessidade de APRO. Plano de ação: Finalizar contratação e iniciar as atividades com a consultoria para definição do marco legal. Fatores Externos/ORGÃO GOVERNAMENTAL (R$ 0,10MM) - Houve atraso no início da elaboração dos PRA's devido indefinições quanto à realização do PRA via SEI em MG, conforme ACT-IEF; e indefinições acerca a elaboração dos projetos no ES a partir da publicação do marco legal e sua operacionalização com o IDAF. Atualmente atividades em andamento. Plano de ação: Acompanhar a execução da Consominas na elaboração dos PRA's em MG; iniciar a elaboração dos PRA's no ES assim que publicado o marco legal (EM ANDAMENTO).
PG43	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	23,03	0,03	-23,00	-1,00	Fatores Internos (R$ 0,12 MM): Plano de Emergência Linhares - Compra de equipamentos em andamento (R$ 0,20 MM): Gerenciamento Escritório Forum Prefeitos Fatores Externos (R$ 16,5 MM): Base Integrada: Estado de Minas Gerais não assinou o Termo Juridico de Repasse de Recurso com a condicionante de prestação de contas por perícia. Nova APRO em andamento excluindo a perícia para dar contunuidade ao processo. (R$ 11,3 MM): Perícia AECOM Agenda Integrada: suspensa desde out-21 pela 12ª vara. Aguardando decisão judicial determinando a retomada de novos pagamentos (R$ 10,1 MM): Repasse SAA Degredo – protocolado na 12ªvara, aguardando homologação e apresentação do projeto pela Prefeitura de Linhares. O repasse será reprogramado para 2023. (R$ 1,2 MM): Apoio SUS - Repasse para Rio Doce. O acordo se encontra em análise com o município de Rio Doce. Plano de Ação: Acompanhar com o Jurídico a negociação e homologação dos acordos em andamento e status da perícia.
PG97	PROJETOS COMP - SALDO A ALOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia R$ XXX: Plano de Ação: Fatores Internos R$ XXX: Plano de Ação: Fatores Externos R$ XXX: Plano de Ação:
Total Compensatórios		86,62	50,29	-36,33	-0,42	

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG00	MEDIDAS MITIGATÓRIAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia R$ XXX: Plano de Ação: Fatores Internos R$ XXX: Plano de Ação: Fatores Externos R$ XXX: Plano de Ação:
PG01	CADASTRO	8,58	4,07	-4,52	-0,53	Economia R$ 0,0MM: Plano de Ação: Fatores Internos R$ 0,0MM: Plano de Ação: Fatores Externos (R$ 26,2MM): Decisão judicial para alteração do modelo de entrevistas a ser realziado pelo Cadastro. Já em execução desde novembro 2022. Postergação dos serviços de perícia para 2023. Plano de Ação: Execução continuada do cadastro durante o ano de 2023.
PG02	PIM - INDENIZAÇÃO ATINGIDOS	986,49	1.272,17	285,69	0,29	Fatores Internos (R$ 95,37) Outros: não efetivação do aditivo da perícia, menores despesas com escritórios e serviços, etc. Fatores Externos R$ 990,62: Reembolso dos honorários deduzidos dos atingidos devido decisão judicial R$ 524,70: Retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial (R$ 890,77): Aba Recursal: 8,8 mil indenizações não pagas devido indefinições processo de perícia (R$ 477,41): Dano Água: 20,0 mil indenizações não pagas devido questões judiciais relacionadas a GV (R$ 593,15): Novel: 7,0 mil pagamentos a menor e efeito do ticket-médio real/orçado (R$ 220,45): Processos de DG com laudos abaixo do previsto e novo PIM Convencional não iniciado
PG03	POVOS INDÍGENAS	19,32	52,32	33,00	1,71	Economia (R$ 4,0): Fornecimento de Água Krenak. Contrato da Danone está em processo de encerramento. Copasa, aditivo assinado em outrubro/22. JC Lima com aditivo de valor e prazo em andamento para 2023. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft e monitorar as medições dos contratos. Economia (R$ 2,0): Alimentação animal Resplendor. Reajuste contratual abaixo do previsto. Plano de Ação: Adequar o orçamento no próximo Draft. Fatores Internos (R$ 8,5): Manutenção de estradas Resplendor. Os contratos dessa DR não possuem uma média regular, pois estão associados às condições climáticas, que interferem na degradação das vias e, consequentemente, demandam maior ou menor uso de agregados, a depender do período. Postergação de ações de outros escopos. Plano de Ação: Acompanhar as medições dos contratos junto ao ponto focal. Fatores Externos (R$ 47,7): SAA, PBA e Fundo Retomada Economica - TG e Comboios. Atraso no cronograma devido a paralisação das atividades do PBA em virtude do conflito gerado pela decisão judicial do retorno do pagamento ASE. Plano de Ação: Construir mesa de diálogo com a comunidade para superação dos dissensos relacionados ao retorno do ASE e consequente retomada das atividades de detalhamento do PBAI e reprogramar dos prazos de construção e detalhamento do PBAI. Fatores Externos R$ 58,2: Retomada do pagamento do ASE para TG e Comboios, conforme decisão judicial de outubro/22, onde foi deliberado desembolso retroativo a janeiro/22. Plano de Ação: Acompanhar fluxo dos pagamentos retroativo e mensal; acompanhar as prestações de contas das associações.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG04	POVOS TRADICIONAIS	0,66	0,07	-0,59	-0,89	Fatores Externos (R$ 35,6): Plano Básico Ambiental e Indenização Coletiva de Danos Materiais Plano de Ação: A 4ª Vara Federal não validou o acordo referente ao Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) e determinou que a Fundação Renova realize a execução das ações do PBAQ. Portanto, o repasse financeiro à ASPERD não foi realizado. O Programa está avaliando com o jurídico o recurso para essa decisão. Fatores Internos: (R$ 3,0): Postergação de outros escopos Plano de Ação: Revisão do fluxo economico e remanejamento de escopo para adequanção do orçamento no próximo ciclo
PG05	PROTEÇÃO SOCIAL	3,63	1,36	-2,28	-0,63	Fatores Internos (R$ 2,4): Planos municipais e estaduais em proteção social. Atraso na pactuação e consequentemente na prestação de contas dos municípios não aderentes; atraso em prestação de contas de planos municipais e estadual em execução; não utilização do valor integral repassado, com possível negociação de remanejamento de valores com os municípios/entidades; realização de capacitação online gerando economia com logísitica; atraso na anuência dos muncípios para o aditivo de baixa contábil e repasse único do saldo de cada termo. Plano de Ação: Negociar com municípios e entidades remanejamento de valores e repasse integral dos valores remanescentes com baixa contábil; acompanhar sistematicamente o processo de prestação de contas; realizar ajustes nos planos com municípios não aderentes, após pactuado na audiência de conciliação realizada em out/22 e implementá-los.
PG07	ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	0,94	0,93	0,00	0,00	Fatores Internos: i. 77% do desvio de variações em função de postergação de execução (aquisição de animais e adequações e reformas de fazendas para garantia de bem-estar animal); e ii. 23% do desvio de contratos sob demanda Plano de Ação: 1. Continuar a apresentação de propostas para compra de animais; 2. Mobilizar via Pedido de Usuário as reformas cabíveis e aguardar disponibilização de equipe de contratos de infraestrutura de outras áreas para realização das manutenções (Ex.: Moradia Temporária).

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG06	PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGO	7,28	10,04	2,75	0,38	Economia Canais de Relacionamento: (R$ 0,5 MM) Plano de Ação: Revisão dos desenbolsos e reclassificação de gastos realizados em contas indevidas. Processo de aprimoramento dos gastos refletidos no Draft 20. Fatores Internos Postergação: (R$ 1,9 MM) - Canais de Relacionamento: Ampliação da capacitade de atendimento do 0800 em atendimento a decisão judicial, revisão dos gastos relativos as infraestruturas dos CIAs. Plano de Ação: revisão da redistribuição do pilar junto ao Draft 20| Solicitação de reclassificação dos gastos dos CIAs vinculando aos contratos de prestação de serviço nos corretos DRs. Postergação: (R$ 10,8 MM) - Diálogo: Execução a menor decorrente da foroalização do contrato de prestação dos serviços de diálogo a menor do que o programado pelo programa. Reprogramação quanto a realização dos fóruns de prestação de contas e implantação da plataforma interativa. Plano de Ação: Revisão das entregas/atividades do programa de forma a garantir melhor aderência orçamentária e adequação no orçamento Draft 20. Antecipação: R$ 1,9 MM - Comunicação: Os materiais impressos estavam sendo distribuídos apenas em versão digital, Contratos sob demandas não executados. Plano de Ação: Retorno da distribuição do material impresso e de atividades presenciais, revisão orçamentaria realizada no draft 20 aprovado garantido melhor aderencia, Plano de ação do PG06 sendo implantado no 2° semestre, campanha de territorios sendo realizada. Antecipação: R$ 0,7 MM - Vimver: Em 2022 tivemos um aumento significativo da demanda por visitas do Vimver em todo o território, fazendo que o realizado superasse o orçado. Plano de Ação: Revisar as demandas de modo a garantir uma melhor aderência orçamentária. Fatores Externos Antecipação: R$12 MM - Assessorias técnicas: referente ao saldo bloqueado na ACP Mariana; Plano de ação: Valores ajustados no Draft20. (R$ 5,0 MM) - Assessorias técnicas: Aguardando parecer judicial referente as inconsistências das prestações de contas dos adiantamentos realizados para Aedas e Rosa Fortini. Plano de Ação: Acompanhar a decisão judicial do contrato Aedas e recebimento da prestação de contas da Rosa Fortini.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG08	REASSENTAMENTO	172,92	168,14	-4,78	-0,03	Economia (R$ 11,6 MM): Flexibilização dos protocolos Covid-19. Plano de Ação: Será realizado take-off nos contratos para ajustes dos valores compromissados. Fatores Internos (R$ 53,1 MM) Contingência não utilizada. Valores realocados para a base do orçamento de 2023 (Draft20) (R$ 27,5 MM) Infraestrutura remanescente Bento: Baixa performance da empresa VINA; (R$ 23,4 MM) Equip. Públicos Paracatu. Menor performance das contratadas. Novo Pacote em contratação; (R$ 1,1 MM) Demais pacotes. Plano de Ação: Gestão junto às Contratadas e Plano de Ação para recuperação (Plano de Aceleração em implantação) e adequação da curva de desembolso no Draft20 Fatores Externos R$ 0,0 MM: Não se aplica. Não houve mpacto orçamentário por fatores externos Plano de Ação:
PG10	INFRAESTRUTURA IMPACTADA	10,45	11,96	1,51	0,14	Economia R$ 0,00: Plano de Ação: N/A Fatores Internos (R$ 6,5MM): Pleitos da AG ainda não finalizados (CTs RBAR e PBAR). Atraso na contratação das Pontes e Campo de Ponte do Gama (Aliado a dificuldades com MO e baixa performance). Plano de Ação: Valores de pleitos foram transferidos para contingência (Draft20). Ações junto as contratadas estão sendo realizadas para mitigar e recuperar os atrasos. Fatores Externos (R$ 11,8MM): AECOM teve pagamentos suspensos. Valores de repasse para Barra Longa ainda não efetivados. Entraves fundiários/cartoriais para aquisição do Terreno para Campo de Pedras. Plano de Ação: Valores da AECOM foram transferidos para contingência (Draft20). Entraves com o terreno de Pedras já solucionados e em andamento. Valores de repasse em tramites finais junto ao jurídico e prefeitura.
PG11	RECUPERAÇÃO ESCOLAS	0,94	0,96	0,01	0,01	Economia Sem economia realcionada. Plano de Ação: N/A Fatores Internos Adiantamento: R$ 0,2 MM - Psicopedagógico Institucional: Estão sendo realizadas mais oficinas com os alunos do que o previsto inicialmente/ 0,1MM Renegociação de valores no aditivo do contrato de transporte escolar. Plano de Ação: N/A- Desvio no limite aceitável. Fatores Externos Sem fatores externos realcionados Plano de Ação: N/A.
PG09	UHE CANDONGA	55,16	58,94	3,79	0,07	Economia: R$ 0,0MM: Plano de Ação: Fatores Internos: (R$ 27,7MM): Desembolso menor que o previsto na recuperação da UHE pois houve alteração de escopo e baixa performance da contratada; menor execução das Condicionantes devido revisão de escopo; serviços de Infraestrutura das Pilhas e Empilhamento tiveram atraso, não atingindo o desembolso previsto mesmo com serviços adicionais realizados pelo Consórcio Rio Doce. Plano de Ação: Serviços a serem realizados no ano de 2023. Fatores Externos R$: 0,0MM: Plano de Ação:

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA	1,21	0,94	-0,27	-0,22	Economia Sem economia realcionada. Plano de Ação: N/A. Fatores Internos Adiantamento: R$ 2,2 MM - Valor referente à provisão de recursos realizada em setembro pela Infra para pagamento do pleito referente ao contrato da Hexágono no PG 12. A Nota fiscal referente a este pleito foi dada entrada debitado do programa no mês de Dezembro. Plano de Ação: No Draft 20 foi ajustado o valor que estava previsto para o ano de 2023 para dezembro de 2022. Fatores Externos Sem fatores externos realcionados Plano de Ação: N/A.
PG13	TURISMO CULTURA LAZER E ESPORTE	0,25	0,29	0,04	0,16	Economia Sem economia realcionada. Plano de Ação: N/A Fatores Internos Adiantamento: Edital Doce: Antecipação das prestaçãoes de contas da 2ª Edição do Edital Doce (Reparação do Lazer). Plano de Ação: N/A. Será mantida a antecipação das ações e ajustada no draft20. Fatores Externos Sem fatores externos realcionados Plano de Ação: N/A.
PG14	SAÚDE	1,16	0,06	-1,10	-0,94	Fatores Internos: +R$ 3,1 MM Plano Mariana: Desvio referente a prestação de contas de todos os repasses para contratação de RH já efetuados para Mariana, não previstos no orçamento de 2022. Repasses em cumprimento da ACP. Plano de ação: reprogramado no Draft 20 Economia: -R$ 0,7 MM -R$ 0,5 MM Programa de Capacitação dos Municípios: mudança na modalidade de capacitação, de ensino presencial para ensino à distância. -R$ 0,2 MM Medição de repasse realizada abaixo dos valores planejados para Barra Longa. Os valores orçados para a suplementação de mão de obra foram realizados de acordo com os valores praticados pela empresa Contexto. Os valores praticados pelo município de Barra Longa são menores, gerando economia. Plano de ação: reprogramado no Draft 20
PG16	PESCA	4,09	0,58	-3,51	-0,86	Economia: (R$ 0,2 M) Programa de Aceleração: Projeto foi concluído e encerrado com saldo no diagrama de rede (Execução PG18). Plano de Ação: Remanejamento do valor foi realocado no Draft 20 para outras atividades do Programa. Fatores Internos: (R$ 1,2 M) Projeto Cultivando para o Pescar: Atraso nas medições anteriores devido as inconsistências nas documentações apresentadas. Plano de Ação: Aditivo em andamento com mais recursos humanos para concluir o projeto. Ajustar Draft 20 (concluído). (R$ 1,1 M) Caracterização Social e Monitoramento Pesqueiro: Reprogramação das atividades com impacto do aditivo. Plano de Ação: Ajustar Draft 20 (concluído). (R$ 0,7 M) Projetos da Foz: Impacto da execução das obras Edificação de Povoação, Projeto Miniestação, Rampa de Subida de Barco e custos com Engenharia. Plano de Ação: Ajustar Draft 20 (concluído). Fatores Externos: (R$ 1,0 M) ATER MG e ES: Atraso no início da execução devido a paralisação do processo de contratação em função das condições impostas pela CTEI. Plano de Ação: Contratação (concluída) . No Draft 20, está previsto para inicio em 2024, mas será antecipado. (R$ 1,0 M) Fomento para a Retomada Econômica: Esse valor foi incluído no orçamento a pedido da Diretoria para que pudesse ter início ainda em 2022, porém não foi possível por fatores externos/ estratégia. Plano de Ação: Postergado para 2023.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG19	RECUPERAÇÃO NEGÓCIOS	1,15	1,34	0,18	0,16	Fatores Internos: (R$ 1,0 M) Reposição de Insumos e Equipamentos Reassentamento: Atraso na entrega da Infraestrutura com reprogramação da execução. Plano de Ação: Estabelecer integração com a coordenação do Reassentamento. Prazo: 31/01/2023. +R$ 0,3 M Locação de Espaços Comerciais Reassentamento: Custo não previsto com pagamento de compensação financeira retroativa. Plano de Ação: N/A.
PG21	AFE - AUXÍLIO FINANCEIRO	14,52	32,57	18,05	1,24	Fatores Internos (R$ 29,30) Outros: realizado abaixo do previsto nos serviços de apoio jurídico e TI Fatores Externos R$ 524,70: Retomada dos AFEs cancelados por decisão judicial

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG17	ATIVIDADE AGROPECUÁRIA	39,80	11,12	-28,68	-0,72	Fatores Externos Açoes da Infra (R$ 31,87 MM) - Em análise de pecúnia judicialmente. Execução da proteção de taludes abaixo do previsto. Plano de ação: N/A. +R$ 3,12 MM - Prorrogação no fornecimento de silagem no território 2 (Médio e Baixo Doce) por decisão do juízo da 12° vara (ACP). Plano de ação: N/A. Fatores Internos (R$ 1,11 MM) - Custeios administrativos e outros, sob demanda. Plano de ação: N/A. (R$ 1,69 MM) - MELHORAMENTO (RENOVA REBANHO): Medições aquém do planejado devido evasão do programa qualidade do leite, por aumento no preço dos insumos, queda no preço do leite e mão de obra escassa no território, ocasionando desistências do programa por parte de alguns produtores. FLORESTAL: Baixa produtividade da Ambiência. Plano de ação: Revisão dos custeios no Draft 20. +R$ 4,30 MM - Avanço nas atividades de saneamento rural por alta performance; Avanço nas atividades ATER 2 e Reparação dos danos, como reflexo do Plano de Aceleração da Retomada (PAR) a jusante, com antecipação das entregas. Plano de ação: N/A. (R$ 2,97 MM) - UD's: Orçamento previsto para parceria com o WRI e as PU's para implantação juntoaos produtores. Mediante o declínio da instituição WRI para continuidade das atividades de Unidades Demonstrativas, a estratégia de atendimento está sendo revista e deverá ser validada junto à Câmara Técnica. Nestas condições, as atividades foram postergadas e serão replanejadas após definições; MELHORIAS ALTERNATIVAS: Replanejamento das atividades de recursos hídricos, em função de revisão das demandas PASEA e perfuração de poços; Desembolso previsto para a parceria CPCD , que foi replanejada para 2023. Plano de ação: UD's: Rever a estratégia de atendimento e validar junto à Câmara Técnica (EM ANDAMENTO). HÍDRICOS: Realizar abertura e medição de novas PU's para distribuição hídrica, adequação hidráulica, fornecimento de bebedouros e testes de bombeamento. (R$ 0,14 MM) - Parceria FUNDAGRES (ATER Coletiva ES). Valor referente a parcela que é prestada conta trimestralmente. Plano de Ação: N/A. (R$ 0,33 MM) - PSA: Desembolso PSA não ocorreu no prazo previsto, está em processo para pagamento, que serão feitos entre jan/23 e fev/23. SEGURO RURAL: Pagamento de seguro das propriedades rurais. Plano de ação: Realizar os pagamentos do PSA conforme planejado. (R$ 0,38 MM) - Gerenciamento execução a menor. Plano de ação: Replanejamento

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG23	MANEJO DE REJEITOS	17,66	11,04	-6,62	-0,37	Fatores Externos BARRAMENTO INFRA: - (R$40,68MM) Postergação: Atividades sob demanda. Atividades judicializadas. Plano de ação: Readequação orçamentária no draft 20. Pois depende de ações no âmbito das ações judiciais. (R$ 0,15MM) - Atraso na resposta da CT-GRSA sobre os planos de trabalho protocolados e ainda estão condicionados a homologação judicial. Plano de ação: Acompanhar junto ao jurídico as tratativas quanto ao tema. Fatores Internos +R$ 4,84MM - Infra Mariana - Execução acima do previsto por performance do fornecedor. Plano de ação: N/A (R$ 0,84MM) - Os desvios ocorrem majoritariamente no contrato da Ecosoft que possui estudos sob demanda que ainda não foram executados, além de alteração de estratégia junto ao órgão regulador (GESAR/FEAM). Plano de ação: N/A (R$ 3,95MM) - LICENCIAMENTO: Execução a menor devido ao não surgimento de demandas relacionadas a licenciamento ambiental dos projetos do Manejo. CONSULTORIA: O desvio mais relevante se encontra no serviço de transectos (a contratar) que foi previsto para iniciar em agosto de 2022, o que não ocorreu, devido às discussões com a CT e mudança de estratégia passando de um processo concorrencial para aditivo em contrato (Guarda-chuva Golder). RENATURALIZAÇÃO: Atraso na entrega de relatórios e necessidade de revisões o que causou impacto nas medições, além do atraso na conclusão da campanha de monitoramento 2 devido ao início antecipado das chuvas. PEER REVIEW PLANO MANEJO: Relatórios entregues pelo fornecedor (SRK) e não validados pela FR e replanejamento de prazos de entregas. GERENCIAMENTO PG23: Redução na equipe de gerenciamento devido a postergação de demandas e desmobilização de recursos, alem do processo de migração dos colaboradores entre gerenciadoras (MCA para PROGEN) ter levado mais tempo que o previsto inicialmente. Plano de ação: 1 - Controlar junto a compras o andamento do processo a fim de grantir o cumprimento dos prazos previstos no cronograma; 2 - Atuar junto ao fornecedor para cumprimento dos prazos de revisão e emissão de documentos. +R$ 1,85MM - BIOENGENHARIA: Os desvios ocorreram majoritariamente no contrato da Inovesa em que houve execução acima do previsto devido a performance do fornecedor. HIDROSEDIMENTOLÓGICOS: A variação ocorreu de forma majoritária nos contratos Hidrobr e Golder com medição acima do previsto devido a novas demandas não previstas para atendimento da CT/GRSA e ACP. (Hidrobr: Mancha de inundação de Jusante e Barra Longa; Golder: Atualização dos estudos geomorfológicos). DEFINITIVIDADE QUINTAIS: Execução da demanda mapeada na contingência do Draft 19, visando dar definitividade aos quintais urbanos de Barra Longa sem a necessidade de Remoção do Rejeito. Plano de ação: N/A (R$ 0,25MM) - Em 2021 foi realizado repasse ao parceiro para a compra de um equipamento. Por se tratar de uma compra internacional, o prazo de importação ocasionou o atraso na entrega do mesmo, fazendo com que a prestação de contas ocorresse somente em 2022. Além disso, houveram outras prestações de contas em atraso, impactando nos repasses previstos no draft. Plano de ação: Atuar junto ao parceiro para que as prestações de contas ocorram conforme cronograma. (R$ 0,28MM) - Mudança na estratégia de execução da demanda. Serviços de coleta e relatórios estão sendo realizados em contratos vigentes. Plano de ação: 'Valor a contratar do DR ajustado no draft 20. (R$ 0,10MM) - Reembolso protocolo COVID executado menor que o previsto. Plano de ação: Revisado no Draft20 (Economia)

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG24	CONTENÇÃO DE REJEITOS	0,22	-3,74	-3,96	-18,04	Economia R$: Plano de Ação: Fatores Internos: (R$ 2,7MM): Projeto encerrado no CIF confomre deliberação nº 555. Valores do realizado referentes a serviços de auditoria e consultoria. Plano de Ação: Projeto encerrado em 2022 na Fundação Renova. Execução a partir de 2023 na Samarco. Fatores Externos R$: Plano de Ação:
PG25	RECUPERAÇÃO ÁREA AMBIENTAL 1	2,71	2,90	0,19	0,07	Fatores Internos (-R$ 0,81MM) - Gasto com serviços de gerenciamento abaixo do previsto. Plano de ação: Revisar a previsão no Draft20 (Economia) (-R$ 0,18MM) - Gasto com pagamentos de PSA não ocorreram em Dez/22. Plano de ação: Finalizar o PSA (documentação proprietários, abertura de PU's, efetuar medições). Está em processo para pagamento, que serão feitos entre jan/23 e fev/23. (-R$ 0,12MM) - Gasto com serviços de vigilância abaixo do previsto. Plano de ação: Revisar a previsão no Draft20 (-R$ 0,11MM) - Gastos com serviços de Licenciamento que não ocorreram. Plano de ação: Revisar a previsão no Draft20 +R$ 0,92MM - Aumento da produtividade das empresas de Restauro e Cerca e Monitoramento (Século XXI e PU´S) e Inventário Florestal (AMBIPAR). Plano de ação: N/A Prestação de contas de terceiros (-R$ 0,28MM) - Desembolso Conv. Recup. ecológica área ambiental 1 (SOCIEDADE DE INVESTIGACOES) menor que o previsto. Plano de ação: NA. Parceria finalizada. Revisar a previsão no Draft20 (Economia) (-R$ 1,91MM) - Desembolso menor que o previsto, baixa produtividade das contratadas Restauro (STCP e ERG) que estavam em processo de repactuação de preços em Suprimentos. Plano de ação: Replanejar e monitorar as atividades de execução de manutenções e replantios. (-R$0,45MM) - Novo contrato Alocação de mão de obra (BIOKRATOS) não iniciado no prazo previsto (atraso na contratação) e Previsão de pleito Cercamento (Século XXI) não aprovado. Suprimentos. Plano de Ação: Replanejar e monitorar as atividades de execução de alocação de mão de obra e retirar previsão Pleito no novo Draft. +R$0,29MM - Desembolsos de serviço gestão qualidade do AR (ECOSOFT) e Análises (FUNDACAO ARTHUR BERNARDES) não são escopo PG25 e foram lançados no PG25, sendo o serviço do PG23 e PG17 respectivamente. Suprimentos. Plano de Ação: NA. Remanejar saldos pedidos para os respectivos PGs.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG28	BIODIVERSIDADE	3,80	52,21	48,41	12,74	Fatores Internos R$ 48MM Causa: ACT FEST / UFES para atendimento ao PMBA (novos desembolsos dos novos aditivos). Plano de Ação: Adequar estratégia diante da realidade dos novos aditivos. (R$ 1,0MM) Causa: Atraso no início das contratações para as ações de reparação do PABA. Plano de Ação: Realizar as contratações de ações do PABA. (R$ 1,2MM) Causa: Atraso na assinatura do acordo de coperação devido a atualização de valores solicitadas pelo parceiro (BNP). Plano de Ação: Construir novo balizamento de preços e nova proposta de parceria e encaminar para assinatura. (R$ 5,0MM) Causa: Outros Plano de Ação: Adequar estratégias e aprovação de projetos e contratações, atualizando cronogramas dos contratos. Fatores Externos (R$ 8,6MM) Causa: Postergação de desembolso dos projetos FAPEMIG por atraso nas prestações de contas. Plano de Ação: Regularizar pendências na prestação de contas do ciclo I e II. (R$ 2,7MM) Causa: Atividades do Monitoramento Anexo I não iniciadas com atraso devido a não obtenção de autorização para coleta, que impediu o início das coletas do período seco. Plano de Ação: Promover liberação de próximo desembolso ACT FEST/UFES. (R$ 0,9MM) Causa: Suspensão de pagamento perícia eixo 12 Plano de Ação: Adequar estratégias de pagamento considerando nova situação e atualização do tratamento das perícias. (R$ 0,8MM) Causa: Revisões demandas na Proposta de Plano de Contingência Plano de Ação: Adoção de mudança de estratégia.
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	7,64	3,00	-4,64	-0,61	Fatores Internos: (R$ 10,8 MM): - Atraso na assinatura da APRO para contratação da parceria SIF/UFV, postergando a prestação de contas para dezembro. A prestação de contas da SIF/UFV foi realizada em 29 de dezembro de 2022 (valor abaixo do previsto). - Houve alteração no cronograma de atividades da FBDS, gerando uma postergação na entrega do produto 01. - Atraso na elaboração e na definição do conteúdo do livro (Bicho do mato). - Houve necessidade de revisão do processo de contratação da RNP. Plano de Ação: Atuar junto as contratadas para cumprimento dos prazos e entrega dos produtos e boletins de medição.

		Mensal				Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG32	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA	25,70	19,66	-6,04	-0,24	Economia R$ 0,0MM: Plano de Ação:NA Fatores Internos R$ 31,6 MM: A curva de desembolso dos pacotes não alcançou o Planejado até o presente momento Plano de Ação: Todos Pacotes contratados e com serviços em andamento, atuando na recuperação (expectativa de recuperação com a conclusão da montagem da estrutura metálica da captação). Plano de Ação: Fatores Externos R$ -10,0 MM: Valores orçados que dependem do concenso com os municípios para que se iniciem as execuções das obras Plano de Ação: Incremento das ações para discussões e aprovações junto aos municípios para obteção do consenso
PG37	GESTÃO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	Economia R$ XXX: Plano de Ação: Fatores Internos R$ XXX: Plano de Ação: Fatores Externos R$ XXX: Plano de Ação:
PG38	MONITORAMENTO ÁGUA	3,69	3,34	-0,34	-0,09	Economia: Contratação menor que o valor orçado. (R$ 1,2MM) Plano de Ação: Orçamento já remanejado no Draft20 para PMQQS e Projetos Especiais. Fatores Internos: Contratos de monitoramento sob demanda sem necessidade de utilização. (R$ 1,7MM) Plano de Ação: Orçamento já remanejado no Draft20 para o PMQQS e Projetos Especiais. Fatores Externos: Atraso no retorno da CT-SHQA do estudo do Coloides. (R$ 0,6MM) Plano de Ação: Cobrar retorno da CT-SHQA estudo Coloides.
PG39	CONSOLIDAÇÃO UCs	0,06	0,26	0,20	3,30	Fatores Externos (R$ 0,4MM) Causa: Entregas de produtos, consecutivas e concomitantes, que dependem da análise do mesmo grupo de especialistas, assim como da contribuição de atores externos. Plano de Ação: Alterar a estratégia de dedicação dos especialistas nos produtos e aumento da equipe. (R$ 0,1MM) Causa:Dificuldade de agendamento para desenvolvimento das atividades nas escolas no período pós pandemia. Atraso na seleção da consultora Plano de Ação: FUNBIO para iniciar a parte executiva do projeto. Plano de Ação: Acompanhar junto a parceira para garantir as entregas. (R$ 0,04MM) Causa: Postergação de outros projetos: Readequação do cronograma de entregas das fases que precedem o início da execução das ações de reparação. Plano de Ação: Agilizar as entregas das etapas anteriores de atendimento da cláusula 181.

	Mensal					Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
PG41	GESTÃO DOS PROGRAMAS	31,29	30,73	-0,56	-0,02	Economia (R$ 17,10MM): (R$10,9MM) Contratos sob demanda de temporários (Periodical e Prestar) (R$4,4MM) Suspensão do contrato de Tacógrafo (Monitoramento de Velocidades) (R$0,6MM) Auditoria de Barra Longa (R$1,2MM) Serviços Contratados das Despesas Finalísticas - Suprimentos e Saúde Segurança Plano de Ação: Adequação dos contratos e valores projetados no Draft20. Fatores Internos (R$ 8,4MM): (R$4,2MM): Serviços de TI (SGS e contratos sob demanada) (R$1,0MM): Despesas Finalísticas executando a menor, sendo R$8,4MM em Despesas com pessoal; (R$8,0MM) com Serviços Contratados; (R$0,8MM) com Despesas de Viagens e (R$0,6MM) em Despesas Diversas (R$1,2MM): Serviços de Auditoria (EY) e Aluguel de veículos (R$1,0MM): Painel Rio Doce (R$1,0MM): Variações em vários DRs Plano de Ação: Valores e fluxo de desembolso ajustados no Draft20.
PG42	GASTOS PÚBLICOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	Fatores Externos: + R$ 0,1 M Pagamento Gabinete Militar MG (Deliberação 428). Plano de Ação: N/A.
Total Reparatórios		1.443,05	1.747,26	304,21	0,21	
Total Programas		1.529,67	1.797,55	267,88	0,18	

	Mensal					Anual Acumulado
PG	Programas	Orçamento	Realizado	Variação	%	Justificativas da variação anual acumulada
ADM	DESPESAS GESTÃO ADMINISTRATIVAS	20,58	26,86	6,28	0,30	Economia: (R$ 8,57 MM) (R$0,2MM) Ativo Fixo: aquisição de licenças SAP (R$5,3MM) serviços de consultorias e outros serviços contratados da Diretoria Institucional (R$0,4MM) agenciamento de viagens Conselheiros (R$0,75MM) Diretoria Planejamento e Gestão referente à consultoria estratégica não contratada (R$0,12MM) serviços financeiros gerais na Gerência Financeira (R$1,0MM) serviços TI (Transmissão dados, operação e manutenção sistemas) (R$0,8MM) economia impressão de documentos Gerência Jurídica Corporativa; Fatores Internos: (R$ 20,72 MM) +R$0,89MM: Despesas com pessoal - em função de valores realizados e não orçados no Draft19: férias indenizadas na rescisão com reflexos em encargos e abono de férias; e valores orçados a menor no Draft19: incidência de INSS sobre a variação (orçado x realizado) RV e 13º, indenização por rescisões e plano de saúde. +R$ 0,23 MM: aumento de despesas de viagem no fim de ano (R$16,4MM) postergação serviços de comunicação institucional, consultorias e outros serviços contratados da Diretoria Institucional devido a revisão estratégica de ações da FR; (R$2,0MM) serviços TI (Consultoria, Licenciamento, Transmissão de Dados e Segurança da Info) (R$0,5MM) postergação consultoria jurídica; (R$0,96MM) postergação serviços de Compliance e auditoria; (R$0,76MM) postergação consultoria e serviços e outros contratos sob demanda de diversas áreas. (R$0,8MM) Ativo Fixo: sendo postergação de compra de equipamentos (R$0,42 MM) Materiais e Despesas Diversas, sendo (R$0,33MM) em Seguros postergado para jan/23 Plano de Ação: revisão do orçamento e ajuste nas projeções do Draft 20
CG	CUSTEIO SISTEMA DE GOVERNANÇA	8,62	63,22	54,60	6,34	Economia: (R$ 12,1 MM) CTs (R$ 3,4 MM) Custeio Atingidos (R$ 1,0 M) CIF (R$ 0,1 M) Auditoria. Plano de Ação: Ajustar Draft 20 (concluído). Fatores Externos: + R$ 17,4 MM Decisão judicial - Fundo Taxas Administrativas ATIs + R$ 62,8 MM Decisão judicial - 1º Repasse ATIs (antecipação de custo previsto em 2023 no Draft 20, correspondente seis meses de execução dos planos de trabalho das ATIs autorizadas). Plano de Ação: N/A.
Total Despesas Administrativas		29,20	90,07	60,88	2,08	
Total Geral		1.558,87	1.887,62	328,76	0,21	

***Valores em milhões de reais.**
