UHE RISOLETA NEVES

Id	EDT	Nome da tarefa	Predecessor	Duração (dias úteis*)	Início	Término	% conclu
1	**1**	**UHE RISOLETA NEVES - ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO**		**1345 dias**	**Qua 17/08/16**	**Ter 12/10/21**	**5%**
2	**1.1**	**MARCOS PRINCIPAIS**		**373 dias**	**Qua 20/06/18**	**Ter 26/11/19**	**0%**
3	1.1.1	Plano de Enchimento do reservatório - Aprovação (Termo de Validação)	51TT	0 dias	Qua 20/06/18	Qua 20/06/18	0%
4	1.1.2	Validação da Regra Operativa da Usina		70 diasd	Ter 15/01/19	Ter 26/03/19	0%
5	1.1.3	Autorização da ANEEL e do ONS - Operador Nacional do Sistema	4II	70 diasd	Ter 15/01/19	Ter 26/03/19	0%
6	1.1.4	Acordo de Nível de Serviço firmado ANEEL e Samarco Mineração/Fun. Renova	5II	70 diasd	Ter 15/01/19	Ter 26/03/19	0%
7	1.1.5	Enchimento do Reservatório - Início	17II	0 dias	Seg 04/11/19	Seg 04/11/19	0%
8	1.1.6	Enchimento do Reservatório - Conclusão	17TT	0 dias	Ter 26/11/19	Ter 26/11/19	0%
9	1.1.7	Adendo ao Projeto Básico - Procotolo ANEEL	16TT+48 dia	0 dias	Sex 05/10/18	Sex 05/10/18	0%
10	1.1.8	Adendo ao Projeto Básico - Aprovação ANEEL	9	60 diasd	Sex 05/10/18	Ter 04/12/18	0%
11	**1.2**	**ENGENHARIA**		**463 dias**	**Qui 15/02/18**	**Ter 26/11/19**	**12%**
12	1.2.1	Plano de Enchimento do reservatório - Elaboração		30 dias	Ter 10/04/18	Seg 21/05/18	97%
13	1.2.2	Plano de descomissionamento das estrut. introduzidas no Reservatório e entorno	33TT	273 dias	Qui 06/09/18	Seg 23/09/19	0%
14	1.2.3	Plano de monitoramento das estruturas e intervenções implantadas	13II	273 dias	Qui 06/09/18	Seg 23/09/19	0%
15	1.2.4	Relatório de Acompanhamento do Enchimento do Reservatório	17II-150 dia	30 dias	Sex 07/06/19	Qui 18/07/19	0%
16	1.2.5	Adendo ao Projeto Básico - Elaboração	12TT;41II	119 dias	Qui 15/02/18	Ter 31/07/18	56%
17	1.2.6	Enchimento do Reservatório	10;41II;19;3	22 diasd	Seg 04/11/19	Ter 26/11/19	0%
18	**1.3**	**CONSTRUÇÃO**		**1092 dias**	**Qua 17/08/16**	**Qui 22/10/20**	**12%**
19	**1.3.1**	**Atividades Críticas para Início do Enchimento**		**1092 dias**	**Qua 17/08/16**	**Qui 22/10/20**	**11%**
20	**1.3.1.1**	**Barramento Metálico A - Construção**		**458 dias**	**Qui 26/01/17**	**Seg 29/10/18**	**77%**
21	1.3.1.1.1	Escopo Inicial		155 dias	Qui 26/01/17	Qua 30/08/17	100%
22	1.3.1.1.2	Alas à jusante (aditivo)*1		64 dias	Qua 01/08/18	Seg 29/10/18	20%
23	1.3.1.2	Barramento Metálico B - Construção		170 dias	Qua 17/08/16	Ter 11/04/17	100%
24	**1.3.1.3**	**Barramento Metálico C - Construção**		**319 dias**	**Qua 02/08/17**	**Seg 22/10/18**	**65%**
25	1.3.1.3.1	Escopo Inicial		203 dias	Qua 02/08/17	Sex 11/05/18	100%
26	1.3.1.3.2	Alas à jusante (aditivo)	25	116 dias	Seg 14/05/18	Seg 22/10/18	4%
27	1.3.1.4	Barramentos Metálicos - Instalação da Instrumentação		91 dias	Seg 18/06/18	Seg 22/10/18	0%
28	1.3.1.5	Monitoramento dos Barramentos Metálicos [CONTÍNUO]	27TI+30 dia	701 diasd	Qua 21/11/18	Qui 22/10/20	0%
29	1.3.1.6	Barramento Principal e Casa de Força - Instrumentação		0 dias	Sex 28/09/18	Sex 28/09/18	0%
30	1.3.1.7	Obras de recuperação e proteção das margens do Reservatório	14II	273 dias	Qui 06/09/18	Seg 23/09/19	0%
31	1.3.1.8	Recuperação e proteção das margens - Instalação da Instrumentação	30II	273 dias	Qui 06/09/18	Seg 23/09/19	0%
32	1.3.1.9	Monitoramento das proteções, margens e demais intervenções - setores [CONTÍNUO]	31TI+30 dia	364 diasd	Qua 23/10/19	Qua 21/10/20	0%
33	1.3.1.10	Fechamento dos setores utilizados como depósito de rejeitos (descomissionamento		273 dias	Qui 06/09/18	Seg 23/09/19	0%
34	1.3.1.11	Dragagem da Fase 1		447 dias	Sex 02/02/18	Seg 21/10/19	17%
35	1.3.1.12	Reparos e manutenção dos equipamentos hidromecânicos [SOB DEMANDA]		201 dias	Qua 15/08/18	Qua 22/05/19	0%
36	**1.3.2**	**Atividades Críticas para Conclusão do Enchimento**		**123 dias**	**Seg 08/10/18**	**Qua 27/03/19**	**40%**
37	1.3.2.1	Dragagem do Canal de Fuga e das Unidades Geradoras		123 dias	Seg 08/10/18	Qua 27/03/19	80%
38	1.3.2.2	Limpeza do duto de alimentação do sistema do STP	37II	123 dias	Seg 08/10/18	Qua 27/03/19	0%
39	**1.3.3**	**Atividades Complementares**		**201 dias**	**Qua 15/08/18**	**Qua 22/05/19**	**0%**
40	1.3.3.1	Reparos e manutenção das Unidades Geradoras	35II	201 dias	Qua 15/08/18	Qua 22/05/19	0%
41	**1.4**	**PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS**		**792 dias**	**Seg 01/10/18**	**Ter 12/10/21**	**0%**
42	1.4.1	Obtenção de autorizações necessárias (DAIA, licença de pesca cientifica e de fauna)	51	273 diasd	Seg 01/10/18	Seg 01/07/19	0%
43	1.4.2	Programa de segurança e alerta e comunicação social	42	75 diasd	Ter 03/09/19	Dom 17/11/19	0%
44	1.4.3	Programa de resgate de fauna	42	75 diasd	Ter 20/08/19	Dom 03/11/19	0%
45	1.4.4	Programa de resgate e soltura de ictiofauna	42	105 diasd	Ter 03/09/19	Ter 17/12/19	0%
46	1.4.5	Programa de Saúde Pública	42	455 diasd	Ter 03/09/19	Ter 01/12/20	0%
47	1.4.6	Programa de monitoramento limnológico e da qualidade das águas	42	427 diasd	Ter 03/09/19	Ter 03/11/20	0%
48	1.4.7	Programa de monitoramento e controle de processos erosivos	42	123 diasd	Qua 03/07/19	Dom 03/11/19	0%
49	1.4.8	Programa de monitoramento sismológico		1105 diasd	Qua 03/10/18	Ter 12/10/21	0%
50	1.4.9	Programa de supressão vegetal	42	61 diasd	Qui 01/08/19	Ter 01/10/19	0%
51	**1.5**	**TERMO DE VALIDAÇÃO DO CONSÓRCIO CANDONGA**	**12**	**30 diasd**	**Seg 21/05/18**	**Qua 20/06/18**	**0%**

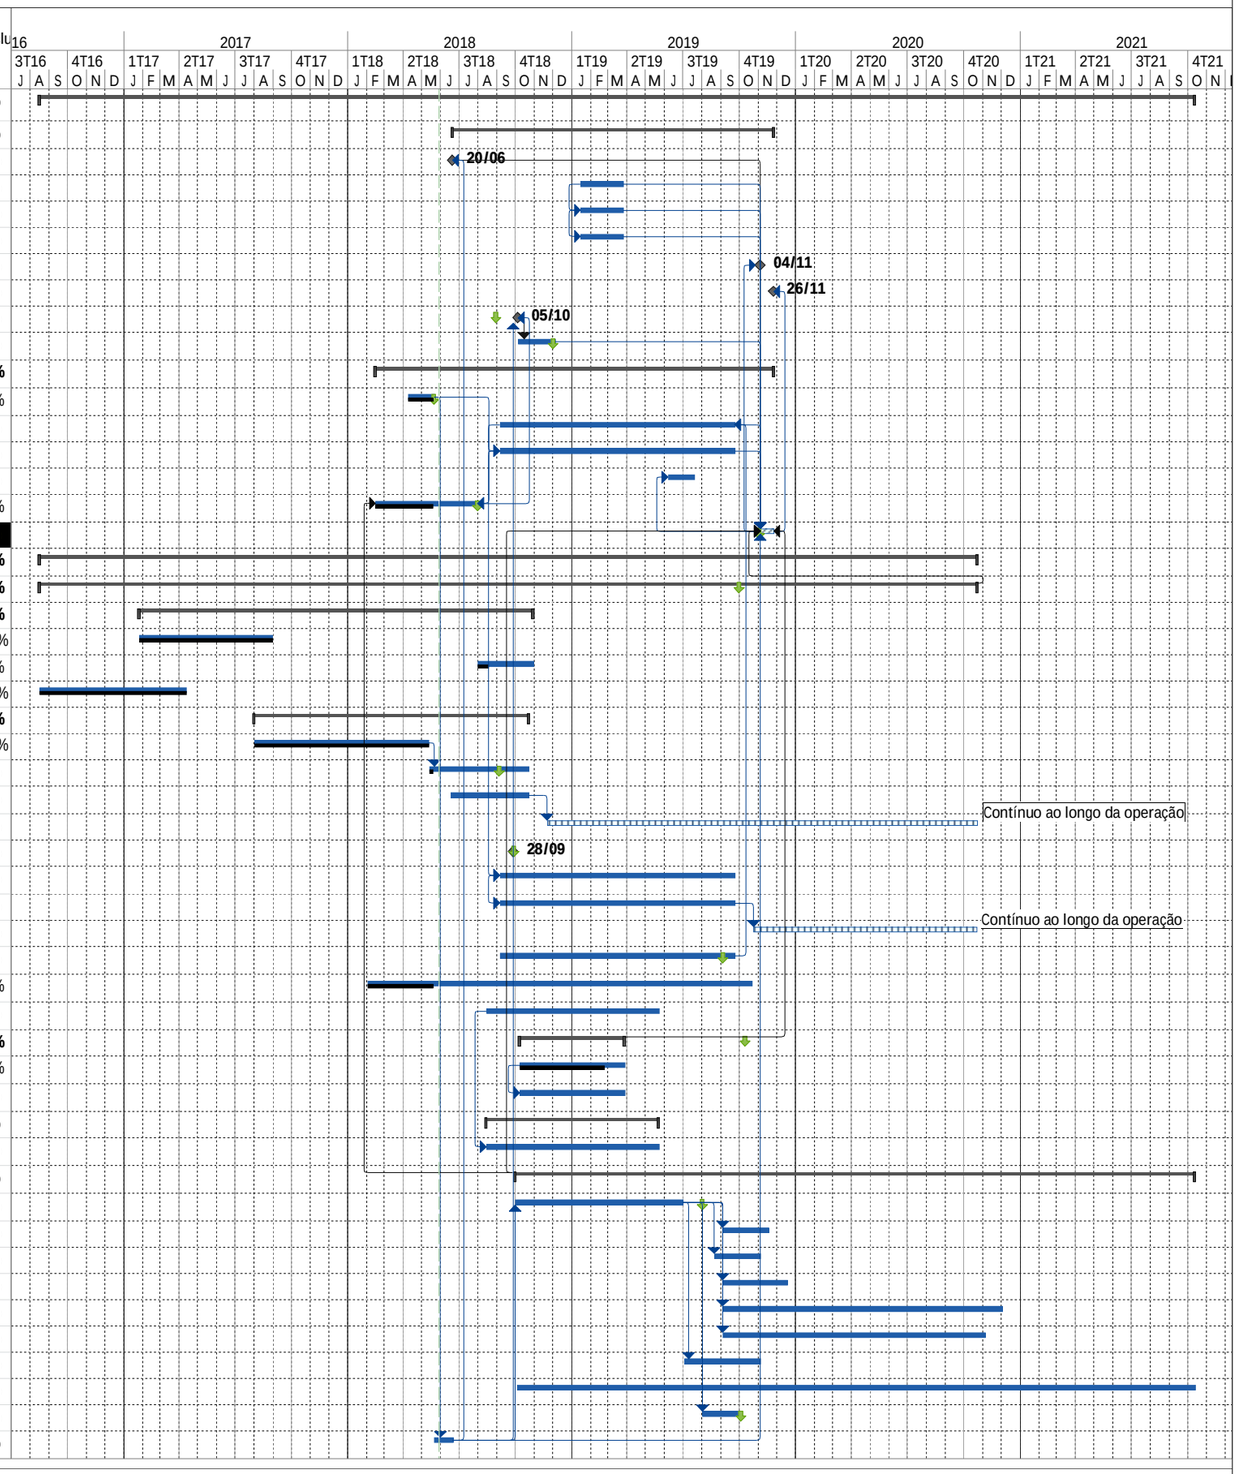

Data: 21/05/2018
Revisão: 0

Tarefa | Etapa | Resumo do projeto | Data limite | Progresso manual
Divisão | Resumo | Tarefa Inativa | Andamento
