

**OFI.NII.112019.8341**  
**Nº IBAMA: 02001.01577/2016-20 (CIF)**  
**Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)**

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2019.

**AO**  
**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**  
**A/C: SR. EDUARDO BIM**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO  
PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS RENOVÁVEIS  
SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF  
CEP: 70818-900

**À**  
**CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE – CTBIO**  
**A/C: SR. FREDERICO DRUMOND MARTINS**


COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE CONSERVAÇÃO E BIODIVERSIDADE  
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes 451 – Edifício Petro Tower, sala 1601,  
Enseada do Suá, Vitória/ES  
CEP: 29050-335

**REF.:** *Apresentação de cronograma preliminar do cumprimento da Alínea "c" da Cláusula 164 do TTAC – Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática"*

Prezado Senhor,

A Fundação Renova ("Fundação") tem a missão de implementar e gerir os programas de reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, conforme programas socioambientais e socioeconômicos previstos no Termo de Transação e Ajuste de Conduta (TTAC). Na frente socioambiental, a cláusula 164 do TTAC trata do "Programa de Conservação da Biodiversidade Aquática".



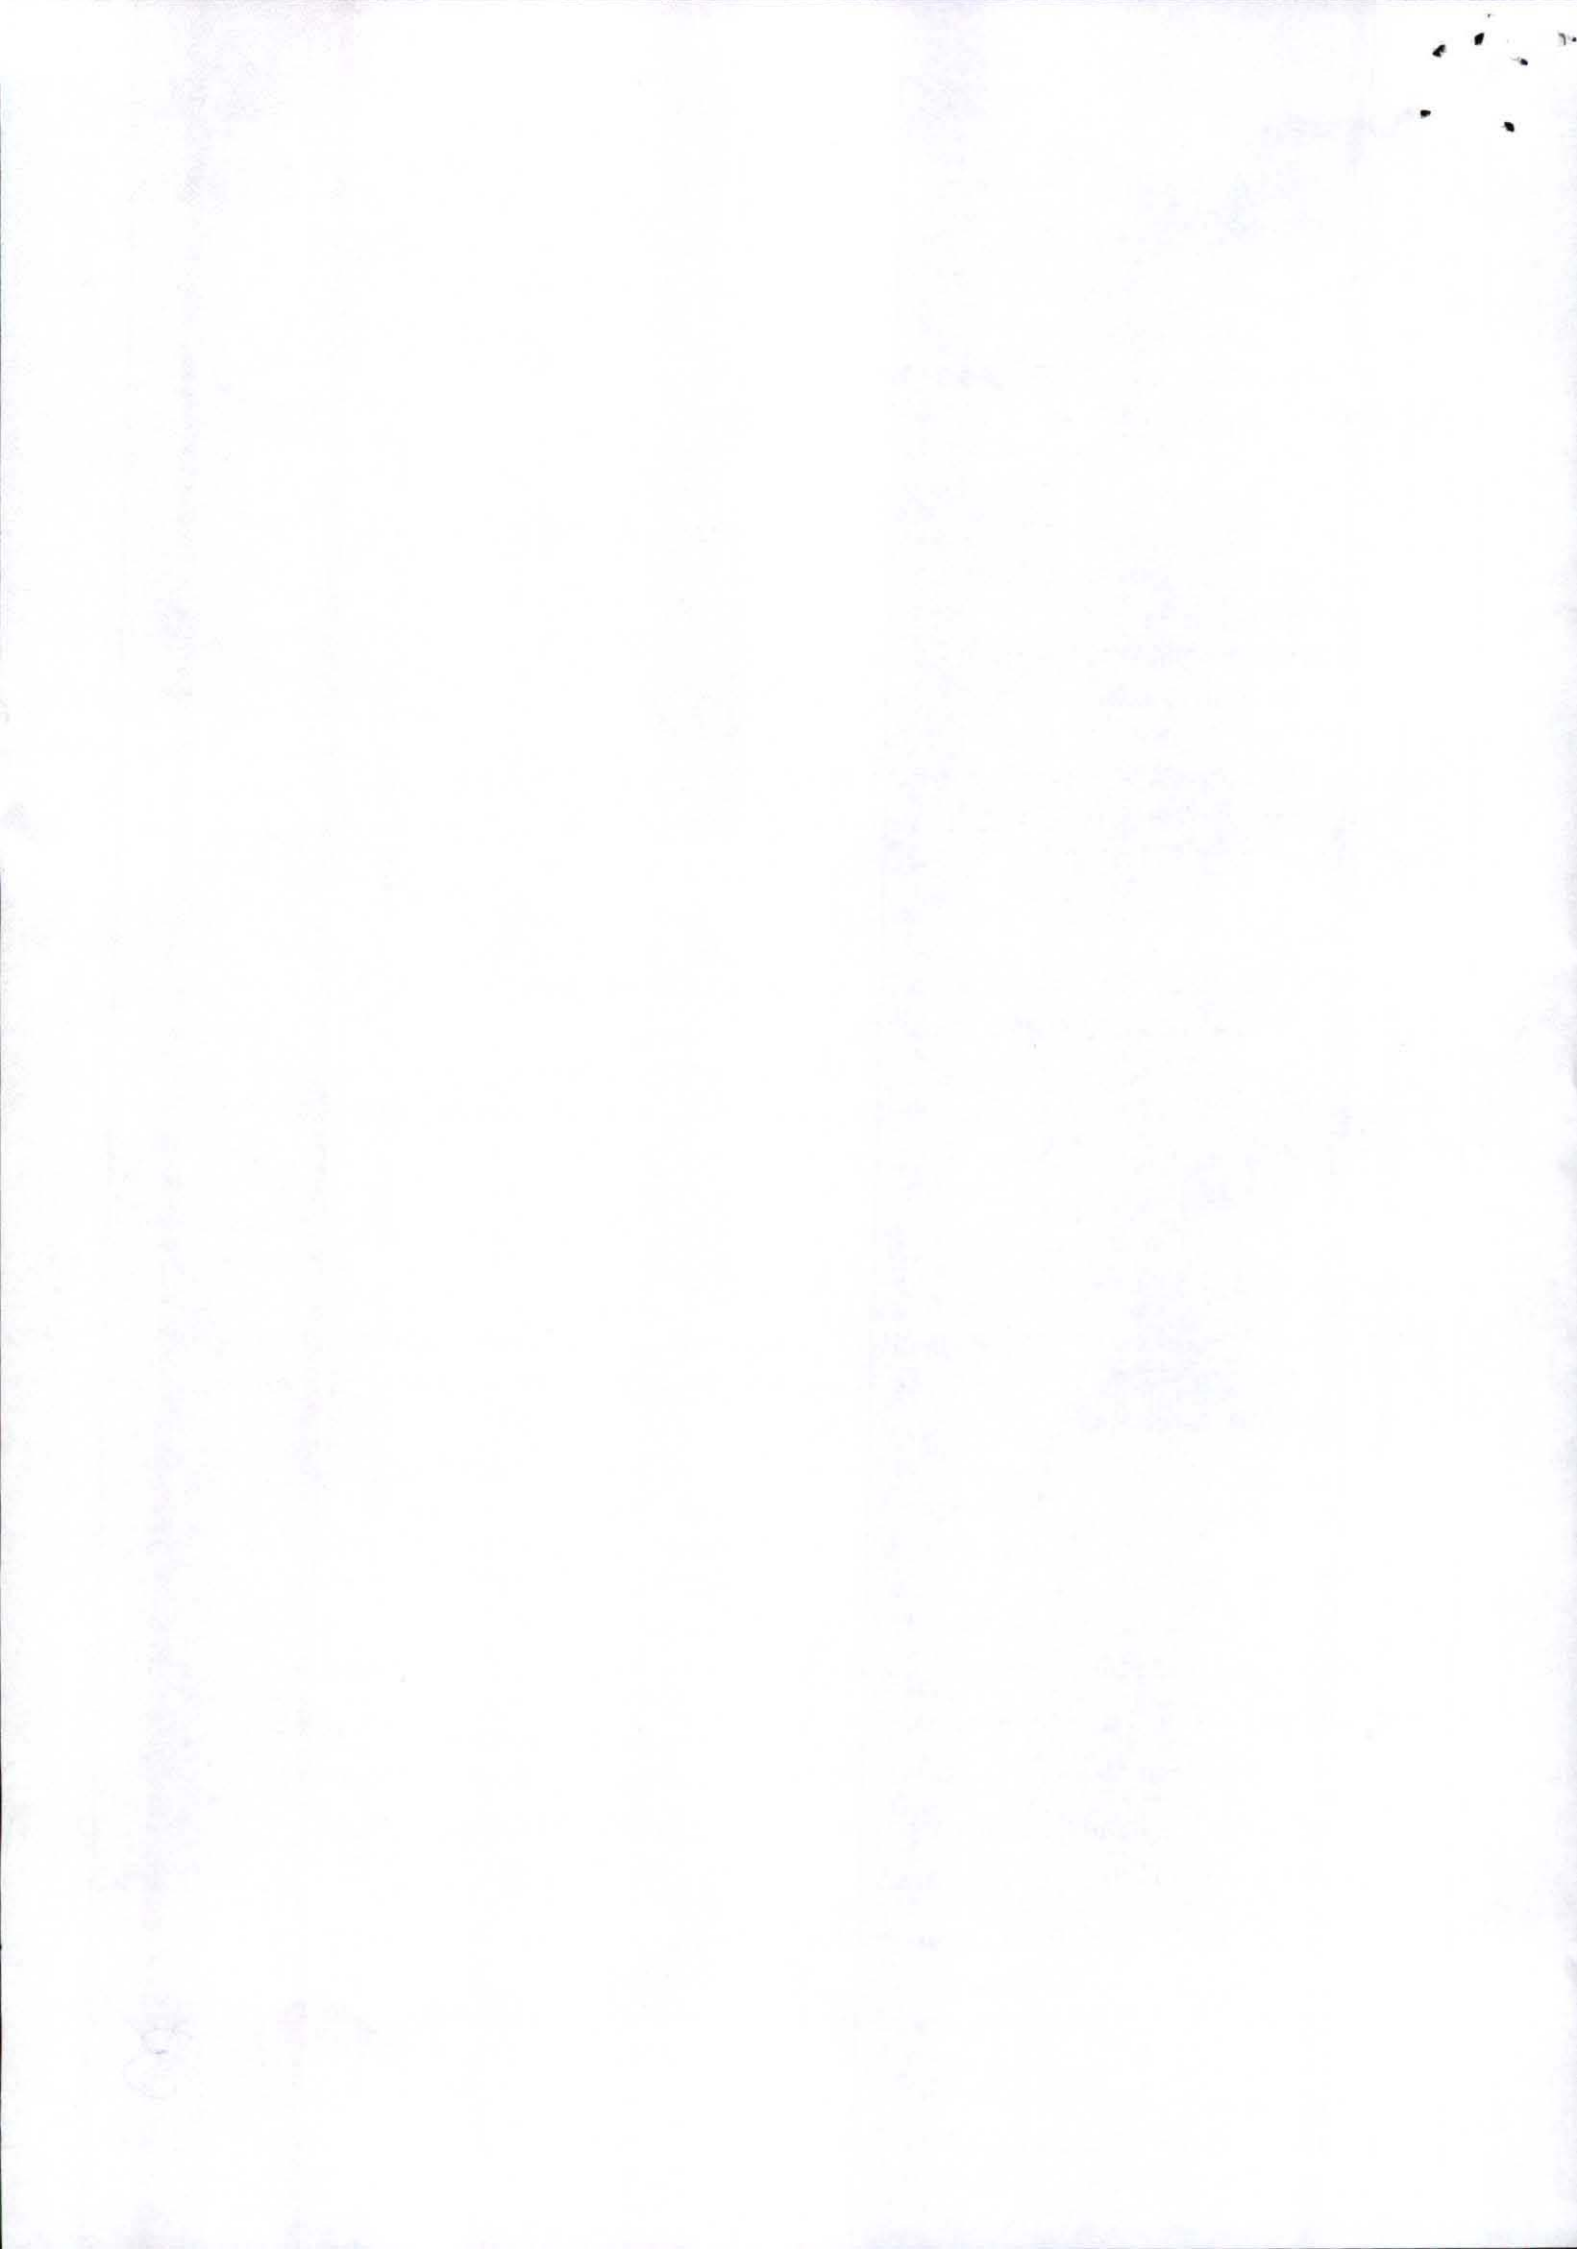


Conforme solicitação durante a 40ª reunião ordinária da CTBio, apresentamos o cronograma preliminar de atendimento à alínea "c" da cláusula 164 do TTAC. O cronograma apresentado atende às proposições da Nota Técnica nº 26/CEPTA/DIBIO/ICMBio.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos votos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



**FUNDAÇÃO RENOVA**  
RACHEL STARLING ALBUQUERQUE PENIDO SILVA  
GERENTE DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

Q. 1. 1. 1.

Id	Nome	Início	Término
0	<b>PG028 - Conservação da Biodiversidade</b>	Qua 29/06/16	Sex 11/06/32
2	2 Marcos	Qui 06/07/17	Ter 02/12/25
42	3 Definição	Ter 27/06/17	Sex 20/12/19
52	4 Execução	Qua 29/06/16	Sex 11/06/32
53	4.1 Projeto de Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Área Ambiental 1_CL.164_TTAC	Qua 29/06/16	Qua 24/03/32
54	4.1.1 FASE 1: Estudo Populacional da Ictiofauna e de invertebrados aquático da calha e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1 (CL.164 "a" _TR1)	Qua 29/06/16	Ter 03/12/19
102	4.1.2 FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do rio Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" _TR2)	Ter 27/02/18	Seg 27/04/20
143	4.1.3 FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 "c" _TR3)	Qui 19/09/19	Sex 01/04/22
144	4.1.3.1 Contratação de Fornecedores para a Elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Qui 19/09/19	Sex 13/03/20
152	4.1.3.2 Elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Qua 18/03/20	Ter 27/10/20
153	4.1.3.2.1 Realizar kick off para elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Qua 18/03/20	Qua 18/03/20
154	4.1.3.2.2 Realizar mobilização	Qui 19/03/20	Qui 16/04/20
155	4.1.3.2.3 Elaboração do propósito do Plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Sex 17/04/20	Sex 10/07/20
156	4.1.3.2.3.1 Elaborar Propósito do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Sex 17/04/20	Sex 15/05/20
157	4.1.3.2.3.2 Revisar propósito do Plano de Ação	Seg 18/05/20	Qua 27/05/20
158	4.1.3.2.3.3 Protocolar Minuta do Propósito do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática na CT-Bio	Qui 28/05/20	Qui 28/05/20
159	4.1.3.2.3.4 Aprovar minuta do propósito do Plano de Ação pela CT-Bio	Sex 29/05/20	Sex 10/07/20
161	4.1.3.2.4 Levantamento e Organização das Informações	Sex 17/04/20	Sex 10/07/20
162	4.1.3.2.4.1 Levantar Informações para elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Sex 17/04/20	Qui 18/06/20
163	4.1.3.2.4.2 Compilar dados das informações para a elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Sex 19/06/20	Qui 09/07/20
164	4.1.3.2.4.3 Protocolar Informações na CT-Bio	Sex 10/07/20	Sex 10/07/20
166	4.1.3.2.5 Realização das Reuniões de Planejamento e Metas e Indicadores	Sex 19/06/20	Ter 27/10/20
167	4.1.3.2.5.1 Ações Preparatórias para a Reunião de Planejamento	Sex 19/06/20	Seg 03/08/20
168	4.1.3.2.5.1.1 Enviar convite para a Reunião Preparatória	Sex 19/06/20	Sex 19/06/20
169	4.1.3.2.5.1.2 Realizar Reunião Preparatória para Elaboração do Plano de Ação Biodiversidade Aquática	Seg 13/07/20	Seg 13/07/20
170	4.1.3.2.5.1.3 Organizar a Reunião de Planejamento	Ter 14/07/20	Sex 31/07/20
171	4.1.3.2.5.1.4 Enviar convite para a Reunião de Planejamento para elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiv	Seg 03/08/20	Seg 03/08/20
173	4.1.3.2.5.2 Oficina de Planejamento	Ter 01/09/20	Qui 22/10/20
174	4.1.3.2.5.2.1 Realizar Oficina de Planejamento para elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquá	Ter 01/09/20	Sex 04/09/20
175	4.1.3.2.5.2.2 Elaborar Relatório da Oficina de Planejamento para elaboração do Plano de Ação para conservação da Biodive	Ter 08/09/20	Sex 02/10/20
176	4.1.3.2.5.2.3 Revisar Relatório da Oficina de Planejamento do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Seg 05/10/20	Qua 21/10/20
177	4.1.3.2.5.2.4 Protocolar Relatório da Oficina de Planejamento para a CT-Bio	Qui 22/10/20	Qui 22/10/20
179	4.1.3.2.5.3 Reunião de Metas e Indicadores	Seg 28/09/20	Ter 27/10/20
180	4.1.3.2.5.3.1 Enviar convites para Reunião de Metas e Indicadores	Seg 28/09/20	Seg 28/09/20
181	4.1.3.2.5.3.2 Realizar Reunião de Metas e Indicadores	Seg 26/10/20	Ter 27/10/20
185	4.1.3.3 Relatório Consolidado do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática	Qua 28/10/20	Sex 19/03/21
186	4.1.3.3.1 Elaborar Relatório Consolidado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Qua 28/10/20	Qua 25/11/20
187	4.1.3.3.2 Revisar Relatório Consolidado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática pela Renova	Qui 26/11/20	Qui 17/12/20
188	4.1.3.3.3 Protocolar, na CT-Bio, o relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Sex 18/12/20	Sex 18/12/20

Id	Nome	Início	Término
189	4.1.3.3.4 Aprovação do Relatório do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática pela CT-Bio	Seg 21/12/20	Sex 19/03/21
191	<b>4.1.3.4 Publicação do Relatório do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática</b>	<b>Seg 22/03/21</b>	<b>Qua 23/03/22</b>
192	4.1.3.4.1 Elaborar Sumário Executivo do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Seg 22/03/21	Qua 23/06/21
193	4.1.3.4.2 Publicar Sumário Executivo do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Qui 24/06/21	Qui 24/06/21
194	4.1.3.4.3 Elaborar livro do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Seg 22/03/21	Ter 22/03/22
195	4.1.3.4.4 Publicar livro do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática	Qua 23/03/22	Qua 23/03/22
197	4.1.3.5 Desmobilizar equipe	Qui 24/03/22	Sex 01/04/22
199	<b>4.1.4 FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c")</b>	<b>Seg 21/12/20</b>	<b>Qua 24/03/32</b>
314	<b>4.2 Processo de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do rio Doce, da foz e ambientes marinhos e estuarinos impactados na Á</b>	<b>Qui 30/06/16</b>	<b>Ter 02/12/25</b>
1435	<b>4.3 Apuração dos Resultados_Projeto</b>	<b>Qui 25/03/32</b>	<b>Sex 11/06/32</b>
1441	<b>5 Encerramento</b>	<b>Ter 11/05/32</b>	<b>Sex 11/06/32</b>
