




RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

Nome da tarefa	% Real.	Início	Término
PF0143 - Recuperação das áreas produtivas Impactadas (Cláusula 125b parte de solo)		jun-16	nov-20
Avaliação de Alternativas	18,0%	jun-16	mar-17
Definição do Escopo		mar-17	jul-17
Planejamento da Execução		jul-17	nov-17
Execução da Recuperação das áreas produtivas Impactadas		nov-17	ago-20
Encerramento do Projeto		ago-20	nov-20
Processos de Monitoramento e Manutenção		nov-15	ago-22
Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)		nov-15	ago-20
Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)		ago-16	ago-22
Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa)		ago-20	jul-21
Encerramento do Programa		ago-22	nov-22



EM BRANCO



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Capacitação da equipe Samarco/Fundação para aplicação do ISA e CAR• Abertura dos silos com volumoso construídos nas propriedades rurais, com o objetivo de reduzir a aquisição de silagem na época de estiagem• Atividades de manutenção nos plantios realizados (capina, aplicação de formicida/herbicida)• Corte de capim para geração de volumoso/silagem em propriedades cujo plantio realizado já está em ponto de corte.• Plantio de pomares e hortaliças• Continuação da entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t até Julho• Continuação de construção de cercas• Adequação do escopo do PG017- Retomada das atividades agropecuárias com estabelecimento do cronograma e orçamento dos projetos que suportam o programa;	<ul style="list-style-type: none">• Concentração de atividades de plantio (pomares, hortaliças);• Continuação do fornecimento de silagem animal aos produtores impactados• Desenvolvimento dos acordos de parceria técnica com as instituições de fomento à pesquisa e extensão rural;• Início da aplicação das ferramentas de diagnóstico ambiental/econômico nas propriedades rurais (ISA e ZAP) que irão suportar as ações previstas no PG017.
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Finalizados os plantios em caráter de substituição de forragem animal em 118 propriedades;• Construção de 188 km de cerca;• Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4794t até Julho (referente aos silos construídos, foram 1.500t de silagem estocadas nas propriedades em Barra Longa e Mariana).	




EM BRANCO

1974



RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS




EM BRANCO



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL

Orçamento (R\$MM)	Total: 42,7	Realizado: -			
Nome da tarefa			% Real.	Início	Término
PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131)			0,0%	set-16	dez-30
Metas do Programa				ago-17	ago-17
Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas				ago-17	ago-17
Definição do Programa				set-16	out-17
Execução do Programa				out-17	dez-30
Encerramento do Programa				out-30	dez-30




EM BRANCO



DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Interações com a Prefeitura de Mariana por meio da diretoria da Fundação Renova	<ul style="list-style-type: none">• Apresentação do detalhamento do Programa para diretoria e gestores da Fundação• Definição de estrutura funcional para transição e execução do Programa• Apresentação da proposta do Programa na Câmara Técnica de Economia
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Alinhamento em nível diretivo da Fundação Renova com expectativas junto à Prefeitura de Mariana.	




EM BRANCO



MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

Orçamento (R\$MM)		Total: 26,5	Realizado: 0,8			
Nome da tarefa				% Real.	Início	Término
PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)					dez-15	jun-20
Metas do Programa					ago-18	mar-20
Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e					ago-18	ago-18
Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais					mar-20	mar-20
Definição do Programa					out-16	mar-17
Execução do Programa					dez-15	mar-20
Processo de recuperação de micro e pequenos negócios					dez-15	mar-20
Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e				22,0%	dez-15	mar-17
Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação					mar-17	jul-18
Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após)					mar-17	mar-20
Encerramento do Programa					mar-20	jun-20




EM BRANCO





MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Tratativa dos processos que foram incluídos seguindo os critérios estabelecidos;• Estudo das situações dos comerciantes impactados indiretos em Barra Longa conforme diretriz do comitê;• Continuação da execução das ações do planejamento realizado para Barra Longa/Candongá;• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência;	<ul style="list-style-type: none">• Continuação da tratativa dos processos que foram incluídos seguindo os critérios estabelecidos;• Continuação da execução das ações do planejamento realizado para Barra Longa/Candongá;• Continuação do processo de auxílio financeiro de Regência;
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Barra Longa: 92 Processos mapeados (33 Autônomos, 59 Comércios, 66 Processos concluídos)• Mariana: 173 Processos mapeados (117 Autônomos, 15 Comércios, 41 Produtores Rurais, 160 Processos Concluídos)	




EM BRANCO




MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

Desembolso Global - R\$ 1.429.660,06

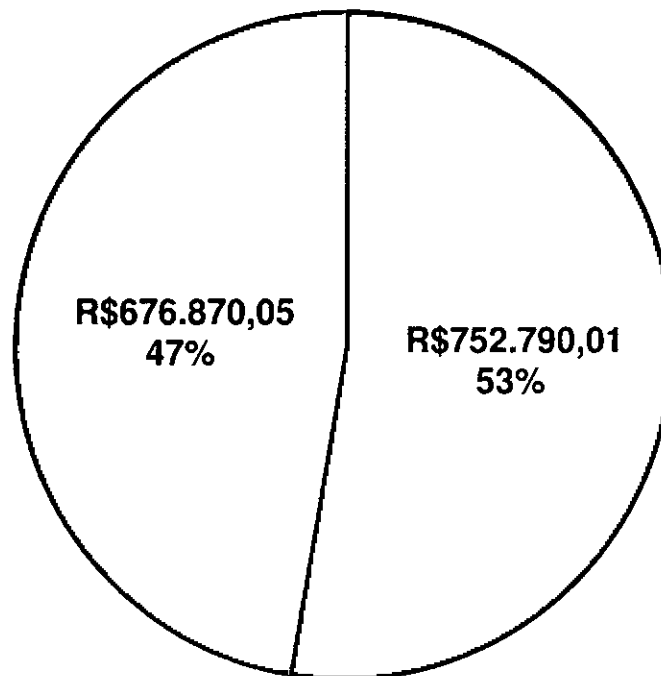

■ Total de desembolso com EQPTOS ■ Total de desembolso com BOLETOS




EM BRANCO






MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS

92 Estabelecimentos mapeados, sendo 62 impactados diretamente pelo acidente

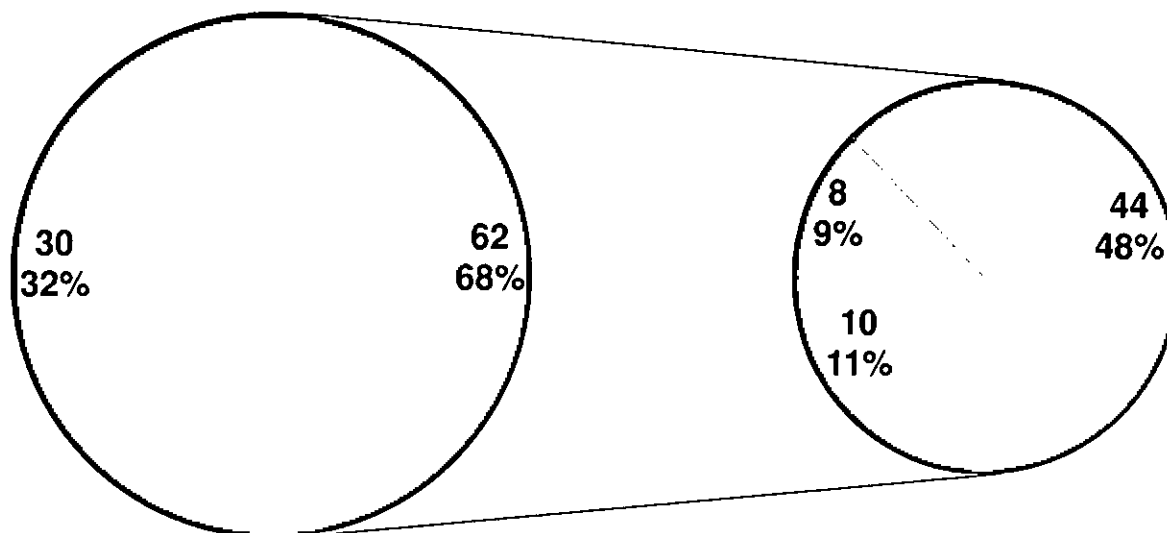

- Atingidos indiretamente
- Estabelecimentos com processos mapeados
- Estabelecimentos com processos de compra (RC) em aberto
- Estabelecimentos com processos finalizados




EM BRANCO



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

Orçamento (R\$MM)	Total: 2,3	Realizado: -		
Nome da tarefa	% Real.	Início	Término	
PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)		nov-15	dez-30	
Metas do Programa		out-16	out-16	
Cláusula 136 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações executadas pela Samarco)		out-16	out-16	
Definição do Programa		set-16	out-16	
Execução do Programa		nov-15	dez-30	
Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	67,0%	nov-15	out-16	
Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)		out-16	dez-30	
Encerramento do Programa		out-30	dez-30	




EM BRANCO



ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL

AÇÕES REALIZADAS NO MÊS	AÇÕES PRÓXIMO MÊS
<ul style="list-style-type: none">• Definida periodicidade de envio dos indicadores;• Fechamento do escopo de contratação do diagnóstico;• Definida a equipe de trabalho do programa;• Fechamento das ações de controle de compliance do programa;• Reunião com o SINE de Mariana• Compilação dos dados dos formulários recebidos dos fornecedores e contratos – Em andamento;	<ul style="list-style-type: none">• Iniciar processo de contratação do diagnóstico;• Definir projeto de TI para controle de terceiros
RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none">• Medição da Mão de Obra local contratada nas regiões atingidas:• 1320 trabalhadores locais das cidades impactadas (64 %)• 850 trabalhadores fora das regiões impactadas (36%)	




EM BRANCO






ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL


FORNECEDORES LOCAIS DE SERVIÇOS
Empresas dos estados Impactados





FORNECEDORES LOCAIS DE SERVIÇOS
Empresas das regiões Impactadas

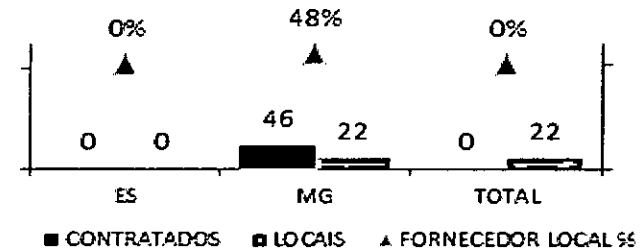

MÃO DE OBRA LOCAL
NTE dos estados Impactados

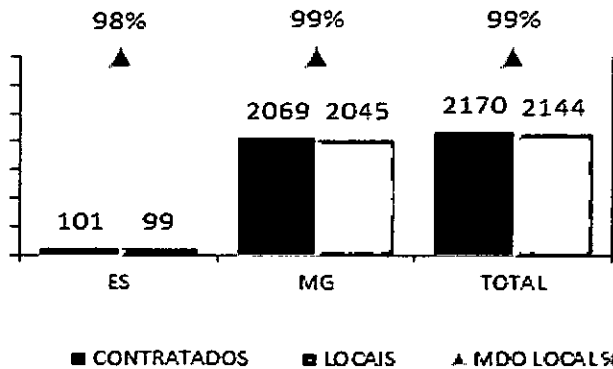


MÃO DE OBRA LOCAL
NTE das regiões Impactadas

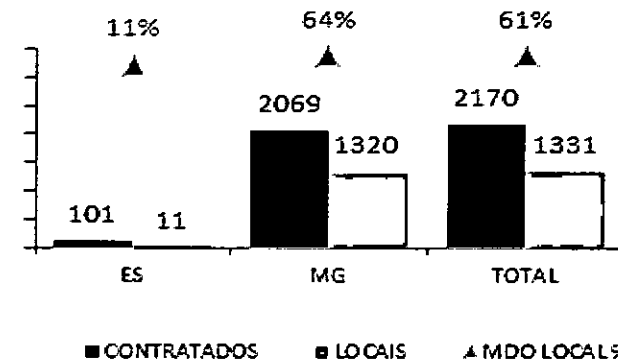


EM BRANCO



DOC. III



EM BRANCO




PLANO DE 3 ANOS



Revisão: 00

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2016

EM BRANCO



INFORMAÇÃO IMPORTANTE

O plano ora apresentado foi desenvolvido com base nas melhores informações e definições disponíveis no momento de sua concepção e naturalmente contém incertezas e indefinições típicas das fases em que os vários programas e seus projetos se encontram, conforme a literatura técnica disponível e as melhores práticas disponíveis. Dessa forma, é possível e esperado que haja a necessidade da realização de ajustes e adequações em função da superveniência de situações de fato distintas das que atualmente se tem conhecimento e que foram utilizadas como referência para a emissão de tal documento.


A estimativa de custos dos programas foi desenvolvida utilizando-se a combinação de três abordagens típicas: estimativa paramétrica, analógica e *bottom up*. A utilização de cada uma destas abordagens foi guiada principalmente pela disponibilidade de informações e pelo nível de maturidade dos projetos associados a cada programa, conforme a literatura técnica disponível e as melhores práticas disponíveis.

Além disso, as estimativas de custos estão sendo apresentadas em valores nominais, tendo como referência os valores limites estabelecidos no ACORDO que deverão ser corrigidos pelo IPCA conforme cláusula 257.

Assim, a Fundação Renova, suas mantenedoras, administradores, empregados e representantes não garantem nem assumem qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude de qualquer informação apresentada neste documento por qualquer omissão ou por quaisquer perdas ou danos, de qualquer natureza, que decorram do uso das informações atualmente disponíveis.

EM BRANCO






CONTEÚDO


1. OBJETIVO	5
2 METODOLOGIA E CONCEITOS	6
2.1 Metodologia de Gestão dos Programas	6
2.2 Indicadores	6
3 SUMÁRIO DO PLANEJAMENTO DE 3 ANOS	7
3.1 Plano dos programas socioeconômicos	7
3.1.1 Medidas reparatórias	8
3.1.2 Medidas compensatórias	9
3.2 Plano dos programas socioambientais	9
3.2.1 Medidas reparatórias	9
3.2.2 Medidas compensatórias	10
3.3 Visão consolidada dos desembolsos	10
4 DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO	11
4.1 Programas Socioeconômicos.....	11
4.1.1 PG001 – Cadastro dos Impactados.....	11
4.1.2 PG002 – Ressarcimento e indenização dos impactados	12
4.1.3 PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	13
4.1.4 PG004 - Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	14
4.1.5 PG005 - Proteção social.....	15
4.1.6 PG006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social.....	16
4.1.7 PG007 - Assistência aos Animais	17
4.1.8 PG008 - Reconstrução de vilas	18
4.1.9 PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	19
4.1.10 PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas.....	20
4.1.11 PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	22
4.1.12 PG012 - Memória histórica, cultural e artística.....	23
4.1.13 PG013 - Turismo, cultura, esporte e lazer	24
4.1.14 PG014 - Saúde física e mental da população impactada	25
4.1.15 PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	26
4.1.16 PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras.....	27
4.1.17 PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	28
4.1.18 PG018 - Diversificação da Economia Regional	29
4.1.19 PG019 - Micro e Pequenos Negócios	30
4.1.20 PG020 - Estímulo à Contratação Local	31
4.1.21 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial.....	32
4.1.22 PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	33
4.2 Programas Socioambientais	34
4.2.1 PG023 - Manejo dos rejeitos.....	34
4.2.2 PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	35
4.2.3 PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos.....	36
4.2.4 PG026 - Recuperação de APPs	37
4.2.5 PG027 - Recuperação de nascentes	38

EM BRANCO



4.2.6 PG028 - Conservação da biodiversidade.....	39
4.2.7 PG029 - Recuperação da fauna silvestre.....	40
4.2.8 PG030 - Fauna e flora terrestre.....	41
4.2.9 PG031 - Coleta e tratamento de esgoto.....	42
4.2.10 PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água.....	43
4.2.11 PG034 - Educação ambiental	44
4.2.12 PG035 - Informação para a população.....	45
4.2.13 PG036 - Comunic. nacional/internacional.....	46
4.2.14 PG037 - Gestão de riscos ambientais.....	47
4.2.15 PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	48
4.2.16 PG039 - Unidades de conservação	49
4.2.17 PG040 - CAR e PRAs.....	50
4.2.18 PG022/PG041 - Gerenciamento programas Socioeconômico e Socioambiental.....	51

EM BRANCO



1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar o planejamento inicial dos programas que serão conduzidos pela FUNDAÇÃO Renova com o intuito de recuperar, mitigar, remediar e reparar, inclusive através de indenização, os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG, pertencente à Samarco Mineração S/A, ocorrido em 05 de novembro de 2015.

A Fundação Renova é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada para gerir e executar as medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais definidos no Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) celebrado em 02 de março de 2016, entre a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e entidades Governamentais ¹, com a Samarco Mineração S/A e suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

Ela foi constituída em 30 de junho de 2016 iniciando suas atividades em 02 de agosto de 2016. A figura abaixo mostra a Visão, Missão, Objetivos e valores definidos para a Fundação.

<p>VISÃO</p> <p>Como uma parceira confiável, a Fundação capacita e apoia as comunidades afetadas para reconstruir suas vidas e meios de subsistência. Restaura e aumenta os valores ambientais da bacia do Rio Doce e seus afluentes, bem como suas comunidades vizinhas, ao mesmo tempo em que demonstra elevados padrões de transparência, integridade e responsabilidade</p>
<p>MISSÃO</p> <p>Implementar programas de reabilitação e compensação social e ambiental descritos no Acordo, trabalhando de forma eficiente, ética e respeitosa em parceria com as comunidades, governos e sociedade civil.</p>
<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Fundamentar a conceituação dos programas socioambientais e socioeconômicos em estudos com embasamento científico e engajamento• Implementar, monitorar e comunicar ações socioeconômicas e ambientais focadas em reparar e recuperar danos resultantes do acidente• Indenizar quando as ações de reparação ou mitigação não forem suficientes ou viáveis• Desenvolver e implementar projetos de boa fé que estejam alinhados com as necessidades e expectativas do poder público e das comunidades.
<p>VALORES</p> <ul style="list-style-type: none">• Integridade, transparência, colaboração, respeito, sustentabilidade

Figura 1 – Visão, Missão, Objetivos e Valores da Fundação

As informações apresentadas neste documento compreendem o período entre novembro de 2015 e dezembro de 2019 e visam atender os requisitos estabelecidos nas cláusulas 6 - inciso XIII e 187 do TTAC.

(1) IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis; ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade; ANA – Agência Nacional de Águas; FUNAI – Fundação Nacional do Índio; DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral; IEF – Instituto Estadual de Florestas; IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas; FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente; IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo; AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos.

EM BRANCO

2 METODOLOGIA E CONCEITOS

2.1 Metodologia de Gestão dos Programas

A metodologia utilizada para implementação dos programas definidos no acordo é baseada nos conceitos da quinta edição do Guia PMBOK e terceira edição do Padrão para Gerenciamento de Programas do PMI² e considera a existência de três fases no ciclo de implementação dos programas, conforme ilustrado na figura abaixo:




Figura 2 – Ciclo de vida dos programas

Abaixo, apresenta-se de forma sucinta o propósito de cada fase.

- **Definição do programa:** fase essencial para garantir que todas as questões relevantes e necessárias para definição do escopo e dos resultados esperados estejam claramente explicitadas entre a FUNDAÇÃO e o Comitê Interfederativo (CIF). A formalização e registro destas definições servirão como base para que os programas sejam dados por encerrados após o término de sua execução.
- **Execução do programa:** nesta fase, os projetos e processos definidos devem ser implementados para o alcance dos objetivos do programa. Esta fase se encerra quando os benefícios e exigências, definidos na fase de definição do programa, são efetivamente alcançados. Para os projetos, a implementação é composta das seguintes fases:




Figura 3 – Ciclo de vida dos projetos

Vale destacar que as fases e portões 1 e 2 são dispensáveis em situações em que a definição do programa indicar qual é a melhor alternativa e escopo para implementação do projeto.

- **Encerramento do programa:** nesta fase há a formalização da conclusão do programa através da devida quitação pelo CIF das entregas e benefícios acordados.

2.2 Indicadores


Para acompanhamento da implementação dos programas e projetos serão utilizados indicadores de desempenho e indicadores de benefícios.

Os indicadores de desempenho têm por objetivo avaliar se um projeto está sendo conduzido conforme planejado. Para isto serão utilizados os indicadores de progresso físico (razão do progresso físico real pelo planejado) e cumprimento de prazo (razão entre a duração prevista para execução do projeto pela duração planejada). Os indicadores de benefício têm por objetivo avaliar quantitativamente o progresso dos benefícios gerados pelos programas e seus projetos. Como estes indicadores podem exigir estudos aprofundados e complexos, além de ainda não terem sido objeto de discussão junto ao CIF, neste documento serão abordados apenas aqueles que estão explicitamente indicados no ACORDO.

(2) PMI: *Project Management Institute* é uma das maiores associações do mundo com o objetivo de reunir profissionais da área de gerenciamento de projetos para trocarem experiências e conhecimentos, identificar e reunir boas práticas nesta área, estabelecer uma ética na profissão e certificar profissionais da área.

EM BRANCO





3 SUMÁRIO DO PLANEJAMENTO DE 3 ANOS

Esta seção demonstra de forma sucinta o planejamento dos programas para os próximos 3 anos. Conforme as definições presentes no TTAC, o portfólio de programas foi dividido em dois grupos:

- **Programas socioeconômicos:** representam o conjunto de medidas e de ações a serem executadas, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos **socioeconômicos** decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.
- **Programas socioambientais:** representam o conjunto de medidas e de ações a serem executadas, necessárias à reparação e compensação pelos danos **socioambientais** decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Os programas também são classificados conforme sua natureza:

- **Programas reparatórios:** compreendem as medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.
- **Programas compensatórios:** compreendem as medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos programas reparatórios.

Na definição do planejamento, os programas socioeconômicos de natureza reparatória têm preferência em relação aos demais programas. Com relação ao desembolso a ser realizado no período, o TTAC estabelece as seguintes regras:

- Aporte de dois bilhões de reais em 2016.
- Aportes de um bilhão e duzentos milhões de reais nos anos de 2017 e 2018.
- Aporte entre oitocentos milhões e um bilhão e seiscentos milhões de reais em 2019.
- Aporte de duzentos e quarenta milhões de reais por ano para as ações e projetos de natureza compensatória.
- Além desses valores, está previsto o aporte de cinquenta milhões de reais em 2016, duzentos milhões de reais em 2017 e duzentos e cinquenta milhões de reais em 2018 (Programa Coleta e Tratamento de Esgoto).

Os capítulos a seguir demonstram as previsões de desembolso que compõem os planos dos programas socioeconômicos e socioambientais.

3.1 Plano dos programas socioeconômicos

O plano dos programas socioeconômicos foi estruturado conforme as definições do TTAC, sendo constituído de 7 (sete) eixos temáticos e 23 (vinte e três) programas conforme ilustrado na figura abaixo.

São consideradas como modalidades de reparação socioeconômica: a reposição, a restituição e a recomposição de bens; a indenização pecuniária em prestação única ou continuada, enquanto identificada tecnicamente a necessidade; o reassentamento padrão rural ou urbano, nos termos do TTAC e observadas as políticas e normas públicas; o autoreassentamento; a permuta e a assistência para remediação e mitigação dos efeitos do rompimento da barragem.

EMBRANCO

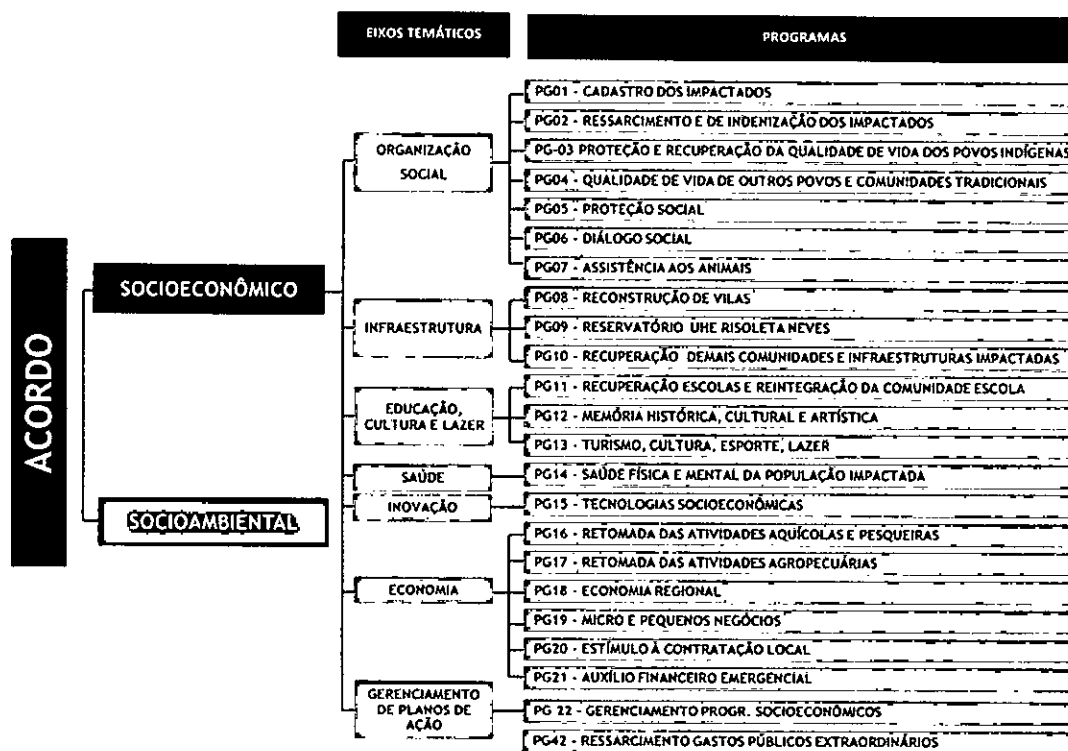



Figura 4 – Estrutura dos programas socioeconômicos


3.1.1 Medidas reparatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioeconômicos de natureza reparatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov-15	set-16	jun-19	out-19	45,9	10,2	23,5	14,2	3,8	2,1
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez-15	out-16	out-19	jan-20	244,7	10,8	117,3	97,6	6,7	21,4
PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	mar-16	out-18	out-18	jan-19	61,7	5,3	19,9	25,6	14,6	1,1
PG004 - Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	ago-16	mar-18	mar-18	jun-18	0,5	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
PG005 - Proteção social	abr-16	jul-17	abr-19	jun-19	38,6	0,0	3,8	15,3	12,3	7,2
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov-15	out-16	dez-30	dez-30	224,5	5,6	24,7	37,5	22,1	19,8
PG007 - Assistência aos Animais	nov-15	out-16	mai-19	jul-19	16,4	10,1	10,1	2,8	1,3	0,1
PG008 - Reconstrução de vilas	nov-15	out-16	mar-22	mar-22	322,5	12,9	26,1	56,3	191,3	38,7
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov-15	nov-16	jul-18	out-18	261,3	29,2	96,4	137,6	27,2	0,0
PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas	nov-15	out-16	nov-18	fev-19	293,1	150,1	220,2	59,2	7,0	0,0
PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	jan-16	out-16	mar-21	mai-21	9,7	0,1	0,9	1,9	2,3	2,2
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev-16	ago-17	jul-22	out-22	34,8	3,3	14,6	11,4	3,2	2,5
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	abr-16	mar-17	mar-22	jun-22	18,3	0,0	1,6	6,4	5,0	2,5
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov-15	out-16	nov-25	nov-25	162,6	10,7	23,8	41,0	40,1	26,7
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	mar-17	abr-17	mar-20	mai-20	10,2	0,0	0,0	0,0	6,3	2,9
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	nov-15	out-16	ago-22	nov-22	125,5	3,5	18,2	52,1	27,8	14,9
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	dez-15	mar-17	mar-20	jun-20	26,5	0,7	4,4	4,1	4,0	4,0
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov-15	out-16	jun-20	set-20	464,1	124,4	202,9	113,6	81,9	40,9
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	jun-16	dez-16	dez-17	dez-17	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0
Total medidas reparatórias					2.390	377	808	706	457	187

Figura 5 – Desembolso dos programas socioeconômicos de cunho reparatório

EM BRANCO



3.1.2 Medidas compensatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioeconômicos de natureza compensatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos Impactados	dez-15	out-16	out-19	Jan-20	144,1	0,0	44,3	99,9	0,0	0,0
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer ³	abr-16	mar-17	mar-22	Jun-22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	dez-16	out-17	out-17	Jan-18	7,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1
PG018 - Diversificação da Economia Regional	set-16	out-17	dez-30	dez-30	42,7	0,0	0,9	11,8	4,6	3,7
PG020 - Estimulo à Contratação Local	nov-15	out-16	dez-30	dez-30	2,3	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
Total medidas compensatórias					197	0	45	112	6	5

Figura 6- Desembolso dos programas socioeconômicos de cunho compensatório

(1) Valores realizados até Julho/2016.

(2) Valores previstos até Dezembro/2016.

(3) Valores a serem definidos após a realização do diagnóstico e definição das ações necessárias

3.2 Plano dos programas socioambientais

O plano dos programas socioeconômicos foi estruturado conforme as definições do TTAC, sendo constituído de 8 (oito) eixos temáticos e 18 (dezoito) programas conforme ilustrado na figura abaixo.

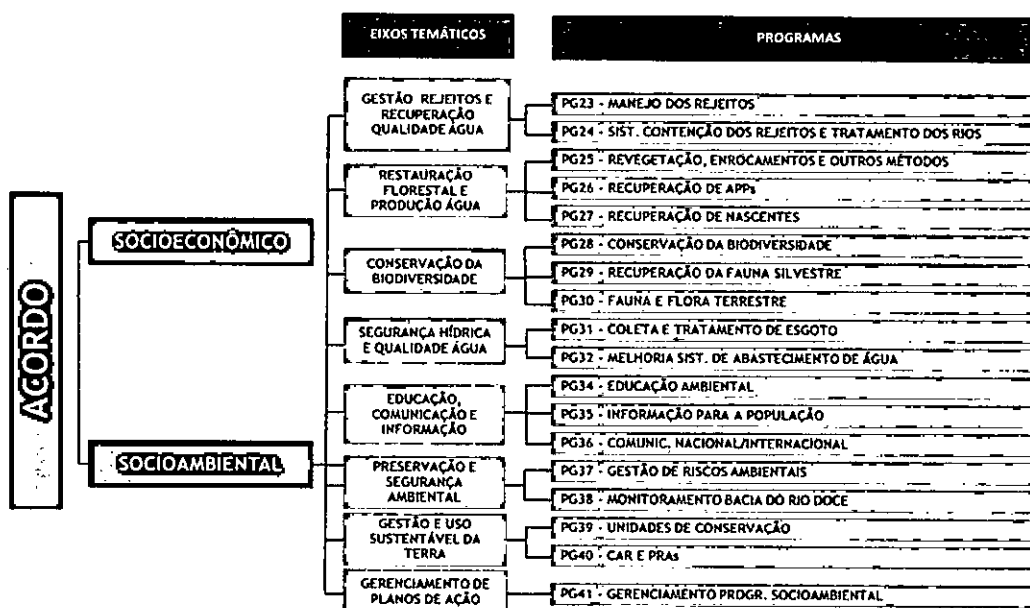



Figura 7 - Estrutura dos programas socioambientais

3.2.1 Medidas reparatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioambientais de natureza reparatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG023 - Manejo dos rejeitos	dez-15	abr-17	mar-26	jun-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EM BRANCO



PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	nov-15	set-16	fev-20	mai-20	648,5	45,4	276,8	203,3	98,1	61,2
PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos	dez-15	abr-17	mar-26	jun-26	1022,6	108,4	194,6	279,6	108,7	120,8
PG028 - Conservação da biodiversidade	jun-16	jul-17	ago-21	nov-21	39,2	0,0	7,4	6,4	7,0	7,0
PG030 - Fauna e flora terrestre	ago-16	dez-16	set-21	nov-21	18,0	0,0	6,0	2,4	2,4	2,4
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan-16	out-16	ago-20	abr-21	96,3	0,2	15,0	30,4	50,4	0,2
PG037 - Gestão de riscos ambientais	set-16	mar-17	mar-17	jun-17	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov-15	jan-17	dez-30	dez-30	263,7	51,7	86,5	29,4	46,4	11,1
PG039 - Unidades de conservação	set-16	jan-17	dez-21	mar-22	6,0	0,0	0,6	1,3	1,0	1,0
PG022/PG041 - Gerenciamento progr. Socioeconômicos e Socioambientais	mar-16	set-16	dez-30	dez-30	590,6	0,3	33,1	114,2	83,5	64,9
Total medidas reparatórias					2.687	206	620	669	398	269

Figura 8 – Desembolso dos programas socioambientais de cunho reparatório

3.2.2 Medidas compensatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioambientais de natureza compensatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG026 - Recuperação de APPs	set-16	fev-17	mar-26	mar-26	1261,6	0,0	15,1	59,1	63,4	77,7
PG027 - Recuperação de nascentes	set-16	fev-17	mar-26	mar-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PG029 - Recuperação da fauna silvestre	mar-18	mar-18	mar-23	mai-23	29,3	0,0	0,1	0,1	14,8	3,6
PG031 - Coleta e tratamento de esgoto	set-16	out-16	dez-18	mar-19	500,0	0,0	50,0	200,0	250,0	0,0
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan-16	out-16	ago-20	abr-21	67,6	0,5	9,5	24,3	30,1	1,2
PG034 - Educação ambiental	fev-16	out-16	jul-26	out-26	35,6	1,9	16,8	6,0	2,2	3,1
PG035 - Informação para a população	jun-16	out-16	mar-26	mar-26	24,8	0,0	1,4	2,3	2,3	2,3
PG036 - Comunic. nacional/Internacional	jun-16	out-16	mar-26	mar-26	5,2	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov-15	jan-17	dez-30	dez-30	13,5	0,0	1,0	10,2	2,0	0,2
PG039 - Unidades de conservação	set-16	jan-17	dez-21	mar-22	15,0	0,0	6,5	8,5	0,0	0,0
PG040 - CAR e PRAs	nov-15	out-16	mar-26	mai-26	6,0	0,0	0,7	2,0	0,5	0,4
Total medidas compensatórias					1.959	2	101	313	366	89

Figura 9 – Desembolso dos programas socioambientais de cunho compensatório

(1) Valores realizados até Julho/2016.

(2) Valores previstos até Dezembro/2016.

3.3 Visão consolidada dos desembolsos

Abaixo são apresentados os custos gerais em milhões de reais planejados até dezembro de 2019.

Visão por capítulo	Total	Total 2017 - 2019		Realizado ²	2016 ³	2017 ³	2018 ³	2019 ³
		Total	Realizado ²					
Programas socioeconômicos	2.587	1.474	377,2	853,8	818,7	463,1	192,3	
Programas socioambientais	4.645	2.103	208,4	721,3	981,9	763,4	357,6	
Ações emergenciais ¹	199	43	141,3	94,0	26,5	16,6	0,0	
Saldo medidas compensatórias	1.945	278	0,0	143,2	14,6	117,9	145,6	
Visão pela natureza	Total	Total	Realizado²	2016³	2017³	2018³	2019³	
Medidas reparatórias	5.275	2.729	724,4	1.522,3	1.401,8	871,1	455,6	
Medidas compensatórias	4.100	1.170	2,4	290,0	440,0	490,0	240,0	
Total	9.375	3.899	727	1.812	1.842	1.361	696	

Figura 10 – Sumário do orçamento até 2019


(1) As ações emergenciais/mitigatórias cobertas neste planejamento são aquelas que se iniciaram em sequência ao evento de rompimento da barragem e que tem seus custos e gestão absorvidos pelo ACORDO, apesar de não estarem diretamente associadas a nenhum dos programas socioeconômicos ou socioambientais.

(2) Valores realizados até Julho/2016.

(3) Valores previstos até Dezembro de cada ano.

EM BRANCO






4 DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO

4.1 Programas Socioeconômicos

4.1.1 PG001 – Cadastro dos Impactados

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
45,9	10,2	23,5	14,2	3,8	2,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Realizar cadastro de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), famílias e comunidades, contendo o levantamento dos impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais e posteriormente, a condução de monitoramento socioeconômico destas famílias e municípios afetados. Além disso, efetuar estudos para identificar e avaliar impactos socioeconômicos com base em requisitos de direitos humanos. CLÁUSULAS: 19 a 30.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cadastro emergencial de 5.296 famílias e 18.135 pessoas em MG e 3.217 famílias e 11.441 pessoas no ES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th colspan="2">2015</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG001-B Programa de levantamento e de cadastro dos Impactados (Cláusulas 19 a 30)</td> <td colspan="2">11/2015</td> <td colspan="4">10/2019</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="25">* Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 19 - Término do cadastramento dos Impactados (Cadastramento socioeconômico de</td> <td colspan="24">12/2016</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados</td> <td colspan="24">3/2017</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 22 - Término da validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo</td> <td colspan="24">4/2017</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo</td> <td colspan="24">9/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td>6/2016</td> <td colspan="24">9/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="25">* Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td>11/2015</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">* PF0059 - Levantamento e cadastro dos Impactados e produção de informações para demais programas</td> </tr> <tr> <td>11/2015</td> <td colspan="24">7/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="25">* Execução do Projeto</td> </tr> <tr> <td>11/2015</td> <td colspan="24">7/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)</td> </tr> <tr> <td>6/2016</td> <td colspan="24">12/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)</td> </tr> <tr> <td>8/2016</td> <td colspan="24">3/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados</td> </tr> <tr> <td>10/2016</td> <td colspan="24">4/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo</td> </tr> <tr> <td>1/2017</td> <td colspan="24">7/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Elaboração de relatório de Impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos Impactados.</td> </tr> <tr> <td>7/2017</td> <td colspan="24">9/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> <tr> <td>1/2017</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">* Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados</td> </tr> <tr> <td>1/2017</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados</td> </tr> <tr> <td>6/2017</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">* Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas</td> </tr> <tr> <td>6/2017</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Monitoramento socioeconômico dos municípios</td> </tr> <tr> <td>6/2017</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Estudos de avaliação de Impactos socioeconômicos e culturais complementares</td> </tr> <tr> <td>6/2017</td> <td colspan="24">6/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">* Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td>6/2019</td> <td colspan="24">10/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="25">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> </tbody> </table>							Nome da Tarefa	2015		2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	PG001-B Programa de levantamento e de cadastro dos Impactados (Cláusulas 19 a 30)	11/2015		10/2019																* Metas do Programa																									Cláusula 19 - Término do cadastramento dos Impactados (Cadastramento socioeconômico de	12/2016																								Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados	3/2017																								Cláusula 22 - Término da validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo	4/2017																								Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo	9/2017																								Definição do Programa																									6/2016	9/2016																								* Execução do Programa																									11/2015	6/2019																								* PF0059 - Levantamento e cadastro dos Impactados e produção de informações para demais programas																									11/2015	7/2017																								* Execução do Projeto																									11/2015	7/2016																								Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)																									6/2016	12/2016																								Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)																									8/2016	3/2017																								Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados																									10/2016	4/2017																								Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo																									1/2017	7/2017																								Elaboração de relatório de Impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos Impactados.																									7/2017	9/2017																								Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)																									1/2017	6/2019																								* Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados																									1/2017	6/2019																								Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados																									6/2017	6/2019																								* Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas																									6/2017	6/2019																								Monitoramento socioeconômico dos municípios																									6/2017	6/2019																								Estudos de avaliação de Impactos socioeconômicos e culturais complementares																									6/2017	6/2019																								* Encerramento do Programa																									6/2019	10/2019																								Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																								
Nome da Tarefa	2015		2016					2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PG001-B Programa de levantamento e de cadastro dos Impactados (Cláusulas 19 a 30)	11/2015		10/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cláusula 19 - Término do cadastramento dos Impactados (Cadastramento socioeconômico de	12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 22 - Término da validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo	4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo	9/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2016	9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11/2015	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* PF0059 - Levantamento e cadastro dos Impactados e produção de informações para demais programas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11/2015	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Execução do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11/2015	7/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2016	12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8/2016	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10/2016	4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1/2017	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Elaboração de relatório de Impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos Impactados.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7/2017	9/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Monitoramento socioeconômico dos municípios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Estudos de avaliação de Impactos socioeconômicos e culturais complementares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6/2019	10/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										


EM BRANCO



4.1.2 PG002 – Ressarcimento e indenização dos impactados

		ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
388,8	10,8	161,5	197,4	6,7	21,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Por meio de negociação coordenada, reparar e indenizar os impactados que sofreram prejuízos e danos devido ao evento. CLÁUSULAS: 31 a 38.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Lista de danos e matriz de danos aprovada internamente. • Verba para contratações de mão-de-obra, obras civis, TI, método de pagamento e toda infra estrutura operacional dos escritórios liberada. • Validação pelo CIF do cronograma de diálogo com entidades públicas, técnicas e famílias impactadas. • Desenvolvido o módulo de indenização antecipada. • Realizado treinamento com as equipes de Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Colatina no módulo de indenização antecipada. • Iniciadas reuniões de validação da matriz de danos com os representantes da população impactada (pescadores, agricultores e comerciantes) no ES e em MG. • Iniciadas obras de adequação dos 10 escritórios da fase 1. • Apresentado programa e obtido aceitação das prefeituras da fase 1 e entes técnicos principais (Incaper, Emater, Ministério da Agricultura e Abastecimento, CDL, SEBRAE, SECOVI, IBAPE). • Desenvolvida metodologia de atualização da matriz de danos. • Concluindo processos de contratação (cartões pré-pagos, atendimento ao público, segurança e limpeza dos escritórios e outros). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Termo</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="3">2016</th> <th colspan="3">2017</th> <th colspan="3">2018</th> <th colspan="3">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Ma</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 a 38) 11/2015 1/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 31 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsto de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001)</td> <td></td> <td>6/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 32 - Pagamento das Indenizações (previsto de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada)</td> <td></td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>12/2015</td> <td>10/2019</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Ações Emergenciais</td> <td>12/2015</td> <td>1/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>PF0060 - Ressarcimento e Indenização dos IMPACTADOS</td> <td>3/2016</td> <td>10/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Marcos do Projeto</td> <td>10/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bão Guandu e Linhares</td> <td>3/2016</td> <td>7/2016</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas</td> <td>4/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Projeto</td> <td>5/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bão Guandu e Linhares</td> <td>5/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Implantar Centros de Negociação - Demais Áreas</td> <td>10/2016</td> <td>1/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Realizar a Etapa de Negociação Coordenada</td> <td>10/2016</td> <td>6/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Efetuar os Pagamentos de Indenizações</td> <td>10/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>7/2017</td> <td>10/2017</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes</td> <td>7/2017</td> <td>10/2019</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>10/2019</td> <td>1/2020</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2019</td> <td>1/2020</td> <td colspan="12">[Barra horizontal]</td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Termo	Início	Término	2016			2017			2018			2019			Jan	Feb	Mar	Apr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 a 38) 11/2015 1/2020															Metas do Programa															Cláusula 31 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsto de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001)		6/2017													Cláusula 32 - Pagamento das Indenizações (previsto de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada)		7/2017													Definição do Programa	9/2016	10/2016													Execução do Programa	12/2015	10/2019	[Barra horizontal]												Ações Emergenciais	12/2015	1/2017	[Barra horizontal]												PF0060 - Ressarcimento e Indenização dos IMPACTADOS	3/2016	10/2017	[Barra horizontal]												Marcos do Projeto	10/2016	7/2017	[Barra horizontal]												Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bão Guandu e Linhares	3/2016	7/2016	[Barra horizontal]												Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas	4/2016	10/2016	[Barra horizontal]												Execução do Projeto	5/2016	7/2017	[Barra horizontal]												Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bão Guandu e Linhares	5/2016	10/2016	[Barra horizontal]												Implantar Centros de Negociação - Demais Áreas	10/2016	1/2017	[Barra horizontal]												Realizar a Etapa de Negociação Coordenada	10/2016	6/2017	[Barra horizontal]												Efetuar os Pagamentos de Indenizações	10/2016	7/2017	[Barra horizontal]												Encerramento do Projeto	7/2017	10/2017	[Barra horizontal]												Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes	7/2017	10/2019	[Barra horizontal]												Encerramento do Programa	10/2019	1/2020	[Barra horizontal]												Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2019	1/2020	[Barra horizontal]											
Nome do Termo	Início	Término	2016						2017			2018			2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PG002-R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 a 38) 11/2015 1/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 31 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsto de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001)		6/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cláusula 32 - Pagamento das Indenizações (previsto de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada)		7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Definição do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Execução do Programa	12/2015	10/2019	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ações Emergenciais	12/2015	1/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PF0060 - Ressarcimento e Indenização dos IMPACTADOS	3/2016	10/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Marcos do Projeto	10/2016	7/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bão Guandu e Linhares	3/2016	7/2016	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas	4/2016	10/2016	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução do Projeto	5/2016	7/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bão Guandu e Linhares	5/2016	10/2016	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Implantar Centros de Negociação - Demais Áreas	10/2016	1/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada	10/2016	6/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Efetuar os Pagamentos de Indenizações	10/2016	7/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Projeto	7/2017	10/2017	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Processo de Negociações e Indenizações Remanescentes	7/2017	10/2019	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa	10/2019	1/2020	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2019	1/2020	[Barra horizontal]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

EM BRANCO




4.1.3 PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
61,7	5,3	19,9	25,6	14,6	1,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Manter as medidas de monitoramento contínuo de aspectos previstos no acordo celebrado com a VALE com os povos Krenak e também medidas de apoio emergencial e monitoramento contínuo das medidas de apoio emergencial aos povos Tupiniquim e Guarani. Outro objetivo é a contratação de consultoria independente conforme termo de referência da FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado dos impactos socioambientais e socioeconômicos do evento sobre os povos Krenak, Tupiniquim e Guarani. CLÁUSULAS: 39 a 45.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<ul style="list-style-type: none"> Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R\$7.092) por família a 126 famílias, disponibilização de R\$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água. Tupiniquim (TI Comboios): Auxílio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias. Tupiniquim e Guarani (Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R\$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R\$ 662.942,70, depositado em uma conta vinculada à associação indígena. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG003 R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 a 45)</td> <td>3/2016</td> <td>1/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak</td> <td>3/2016</td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circums</td> <td></td> <td>4/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)</td> <td></td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani</td> <td></td> <td>3/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani</td> <td>3/2016</td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)</td> <td></td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>7/2016</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Eexecução do Programa</td> <td>3/2016</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>- PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak</td> <td>9/2016</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Erecução de infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak</td> <td>11/2016</td> <td>5/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>5/2018</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>- Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir) (início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Processos de Apoio Emergencial</td> <td>3/2016</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financ</td> <td>8/2016</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieiras) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro</td> <td>3/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro</td> <td>3/2016</td> <td>11/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Fornecimento Emergencial de Água - Krenak</td> <td>8/2016</td> <td>5/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>10/2018</td> <td>1/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2018</td> <td>1/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> </tbody> </table>							Nome do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG003 R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 a 45)	3/2016	1/2019	[Gantt chart bars]																Metas do Programa			[Gantt chart bars]																Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	3/2016		[Gantt chart bars]																Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circums		4/2016	[Gantt chart bars]																Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak		7/2016	[Gantt chart bars]																Cláusula 43 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		8/2018	[Gantt chart bars]																Cláusula 44 - Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani		3/2016	[Gantt chart bars]																Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	3/2016		[Gantt chart bars]																Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani		7/2016	[Gantt chart bars]																Cláusula 44 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)		8/2018	[Gantt chart bars]																Definição do Programa	7/2016	10/2018	[Gantt chart bars]																Eexecução do Programa	3/2016	10/2018	[Gantt chart bars]																- PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak	9/2016	8/2018	[Gantt chart bars]																Erecução de infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak	11/2016	5/2018	[Gantt chart bars]																Encerramento do Projeto	5/2018	8/2018	[Gantt chart bars]																- Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir) (início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)			[Gantt chart bars]																Processos de Apoio Emergencial	3/2016	8/2018	[Gantt chart bars]																Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financ	8/2016	8/2018	[Gantt chart bars]																Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieiras) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	10/2016	[Gantt chart bars]																Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	11/2016	[Gantt chart bars]																Fornecimento Emergencial de Água - Krenak	8/2016	5/2018	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa	10/2018	1/2019	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2018	1/2019	[Gantt chart bars]															
Nome do Tarefa	Início	Término	2016							2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PG003 R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 a 45)	3/2016	1/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Metas do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	3/2016		[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circums		4/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak		7/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 43 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)		8/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 44 - Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani		3/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	3/2016		[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani		7/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 44 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)		8/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Definição do Programa	7/2016	10/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Eexecução do Programa	3/2016	10/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
- PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak	9/2016	8/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Erecução de infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak	11/2016	5/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	5/2018	8/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
- Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir) (início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Processos de Apoio Emergencial	3/2016	8/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financ	8/2016	8/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieiras) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	10/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Tupiniquim e Guarani (Comboios) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	11/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Fornecimento Emergencial de Água - Krenak	8/2016	5/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Programa	10/2018	1/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2018	1/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

EM BRANCO

EM BRANCO






4.1.5 PG005 - Proteção social

		ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																							
38,6	0,0	3,8	15,3	12,3	7,2																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																												
Promover a proteção social por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico. CLÁUSULAS: 54 a 58.																																																																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica (CRAS). Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial. Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território. 																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																												
Os objetivos do programa serão realizados por meio de processos que contemplam ações socioassistenciais no período de 36 meses. Durante este período, a FUNDAÇÃO estará dando continuidade às ações emergenciais e, a partir de jun/17, estará implantando ações estruturadas até a efetiva definição do programa.																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Item ou Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Set</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 a 58)</td> <td>4/2016</td> <td>6/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Cláusula 58 - início do Programa de Proteção Social</td> <td>4/2016</td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social</td> <td></td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>• Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td>4/2016</td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> • Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social</td> <td>4/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> • Execução de ações socioassistenciais emergenciais</td> <td>4/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> • Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)</td> <td>7/2017</td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> • Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme Acordo)</td> <td>7/2017</td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>• Encerramento do Programa</td> <td>4/2019</td> <td>6/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>4/2019</td> <td>6/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> </tbody> </table>						Item ou Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 a 58)	4/2016	6/2019	[Gantt chart bars]																• Metas do Programa			[Gantt chart bars]																Cláusula 58 - início do Programa de Proteção Social	4/2016		[Gantt chart bars]																Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		4/2019	[Gantt chart bars]																• Definição do Programa	9/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																• Execução do Programa	4/2016	4/2019	[Gantt chart bars]																• Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																• Execução de ações socioassistenciais emergenciais	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																• Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																• Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme Acordo)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																• Encerramento do Programa	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]															
Item ou Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																											
			Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																										
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 a 58)	4/2016	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Metas do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 58 - início do Programa de Proteção Social	4/2016		[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Definição do Programa	9/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Execução do Programa	4/2016	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Execução de ações socioassistenciais emergenciais	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme Acordo)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
• Encerramento do Programa	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									


EM BRANCO



4.1.6 PG006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

ORÇAMENTO (R\$MM)									
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019				
224,5	5,6	24,7	37,5	22,1	19,8				
OBJETIVO									
Criar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em espaços fixos ou itinerantes que contempla a instituição de mesa de diálogo e negociação permanente; a construção e manutenção do sítio virtual na internet; a criação e manutenção de espaços dialógicos com as comunidades; central 0800 de atendimento à população; criação de um manual de "perguntas e respostas"; divulgação em redes sociais sobre iniciativas da FUNDAÇÃO, esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação. CLÁUSULAS: 59 a 72.									
STATUS ATUAL									
<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução. • Acumulado de reuniões: 258 com 8.554 participantes no trecho I (Mariana ao município de Rio Doce) e 189 com 7.710 participantes nos trechos II (municípios ao longo do rio Doce em MG) e III (municípios ao longo do rio Doce no ES). • Disponibilização de canais de comunicação: central 0800, <i>Fale conosco</i> no site da empresa, Facebook e postos físicos de atendimento. • Capacidade de atendimento de 100% das ligações no 0800. 									
CRONOGRAMA E METAS									
As medidas deste programa estão em andamento através de quatro processos básicos que foram iniciados em caráter emergencial após o EVENTO e que estão sendo adequadamente estruturados. São eles: a) Processo de comunicação institucional; b) Processo de participação e diálogo; c) Processo de canais de relacionamentos e d) Processo de ouvidoria.									
Para implantação do processo definitivo de ouvidoria, a FUNDAÇÃO prevê a realização do projeto "PF0149 – Implantação do Processo Definitivo de Ouvidoria da FUNDAÇÃO" com previsão de término para abr/17.									
Nome do Tarefa									
		2016		2017		2018		2019	
		Jan	Dez	Jan	Dez	Jan	Dez	Jan	Dez
PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 a 72) 11/2015 12/2030									
• Metas do Programa									
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma Interativa sobre o EVENTO		12/2016		29/12					
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria		4/2017		17/04					
Definição do Programa									
9/2016		10/2016							
• Execução do Programa									
11/2015		12/2030							
• Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social									
12/2015		12/2016							
11/2015		3/2017							
11/2015		3/2017							
11/2015		4/2017							
• PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO									
8/2016		7/2017							
8/2016		9/2016							
9/2016		4/2017							
4/2017		7/2017							
• Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social									
12/2016		12/2030							
12/2016		12/2030							
3/2017		12/2030							
3/2017		12/2030							
4/2017		12/2030							
• Encerramento do Programa									
10/2030		12/2030							
Encerramento do Programa (capta e formatação de benefícios)									
10/2030		12/2030							

EM BRANCO



4.1.7 PG007 - Assistência aos Animais

TOTAL	REALIZADO	ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																										
		2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																							
16,4	10,1	10,1	2,8	1,3	0,1																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																												
Assistência aos animais extraviados e desalojados pelo EVENTO na região de Mariana e Barra Longa. CLÁUSULAS: 73 a 75.																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusão da 3ª campanha de visitas de pós adoção. • 73 animais adotados (54% do total disponível para adoções). • 100% dos animais atendidos pelo programa possuem identificação e prontuário médico. • 111 animais de pequeno porte sob guarda do programa (55 disponíveis para adoção e 56 reconhecidos por seus tutores) • 244 animais de grande porte sob guarda do programa. • 3 fazendas mantidas pelo programa para assistência aos animais. 																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																												
Este programa foi iniciado logo após o EVENTO com previsão de manutenção por até 60 dias após a finalização do reassentamento, prazo que entendemos ser suficiente para que todos os animais já estejam com seus donos ou tenham sido efetivamente doados a seus tutores, dispensando assim, a necessidade de construção de um Santuário.																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG007 - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 a 75)</td> <td>11/2015</td> <td>7/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td> Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais</td> <td></td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>01/05</td> </tr> <tr> <td>• Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>01/05</td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td> • Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)</td> <td>11/2015</td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td> Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)</td> <td>11/2015</td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Encerramento do Programa</td> <td>5/2019</td> <td>7/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>5/2019</td> <td>7/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG007 - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 a 75)	11/2015	7/2019																		• Metas do Programa																				Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais		5/2019																	01/05	• Definição do Programa	9/2016	10/2016																	01/05	• Execução do Programa	11/2015	5/2019																		• Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)	11/2015	5/2019																		Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)	11/2015	5/2019																		• Encerramento do Programa	5/2019	7/2019																		Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	5/2019	7/2019																	
Nome do Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																											
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																										
PG007 - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 a 75)	11/2015	7/2019																																																																																																																																																																																																																										
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 75 - Término da Assistência aos Animais		5/2019																	01/05																																																																																																																																																																																																									
• Definição do Programa	9/2016	10/2016																	01/05																																																																																																																																																																																																									
• Execução do Programa	11/2015	5/2019																																																																																																																																																																																																																										
• Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)	11/2015	5/2019																																																																																																																																																																																																																										
Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)	11/2015	5/2019																																																																																																																																																																																																																										
• Encerramento do Programa	5/2019	7/2019																																																																																																																																																																																																																										
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	5/2019	7/2019																																																																																																																																																																																																																										


EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO






4.1.10 PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
293,1	150,1	220,2	59,2	7,0	0,0
OBJETIVO					
<p>Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como:</p> <p>a) reestabelecimentos de acessos. b) limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do EVENTO. c) demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza. d) reconstrução de pontes. e) drenagens. f) reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol. g) reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos. h) reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público. i) reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer. j) reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas. k) recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo EVENTO. l) contenções de taludes e encostas para acessos. m) reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas. n) reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. CLÁUSULAS: 82 a 88.</p>					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none">• 100% da construção de pontes de cabos de aço concluídas.• 100% de abertura de acessos para sirenes da "Fase 1".• 100% dos dispositivos de drenagens mapeados foram reestabelecidos.• 100% abertura e acabamento final das estradas não pavimentadas.• 100% de asfalto recuperado em Barra Longa.• 88 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira.• 12 currais e 4 mata burros reformados em Barra Longa.• 38 quintais finalizados em Barra Longa.• Reformas concluídas em 23 propriedades rurais e 17 espaços públicos em distritos atingidos.					

EM BRANCO


EMBRANCO



4.1.11 PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar


ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																										
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																					
9,7	0,1	0,9	1,9	2,3	2,2																																																																					
OBJETIVO																																																																										
Providenciar a reconstrução, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários às escolas impactadas de Fundão até Candonga e providenciar os meios para reintegração de seus respectivos alunos e profissionais envolvidos nas rotinas escolares. CLÁUSULAS: 89 a 94.																																																																										
STATUS ATUAL																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e seguem o calendário regular de 2016. Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifânio Gonçalves e E. M. José de Vasconcelos Melhoria da acessibilidade nas escolas. Maior integração da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares. 																																																																										
CRONOGRAMA E METAS																																																																										
O objetivo relacionado à reconstrução, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários está sendo tratado nos programas de infraestrutura PG008 e PG010 e neste o foco está na reintegração da comunidade escolar.																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th colspan="2">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Mai</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG011 R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)</td> <td colspan="2">1/2016</td> <td colspan="2">5/2016</td> <td colspan="16"></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa <ul style="list-style-type: none"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C 12/2016 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P 3/2019 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues 3/2019 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B 10/2016 Definição do Programa 9/2016 10/2016 Execução do Programa <ul style="list-style-type: none"> PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 8/2016 3/2017 Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira 10/2016 12/2016 Encerramento do Projeto 12/2016 3/2017 PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 6/2018 10/2018 Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu 10/2018 3/2019 Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 8/2018 12/2018 Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues 9/2018 3/2019 Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa <ul style="list-style-type: none"> Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) 1/2016 10/2016 Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016 Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais <ul style="list-style-type: none"> Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 3/2016 3/2021 Encerramento do Programa <ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2021 5/2021 </td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	2016		2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Jul	Out	PG011 R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)	1/2016		5/2016																		<ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa <ul style="list-style-type: none"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C 12/2016 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P 3/2019 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues 3/2019 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B 10/2016 Definição do Programa 9/2016 10/2016 Execução do Programa <ul style="list-style-type: none"> PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 8/2016 3/2017 Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira 10/2016 12/2016 Encerramento do Projeto 12/2016 3/2017 PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 6/2018 10/2018 Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu 10/2018 3/2019 Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 8/2018 12/2018 Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues 9/2018 3/2019 Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa <ul style="list-style-type: none"> Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) 1/2016 10/2016 Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016 Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais <ul style="list-style-type: none"> Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 3/2016 3/2021 Encerramento do Programa <ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2021 5/2021 																
Nome do Tarefa	2016		2017				2018				2019																																																															
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Jul	Out																																																										
PG011 R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)	1/2016		5/2016																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa <ul style="list-style-type: none"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C 12/2016 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P 3/2019 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues 3/2019 Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B 10/2016 Definição do Programa 9/2016 10/2016 Execução do Programa <ul style="list-style-type: none"> PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 8/2016 3/2017 Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira 10/2016 12/2016 Encerramento do Projeto 12/2016 3/2017 PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 6/2018 10/2018 Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu 10/2018 3/2019 Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução 8/2018 12/2018 Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues 9/2018 3/2019 Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa <ul style="list-style-type: none"> Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) 1/2016 10/2016 Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016 Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais <ul style="list-style-type: none"> Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 3/2016 3/2021 Encerramento do Programa <ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2021 5/2021 																																																																										

EM BRANCO



EM BRANCO






4.1.13 PG013 - Turismo, cultura, esporte e lazer

		ORÇAMENTO (R\$MM)				
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019	
18,3	0,0	1,6	6,4	5,0	2,5	
OBJETIVO						
Realizar o diagnóstico de impacto no turismo, cultura, esporte e lazer que deverá nortear a estruturação de projetos e processos para fomento dessas atividades nas localidades que tiverem impactos apontados. CLÁUSULAS: 101 a 105.						
STATUS ATUAL						
<ul style="list-style-type: none"> • Detalhamento do Programa e definição do Termo de Referência e demais documentos licitatórios. • Apoio emergencial às áreas mais afetadas no tema objeto do Programa (Mariana e Linhares – Regência). • Contato formal com os 40 municípios da área de abrangência socioeconômica informando do futuro próximo dos trabalhos por meio de consultoria especializada e encaminhando questionário para coleta de informações prévias. • Recebimento das propostas técnicas para realização do diagnóstico em 17/08 (vendedor list : 10 empresas. Propostas Recebidas: 5. 						
CRONOGRAMA E METAS						
Excepcionalmente, a FUNDAÇÃO poderá apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico, previsto num processo emergencial para tal finalidade.						
<small>Nome do Tarefa</small> <small>Inicio</small> <small>Termino</small> <small>2016</small> <small>2017</small> <small>2018</small> <small>2019</small> <small>Jan</small> <small>Mar</small> <small>Mai</small> <small>Jul</small> <small>Set</small> <small>Nov</small> <small>Dez</small> <small>Jan</small> <small>Mar</small> <small>Mai</small> <small>Jul</small> <small>Set</small> <small>Nov</small> <small>Dez</small> <small>Jan</small> <small>Mar</small> <small>Mai</small> <small>Jul</small> <small>Set</small> <small>Nov</small> <small>Dez</small>						
PG013 - RAC - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)		4/2016	6/2022			
• Metas do Programa						
Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer		3/2017		◆ 8/2017		
Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer		3/2022				
• Definição do Programa		9/2016	3/2017			
• Execução do Programa		4/2016	3/2022			
• Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer		4/2016	3/2017			
• Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CF)		4/2016	3/2017			
• Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn)		3/2017	3/2022			
• Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)		3/2017	3/2022			
• Encerramento do Programa		3/2022	6/2022			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		3/2022	6/2022			


EMBRANCO




4.1.14 PG014 - Saúde física e mental da população impactada

		ORÇAMENTO (R\$MM)											
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019								
162,6	10,7	23,8	41,0	40,1	26,7								
OBJETIVO													
Desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS e desenvolver estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO. CLÁUSULAS: 106 a 112.													
STATUS ATUAL													
<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social de Mariana e de Saúde de Barra Longa: 309 ações levantadas, com 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolução). Taxa de incidência e prevalência de doenças: mapa do perfil epidemiológico retrospectivo. 													
CRONOGRAMA E METAS													
A premissa é que os estudos sejam executados até nov/25 com informações geradas para subsidiar ações de apoio à saúde durante o período previsto.													
Nome da Tarefa													
		2015		2017		2019		2019					
		Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out	Jan	Apr	Jul	Out
: PG014 R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10) 11/2015 11/2025													
• Metas do Programa													
Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à Saúde Física e Mental												02/25	
Cláusula 111 - Encerramento do Estudo epidemiológico e toxicológico													
Definição do Programa													
• Execução do Programa		9/2016	10/2016										
• Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS													
Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)		11/2015	3/2019										
• Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas													
Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)		6/2016	11/2025										
• Encerramento do Programa													
Encerramento do Programa (captura e formatação de benefícios)		8/2025	11/2025										

EMBRANCO






4.1.15 PG015 - Tecnologias Socioeconômicas

ORÇAMENTO (R\$MM)																		
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019													
7,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1													
OBJETIVO																		
Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo desastre, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação. CLÁUSULAS: 113 a 115.																		
STATUS ATUAL																		
CRONOGRAMA E METAS																		
Nome do Tarefa	Início	Fim	2016				2017				2018				2019			
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out
PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 à 115)	12/2016	1/2018																
Metas do Programa																		
Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CB		10/2017																
Definição do Programa	12/2016	10/2017																
Execução do Programa (a definir)																		
Ações compensatórias para este programa deverão ser definidas após a Definição do Programa																		
Encerramento do Programa	10/2017	1/2018																
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2017	1/2018																

EM BRANCO

EM BRANCO






4.1.17 PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
125,5	3,5	18,2	52,1	27,8	14,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Disponibilização de área aos produtores que tiveram suas atividades agropecuárias permanentemente inviabilizadas em decorrência do EVENTO, equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR; Recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das condições para produzir conforme SITUAÇÃO ANTERIOR, incluindo solo, animais, equipamentos e instalações; Recuperação de pastagens nas áreas impactadas, quando tecnicamente viável; Formação de pastagens equivalentes em outras áreas da propriedade em substituição às pastagens tecnicamente não recuperáveis; Substituição de pastagens por outras fontes de alimentação animal com maior produtividade que possam ser cultivadas na propriedade impactada; Reestabelecimento das estruturas de captação de água para irrigação e dessedentação animal impactados à SITUAÇÃO ANTERIOR ou, não sendo possível, desenvolver alternativas ao reestabelecimento das estruturas de captação de água; e Fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até recuperação da pastagem. CLÁUSULAS: 124 a 128.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<ul style="list-style-type: none"> Finalizados os plantios em caráter de substituição de forragem animal em 94 propriedades. Construção de 188 km de cerca. Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t até Julho (referente aos silos construídos, foram 1.500t de silagem estocadas nas propriedades em Barra Longa e Mariana). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Título</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG017.R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 a 128)</td> <td>11/2015</td> <td>11/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart showing project progress across years 2015-2019]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo</td> <td></td> <td>10/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem</td> <td></td> <td>8/2020</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades</td> <td></td> <td>8/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas</td> </tr> <tr> <td>Execução do cercamento das demais propriedades afetadas</td> <td>4/2016</td> <td>5/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>2/2017</td> <td>5/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td>12/2015</td> <td>4/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo</td> <td>1/2016</td> <td>10/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>10/2017</td> <td>1/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 sub:1)</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td>6/2016</td> <td>2/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais</td> <td>2/2017</td> <td>11/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>11/2019</td> <td>2/2020</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0147 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)</td> </tr> <tr> <td>Avaliação de Alternativas</td> <td>6/2016</td> <td>1/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (1)</td> <td>1/2017</td> <td>1/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td>1/2018</td> <td>6/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda</td> <td>6/2018</td> <td>2/2020</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>2/2020</td> <td>5/2020</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)</td> </tr> <tr> <td>Avaliação de Alternativas</td> <td>6/2016</td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Escopo</td> <td>3/2017</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td>7/2017</td> <td>11/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas</td> <td>11/2017</td> <td>8/2020</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>8/2020</td> <td>11/2020</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processos de Monitoramento e Manutenção</td> </tr> <tr> <td>Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)</td> <td>11/2015</td> <td>8/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)</td> <td>8/2016</td> <td>8/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premeisa adocada para verificação da efetividade do programa)</td> <td>8/2020</td> <td>7/2021</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>8/2022</td> <td>11/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>8/2022</td> <td>11/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bar]</td> </tr> </tbody> </table>							Nome do Título	Início	Término	2015				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	PG017.R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 a 128)	11/2015	11/2022	[Gantt chart showing project progress across years 2015-2019]																Metas do Programa																			Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo		10/2017	[Gantt chart bar]																Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem		8/2020	[Gantt chart bar]																Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades		8/2022	[Gantt chart bar]																Definição do Programa																			Execução do Programa	9/2016	10/2016	[Gantt chart bar]																PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas																			Execução do cercamento das demais propriedades afetadas	4/2016	5/2017	[Gantt chart bar]																Encerramento do Projeto	2/2017	5/2017	[Gantt chart bar]																PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)																			Planejamento da Execução	12/2015	4/2016	[Gantt chart bar]																Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	1/2016	10/2017	[Gantt chart bar]																Encerramento do Projeto	10/2017	1/2018	[Gantt chart bar]																PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 sub:1)																			Planejamento da Execução	6/2016	2/2017	[Gantt chart bar]																Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais	2/2017	11/2019	[Gantt chart bar]																Encerramento do Projeto	11/2019	2/2020	[Gantt chart bar]																PF0147 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)																			Avaliação de Alternativas	6/2016	1/2017	[Gantt chart bar]																Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (1)	1/2017	1/2018	[Gantt chart bar]																Planejamento da Execução	1/2018	6/2018	[Gantt chart bar]																Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda	6/2018	2/2020	[Gantt chart bar]																Encerramento do Projeto	2/2020	5/2020	[Gantt chart bar]																PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)																			Avaliação de Alternativas	6/2016	3/2017	[Gantt chart bar]																Definição do Escopo	3/2017	7/2017	[Gantt chart bar]																Planejamento da Execução	7/2017	11/2017	[Gantt chart bar]																Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas	11/2017	8/2020	[Gantt chart bar]																Encerramento do Projeto	8/2020	11/2020	[Gantt chart bar]																Processos de Monitoramento e Manutenção																			Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)	11/2015	8/2022	[Gantt chart bar]																Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)	8/2016	8/2022	[Gantt chart bar]																Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premeisa adocada para verificação da efetividade do programa)	8/2020	7/2021	[Gantt chart bar]																Encerramento do Programa	8/2022	11/2022	[Gantt chart bar]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2022	11/2022	[Gantt chart bar]															
Nome do Título	Início	Término	2015							2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PG017.R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 a 128)	11/2015	11/2022	[Gantt chart showing project progress across years 2015-2019]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo		10/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem		8/2020	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades		8/2022	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Execução do Programa	9/2016	10/2016	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PF0061 - Cercamento das demais propriedades afetadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Execução do cercamento das demais propriedades afetadas	4/2016	5/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Projeto	2/2017	5/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PF0089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Planejamento da Execução	12/2015	4/2016	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo	1/2016	10/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Projeto	10/2017	1/2018	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PF0141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 sub:1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Planejamento da Execução	6/2016	2/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais	2/2017	11/2019	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Projeto	11/2019	2/2020	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PF0147 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Avaliação de Alternativas	6/2016	1/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (1)	1/2017	1/2018	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Planejamento da Execução	1/2018	6/2018	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda	6/2018	2/2020	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Projeto	2/2020	5/2020	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Avaliação de Alternativas	6/2016	3/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Definição do Escopo	3/2017	7/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Planejamento da Execução	7/2017	11/2017	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas	11/2017	8/2020	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Projeto	8/2020	11/2020	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Processos de Monitoramento e Manutenção																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)	11/2015	8/2022	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)	8/2016	8/2022	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premeisa adocada para verificação da efetividade do programa)	8/2020	7/2021	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Programa	8/2022	11/2022	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2022	11/2022	[Gantt chart bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

EM BRANCO




4.1.18 PG018 - Diversificação da Economia Regional

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																								
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																			
42,7	0,0	0,9	11,8	4,6	3,7																																																																																																																																																																																																			
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																								
Implementar estratégias para o desenvolvimento de outras atividades econômicas na região que promovam a diminuição de sua dependência com relação à indústria minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias na região, baseada em alternativas tecnológicas de base sustentável e capaz de promover uma maior integração produtiva da população. CLÁUSULAS: 129 a 131.																																																																																																																																																																																																								
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																								
Alinhamentos conceituais junto ao CIF e Prefeitura de Mariana.																																																																																																																																																																																																								
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 a 131)</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e Incentivo às atividades econôm</td> <td></td> <td>8/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Execução do Programa</td> <td>10/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)</td> <td>10/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Encerramento do Programa</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>↳ Encerramento do Programa (captação e formalização de benefícios)</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2015				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 a 131)																				↳ Metas do Programa																				↳ Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e Incentivo às atividades econôm		8/2017																		↳ Definição do Programa	9/2016	10/2017																		↳ Execução do Programa	10/2017	12/2030																		↳ Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)	10/2017	12/2030																		↳ Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																		↳ Encerramento do Programa (captação e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																	
Nome da Tarefa	Início	Término	2015						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																							
			Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																																																						
PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 a 131)																																																																																																																																																																																																								
↳ Metas do Programa																																																																																																																																																																																																								
↳ Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e Incentivo às atividades econôm		8/2017																																																																																																																																																																																																						
↳ Definição do Programa	9/2016	10/2017																																																																																																																																																																																																						
↳ Execução do Programa	10/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																						
↳ Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)	10/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																						
↳ Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																						
↳ Encerramento do Programa (captação e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																						

EM BRANCO







4.1.19 PG019 - Micro e Pequenos Negócios

TOTAL	REALIZADO	ORÇAMENTO (R\$MM)			
		2016	2017	2018	2019
26,5	0,7	4,4	4,1	4,0	4,0
OBJETIVO					
Recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo impactados e localizados de Fundação até Candonga e Regência e Povoação, diretamente impactados pelo EVENTO. CLÁUSULAS: 132 a 133.					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none"> Barra Longa: 92 Processos mapeados (33 Autônomos, 59 Comércios, 66 Processos concluídos). Mariana: 176 Processos mapeados (120 Autônomos, 15 Comércios, 41 Produtores Rurais, 168 Processos Concluídos). 					
CRONOGRAMA E METAS					
Fase de execução com prazo previsto de 36 meses.					
<small>Nome da Tarefa</small> <small>Início</small> <small>Término</small> <small>2015</small> <small>2017</small> <small>2018</small> <small>2019</small> <small>Jan</small> <small>Feb</small> <small>Mar</small> <small>Abr</small> <small>Mai</small> <small>Jun</small> <small>Jul</small> <small>Ago</small> <small>Sep</small> <small>Out</small> <small>Nov</small> <small>Dez</small> <small>Jan</small> <small>Feb</small> <small>Mar</small> <small>Abr</small> <small>Mai</small> <small>Jun</small> <small>Jul</small> <small>Ago</small> <small>Sep</small> <small>Out</small> <small>Nov</small> <small>Dez</small>					
PG019 B - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133) <small>17/2015</small> <small>6/2020</small>					
<ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa 					
<ul style="list-style-type: none"> Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundação até Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDAÇÃO) 		8/2018			
<ul style="list-style-type: none"> Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais 		3/2020			
<ul style="list-style-type: none"> Definição do Programa 		<small>10/2016</small> <small>3/2017</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Execução do Programa 		<small>12/2015</small> <small>3/2020</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Processo de recuperação de micro e pequenos negócios 		<small>12/2015</small> <small>3/2020</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundação até Candonga e Regência e Povoação 		<small>12/2015</small> <small>3/2017</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundação até Candonga e Regência e Povoação 		<small>3/2017</small> <small>7/2018</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após formalização do 		<small>3/2017</small> <small>3/2020</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa 		<small>3/2020</small> <small>6/2020</small>			
<ul style="list-style-type: none"> Encerramento do Programa (captura e formatação de benefícios) 		<small>3/2020</small> <small>6/2020</small>			

EM BRANCO





4.1.20 PG020 - Estímulo à Contratação Local

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																
2,3	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																					
Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência. CLÁUSULAS: 134 a 136.																																																																																																																																																																																																																																					
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																					
Medição da Mão de Obra local contratada nas regiões atingidas:																																																																																																																																																																																																																																					
<ul style="list-style-type: none"> • 1320 trabalhadores locais das cidades impactadas (64 %). • 850 trabalhadores fora das regiões impactadas (36%). 																																																																																																																																																																																																																																					
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mai</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)</td> <td>11/2015</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 136 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações executadas pela Samarco)</td> <td>10/2016</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)</td> <td>11/2015</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)</td> <td>10/2016</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Encerramento do Programa</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mai	Out	Jan	Feb	Mai	Out	Jan	Feb	Mai	Out	Jan	Feb	Mai	Out	PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)	11/2015	12/2030																			• Metas do Programa																					Cláusula 136 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações executadas pela Samarco)	10/2016																				Definição do Programa	9/2016	10/2016																			• Execução do Programa	11/2015	12/2030																			Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	11/2015	10/2016																			Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)	10/2016	12/2030																			• Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																		
Nome do Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																				
			Jan	Feb	Mai	Out	Jan	Feb	Mai	Out	Jan	Feb	Mai	Out	Jan	Feb	Mai	Out																																																																																																																																																																																																																			
PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)	11/2015	12/2030																																																																																																																																																																																																																																			
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																					
Cláusula 136 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações executadas pela Samarco)	10/2016																																																																																																																																																																																																																																				
Definição do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																			
• Execução do Programa	11/2015	12/2030																																																																																																																																																																																																																																			
Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	11/2015	10/2016																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)	10/2016	12/2030																																																																																																																																																																																																																																			
• Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																			

EM BRANCO




4.1.21 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
464,1	124,4	202,9	113,6	81,9	40,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Prestar auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas. CLÁUSULAS: 137 a 140.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<ul style="list-style-type: none"> Elegíveis: 7.969. Cartões confeccionados: 8.021. Cartões entregues: 7.531. Abrangência territorial: 38 municípios da Bacia do Rio Doce, área costeira, Mariana e Barra Longa. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Este programa foi iniciado logo após o EVENTO e ficará ativo até que as condições pré-existentes sejam restabelecidas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19">PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140); 11/2015 a 9/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">* Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal</td> </tr> <tr> <td colspan="19">6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">* Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">9/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="19">10/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="19">* Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">11/2015</td> </tr> <tr> <td colspan="19">6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">* Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">9/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">* Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">9/2020</td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	Início	Término	2015				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140); 11/2015 a 9/2020																			* Metas do Programa																			Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal																			6/2020																			* Definição do Programa																			9/2016																			10/2016																			* Execução do Programa																			11/2015																			6/2020																			* Encerramento do Programa																			6/2020																			9/2020																			* Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																			6/2020																			9/2020																		
Nome do Tarefa	Início	Término	2015						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140); 11/2015 a 9/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
9/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

EMBRANCO

30




4.1.22 PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários

ORÇAMENTO (R\$MM)															
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019										
29,4	0,0	0,00	29,4	0,00	0,00										
OBJETIVO															
Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento. CLÁUSULAS: 141 a 143.															
STATUS ATUAL															
Análise do Termo e desenho do macroprocesso e fluxo do Programa.															
CRONOGRAMA E METAS															
Nome da Tarefa		Início	Término	2016		2017		2018		2019					
				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out
PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)		4/2016	12/2017												
• Metas do Programa		12/2017	12/2017												
Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES			12/2017												
• Definição do Programa		6/2016	12/2016												
Definição e Formalização do Programa junto ao CF		6/2016	12/2016												
• Execução do Programa		1/2017	12/2017												
Ressarcimento dos COMPROMITENTES		1/2017	12/2017												
• Encerramento do Programa		10/2017	12/2017												
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		10/2017	12/2017												

EM BRANCO





4.2 Programas Socioambientais

4.2.1 PG023 - Manejo dos rejeitos

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OBJETIVO					
Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 e realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados decorrentes dos estudos previstos neste programa, bem como considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região. CLÁUSULAS: 150 a 153.					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none">• Resultado final do estudo biogeoquímico e geomorfológico entregue aos órgãos reguladores em atendimento à cláusula 150• Orientações para manejo de rejeito entregue aos órgãos reguladores em atendimento à cláusula 150.					
CRONOGRAMA E METAS					
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos - e tanto o cronograma como o custo dos dois programas está sendo apresentado neste documento no PG025.					

EM BRANCO



EM BRANCO
