

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO TRIMESTRAL – ABR_MAI_JUN

PG 03 – Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígena

SUMÁRIO

Sumário

2. EQUIPE TÉCNICA DO PG03	4
A. EQUIPE TÉCNICA – ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR TERRITÓRIO	5
B. CRONOGRAMA 2024.....	6
3. GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES	11
A. CLÁUSULAS	11
B. DELIBERAÇÕES.....	12
4. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE (ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024)	19
4.1. TERRA INDÍGENA COMBOIOS	19
4.2. TERRAS INDÍGENAS TUPINIQUIM E CAIEIRAS VELHAS II	24
4.2.1.....	<i>Ações emergenciais</i>
4.2.1.1.....	<i>Auxílio Subsistência Emergencial (ASE)</i>
4.2.2.....	<i>Ações transitórias</i>
4.2.3.....	<i>Relacionamento</i>
4.3.1.....	<i>Ações emergenciais</i>
4.3.1.1.....	<i>Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência</i>
4.3.4.....	<i>Relacionamento</i>
3. AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE	38

1. INTRODUÇÃO

A Fundação Renova é a organização constituída para conduzir ações para reparação, mitigação e/ou compensação dos impactos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, de acordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

A estrutura da instituição é composta por programas reparatórios e compensatórios, sendo o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG03) considerado reparatório, cujo objetivo é identificar impactos e promover ações mitigatórias e reparatórias para os povos indígenas, conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC e com as diretrizes da convenção OIT 169 da legislação indigenista, que estabelecem princípios fundamentais para a interação com os povos originários para implementação de projetos do seu interesse ou que podem impactar seu modo de vida e território.

O Programa atende no âmbito do processo reparatório, os indígenas das etnias Tupiniquim, Guarani e Krenak, das terras indígenas indicadas pelo TTAC: Krenak, em Resplendor – MG, e Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II em Aracruz – ES.

No âmbito do Programa, a participação livre e informada das comunidades indígenas que fazem parte do escopo, é fundamental na elaboração e execução dos seus projetos e ações. Além disso, é direito dos povos indígenas que suas especificidades sejam respeitadas e que todos sejam consultados, de modo a configurar um processo reparatório coeso com o contexto das comunidades.

Destaca-se que não cabe à Fundação Renova sobrepor as ações de responsabilidade do poder público, de vulnerabilidades já existentes nos territórios indígenas.

O Programa está estruturado em três fases, a saber: a) Emergencial: em que se desenvolvem ações de mitigação de vulnerabilidades e riscos associados aos impactos nos povos e comunidades tradicionais; b) Transitória: em que são analisados os impactos e acordados os programas/ações de reparação e seus respectivos planos de trabalho, momento em que deve ocorrer articulações com órgãos reguladores sobre a realização dos estudos de impacto, bem como detalhamento das ações reparatórias estruturantes, e o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais; e c) Estruturante: em que são executados e monitorados os

programas/ações de reparação, baseadas em estudos especializados e nos impactos identificados.

As ações de relacionamento e diálogo entre Fundação Renova e comunidades indígenas ocorrem em todas as fases do Programa. O processo de implementação das ações, em alguns momentos, pode prever a concomitância entre fases. Ainda, as ações de comunicação e diálogo, seguindo metodologia definida pelo Programa em Plano específico, são fundamentais para:

- Construção de relação de confiança entre comunidades e equipe técnica;
- Construção de ambiência para desenvolvimento do Programa e das ações reparatórias;
- Fortalecimento da autonomia das comunidades; e
- Desenvolvimento das ações a partir de apoio técnico às associações e comunidades.

Esse Relatório Trimestral apresenta uma síntese das ações executadas referentes às três fases supracitadas do Programa, referentes ao período de janeiro, fevereiro e março de 2024.

2. EQUIPE TÉCNICA DO PG03

O PG03 é composto por nove colaboradores, responsáveis pelo planejamento, execução, monitoramento e avaliação de projetos e atividades voltadas à proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos originários.

Tabela 1 - Equipe técnica PG 03 organizada por território

Nome	Formação	Território	Cargo
Wagner Elisio Tonon	Biólogo	Povos Tradicionais e Indígenas	Gerente Geral da Socioeconomia
Maria Albanita Roberta de Lima	Serviço Social, Pós-Graduação em Gerontologia e Especialização em Políticas Publicas	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Coordenadora do Programa de Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
Adebal de Andrade Júnior	Doutor em Antropologia Cultural e mestre em Ciências Sociais	Krenak	Especialista Técnico de Programa Socioeconômico
Ana Luiza Coêlho Araújo Ferreira	Cientista Social e Mestre em Antropologia	Comboios, Tupiniquim/ Guarani	Especialista Técnica de Programa Socioeconômico

Bruna Aarão	Cientista Social e Mestre em Ciência Política	Comboios e Tupiniquim/ Guarani/Krenak	Especialista Técnica de Programa Socioeconômico
Carolline Araújo Rocha	Engenheira Mecânica e Administradora	Krenak	Engenheira de Projetos e Obras
Fernanda Cristina Cerqueira de Jesus	Engenheira Ambiental	Comboios e Tupiniquim/ Guarani e Krenak	Analista Programa Socioeconômico
Milton Alves de Souza Netto	Tecnólogo em Petróleo e gás e Especialista em Etnologia indígena	Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Analista Territorial de Programa Socioeconômico

a. Equipe Técnica – Atividades desempenhadas por território

Com relação às ações executadas nos territórios, a equipe técnica/operacional se organiza da seguinte forma:

a. TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II

Tabela 2 - TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II: ações por eixo e respectivos responsáveis técnicos/operacionais.

Eixo	Atividade	Responsável
Emergencial	Fornecimento de água mineral em Comboios	Milton Netto
	Aprovação do Plano de Contingência de Cheias Comboios pela da Defesa Civil	Fernanda Cerqueira / Ana Luiza Ferreira / Milton Netto
	Auxílio Subsistência Emergencial	Bruna Aarão/ Milton Netto
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Fernanda Cerqueira
Transitório	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)	Ana Luiza Ferreira/ Milton Netto

	Sistema de Abastecimento de Água (projetos)	Ana Luiza Ferreira / Milton Netto/ Fernanda Cerqueira
Estruturante	Execução do PBAI	Bruna Aarão/ Milton Netto/ Ana Luiza Ferreira
	Acordo de reparação integrada-indenização	Bruna Aarão/Milton Netto
	Sistema de Abastecimento de Água (perfuração de poços)	Milton Netto / Fernanda Cerqueira

b. TI Krenak

Tabela 3 - TI Krenak: ações por eixo e respectivos responsáveis técnicos/operacionais.

Eixo	Atividade	Responsável
Emergencial	Auxílio de subsistência extra emergencial	Bruna Aarão/ Carolline Araujo Rocha
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	Carolline Araujo Rocha
	Manutenção das vias de acesso	Carolline Araujo Rocha
	Distribuição de insumos para animais	Carolline Araujo Rocha
	Obras de melhoria nos acessos	Carolline Araujo Rocha
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Carolline Araujo Rocha
Transitório	Elaboração de Estudo do Componente Indígena e Plano de Ação Permanente	Carolline Araújo / Adebald de Andrade Junior
	Sistema de Abastecimento de Água – SAA (Projeto)	Fernanda Cerqueira
Estruturante	Execução de Plano de Ação Permanente	Carolline Araújo / Adebald de Andrade Junior
	Sistema de Abastecimento de Água – SAA (Implantação)	Fernanda Cerqueira

b. Cronograma 2024

O cronograma a seguir (Tabela 4) apresenta o status do desenvolvimento das ações que estão em execução no PG03, público-alvo, período de início e respectivas justificativas para as categorias de status relacionadas no trimestre de referência deste relatório (abril/ maio/ junho de 2024).

Tabela 4 - Cronograma previsto/realizado para o período deste relatório trimestral – abril, maio e junho de 2024

Eixo	Ação prevista	Público-alvo	Programa de Interface	Início	Em andamento ou término previsto	Justificativa**
Emergencial	Fornecimento de água mineral	TI Comboios	-	2020	Em andamento	-
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	TI Krenak	Infraestrutura	2016	Em andamento	-
	Auxílio de Subsistência Extra Emergencial	TI Krenak	-	2015	Em andamento	-
	Auxílio Subsistência Emergencial	TIS Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	-	2016	Em andamento	-
	Distribuição de Insumos para alimentação animal	TI Krenak	-	2016	Em andamento	-
	Obras de manutenção de vias de acesso viário ao Território Krenak (Rotas de entrega de água) e mitigação de riscos período chuvoso	TI Krenak	Infraestrutura	2016	Em andamento	-
	Obras de melhoria nos acessos (8 pontos críticos)	TI Krenak	Infraestrutura	Janeiro 2019	Suspenso	Suspenso para reavaliação da demanda.
	Obras de melhoria nos acessos – Demais	TI Krenak	Infraestrutura	Janeiro 2019	Suspenso	Suspenso para reavaliação da demanda.
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	-
	Programa de Monitoramento da Quali-	TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	-

	Quantitativo Sistemático (PMQQS)					
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	-
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TIS Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	
Transitório	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena	Tis Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	-	2021	Em andamento	No período foram realizadas atividades de articulação e pactuação com a FUNAI e comunidade para retomada do PBAI das comunidades indígenas de Aracruz/ES. Além disso, foram realizadas reuniões ampliadas para apresentação do Plano de Trabalho do PBAI, na TI Comboios e com o grupo de representantes da Comissão de Caciques.
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC)	TIS Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II		2021	Concluído	As ações do FAIC foram concluídas ainda em 2023.
	Elaboração de projeto de SAA – Sistema de Abastecimento de Água	TIS Comboios e Tupiniquim (Córrego do Ouro, Comboios, Pau Brasil, Amarelos, Olhos D'água e Nova Esperança)	Engenharia PG32 – Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água		2019	Em andamento

						Em paralelo, o PG03 concluiu em 14/06/2024 o processo de aditivo do contrato nº 4900000688 com a empresa Hidropoços para perfurar mais três poços, nas aldeias de Pau Brasil, Olho d' Água, Comboios e realizar a manutenção do total de seis poços em Aracruz - ES. A execução dos poços aditivados se dará no próximo trimestre.
Estruturante	Recuperação de nascentes	TI Krenak	PG 26 – Uso Sustentável da Terra	2019	Em andamento	<p>Em 2019 foi implementado o programa de recuperação de nascentes e áreas degradadas, por meio do CBH Doce. Em 2021, o projeto foi paralisado devido ao contexto do Plano de Contingência da Saúde Indígena e do Novo Coronavírus. Em 2022, houve anuência da comunidade para retorno das atividades relacionadas ao projeto. assim aconteceram formação de manuseio de motosserra e treinamento para cerqueiros.</p> <p>A ação de a instalação de cercas nas áreas mapeadas, está em andamento desde o início em 2023.</p>

** Justificativa para as categorias de status relacionadas.

3. GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES

Conceitos:

Itens de ação: são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova. Exemplo: Caput Cláusula 39.

Itens de requisitos: são itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Caput Cláusula 40.

a. Cláusulas

Considerações:

Há um total de onze itens de ação de cláusulas distribuídos para o programa PG03. Não constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados nos itens de ação, conforme conceitos acima apresentados. As demais cláusulas relacionadas ao programa dependem da elaboração da definição/escopo do programa, que passa atualmente por revisão. A distribuição dos itens de ação por status é apresentada na Figura 1 a seguir.

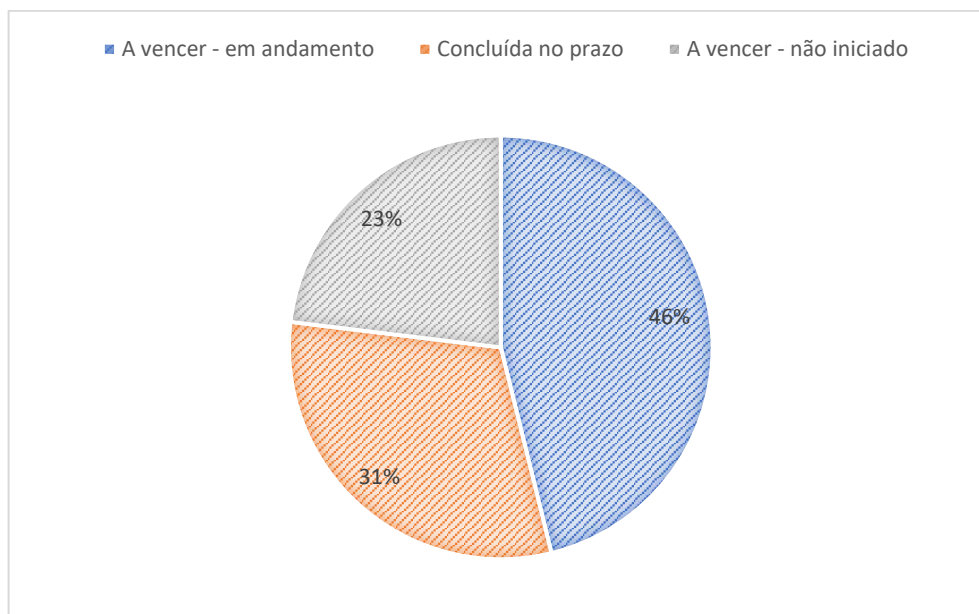


Figura 1 - Distribuição dos itens de ação por status

Cumprido destacar que o status de conclusão acima representado se refere às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF e encontram-se disponíveis no SharePoint através do seguinte link: <https://bit.ly/2EDMxfS>.

A seguir, é apresentado o detalhamento dessas cláusulas, em conformidade com cada status.

Tabela 5 - Detalhamento das cláusulas do PG03, conforme o status de conclusão

Status	Cláusula	Prazo TTAC	Observações
Itens a vencer em andamento	39	Não definido	Programa em execução.
Itens a vencer em andamento	43 (§1º)	Não definido	Ação concluída em 12/03/16. Relatório emitido pelo Jurídico da Renova para a 12ª vara Federal da seção judiciária de MG.
Itens a vencer em andamento	43 (Inc. I)	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações contidas neste.
Itens a vencer em andamento	43 (Inc. II)	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações.
Itens a vencer em andamento	44 (Inc. II)	Não definido	Desde a criação da Renova esta vem cumprindo os acordos emergenciais para estes povos, estes vêm sendo renovados, último assinado em dez/20 e válido até dez/21.
Itens a vencer em andamento	44 (Inc. IV).	Não definido	Trata-se da contratação do detalhamento do PBAI.
Itens a vencer em andamento	44 (Inc. V).	Não definido	Trata-se da execução do PBAI.
Itens concluídos no prazo	43 (Inc III)	Não definido	Estudo foi contratado para os indígenas de Aracruz e Krenak, porém no momento de assinar o Acordo para execução, os Krenak se opuseram, seguindo apenas com os Tupiniquim Guarani.
Itens concluídos no prazo	44 (Inc I - ação 1)	22/03/2016	Concluída em 22/03/16 com a emissão de um parecer técnico preliminar emitido pela Samarco.
Itens concluídos no prazo	44 (Inc I-ação 2).	Não definido	Concluído em 26/02/16 com a assinatura do acordo emergencial.
Itens concluídos no prazo	44 (Inc III e §3º).	Não definido	Concluído em 30/06/16 com a contratação da empresa de consultoria independente (Polifônicas)

b. Deliberações

Considerações:

Referente a Terra Indígena Krenak, há um total de 10 itens de ação nas deliberações. E, quanto as Terras Indígenas de Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II, há um total de 16 itens de ação nas deliberações. Não constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos apresentados anteriormente. A distribuição dos itens de ação por status é apresentada na Figura 2 e Tabela 6 a seguir.

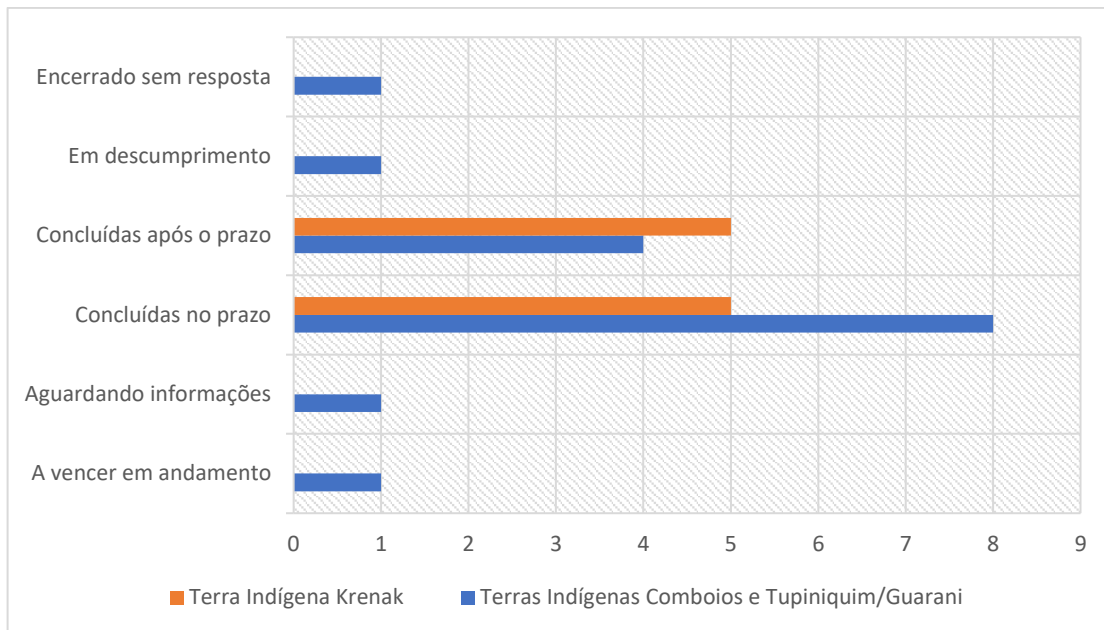


Figura 2 - Distribuição dos itens de ação por status

Tabela 6 - Distribuição dos itens de ação por status

Público-alvo	Status	Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 155 (item 2)	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF	20/08/2018	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 / OFI.NII.082018.386320/08/18.
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 2) / NT nº 005/2018/CT-IPCT/CIF e nº 011/2018/CT-IPCT/CIF	20/08/2018	Encaminhado o documento “Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas” Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 205 (item 3) / NT nº 11/2018/CTIPCT /NT nº 19/2018/CTIPCT	15/10/2018	Apresentado para TI Comboios na data determinada. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018. 4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas. OFI.NII.102018.4315
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 360 (item 1.1) / NT nº 19/2019 / Notif. nº 18/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN	Não definido	Enviado em 06/01/19 o documento OFI.NII.122019.8638 a manifestação ressaltando a necessidade de evidências do repasse da associação às famílias Krenak. Solicitando suspensão de multa (deliberação relacionada às deliberações 299 e 335)
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 169 (item 1) / NT nº 08/2018/CT-IPCT/CIF.	31/07/2018	Realizado o protocolo em 29/08/18 conforme documento OFI.NII.082018.3883 confirmando a inclusão das 4 famílias Krenak.
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT	29/10/2018	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 299 / NT nº 05/2019/CT-IPCT / Notif. nº 19/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN.	31/07/2019	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias.

Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 335 (item 2) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN	29/10/2019	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 335 (item 3) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN.	03/11/2019	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019
Krenak	Item concluído	DEL. 692, de 28 de junho de 2023. (item 1)	28/06/2023	Encaminhado em 28/06/2023 lista de inclusão de 47 famílias, conforme Lista Família Krenak, SEI 16242354, no pagamento do ASE e nas demais ações previstas no âmbito do Acordo Emergencial. Recebemos das lideranças um ofício, pedindo a não inclusão de 3 famílias. Portanto foram imediatamente incluídas 44 famílias.
Krenak	Itens concluídos	DEL. 692, de 28 de junho de 2023. (item 2)	28/06/2023	A Fundação Renova apoiou com a estrutura solicitada, operacionalizando as reuniões realizadas pela comunidade no território para definição de critérios de inclusão de famílias. Em 08/05/2024, a Funai encaminhou o ofício nº 112/2024/CR-MGES enviando os critérios de inclusão definidos pela comunidade.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 201 (item 1) / NT nº 14/2018/CTIPCT.	Não definido	Conforme ata do da 33ª reunião do CIF de dez/18, a questão de descumprimento foi retirada da pauta uma vez que foi consensuado que o foco deveria ser nas soluções definitivas de abastecimento. Projetos estruturantes em andamento.

Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 206 (item 1) / NT nº 20/2018/CT-IPCT/CIF.	19/10/18	Ação em desenvolvimento. Atividade estava paralisada devido o contexto da COVID 19
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 445 (item 1.1) / Nota Técnica Intercâmaras nº 001/2020/CT-IPCT/CT-Saúde/CT-GRSA/CT- SHQA/CIF; a Nota Técnica nº 35/2020/CT-IPCT.	31/10/22	Fornecimento realizado em setembro/22.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 477 (item 2) / Nota Técnica nº 37/2021/CT-IPCT/CIF.	Não definido	<p>Data planejada atualizada para 31/10/2022, conforme cronograma do PG03 confirmado pela equipe do PG/PMO.</p> <p>A entrega do PBAI corresponde à conclusão da Cláusula 44 Inc. II.</p> <p>Plano de Trabalho do PBAI de Três Palmeiras protocolado na FUNAI por meio do Ofício FR.2022.1803.</p> <p>PBAI de Três Palmeiras protocolado na FUNAI por meio do Ofício FR.2022.1824.</p> <p>Proposta de ações antecipatórias, como parte dos Programas reparatórios, protocolado na FUNAI em setembro de 2023, por meio do Ofício FR.2023.2426.</p> <p>Plano de Trabalho ajustado protocolado na FUNAI em outubro de 2023, através do Ofício FR.2023.2553.</p>
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 155 (item 2)	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF.	20/08/18	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 e OFI.NII.082018.386320/08/18.

Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 2) / NT nº. 005/2018/CT-IPCT/CIF e nº 011/2018/CT-IPCT/CIF	20/08/18	Encaminhado o documento “Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas” Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 205 (item 3) / NT nº. 11/2018/CTIPCTNT 19/2018/CTIPCT	15/10/18	Encaminhado em 15/10/18 o documento OFI.NII.102018.4315 Com o Plano de Cheias para a TI Comboios. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018. 4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas. Considerando o posicionamento do município de Aracruz, quanto a falta de orçamento para execução, e as limitações na responsabilidade da FR. Está em elaboração dossiê do processo para apresentação dos papéis e responsabilidades, para futura reunião com os atores envolvidos.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 227 (item 1) / NT nº 021/2018	Não definido	Em relação aos acordos emergenciais, no dia 26/12 foram assinados os acordos conforme proposta da Fundação Renova.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 231 (item 1) / NT nº. 23/2018/CTIPCT/CIF	29/12/18	Encaminhadas em 20/12/18
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 231 (item 3) / NT nº 23/2018/CTIPCT/ CIF.	Não definido	Equipe técnica está preparando relatório sobre o tema. Previsão de entrega em setembro/20.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 231 (item 2) / NT nº 23/2018/CTIPCT/ CIF.	Não definido	02/10/2020
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos após prazo	DEL. 201 (item 2) / NT nº 14/2018/CTIPCT.	16/10/18	Enviado o OFI.NII.032019.5775 em 28/03/19, citando que as ações estruturantes em relação ao abastecimento de água já foram iniciadas no workshop de intercâmaras realizado em 15/03/10, e que os encaminhamentos desta estão em andamento.

Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos após prazo	DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT.	29/10/18	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos após prazo	DEL. 227 (item 2) / NT nº 21/2018.	19/11/18	Deliberação está sendo cumprida. Fundação Renova respeita a isonomia dos povos indígenas atendidos pelo PG03.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens em descumprimento	DEL. 452 (item 5) - Nota Técnica nº 35/2020/CT-IPCT	-	Fornecimento de água continuado.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens encerrados sem resposta	DEL. 445* (item 2.1) - Nota Técnica nº 35 da CT-IPCT	-	Fornecimento de água continuado.

* **NOTA:** As deliberações CIF nº 445 itens 2.1 a 2.5 e 452 item 5 foram contestados os cumprimentos junto ao Sistema CIF

4. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE (ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2024)

Neste item serão apresentadas as ações executadas no 2º trimestre de 2024, referente aos meses de abril, maio de junho. Tratando-se de todas as ações realizadas nas terras indígenas Tupiniquim, Caieiras Velhas II, Comboios e Krenak.

4.1. Terra Indígena Comboios

4.1.1. Eixo Emergencial

Tabela 7 - Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TI COMBOIOS	
Ações	4.1.1.1 Fornecimento de água mineral
	4.1.1.2 Auxílio Subsistência Emergencial

4.1.1.1. Fornecimento de água mineral

Durante o período abrangido por este relatório, o fornecimento foi realizado semanalmente na TI Comboios em dois pontos: um na aldeia de Comboios e outro na aldeia Córrego do Ouro.

Tabela 8 - Entrega de água nas comunidades de Comboios e Córrego do Ouro entre os meses de abril, maio e junho de 2024.

Pontos de entrega acordados	Galões de 20 litros		
	Abril	Maio	Junho
Aldeia Comboios	1777	1375	1780
Aldeia Córrego do Ouro	490	442	333
Total	2267	1817	2113

A entrega de água mineral é realizada de acordo com a demanda de consumo apresentada, ou seja, a comunidade devolve os vasilhames vazios que são trocados por cheios.

4.1.1.2. Plano de Contingência de Cheias Comboios

Em atendimento a Deliberação 205, a Fundação Renova elaborou o Plano de Contingência de Cheias à TI Comboios.

No período deste relatório, maio de 2024, a FR protocolou na Prefeitura de Aracruz / Defesa Civil e na CT-IPCT, o documento finalizado com todas as evidências sobre sua

construção, além de realizar apresentação aos representantes da CT-IPCT quanto ao processo de elaboração e matriz de responsabilidades dos atores envolvidos.

4.1.1.3. Auxílio Subsistência Emergencial (ASE)

A Fundação repassa mensalmente à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios o valor de dois salários-mínimos e meio (vigente no ano) uma cesta básica¹ para cada família com valor de referência do DIEESE para o mês vigente acresce 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo para cada dependente e adiciona-se o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal a título de cobertura de gastos administrativos da associação. Os valores são repassados no dia 15 de cada mês para a associação indígena que é responsável por repassar os valores às famílias (conforme quadro abaixo).

Tabela 9 - Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Comboios

ASSOCIAÇÃO	MÊS/ANO	TITULARES	DEPENDENTES	VALOR
AITC	Abril	292	562	R\$1.477.998,56
	Maio	292	564	R\$1.504.740,55
	Junho	292	564	R\$1.471.486,09

As associações/lideranças indígenas possuem autonomia para a sua organização administrativa e realizam processos de elegibilidade conforme sua governança. Cabe a Fundação verificar se as movimentações solicitadas mensalmente pelas lideranças estão dentro das regras vigentes no acordo.

A Fundação Renova encaminha todos os meses planilha com descritivo das famílias, considerando as movimentações mensais solicitadas pelas associações, para conferência dos beneficiários.

Cabe a associação realizar a prestação de contas junto a Fundação Renova por meio da entrega de recibos/comprovantes de transferência bancárias. A ausência da entrega dos recibos pode acarretar suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

4.1.2. Ações transitórias

Tabela 10 - Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre

¹ Estimativa apresentada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de acordo com o parâmetro da capital Vitória (ES).

AÇÕES TRANSITÓRIAS TI COMBOIOS	
Ações	4.1.2.1 Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI
	4.1.2.2 Sistema de Abastecimento de Água

4.1.2.1. Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)

No trimestre de referência deste relatório, destacam-se as seguintes atividades, conforme tabela a seguir:

Tabela 11 – Atividades do Trimestre

PERÍODO	ATIVIDADE
21/05	Reunião de alinhamento com a FUNAI em BSB para continuidade das ações de detalhamento do PBAI.
05/06	Reunião de apresentação do Plano de Trabalho na TI Comboios.
06/06	Reunião de apresentação do Plano de Trabalho para os representantes da Comissão de Caciques.

O Plano de Trabalho para detalhamento do PBAI foi aprovado pelos caciques e representantes indígenas na TI Comboios (Memória de Reunião – Anexo). As oficinas de detalhamento dos Programas iniciarão no mês de julho de 2024.



Foto 1 – Reunião de Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho para Detalhamento do PBAI na TI Comboios em 05.06.24.

4.1.2.2. Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) inclui as fases de estudos geológicos, topografia, atividade de perfuração, testes de vazão e de qualidade da água, atualização de imóveis para conclusão dos projetos conceitual, básico e detalhado.

Nos meses de abril e maio a Fundação Renova atualizou o número de imóveis e a geolocalização dos imóveis das comunidades de Córrego do Ouro e Comboios respectivamente, de modo que todos os moradores sejam contemplados pela rede de abastecimento quando implantado.

Durante a fase de elaboração do projeto detalhado de Córrego do Ouro, de modo, a promover a participação ativa da comunidade de Córrego do Ouro no processo de construção do SAA. Destaca-se, a apresentação do fluxograma das etapas iniciais, as em andamento e as próximas etapas para implantação do sistema de abastecimento na data de 21/05 (Fotos 1 e 2). Na oportunidade os indígenas presentes puderam esclarecer as dúvidas, dar sugestões, indicar pontos de melhorias e perceber se a proposta discutida atende suas expectativas. Por fim, o Cacique Gilmar, manifestou que ficou satisfeito com o que foi os apresentado e pede para os membros de sua comunidade se manifestem levantando a mão caso se estejam de acordo, todo o público presente conforme lista de presença e Ata de reunião levantaram mão em sinal aprovação.



Foto 2 – Aprovação do Projeto Básico do SAA na Comunidade de Córrego do Ouro, TI Comboios, em 21.05.24.

Diante, da aprovação da comunidade a Fundação Renova concluiu o projeto detalhado do SAA em 28/06, o enviou para análise e validação do SESAI-DSEI por meio do ofício FR.2024.1740.

Por outro lado, o fluxo de aditivo de escopo, valor e prazo para o contrato nº 490000688 foi finalizado, e a perfuração de poço profundo para comunidade de Comboios está prevista para ocorrer no mês de agosto de 2024. Na sequência, com o resultado dos testes de vazão e de qualidade da água, a Fundação dará início a construção do projeto básico do SAA e, tão logo aprovados pelo DSEI-SESAI e Comunidade, inicia-se o projeto detalhado.

A elaboração dos referidos projetos tem por objetivo definir o sistema de abastecimento de água para consumo humano e demonstrar às partes interessadas o detalhamento necessário para instalação.

Dentre as ações estratégicas desenvolvidas para trazer agilidade e transparência as etapas que compõem o processo de implantação do SAA, assim como, atender a expectativa e consultar as comunidades para a realização de quaisquer atividades de campo no território, primeiramente a Fundação contextualiza a importância do acontecimento da ação e solicita a autorização dos caciques e lideranças para seguir com o escopo planejado através dos ofícios anexos, que os convida a participar de forma integral das atividades de campo.

Ressalta-se, que no período deste relatório realizou-se reuniões internas com a engenharia, infraestrutura, licenciamento, jurídico, compliance e suprimentos para buscar alternativas que atrelem prazos menores à execução dos fluxos, autorizações ambientais e sociais prevendo a definitividade do SAA.

Deste modo, visando estabelecer uma comunicação assertiva com a Secretária Especial de Saúde “SESAI”, a Fundação Renova solicitou uma agenda presencial em Brasília com o órgão para tratar das ações concluídas, em andamento e próximos passos para implantação do SAA Aracruz, conforme cronograma executivo enviado à CT-IPCT, em 14/05/24 por meio do Ofício FR.2024.1266. Dentre os temas trabalhados, temos: Diretrizes governamentais para elaboração dos projetos; autorizações junto aos órgãos e comunidade para implantação; instrumento jurídico.

4.1.3. Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho do escopo de atuação do PG03. A comunicação entre Fundação e comunidades indígenas é uma ação transversal que perpassa todas as fases do programa.

Nos meses de referência do relatório a Fundação realizou diálogos referente as fases do programa:

- Fase emergencial; 1. operacionalização do ASE (inclusão de dependentes/alterações solicitadas pelas lideranças indígenas e acompanhamento de recibos e planilhas); reunião com a associação indígena para regularização documental pendente: recibos divergentes/ausentes; declaração assinada pelos pais das crianças recém-nascidas; e
- Fase transitória: 1. PBAI (retorno das atividades); 2. SAA (contratação de empresa para perfuração do poço em Comboios e elaboração dos projetos do SAA).

4.2. Terras Indígenas Tupiniquim e Caieiras Velhas II

4.2.1. Ações emergenciais

Tabela 12 - Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TUPINIQUIM/GUARANI	
Emergencial	4.2.1.1 Auxílio Subsistência Emergencial

4.2.1.1. Auxílio Subsistência Emergencial (ASE)

Com a decisão judicial, o TAC 2021, assinado em dezembro de 2020, prevendo o atendimento de até 1.350 famílias para a terra indígena Tupiniquim e Guarani voltou a ser válido. Mensalmente, a Fundação Renova repassa às associações Indígenas signatárias do acordo um salário-mínimo (vigente no ano) e o valor de uma cesta básica² para cada família., acrescidos de 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo para cada dependente. Adiciona-se o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal a título de cobertura de gastos administrativos da associação. Os valores são repassados no dia 15 de cada mês para a associação indígena que é responsável por repassar os valores às famílias (Tabela 13).

Tabela 13 - Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Tupiniquim Guarani

ASSOCIAÇÃO	MÊS	TITULARES	DEPENDENTES	VALOR
ATCV	Abril	172	380	R\$500.239,16
	Maio	172	380	R\$ 498.948,49

² Estimativa apresentada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de acordo com o parâmetro da capital Vitória (ES).

	Junho	172	380	R\$ 498.422,95
AITG	Abril	510	1.010	R\$ 1.449.395,85
	Maio	509	1.013	R\$ 1.446.432,31
	Junho	509	1.018	R\$ 1.447.249,22
AITAA	Abril	52	120	R\$ 152.499,56
	Maio	52	120	R\$ 152.361,97
	Junho	52	120	R\$ 152.203,09
AIG	Abril	52	114	R\$ 150.720,44
	Maio	52	115	R\$ 152.342,65
	Junho	52	115	R\$ 150.720,49
AITUGUAA	Abril	97	179	R\$ 272.358,64
	Maio	97	181	R\$ 273.288,06
	Junho	97	181	R\$ 271.212,55
AITUPIAPABRA	Abril	279	457	R\$ 762.815,19
	Maio	279	457	R\$ 762.076,96
	Junho	279	457	R\$ 761.224,47
AITUPAIRA	Abril	187	392	R\$ 539.040,79
	Maio	187	392	R\$ 536.193,15
	Junho	187	392	R\$ 535.621,77

As associações/lideranças indígenas possuem autonomia para a sua organização administrativa e realizam processos de elegibilidade conforme sua governança. Cabe a Fundação verificar se as movimentações solicitadas mensalmente pelas lideranças estão dentro das regras vigentes no acordo.

A Fundação Renova encaminha todos os meses planilha com descritivo das famílias, considerando as movimentações mensais solicitadas pelas associações, para conferência dos beneficiários.

Cabe a associação realizar a prestação de contas junto a Fundação Renova por meio da entrega de recibos/declarações. A ausência da entrega dos recibos pode acarretar suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

4.2.2. Ações transitórias

Tabela 14 - Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre

AÇÕES TRANSITÓRIAS	
Ações	4.2.2.1-Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI
	4.2.2.2-Elaboração dos Projetos de SAA Tupiniquim Guarani

4.2.2.1. Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI

No trimestre de referência deste relatório, destacam-se as seguintes atividades no território Tupiniquim e Guarani, conforme tabela a seguir:

Tabela 15 – Atividades do Trimestre no âmbito do PBAI

PERÍODO	ATIVIDADE
21/05	Reunião de alinhamento com a FUNAI em BSB para continuidade das ações de detalhamento do PBAI.
05/06	Reunião de apresentação do Plano de Trabalho na TI Comboios.
06/06	Reunião de apresentação do Plano de Trabalho para os representantes da Comissão de Caciques.

O Plano de Trabalho para detalhamento do PBAI foi aprovado (Memória de Reunião – Anexo) pelos caciques e representantes indígenas da TI Tupiniquim e Caieiras Velhas II, considerando a organização social, política e representativa denominada de Comissão de Caciques, formada pelas comunidades Areal, Amarelos, Olhos D’água, Nova Esperança, Boa Esperança e Piraquê-Açú. As oficinas de detalhamento dos Programas iniciarão no mês de julho de 2024.



Foto 3 – Reunião de Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho para Detalhamento do PBAI com a Comissão de Caciques na comunidade de Areal, em 06.06.24.

No que refere ao detalhamento do PBAI das comunidades de Pau Brasil, Irajá e Caieiras Velhas, a FR, em respeito a decisão destas comunidades por reiniciar o processo, está

contratando nova empresa, por meio de processo concorrencial, para dar continuidade as atividades, garantindo o atendimento aos direitos dos povos indígenas na reparação dos impactos.

4.2.2.2. Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

A elaboração dos projetos do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) tem como objetivo apresentar às comunidades de Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos D'água, e à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) o detalhamento para instalação do sistema de abastecimento de água tratada, considerando estudos geológicos, atividade de perfuração, testes de vazão e de qualidade da água. Como parte das pactuações estabelecidas ao longo do processo de reparação junto às comunidades indígenas, a Fundação Renova se comprometeu, em reunião realizada em 2019, a elaborar os projetos para implantação do SAA nas referidas comunidades.

Nesse trimestre dois poços foram perfurados nas comunidades nas comunidades de Amarelos e de Nova Esperança respectivamente.



Foto 4 – Teste de Vazão na comunidade de Amarelos, em 21.05.24

Os testes de vazão e de qualidade foram realizados no mesmo período e enviados à engenharia para subsidiar a construção do projeto básico, previsto para conclusão no mês outubro de 2024.



Foto 5 – Teste de Vazão na Comunidade de Nova Esperança, em 14.06.24.

Em 19/06 a Fundação Renova atualizou o número de imóveis e a geolocalização dos imóveis da comunidade de Amarelos, de modo que todos os moradores sejam contemplados pela rede de abastecimento quando implantado.

Devido à proximidade para iniciar as obras de perfuração nas comunidades de Pau Brasil e Olho d'água realizou-se uma visita integrada respectivamente nas datas 11 e 20 de junho para validar o local de perfuração e programar a limpeza e implantação da praça de trabalho ocorridas em 18 e 26/06.

Por outro lado, o fluxo de aditivo de escopo, valor e prazo para o contrato nº 490000688 foi finalizado, e a perfuração de poço profundo para as comunidades de Olho d'água e Pau Brasil está prevista para ocorrer no mês de agosto e setembro de 2024. Na sequência, com o resultado dos testes de vazão e de qualidade da água, a Fundação dará início a construção do projeto básico do SAA e, tão logo aprovados pelo DSEI-SESAI e Comunidade, inicia-se o projeto detalhado.

Dentre as ações estratégicas desenvolvidas para trazer agilidade e transparência as etapas que compõem o processo de implantação do SAA, assim como, atender a expectativa e consultar as comunidades para a realização de quaisquer atividades de campo no território, primeiramente a Fundação contextualiza a importância do acontecimento da ação e solicita a autorização dos caciques e lideranças para seguir com o escopo planejado através dos ofícios anexos, que os convida a participar de forma integral das atividades de campo.

Ressalta-se, que no período deste relatório realizou-se reuniões internas com a engenharia, infraestrutura, licenciamento, jurídico, compliance e suprimentos para buscar alternativas que atrelem prazos menores à execução dos fluxos, autorizações ambientais e sociais prevendo a definitividade do SAA.

Deste modo, visando estabelecer uma comunicação assertiva com a Secretária Especial de Saúde “SESAI”, a Fundação Renova solicitou uma agenda presencial em Brasília com o órgão para tratar das ações concluídas, em andamento e próximos passos para implantação do SAA Aracruz, conforme cronograma executivo enviado à CT-IPCT, em 14/05/24 por meio do Ofício FR.2024.1266. Dentre os temas trabalhados, temos: Diretrizes governamentais para elaboração dos projetos; autorizações junto aos órgãos e comunidade para implantação; instrumento jurídico.

4.2.3. Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho do escopo de atuação do PG03. A comunicação entre Fundação e comunidades indígenas é uma ação transversal que perpassa todas as fases do programa.

Nos meses de referência do relatório a Fundação realizou diálogos referente a todas as fases do programa.

- Fase emergencial; 1. operacionalização do ASE (inclusão de dependentes/alterações solicitadas pelas lideranças indígenas e acompanhamento de recibos e planilhas); reunião com as associações indígenas para regularização documental pendente: recibos divergentes/ausentes; declaração assinada pelos pais das crianças recém-nascidas.
- Fase transitória:
 1. PBAI (retorno das atividades);
 2. SAA (Amarelos - Poço concluído em 22/05 e o resultado do teste de qualidade disponibilizado em 20/06/2024; Nova Esperança - 2ª perfuração e teste de vazão concluídos em 15/06).

4.3. TERRA INDÍGENA KRENAK

4.3.1. Ações emergenciais

Tabela 16 - Ações do eixo emergencial desenvolvidas no trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TERRITÓRIO	
4.3.1.1	Auxílio financeiro extra emergencial de Subsistência
4.3.1.2	Fornecimento de água mineral
4.3.1.3	Fornecimento de água bruta e potável
4.3.1.4	Fornecimento de suplementação bovina
4.3.1.5	Manutenção de Vias de Acesso
4.3.1.5	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)

4.3.1.1. Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência

Atualmente o auxílio extra emergencial é pago às 8 (oito) associações indígenas Krenak, cabendo a cada uma delas efetuar o repasse às famílias do seu grupo. Conforme previsto no acordo Emergencial, cada família recebe mensalmente o equivalente à 9 (nove) vezes o valor do salário-mínimo vigente, o que totaliza R\$ 12.708,00 (Doze mil, setecentos e oito reais) para cada uma das 181 (cento e oitenta e uma) famílias.

Na Tabela 17 é demonstrado o levantamento quantitativo das famílias atendidas e o valor mensal recebido pelas associações para repasse no período de abril, maio e junho ou de 2024. Os comprovantes de pagamento estão disponíveis em anexo, assim como a documentação pertinente a inclusão de novas famílias ocorrida em julho/2024.

Tabela 17 – Pagamento Financeiro Extra Emergencial às Associações Indígenas Krenak

ASSOCIAÇÃO	MÊS	Nº DE FAMÍLIAS	VALOR TOTAL
ATORÃN	Abril	45	R\$ 571.860,00
	Maio		R\$ 571.860,00
	Junho		R\$ 571.860,00
BAKAN	Abril	16	R\$ 203.328,00
	Maio		R\$ 203.328,00
	Junho		R\$ 203.328,00
BURUM ERERRE	Abril	20	R\$ 254.160,00
	Maio		R\$ 254.160,00
	Junho		R\$ 254.160,00
KRENAK	Abril	22	R\$ 279.576,00
	Maio		R\$ 279.576,00
	Junho		R\$ 279.576,00
NAKNENUK	Abril	13	R\$ 165.204,00
	Maio		R\$ 165.204,00
	Junho		R\$ 165.204,00
NAKRERRE	Abril	15	R\$ 190.620,00
	Maio		R\$ 190.620,00
	Junho		R\$ 190.620,00
TAKRUK	Abril	17	R\$ 216.036,00
	Maio		R\$ 216.036,00

ASSOCIAÇÃO	MÊS	Nº DE FAMÍLIAS	VALOR TOTAL
	Junho		R\$ 216.036,00
UATU	Abril	33	R\$ 419.364,00
	Maio		R\$ 419.364,00
	Junho		R\$ 419.364,00
TOTAL			R\$ 6.900,445,00

4.3.1.2. Fornecimento de água mineral

O fornecimento de água mineral para o povo Krenak se insere na Cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC). A Fundação Renova disponibiliza 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa por dia. O volume de água mineral distribuído considera o total de 600 (seiscentas) pessoas, conforme o Acordo Emergencial Krenak.

A quantidade em litros (L) de água mineral fornecida no trimestre de abril, maio e junho de 2024 aos beneficiários da TI Krenak, está representado na Figura 3 e os comprovantes de entrega estão disponíveis em anexo.


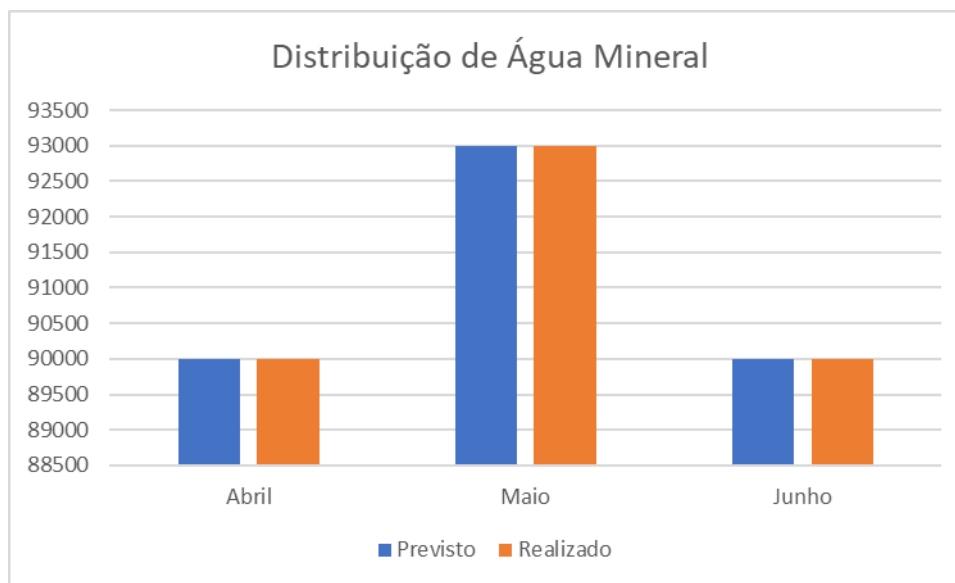


Figura 3 - Indicador de progresso para o fornecimento de água mineral na TI Krenak – abril, maio e junho de 2024

A localização dos pontos de entrega de água na TI Krenak são apresentados no Mapa 1

Mapa 1 - Localização dos pontos de entrega de água mineral na TI Krenak

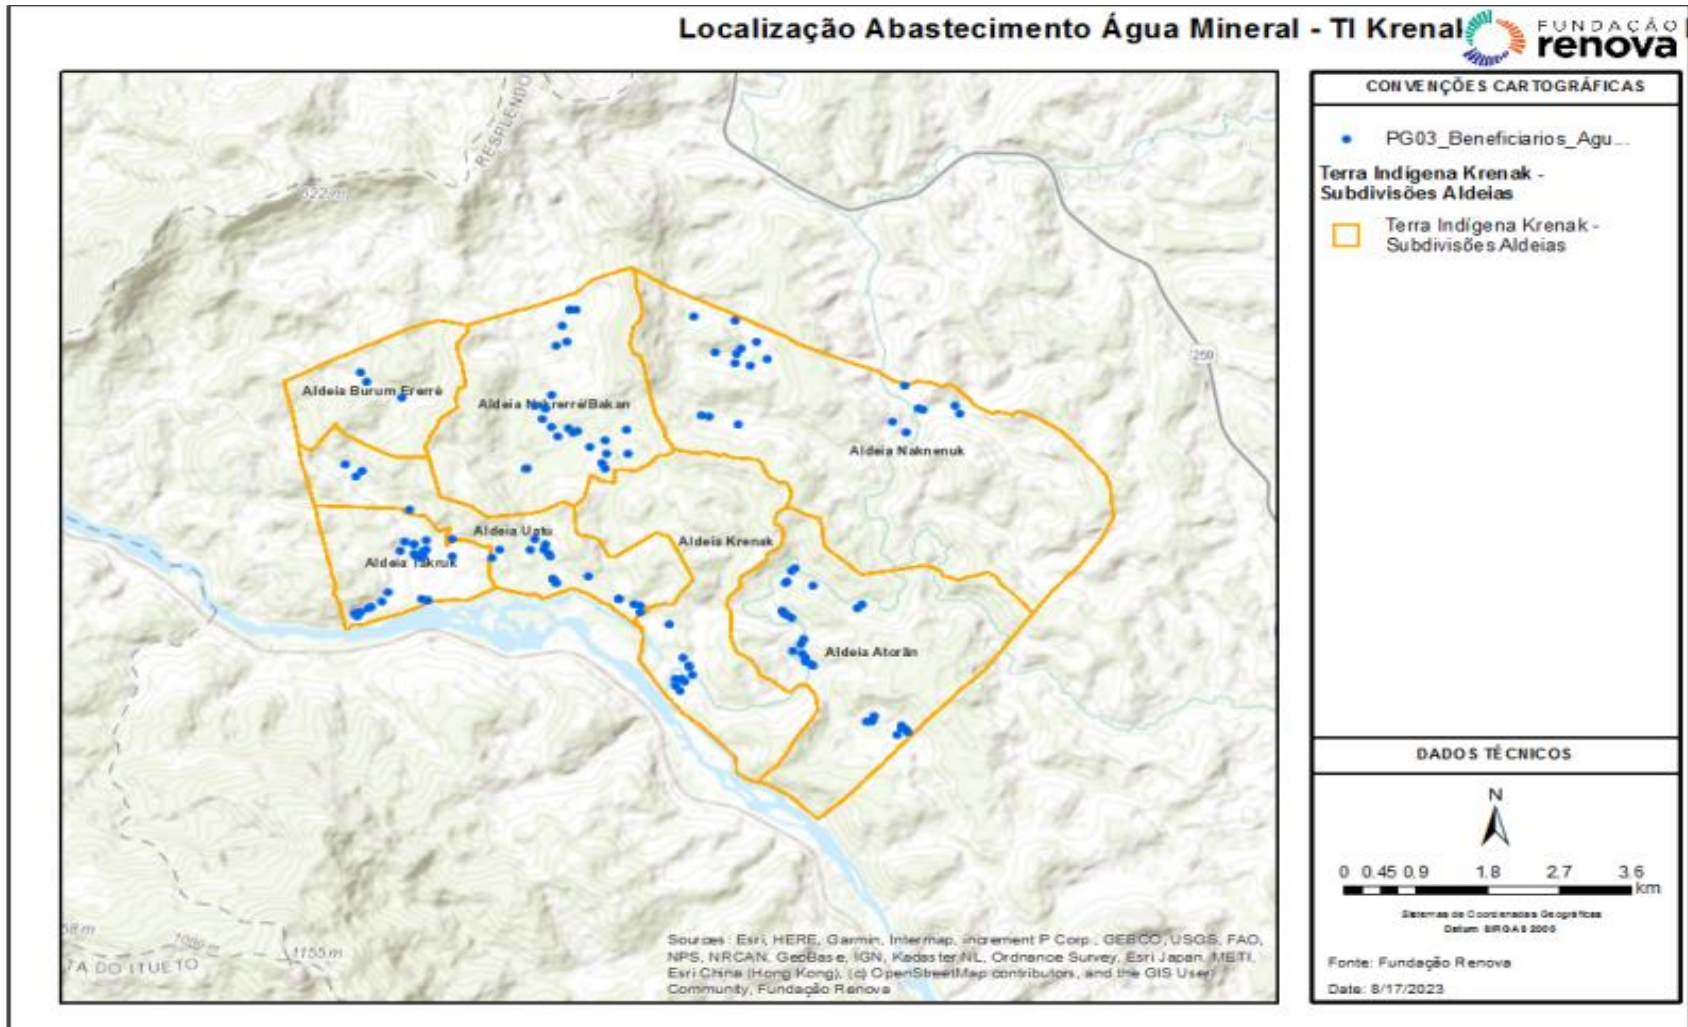

4.3.1.3. Fornecimento de água bruta e potável

A distribuição de água bruta e potável é realizada na TI Krenak por meio de caminhões-pipa. O quantitativo de água potável e bruta é de 1.000 (um mil) litros (cada) ao dia, distribuídos em 142 (cento e quarenta e dois) pontos de abastecimento (potável) e em 103 (cento e três) pontos de abastecimento (bruta). O abastecimento de água ao povo Krenak, vale lembrar, está inserido na Cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Devido a resistência da comunidade indígena quanto ao registro fotográfico do hidrômetro eletrônico (instalado no caminhão pipa) e do local de abastecimento, o que supriria a necessidade de assinatura de recibos e evitaria o contato próximo entre entregador e beneficiário, houve em maio/2020 uma alteração no formato de comprovação de abastecimento, passando a ser realizado por meio de registro fotográfico do hidrômetro antes e após a entrega de água bruta e potável na terra indígena, não sendo possível determinar com exatidão o quantitativo individual de volume de água entregue.

É importante frisar que o abastecimento de água potável é realizado sob demanda, conforme volume disponível na caixa d'água quando da reposição diária, podendo influenciar em alterações no fornecimento mensal (m³) e diferença entre o previsto e o realizado. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no Anexo 4.3.2.3.

Tabela 18 - Média do fornecimento de água bruta e potável na TI Krenak.

TIPO/MÊS	ABRIL	MAIO	JUNHO
Potável (m ³)	5.769	6.289	6.288
Bruta (m ³)	1.119	1.088	1.343

4.3.1.4. Fornecimento de suplementação bovina

O fornecimento de suplementação bovina previsto no TTAC, Cláusula 43: a) fornecimento mensal de 21 sacos de ração por família (total de 108 famílias); b) fornecimento mensal de alimentação volumosa, de 2,4 toneladas por família (total de 100 famílias); e c) fornecimento mensal de 3 (três) sacos de sal mineral por família (total de 100 famílias).

Tabela 19 - Suplementação bovina por mês e indicadores de progresso

PRODUTO	Nº DE FAMÍLIAS	QUANTIDADE	ABRIL	MAIO	JUNHO
---------	----------------	------------	-------	------	-------


Ração	108	21 sacos*	2.268	2.268	2.268
Sal mineral	100	3 sacos**	300	300	300
Silagem de milho	100	2,4 toneladas	240	240	240

*Cada saco contém 40 quilos;

**Cada saco contém 25 quilos.

O Mapa 3 a seguir apresenta a entrega de insumos realizada no período de composição deste relatório:

MAPA 2 - Mapa 3 - Localização das entregas de insumos agropecuários na TI Krenak

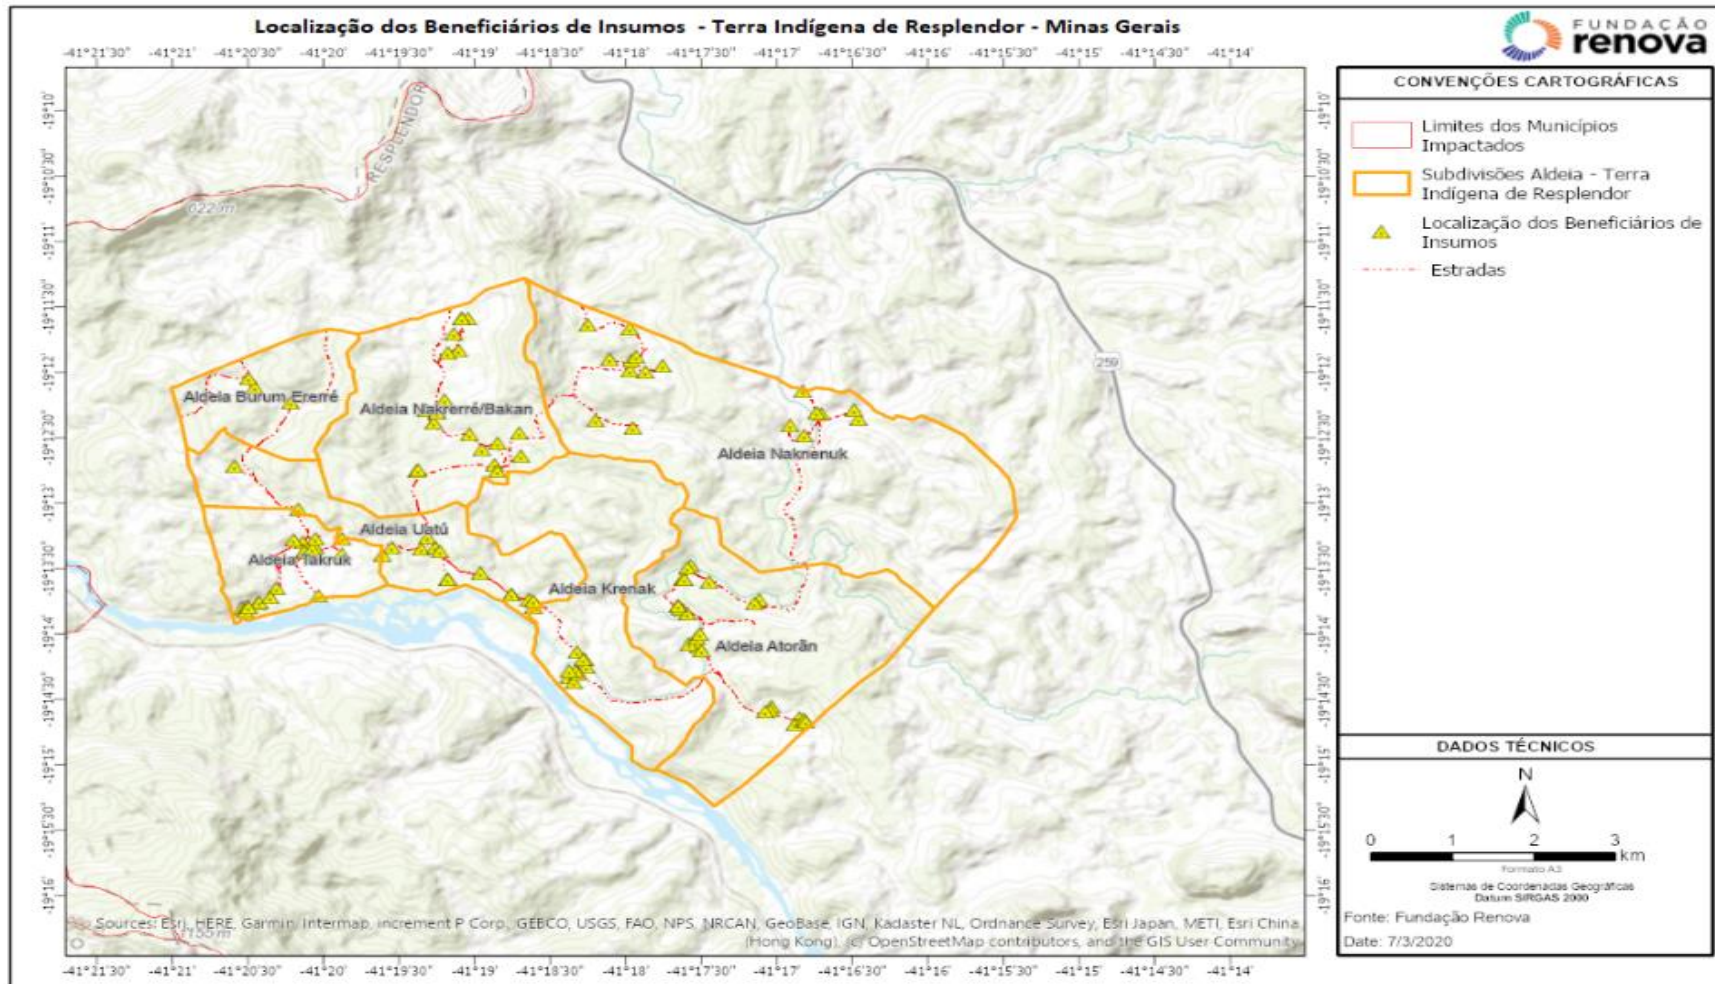

4.3.1.5. Manutenção das vias de acesso

As obras de manutenção nas vias do Território Krenak vêm acontecendo sob responsabilidade da empresa JC Lima, sob a gestão contratual da Infraestrutura Rio Doce.

Abaixo, fotos de atividades rotineiras de manutenção de vias no mês de abril, maio e junho.



Foto 6 – Área de Manutenção de Vias

Destaca-se neste trimestre o apoio logístico com o carregamento de estacas ao projeto de Recuperação de Nascentes executado pelo PG 26 – Uso Sustentável da Terra. Nesta etapa, os beneficiários estão executando as cercas ao redor das nascentes mapeadas. O PG 03 tem apoiado com o diálogo, mobilização dos participantes do projeto e demais necessidades de logística para que as ações sejam realizadas dentro do cronograma previsto.



Foto 7 - Carregamento de Estacas

4.3.1.6. Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referente do monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço é <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>, no qual estão disponíveis o boletim trimestral de lagoas, zona costeira e estuários e o boletim mensal de rios. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma online interativa.

Conforme apresentado, o ponto de monitoramento em Resplendor (MG) próximo a essa Terra Indígena é o Ponto RDO 10, localizado na margem direita do rio Doce, em Resplendor (Coordenadas UTM: 263318,88 leste/ 7861251,39 norte/zona 24 k).

4.3.2. Ações transitórias

O ECI está paralisado desde maio de 2017. O plano de trabalho (PT) do ECI elaborado pela consultoria independente foi protocolado na Funai e aprovado pelo órgão indigenista em fevereiro de 2017, Ofício nº 5/2017/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. Contudo, não foi aprovado pela comunidade indígena Krenak em reunião realizada maio de 2017. Desde então, não houve avanço nas tratativas referentes ao ECI.

Mediante a necessidade de se realizar o Estudo Circunstanciado de Impacto Krenak e que este atenda às necessidades e especificidades da comunidade, a Fundação Renova solicitou e aguarda o Termo de Referência que deve ser emitido pela FUNAI, este será o documento balizador das atividades de identificação, detalhamento e Plano de Ação Permanente, no âmbito do processo de reparação de impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

4.3.2.2. Elaboração de projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água

Por meio de diálogo, a Fundação Renova tem realizado conversas sobre o assunto e solicitado reuniões com a comunidade para tratar sobre o tema. Trata-se de uma ação transitória para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em 2015 na comunidade indígena Krenak.

4.3.3. Ações estruturantes

4.3.3.1. Recuperação de nascentes e áreas degradadas

Houve anuência do povo Krenak para as atividades relacionadas à recuperação de nascentes. As atividades relacionadas retornaram com a participação da comunidade.

Destaca-se o apoio ao projeto de Recuperação de Nascentes, que englobou não apenas a logística para transportar materiais às áreas de construção de cercas em regiões de difícil acesso, mas também o diálogo constante com os envolvidos no projeto. Os beneficiários estão recebendo os lotes com materiais necessários para construir as cercas para proteção das nascentes.

No decorrer de 2023, em colaboração com os proprietários beneficiários do projeto, foi efetuada a construção de cerca de 12.934 metros de cercamento.

No ano de 2024, nesse trimestre, as ações com os beneficiários foram retomadas. O projeto está em andamento e conta com o apoio do diálogo do PG03 e dos contratos, para apoio logístico no carregamento do material para áreas de difícil acesso para que as ações sejam finalizadas no ano de 2024.

4.3.4. Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho do escopo de atuação do PG03. A comunicação entre Fundação e comunidades indígenas é uma ação transversal que perpassa todas as fases do programa.

Foram realizadas idas a campo periódicas e diálogo direto com a comunidade indígena para esclarecimentos sobre as ações da Fundação Renova e garantindo que seja respeitado o protocolo de consulta Krenak.

3. AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE

Tabela 20 - Cronograma das Próximas Atividades

TERRA INDÍGENA	EIXO	AÇÃO	DETALHAMENTO
COM BOI OS	Emergencial e Transitórias	Distribuição de água mineral	A distribuição ocorre nas comunidades de Córrego do Ouro e Comboios

		Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)	Segue mantida para o próximo trimestre.
		Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	Monitoramento ocorre na estação de tratamento de água de Aracruz.
		Auxílio de Subsistência Emergencial	Pagamento das Famílias.
		Detalhamento do PBAI	Realização de oficinas participativas para detalhamento dos programas do PBAI.
		SAA – Sistema de Abastecimento de Água	No próximo período será realizado a perfuração do poço, assim como as tratativas de relacionamento para organizar o início dos trabalhos na aldeia Comboios. Aprovação do projeto detalhado de Córrego do Ouro pela SESAI-DSEI.
TUPINIQUIM GUARANI	Emergencial	Auxílio de Subsistência Emergencial	Pagamento das famílias.
	Transitório	SAA – Sistema de Abastecimento de Água	No próximo período será realizado a perfuração dos poços de Pau Brasil e Olho d' Água. ;- Elaboração dos projetos básicos de Amarelos e Nova Esperança.
		Detalhamento do PBAI	Realização de oficina participativa de detalhamento dos Programas do PBAI.
KRENAK	Emergencial	Auxílio Financeiro Extra Emergencial	Pagamento do auxílio financeiro extra emergencial contínua.
		Fornecimento de Água Mineral	Segue prevista a continuidade, para o próximo trimestre, do fornecimento de água mineral para o povo Krenak, de 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa por dia, para 600 (seiscentas) pessoas.
		Fornecimento de Água Bruta e potável	A distribuição de água bruta e potável será mantida na TI Krenak no próximo trimestre.
		Fornecimento de Suplementação Bovina	O fornecimento de suplementação bovina alimentar segue mantido para o próximo trimestre.

		Manutenção de vias de acesso	A manutenção das vias de acesso à Terra Indígena Krenak será mantida para o próximo trimestre, tendo em vista a viabilização do tráfego regular dos caminhões-pipa.
		Implantação de cisternas de captação de água de chuva	Implantação de 120 cisternas de placas nos moldes dos programas governamentais.
		Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)	Segue mantida para o próximo trimestre.
		Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	Segue mantida para o próximo trimestre (conforme a retomada parcial), através da manutenção da frequência de coleta e parâmetros analisados.
	Estruturante	Recuperação de Nascentes	Houve o retorno do projeto de recuperação de nascentes, a execução das áreas mapeadas continua para o próximo trimestre.
		SAA – Sistema de Abastecimento de Água	Permanecer com o diálogo e tratativas para elaboração do projeto de sistema de abastecimento de água potável para atendimento das oito aldeias que formam a Terra Indígena Krenak.
