

FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL – JUL/AGO/SET**

**PG 03 – Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígena**

# SUMÁRIO

## Sumário

<b>2. EQUIPE TÉCNICA DO PG03</b> .....	<b>4</b>
A. EQUIPE TÉCNICA – ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR TERRITÓRIO .....	5
B. CRONOGRAMA 2024.....	6
<b>3. GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES</b> .....	<b>12</b>
A. CLÁUSULAS .....	12
B. DELIBERAÇÕES.....	13
<b>4. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)</b> .....	<b>20</b>
4.1. TERRA INDÍGENA COMBOIOS .....	20
4.2. TERRAS INDÍGENAS TUPINIQUIM E CAIEIRAS VELHAS II .....	25
4.2.1.....	<i>Ações emergenciais</i>
4.2.1.1.....	<i>Auxílio Subsistência Emergencial (ASE)</i>
4.2.2.....	<i>Ações transitórias</i>
4.2.3.....	<i>Relacionamento</i>
4.3.1.....	<i>Ações emergenciais</i>
4.3.1.1.....	<i>Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência</i>
4.3.4.....	<i>Relacionamento</i>
<b>3. AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE</b> .....	<b>41</b>

## 1. INTRODUÇÃO

A Fundação Renova é a organização constituída para conduzir ações para reparação, mitigação e/ou compensação dos impactos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, de acordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

A estrutura da instituição é composta por programas reparatórios e compensatórios, sendo o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG03) considerado reparatório, cujo objetivo é identificar impactos e promover ações mitigatórias e reparatórias para os povos indígenas, conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC e com as diretrizes da convenção OIT 169 da legislação indigenista, que estabelecem princípios fundamentais para a interação com os povos originários para implementação de projetos do seu interesse ou que podem impactar seu modo de vida e território.

O Programa atende no âmbito do processo reparatório, os indígenas das etnias Tupiniquim, Guarani e Krenak, das terras indígenas indicadas pelo TTAC: Krenak, em Resplendor – MG, e Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II em Aracruz – ES.

No âmbito do Programa, a participação livre e informada das comunidades indígenas que fazem parte do escopo, é fundamental na elaboração e execução dos seus projetos e ações. Além disso, é direito dos povos indígenas que suas especificidades sejam respeitadas e que todos sejam consultados, de modo a configurar um processo reparatório coeso com o contexto das comunidades.

Destaca-se que não cabe à Fundação Renova sobrepor as ações de responsabilidade do poder público, de vulnerabilidades já existentes nos territórios indígenas.

O Programa está estruturado em três fases, a saber: a) Emergencial: em que se desenvolvem ações de mitigação de vulnerabilidades e riscos associados aos impactos nos povos e comunidades tradicionais; b) Transitória: em que são analisados os impactos e acordados os programas/ações de reparação e seus respectivos planos de trabalho, momento em que deve ocorrer articulações com órgãos reguladores sobre a realização dos estudos de impacto, bem como detalhamento das ações reparatórias estruturantes, e o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais; e c) Estruturante: em que são executados e monitorados os

programas/ações de reparação, baseadas em estudos especializados e nos impactos identificados.

As ações de relacionamento e diálogo entre Fundação Renova e comunidades indígenas ocorrem em todas as fases do Programa. O processo de implementação das ações, em alguns momentos, pode prever a concomitância entre fases. Ainda, as ações de comunicação e diálogo, seguindo metodologia definida pelo Programa em Plano específico, são fundamentais para:

- Construção de relação de confiança entre comunidades e equipe técnica;
- Construção de ambiência para desenvolvimento do Programa e das ações reparatórias;
- Fortalecimento da autonomia das comunidades; e
- Desenvolvimento das ações a partir de apoio técnico às associações e comunidades.

Esse Relatório Trimestral apresenta uma síntese das ações executadas referentes às três fases supracitadas do Programa, referentes ao período de julho, agosto e setembro de 2024.

## 2. EQUIPE TÉCNICA DO PG03

O PG03 é composto por sete colaboradores, responsáveis pelo planejamento, execução, monitoramento e avaliação de projetos e atividades voltadas à proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos originários.

Tabela 1 - Equipe técnica PG 03 organizada por território

Nome	Formação	Território	Cargo
Wagner Elisio Tonon	Biólogo	Povos Tradicionais e Indígenas	Gerente Geral da Socioeconomia
Maria Albanita Roberta de Lima	Serviço Social, Pós-Graduação em Gerontologia e Especialização em Políticas Públicas	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Coordenadora do Programa de Qualidade de Vida dos Povos Indígenas
Adebal de Andrade Júnior	Doutor em Antropologia Cultural e mestre em Ciências Sociais	Krenak	Especialista Técnico de Programa Socioeconômico
Ana Luiza Coêlho Araújo Ferreira	Cientista Social e Mestre em Antropologia	Comboios, Tupiniquim/ Guarani	Especialista Técnica de Programa Socioeconômico

Bruna de Fátima Chaves Aarão	Cientista Social, Especialista em Políticas Públicas e Poder Legislativo e Mestre em Ciência Política	Comboios e Tupiniquim/ Guarani/Krenak	Especialista Técnica de Programa Socioeconômico
Carolline Araújo Rocha	Engenheira Mecânica e Administradora	Krenak	Engenheira de Projetos e Obras
Fernanda Cristina Cerqueira de Jesus	Engenheira Ambiental	Comboios e Tupiniquim/ Guarani e Krenak	Analista Programa Socioeconômico

### a. Equipe Técnica – Atividades desempenhadas por território

Com relação às ações executadas nos territórios, a equipe técnica/operacional se organiza da seguinte forma:

#### a. TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II

Tabela 2 - TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II: ações por eixo e respectivos responsáveis técnicos/operacionais.

Eixo	Atividade	Responsável
<b>Emergencial</b>	Fornecimento de água mineral em Comboios	Fernanda Cerqueira
	Aprovação do Plano de Contingência de Cheias Comboios pela da Defesa Civil	Fernanda Cerqueira / Ana Luiza Ferreira
	Auxílio Subsistência Emergencial	Bruna Aarão/ Ana Luiza Ferreira
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Fernanda Cerqueira
<b>Transitório</b>	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)	Ana Luiza Ferreira/ Bruna Aarão
	Sistema de Abastecimento de Água (projetos)	Fernanda Cerqueira

<b>Estruturante</b>	Execução do PBAI	Ana Luiza Ferreira/ Bruna Aarão
	Acordo de reparação integrada-indenização	Bruna Aarão
	Sistema de Abastecimento de Água (perfuração de poços)	Fernanda Cerqueira

## b. TI Krenak

Tabela 3 - TI Krenak: ações por eixo e respectivos responsáveis técnicos/operacionais.

Eixo	Atividade	Responsável
<b>Emergencial</b>	Auxílio de subsistência extra emergencial	Adebal de Andrade Junior/ Bruna Aarão/ Carolline Araujo Rocha
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	Carolline Araujo Rocha
	Manutenção das vias de acesso	Carolline Araujo Rocha
	Distribuição de insumos para animais	Carolline Araujo Rocha
	Obras de melhoria nos acessos	Carolline Araujo Rocha
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Carolline Araujo Rocha
<b>Transitório</b>	Elaboração de Estudo do Componente Indígena e Plano de Ação Permanente	Carolline Araújo / Adebal de Andrade Junior
	Sistema de Abastecimento de Água – SAA (Projeto)	Carolline Araújo / Adebal de Andrade Junior/ Fernanda Cerqueira
<b>Estruturante</b>	Execução de Plano de Ação Permanente	Carolline Araújo/ Adebal de Andrade Junior
	Sistema de Abastecimento de Água – SAA (Implantação)	Carolline Araújo/ Adebal de Andrade Junior/ Fernanda Cerqueira

## b. Cronograma 2024

O cronograma a seguir (Tabela 4) apresenta o status do desenvolvimento das ações que estão em execução no PG03, público-alvo, período de início e respectivas justificativas para as

categorias de status relacionadas no trimestre de referência deste relatório (julho/ agosto/ setembro de 2024).

Tabela 4 - Cronograma previsto/realizado para o período deste relatório trimestral – abril, maio e junho de 2024

Eixo	Ação prevista	Público-alvo	Programa de Interface	Início	Em andamento ou término previsto	Justificativa**
Emergencial	Fornecimento de água mineral	TI Comboios	-	2020	Em andamento	-
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	TI Krenak	Infraestrutura	2016	Em andamento	-
	Auxílio de Subsistência Extra Emergencial	TI Krenak	-	2015	Em andamento	-
	Auxílio Subsistência Emergencial	TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	-	2016	Em andamento	-
	Distribuição de Insumos para alimentação animal	TI Krenak	-	2016	Em andamento	-
	Obras de manutenção de vias de acesso viário ao Território Krenak (Rotas de entrega de água) e mitigação de riscos período chuvoso	TI Krenak	Infraestrutura	2016	Em andamento	-
	Obras de melhoria nos acessos (8 pontos críticos)	TI Krenak	Infraestrutura	Janeiro 2019	Suspensão	Suspensão para reavaliação da demanda.
	Obras de melhoria nos acessos – Demais	TI Krenak	Infraestrutura	Janeiro 2019	Suspensão	Suspensão para reavaliação da demanda.
	Programa de Monitoramento da Qualidade Quantitativo Sistemático (PMQQS)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	-
	Programa de Monitoramento da Qualidade	TIs Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	-

	Quantitativo Sistemático (PMQQS)					
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	-
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TIS Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	Em atendimento à Deliberação CIF nº 707, de 24/09/23, o monitoramento mensal será ampliando em 12 pontos distribuídos entre as aldeias Nova Esperança, Amarelos, Olho d'água e Pau Brasil. Respeitando as diretrizes para a realização de serviços em terras indígenas, a Fundação Renova por meio do Ofício FR.2024.258, de 24/09/24 encaminhou para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas ("FUNAI") as autorizações do Cacicado e da Secretaria Especial de Saúde Indígena ("SESAI"), a fim de, requerer a anuência do órgão para iniciar o monitoramento dos pontos definidos previamente pela CT-Saúde, que acontecerá na 73ª campanha do "PMQACH" no mês 10/2024.
Transitório	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena	Tis Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II	-	2021	Em andamento	<p>No período, a H&amp;P, responsável pelo detalhamento do PBAI, deu continuidade ao detalhamento do PBAI da TI Comboios e das comunidades da Comissão de Caciques, por meio de oficinas participativas, visita técnica e diálogos direcionados.</p> <p>Quanto a comunidade de Três Palmeiras, foram realizados ajustes nos Programas do PBAI já protocolado na FUNAI em 2022 e no documento de ações antecipatórias, pela empresa de consultoria H&amp;P. Parte dos ajustes foi protocolado na FUNAI em agosto de 2024, com previsão de finalização dos demais ajustes para o período seguinte, com oficinas participativas na comunidade.</p>

					Com relação ao detalhamento do PBAI das comunidades Pau Brasil, Irajá e Caieiras Velhas, o processo de contratação está em andamento, na fase de finalização.
Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC)	TIS Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II		2021	Concluído	As ações do FAIC foram concluídas ainda em 2023.
Elaboração de projeto de SAA – Sistema de Abastecimento de Água	TIS Comboios e Tupiniquim (Córrego do Ouro, Comboios, Pau Brasil, Amarelos, Olhos D’água e Nova Esperança)	Engenharia PG32 – Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	2019	Em andamento	<p>No período, o PG03 finalizou o processo de aditivo para o contrato nº 4900000688 com a empresa Hidropoços e realizou a perfuração de outros três poços, os testes de vazão e de qualidade de água nas comunidades indígenas Olho D’água, Comboios e Pau Brasil respectivamente.</p> <p>Para subsidiar a elaboração do projeto básico da Comunidade Amarelos foi necessário realizar a complementação do serviço de topografia para esta Aldeia em 30/08/24. Em paralelo, o projeto básico para a comunidades Nova Esperança também estar na fase de elaboração.</p> <p>Diante da conclusão do projeto detalhado da aldeia Córrego do Ouro, a Fundação o encaminhou para análise e aprovação do DSEI-SESAI, assim como para conhecimento da Comunidade e Funai por meio do Ofício FR.2024.1740 de 01/07/2024.</p> <p>Para finalizar o parecer do projeto detalhado a SESAI em 02/08/24 solicitou a perfilagem ótica do poço de Córrego do Ouro através do documento Nº 107/2024/COSA/CGISA/DEAMB/SESAI/MS. A Fundação pelo Ofício FR.2024.2140, de 14/08/2024 acordou a data 16/08/24 para realização da atividade, mas, devido o tempo de produção do relatório técnico e demais arquivos, estes dados serão encaminhados no mês de outubro de 2024.</p>

Estruturante	Recuperação de nascentes	TI Krenak	PG 26 – Uso Sustentável da Terra	2019	Em andamento	<p>Em 2019 foi implementado o programa de recuperação de nascentes e áreas degradadas, por meio do CBH Doce. Em 2021, o projeto foi paralisado devido ao contexto do Plano de Contingência da Saúde Indígena e do Novo Coronavírus. Em 2022, houve anuência da comunidade para retorno das atividades relacionadas ao projeto. assim aconteceram formação de manuseio de motosserra e treinamento para cerqueiros.</p> <p>A ação de a instalação de cercas nas áreas mapeadas, está em andamento desde o início em 2023.</p>
--------------	--------------------------	-----------	----------------------------------	------	--------------	--

\*\* Justificativa para as categorias de status relacionadas.

### 3. GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES

Conceitos:

**Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova. Exemplo: Caput Cláusula 39.

**Itens de requisitos:** são itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Caput Cláusula 40.

#### a. Cláusulas

Considerações:

Há um total de onze itens de ação de cláusulas distribuídos para o programa PG03. Não constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados nos itens de ação, conforme conceitos acima apresentados. As demais cláusulas relacionadas ao programa dependem da elaboração da definição/escopo do programa, que passa atualmente por revisão. A distribuição dos itens de ação por status é apresentada na Figura 1 a seguir.

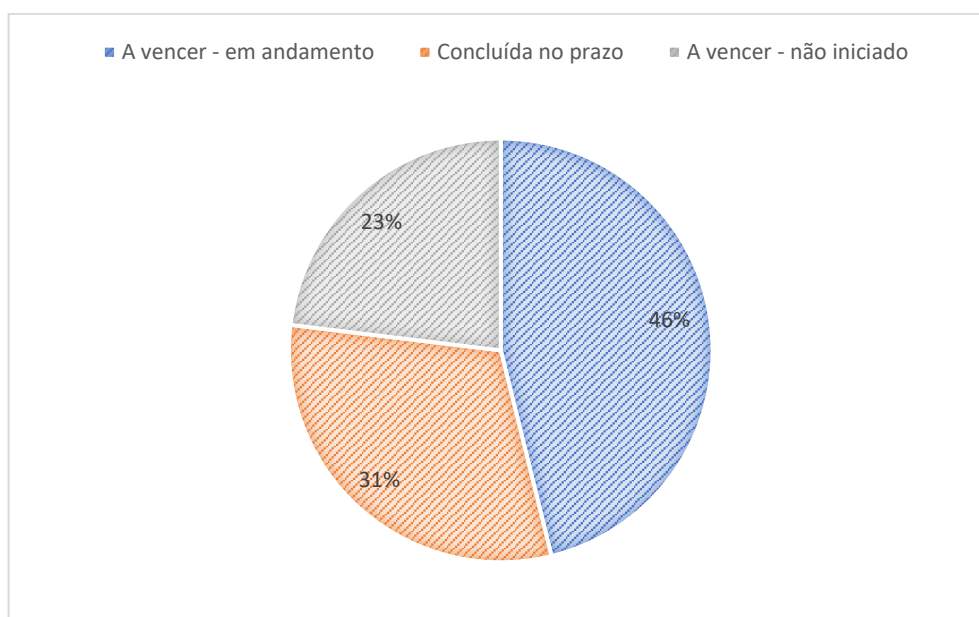


Figura 1 - Distribuição dos itens de ação por status

Cumpramos destacar que o status de conclusão acima representado se refere às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF e encontram-se disponíveis no SharePoint através do seguinte link: <https://bit.ly/2EDMxfS>.

A seguir, é apresentado o detalhamento dessas cláusulas, em conformidade com cada status.


Tabela 5 - Detalhamento das cláusulas do PG03, conforme o status de conclusão

Status	Cláusula	Prazo TTAC	Observações
Itens a vencer em andamento	39	Não definido	Programa em execução.
Itens a vencer em andamento	43 (§1º)	Não definido	Ação concluída em 12/03/16. Relatório emitido pelo Jurídico da Renova para a 12ª vara Federal da seção judiciária de MG.
Itens a vencer em andamento	43 (Inc. I)	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações contidas neste.
Itens a vencer em andamento	43 (Inc. II)	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações.
Itens a vencer em andamento	44 (Inc. II)	Não definido	Desde a criação da Renova esta vem cumprindo os acordos emergenciais para estes povos, estes vêm sendo renovados, último assinado em dez/20 e válido até dez/21.
Itens a vencer em andamento	44 (Inc. IV).	Não definido	Trata-se da contratação do detalhamento do PBAI.
Itens a vencer em andamento	44 (Inc. V).	Não definido	Trata-se da execução do PBAI.
Itens concluídos no prazo	43 (Inc III)	Não definido	Estudo foi contratado para os indígenas de Aracruz e Krenak, porém no momento de assinar o Acordo para execução, os Krenak se opuseram, seguindo apenas com os Tupiniquim Guarani.
Itens concluídos no prazo	44 (Inc I - ação 1)	22/03/2016	Concluída em 22/03/16 com a emissão de um parecer técnico preliminar emitido pela Samarco.
Itens concluídos no prazo	44 (Inc I - ação 2).	Não definido	Concluído em 26/02/16 com a assinatura do acordo emergencial.
Itens concluídos no prazo	44 (Inc III e §3º).	Não definido	Concluído em 30/06/16 com a contratação da empresa de consultoria independente (Polifônicas)

## b. Deliberações

Considerações:

Referente a Terra Indígena Krenak, há um total de 10 itens de ação nas deliberações. E, quanto as Terras Indígenas de Comboios, Tupiniquim e Caieiras Velhas II, há um total de 16 itens de ação nas deliberações. Não constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos apresentados anteriormente. A distribuição dos itens de ação por status é apresentada na Figura 2 e Tabela 6 a seguir.

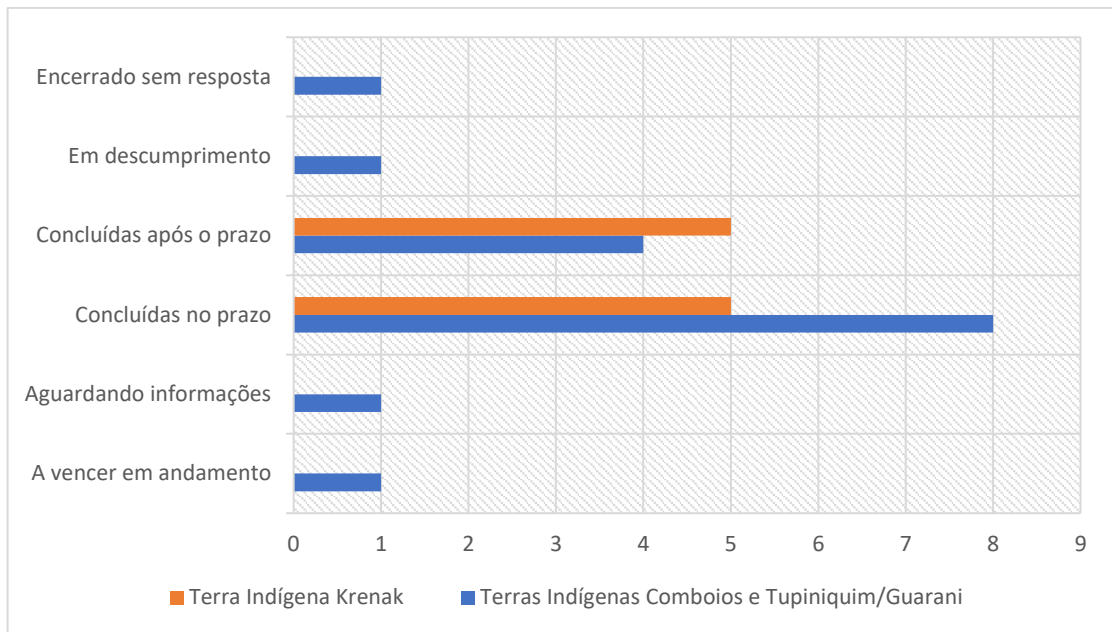

*Figura 2* - Distribuição dos itens de ação por status

Tabela 6 - Distribuição dos itens de ação por status

Público-alvo	Status	Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 155 (item 2)	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF	20/08/2018	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 / OFI.NII.082018.386320/08/18.
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 2) / NT nº 005/2018/CT-IPCT/CIF e nº 011/2018/CT-IPCT/CIF	20/08/2018	Encaminhado o documento “Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas” Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 205 (item 3) / NT nº 11/2018/CTIPCT /NT nº 19/2018/CTIPCT	15/10/2018	Apresentado para TI Comboios na data determinada. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018. 4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas. OFI.NII.102018.4315
Krenak	Itens concluídos no prazo	DEL. 360 (item 1.1) / NT nº 19/2019 / Notif. nº 18/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN	Não definido	Enviado em 06/01/19 o documento OFI.NII.122019.8638 a manifestação ressaltando a necessidade de evidências do repasse da associação às famílias Krenak. Solicitando suspensão de multa (deliberação relacionada às deliberações 299 e 335)
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 169 (item 1) / NT nº 08/2018/CT-IPCT/CIF.	31/07/2018	Realizado o protocolo em 29/08/18 conforme documento OFI.NII.082018.3883 confirmando a inclusão das 4 famílias Krenak.
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT	29/10/2018	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 299 / NT nº 05/2019/CT-IPCT / Notif. nº 19/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN.	31/07/2019	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias.

Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 335 (item 2) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN	29/10/2019	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019
Krenak	Itens concluídos após prazo	DEL. 335 (item 3) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN.	03/11/2019	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019
Krenak	Item concluído	DEL. 692, de 28 de junho de 2023. (item 1)	28/06/2023	Encaminhado em 28/06/2023 lista de inclusão de 47 famílias, conforme Lista Família Krenak, SEI 16242354, no pagamento do ASE e nas demais ações previstas no âmbito do Acordo Emergencial. Recebemos das lideranças um ofício, pedindo a não inclusão de 3 famílias. Portanto foram imediatamente incluídas 44 famílias.
Krenak	Itens concluídos	DEL. 692, de 28 de junho de 2023. (item 2)	28/06/2023	A Fundação Renova apoiou com a estrutura solicitada, operacionalizando as reuniões realizadas pela comunidade no território para definição de critérios de inclusão de famílias. Em 08/05/2024, a Funai encaminhou o ofício nº 112/2024/CR-MGES enviando os critérios de inclusão definidos pela comunidade.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 201 (item 1) / NT nº 14/2018/CTIPCT.	Não definido	Conforme ata do da 33ª reunião do CIF de dez/18, a questão de descumprimento foi retirada da pauta uma vez que foi consensuado que o foco deveria ser nas soluções definitivas de abastecimento. Projetos estruturantes em andamento.

Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 206 (item 1) / NT nº 20/2018/CT-IPCT/CIF.	19/10/18	Ação em desenvolvimento. Atividade estava paralisada devido o contexto da COVID 19
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 445 (item 1.1) / Nota Técnica Intercâmaras nº 001/2020/CT-IPCT/CT-Saúde/CT-GRSA/CT- SHQA/CIF; a Nota Técnica nº 35/2020/CT-IPCT.	31/10/22	Fornecimento realizado em setembro/22.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens a vencer em andamento	DEL. 477 (item 2) / Nota Técnica nº 37/2021/CT-IPCT/CIF.	Não definido	<p>Data planejada atualizada para 31/10/2022, conforme cronograma do PG03 confirmado pela equipe do PG/PMO.</p> <p>A entrega do PBAI corresponde à conclusão da Cláusula 44 Inc. II.</p> <p>Plano de Trabalho do PBAI de Três Palmeiras protocolado na FUNAI por meio do Ofício FR.2022.1803.</p> <p>PBAI de Três Palmeiras protocolado na FUNAI por meio do Ofício FR.2022.1824.</p> <p>Proposta de ações antecipatórias, como parte dos Programas reparatórios, protocolado na FUNAI em setembro de 2023, por meio do Ofício FR.2023.2426.</p> <p>Plano de Trabalho ajustado protocolado na FUNAI em outubro de 2023, através do Ofício FR.2023.2553.</p>
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 155 (item 2)	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF.	20/08/18	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 e OFI.NII.082018.386320/08/18.

Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 187 (item 2) / NT nº. 005/2018/CT-IPCT/CIF e nº 011/2018/CT-IPCT/CIF	20/08/18	Encaminhado o documento "Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas" Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 205 (item 3) / NT nº. 11/2018/CTIPCTNT 19/2018/CTIPCT	15/10/18	Encaminhado em 15/10/18 o documento OFI.NII.102018.4315 Com o Plano de Cheias para a TI Comboios. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018. 4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 227 (item 1) / NT nº 021/2018	Não definido	Em relação aos acordos emergenciais, no dia 26/12 foram assinados os acordos conforme proposta da Fundação Renova.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 231 (item 1) / NT nº. 23/2018/CTIPCT/CIF	29/12/18	Encaminhadas em 20/12/18
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 231 (item 3) / NT nº 23/2018/CTIPCT/ CIF.	Não definido	Equipe técnica está preparando relatório sobre o tema. Previsão de entrega em setembro/20.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos no prazo	DEL. 231 (item 2) / NT nº 23/2018/CTIPCT/ CIF.	Não definido	02/10/2020
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos após prazo	DEL. 201 (item 2) / NT nº 14/2018/CTIPCT.	16/10/18	Enviado o OFI.NII.032019.5775 em 28/03/19, citando que as ações estruturantes em relação ao abastecimento de água já foram iniciadas no workshop de intercâmaras realizado em 15/03/10, e que os encaminhamentos desta estão em andamento.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos após prazo	DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT.	29/10/18	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.

Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens concluídos após prazo	DEL. 227 (item 2) / NT nº 21/2018.	19/11/18	Deliberação está sendo cumprida. Fundação Renova respeita a isonomia dos povos indígenas atendidos pelo PG03.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens em descumprimento	DEL. 452 (item 5) - Nota Técnica nº 35/2020/CT-IPCT	-	Fornecimento de água continuado.
Comboios e Tupiniquim/ Guarani	Itens encerrados sem resposta	DEL. 445* (item 2.1) - Nota Técnica nº 35 da CT-IPCT.	-	Fornecimento de água continuado.
Comboios / Tupiniquim e Guarani / Krenak	Atendimento contínuo	DEL. 811.	Indefinido	Refere-se as regras para acesso aos territórios tradicionais e orientações para a realização de reuniões, oitivas e consultas junto atingidos atendidos pelos Programas 03 e 04.

\* **NOTA:** As deliberações CIF nº 445 itens 2.1 a 2.5 e 452 item 5 foram contestados os cumprimentos junto ao Sistema CIF

## 4. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024)

Neste item serão apresentadas as ações executadas no 3º trimestre de 2024, referente aos meses de julho, agosto e setembro. Tratando-se de todas as ações realizadas nas terras indígenas Tupiniquim, Caieiras Velhas II, Comboios e Krenak.

### 4.1. Terra Indígena Comboios

#### 4.1.1. Eixo Emergencial

Tabela 7 - Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TI COMBOIOS	
Ações	4.1.1.1 Fornecimento de água mineral
	4.1.1.2 Auxílio Subsistência Emergencial

##### 4.1.1.1. Fornecimento de água mineral

Durante o período abrangido por este relatório, o fornecimento foi realizado semanalmente na TI Comboios, em dois pontos: um na aldeia de Comboios e outro na aldeia Córrego do Ouro.

Tabela 8 - Entrega de água nas comunidades de Comboios e Córrego do Ouro entre os meses de julho, agosto e setembro de 2024.

Pontos de entrega acordados	Galões de 20 litros		
	Julho	Agosto	Setembro
Aldeia Comboios	1.414	1.401	1.658
Aldeia Córrego do Ouro	379	295	368
<b>Total</b>	<b>1.793</b>	<b>1.696</b>	<b>2026</b>

A entrega de água mineral é realizada de acordo com a demanda de consumo apresentada. Ou seja, a comunidade devolve os vasilhames vazios, que são trocados por outros cheios.

##### 4.1.1.2. Auxílio Subsistência Emergencial (ASE)

A Fundação repassa mensalmente à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (AITC) o valor de dois salários mínimos e meio (vigente no ano), uma cesta básica para cada família, com valor de referência do DIEESE para o mês vigente, acrescido de 20% (vinte por cento) do valor de um salário mínimo para cada dependente. Adiciona-se, ainda, um acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal a título de cobertura de gastos administrativos

da associação. Os valores são repassados no dia 15 de cada mês para a associação indígena, que é responsável por repassar os valores às famílias (conforme quadro abaixo)."

Tabela 9 - Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Comboios

ASSOCIAÇÃO	MÊS/ANO	TITULARES	DEPENDENTES	VALOR
AITC	Julho	292	562	R\$ 1.469.212,88
	Agosto	292	561	R\$ 1.459.724,49
	Setembro	293	573	R\$ 1.527.670,29

As associações/lideranças indígenas possuem autonomia para sua organização administrativa e realizam processos de elegibilidade conforme sua governança. Cabe à Fundação verificar se as movimentações solicitadas mensalmente pelas lideranças estão dentro das regras vigentes no acordo.

A Fundação Renova encaminha todos os meses uma planilha com o descritivo das famílias, considerando as movimentações mensais solicitadas pelas associações, para a conferência dos beneficiários.

Cabe à associação realizar a prestação de contas junto à Fundação Renova, por meio da entrega de recibos/comprovantes de transferências bancárias. A ausência da entrega dos recibos pode acarretar a suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias."

#### 4.1.2. Ações transitórias

Tabela 9 - Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre

AÇÕES TRANSITÓRIAS TI COMBOIOS	
Ações	4.1.2.1 Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI
	4.1.2.2 Sistema de Abastecimento de Água

##### 4.1.2.1. Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)

No trimestre de referência deste relatório, destacam-se as seguintes atividades:

- Oficinas participativas com os grupos de referência por tema;
- Visitas técnicas; e
- Diálogos direcionados.

As atividades foram realizadas conforme o calendário a seguir:

Tabela 10 – Cronograma de Atividades de Detalhamento do PBAI na TI Comboios

Período	Atividade
10 e 11/07/2024	Validação dos Programas do PBAI
15 e 16/07/2024, 13, 15, 19 a 21/08/2024	Detalhamento dos Programas

A fase de detalhamento do PBAI consiste na aplicação das metodologias previstas, considerando as oficinas, visitas técnicas e elaboração do produto em escritório.

No mês de setembro as atividades foram suspensas, a pedido dos indígenas, sob justificativa de quantidade de agendas no território. Portanto, a empresa consultora H&P prosseguiu com as atividades de escritório.



Foto 1 – Oficina Participativa na TI Comboios.



Foto 2 – Oficina Participativa na TI Comboios.

#### 4.1.2.2. Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) inclui as fases de estudos geológicos, topografia, perfuração de poços, testes de vazão e de qualidade da água, georreferenciamento de imóveis elaboração de projetos conceitual, básico e detalhado, validação dos projetos junto à Comunidade, Funai e aprovação da SESAI e do DSEI, licenciamentos federais e estaduais, a contratação de empresa para implantação da rede de abastecimento, teste operacionais e por fim o repasse do SAA para a gestão do poder público.

No referido trimestre o PG03 finalizou o processo de aditivo do contrato nº 4900000688 com a empresa Hidropoços e avançou etapas significativas rumo a conclusão do SAA, dentre elas destaca-se a conclusão de três poços profundos, sendo um destes perfurado na

comunidade Comboios. A partir do resultado satisfatório dos testes de vazão e de qualidade de água o projeto básico poderá ser iniciado.

Com relação ao projeto detalhado de Córrego do Ouro, este foi concluído e enviado na data 01/07/24 via Ofício FR.2024.1740 com a SESAI-DSEI para aprovação e para conhecimento da Comunidade e Funai. Diante do contexto, a SESAI solicitou por meio do documento Nº 107/2024/COSA/CGISA/DEAMB/SESAI/MS de 02/08/24 a perfilagem ótica do poço de 130m construído em maio de 2023, a fim de, conhecer as condições e estrutura atual do perfil construtivo.

Por meio do Ofício FR.2024.2140, de 14/08/2024 a Fundação comunicou a data de 16/08/24 para realização do serviço que foi executado com o acompanhamento por técnicos da SESAI e do DSEI. A elaboração do relatório da atividade executada seguiu as diretrizes do caderno de especificações técnicas disponibilizado pelo órgão e foi finalizado no mês 09/2024. Os dados gerados serão encaminhados a SESAI no mês de outubro de 2024.

Importante reforçar que dentre as ações estratégicas desenvolvidas para trazer agilidade e transparência as etapas que compõem o processo de construção do SAA, assim como, atender a expectativa e consultar as comunidades e suas respectivas lideranças para a realização de quaisquer atividades no território indígena, primeiramente o PG03 contextualiza a importância da ação e solicita a autorização dos caciques para seguir com o escopo planejado, que por meio de ofícios os convida a participar das atividades em campo.

Ressalta-se, que além das estratégias com os stakeholders no período deste relatório realizou-se reuniões com a engenharia, infraestrutura, licenciamento, jurídico, compliance e suprimentos objetivando buscar alternativas que atrelem fluidez e prazos menores à execução dos fluxos, autorizações ambientais e sociais prevendo a definitividade do SAA.

Dentre as reuniões realizadas, destaca-se a agenda ocorrida em 13/08/24 em Brasília visando estabelecer uma comunicação assertiva com a Secretária Especial de Saúde “SESAI”, a Fundação Renova solicitou o momento para tratar das ações concluídas, em andamento e próximos passos para implantação dos SAAs Aracruz e Krenaks, prevendo favorecer o atendimento do cronograma executivo enviado à CT-IPCT, em 14/05/24 por meio do Ofício FR.2024.1266. Dentre os temas trabalhados, temos: Diretrizes governamentais para

elaboração dos projetos; tecnologias disponíveis para implantação de SAA em terras indígenas; instrumento jurídico para parcerias.

A seguir, o registro fotográfico das principais ações realizadas neste período:



Foto 3 – Perfilagem do poço da Comunidade de Córrego do Ouro, acompanhado pela SESEI e DSEI.



Foto 4 – Teste de vazão no poço construído na Comunidade Comboios.

#### 4.1.3. Relacionamento

A Fundação Renova reafirma seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisões com a participação das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor

desempenho do escopo de atuação do PG03. A comunicação entre a Fundação e as comunidades indígenas é uma ação transversal que permeia todas as fases do programa.

Nos meses de referência do relatório, a Fundação realizou diálogos referentes às fases do programa:

Fase emergencial: Operacionalização do ASE (inclusão de dependentes/alterações solicitadas pelas lideranças indígenas e acompanhamento de recibos e planilhas).

Fase transitória: 1. PBAI (retorno das atividades); 2. SAA (contratação de empresa para perfuração do poço em Comboios e elaboração dos projetos do SAA).

## 4.2. Terras Indígenas Tupiniquim e Caieiras Velhas II

### 4.2.1. Ações emergenciais

Tabela 11 - Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TI TUPINIQUIM/GUARANI	
<b>Emergencial</b>	4.2.1.1 Auxílio Subsistência Emergencial

#### 4.2.1.1. Auxílio Subsistência Emergencial (ASE)

Com a decisão judicial, o TAC 2021, assinado em dezembro de 2020, que prevê o atendimento de até 1.350 famílias para as terras indígenas Tupiniquim e Guarani, voltou a ser válido. Mensalmente, a Fundação Renova repassa às associações indígenas signatárias do acordo um salário mínimo (vigente no ano) e o valor de uma cesta básica para cada família, acrescidos de 20% (vinte por cento) do valor de um salário mínimo para cada dependente. Adiciona-se também um acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal a título de cobertura de gastos administrativos da associação. Os valores são repassados no dia 15 de cada mês para a associação indígena, que é responsável por repassar os valores às famílias (Tabela 13).

Tabela 13 - Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Tupiniquim Guarani

ASSOCIAÇÃO	MÊS	TITULARES	DEPENDENTES	VALOR
ATCV	Julho	172	383	R\$501.861,74
	Agosto	219	469	R\$622.066,36
	Setembro	219	469	R\$ 622.277,45
	Julho	509	1.018	R\$ 1.440.465,67

AITG	Agosto	462	936	R\$ 1.301.215,34
	Setembro	462	937	R\$ 1.301.649,53
AITAA	Julho	52	120	R\$ 151.903,88
	Agosto	52	121	R\$151.156,53
	Setembro	52	121	R\$ 150.331,99
AIG	Julho	52	116	R\$ 152.200,40
	Agosto	52	116	R\$ 149.080,89
	Setembro	52	117	R\$ 150.925,03
AITUGUAA	Julho	97	179	R\$ 271.840,50
	Agosto	97	183	R\$ 269.083,55
	Setembro	97	183	R\$ 267.762,15
AITUPIAPABRA	Julho	279	463	R\$767.625,15
	Agosto	279	466	R\$ 760.170,55
	Setembro	279	466	R\$ 752.263,04
AITUPAIRA	Julho	187	395	R\$ 537.214,45
	Agosto	187	396	R\$ 531.327,88
	Setembro	187	396	R\$ 529.012,75

As associações/lideranças indígenas possuem autonomia para sua organização administrativa e realizam processos de elegibilidade conforme sua governança. Cabe à Fundação verificar se as movimentações solicitadas mensalmente pelas lideranças estão dentro das regras vigentes no acordo.

A Fundação Renova encaminha todos os meses uma planilha com o descritivo das famílias, considerando as movimentações mensais solicitadas pelas associações, para a conferência dos beneficiários.

Cabe à associação realizar a prestação de contas junto à Fundação Renova, por meio da entrega de recibos/declarações. A ausência da entrega dos recibos pode acarretar a suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

#### 4.2.2. Ações transitórias

Tabela 12 - Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre

AÇÕES TRANSITÓRIAS	
	4.2.2.1-Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI

**Ações**

## 4.2.2.2-Elaboração dos Projetos de SAA Tupiniquim Guarani

## 4.2.2.1. Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI

No trimestre de referência deste relatório se destacam as seguintes atividades no território Tupiniquim e Guarani, conforme tabela a seguir:

Tabela 13 – Cronograma de Detalhamento do PBAI nas Comunidades da Comissão de Caciques.

Período	Atividade
17, 23, 25, 29, 30, 31/07, 01 e 02/08/2024	Detalhamento do Programa de Fortalecimento Institucional.

A fase de detalhamento do PBAI consiste na aplicação das metodologias previstas, considerando as oficinas, visitas técnicas e elaboração do produto em escritório. As comunidades que compõem a Comissão de Caciques definiu que o primeiro Programa a ser detalhado seria o Programa de Fortalecimento Institucional das Organizações Indígenas, visando serem fortalecidas para o desenvolvimento dos demais Programas do PBAI. O objetivo dos indígenas é que este Programa seja protocolado da FUNAI para avaliação e execução como ação antecipatória.

No mês de setembro as atividades foram suspensas, a pedido dos indígenas, sob justificativa de quantidade de agendas no território. Portanto, a empresa consultora H&P prosseguiu com as atividades de escritório.



Foto 6 – Oficina Participativa com representantes da Comissão de Caciques.



Foto 5 – Visita Técnica com representantes da Comissão de Caciques.

No que se refere as comunidades Pau Brasil, Irajá e Caieiras, o processo concorrencial, para detalhamento do PBAI, está em andamento na Fundação Renova.

#### 4.2.2.2. Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) inclui as fases de estudos geológicos, topografia, perfuração de poços, testes de vazão e de qualidade da água, georreferenciamento de imóveis elaboração de projetos conceitual, básico e detalhado, validação dos projetos junto à Comunidade, Funai e aprovação da SESAI e do DSEI, licenciamentos federais e estaduais, a contratação de empresa para implantação da rede de abastecimento, teste operacionais e por fim o repasse do SAA para a gestão do poder público.

No referido trimestre o PG03 finalizou o processo de aditivo do contrato nº 4900000688 com a empresa Hidropoços e avançou etapas significativas rumo a conclusão do SAA, dentre elas destaca-se a conclusão de três poços profundos, sendo dois deles perfurados nas comunidades Olho D'água e Pau Brasil. A partir do resultado satisfatório dos testes de vazão e de qualidade de água o projeto básico poderá ser iniciado para estas aldeias.

Entretanto, foi identificado o crescimento habitacional nas comunidades e como premissa a elaboração do projeto básico, se faz necessário atualizar o número de imóveis e a geolocalização destes. Deste modo, o PG03 iniciou o processo concorrencial para contratar o serviço. Após o levantamento desses dados daremos início ao projeto básico.

Por outro lado, com os poços concluídos no trimestre anterior nas comunidades Amarelos e Nova Esperança o projeto básico de ambas estão em fase final de elaboração com previsão de conclusão no mês de outubro de 2024.

Destaca-se, que devido ao crescimento habitacional da comunidade Amarelos a Fundação realizou o serviço de topografia complementar do terreno em 30/08/24 para subsidiar a elaboração do projeto básico, de modo, que toda as residências estejam contemplados na implantação da rede de abastecimento. Importante mencionar, que anterior a execução da referida atividade, em respeito as diretrizes da Funai e aos povos originários, a Fundação realizou a consulta a livre, prévia, informada com o Cacique da aldeia e depois

comunicou a ação as partes interessadas por meio do Ofício FR.2024.2233, de 26 de agosto de 2024.

Importante reforçar que dentre as ações estratégicas desenvolvidas para trazer agilidade e transparência as etapas que compõem o processo de construção do SAA, assim como, atender a expectativa e consultar as comunidades e suas respectivas lideranças para a realização de quaisquer atividades no território indígena, primeiramente a Fundação contextualiza a importância da ação e solicita a autorização dos caciques para seguir com o escopo planejado através dos ofícios anexos, que os convida a conhecer de forma integral das atividades de campo.

Ressalta-se, que além das estratégias com os stakeholders no período deste relatório realizou-se reuniões internas com a engenharia, infraestrutura, licenciamento, jurídico, compliance e suprimentos objetivando buscar alternativas que atrelem fluidez e prazos menores à execução dos fluxos, autorizações ambientais e sociais prevendo a definitividade do SAA.

Dentre as reuniões realizadas, destaca-se a agenda ocorrida em 13/08/24 em Brasília visando estabelecer uma comunicação assertiva com a Secretária Especial de Saúde “SESAI”, a Fundação Renova solicitou o momento para tratar das ações concluídas, em andamento e próximos passos para implantação dos SAAs Aracruz e Krenaks, prevendo favorecer o atendimento do cronograma executivo enviado à CT-IPCT, em 14/05/24 por meio do Ofício FR.2024.1266. Dentre os temas trabalhados, temos: Diretrizes governamentais para

elaboração dos projetos; tecnologias disponíveis para implantação de SAA em terras indígenas; instrumento jurídico para parcerias.

A seguir, o registro fotográfico das principais ações realizadas neste período:



Foto 7 – Teste de vazão do poço construído na comunidade Olho D'água, em 21.05.24



Foto 8 – Teste de vazão do poço construído na comunidade Pau Brasil, em 17.09.24.

#### 4.2.3. Relacionamento

A Fundação Renova reafirma seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com a participação das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho do escopo de atuação do PG03. A comunicação entre a Fundação e as comunidades indígenas é uma ação transversal que perpassa todas as fases do programa.

Nos meses de referência do relatório, a Fundação realizou diálogos referentes a todas as fases do programa.

Fase Emergencial: 1. Operacionalização do ASE (inclusão de dependentes, alterações solicitadas pelas lideranças indígenas e acompanhamento de recibos e planilhas). 2. Reunião com associações indígenas para regularização documental pendente: recibos divergentes/ausentes e declaração assinada pelos pais das crianças recém-nascidas.

Fase Transitória: 1. PBAI (retorno das atividades); 2. SAA (Amarelos e Nova Esperança - elaboração de projeto básico em andamento; Olho D'água e Pau Brasil concluído a perfuração dos poços, o teste de vazão e o resultado do teste de qualidade de água.

### 4.3. TERRA INDÍGENA KRENAK

#### 4.3.1. Ações emergenciais

Tabela 14 - Ações do eixo emergencial desenvolvidas no trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TERRITÓRIO	
4.3.1.1	Auxílio financeiro extra emergencial de Subsistência
4.3.1.2	Fornecimento de água mineral
4.3.1.3	Fornecimento de água bruta e potável
4.3.1.4	Fornecimento de suplementação bovina
4.3.1.5	Manutenção de Vias de Acesso
4.3.1.5	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)

##### 4.3.1.1. Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência

O auxílio extra emergencial é pago a 8 (oito) associações indígenas Krenak, cabendo a cada uma delas efetuar o repasse às famílias de seu grupo. Conforme previsto no acordo emergencial, cada família recebe mensalmente o equivalente a 9 (nove) vezes o valor do salário-mínimo vigente, o que totaliza R\$ 12.708,00 (doze mil, setecentos e oito reais) para cada uma das famílias.

Na Tabela 17, é demonstrado o levantamento quantitativo das famílias atendidas e o valor mensal recebido pelas associações para repasse no período de julho, agosto e setembro de 2024. No mês de setembro, foi realizada a inclusão de mais 18 famílias no pagamento do auxílio financeiro Extra Emergencial, em atendimento aos itens 1 e 2 da Deliberação CIF 692/2023.

Tabela 15 – Pagamento Financeiro Extra Emergencial às Associações Indígenas Krenak

ASSOCIAÇÃO	MÊS	Nº DE FAMÍLIAS	VALOR TOTAL
<b>ATORÃN</b>	Julho	45	R\$ 571.860,00
	Agosto	45	R\$ 571.860,00
	Setembro	54	R\$ 1.029.348,00
<b>BAKAN</b>	Julho	16	R\$ 203.328,00
	Agosto	16	R\$ 203.328,00
	Setembro	17	R\$ 388.980,00
<b>BURUM ERERRE</b>	Julho	20	R\$ 254.160,00
	Agosto	20	R\$ 254.160,00
	Setembro	21	R\$ 304.992,00
<b>KRENAK</b>	Julho	22	R\$ 279.576,00
	Agosto	22	R\$ 279.576,00
	Setembro	23	R\$ 465.228,00
<b>NAKNENUK</b>	Julho	13	R\$ 165.204,00
	Agosto	13	R\$ 165.204,00
	Setembro	13	R\$ 165.204,00
<b>NAKRERRE</b>	Julho	15	R\$ 190.620,00
	Agosto	15	R\$ 190.620,00
	Setembro	17	R\$ 292.284,00
<b>TAKRUK</b>	Julho	17	R\$ 216.036,00
	Agosto	17	R\$ 216.036,00
	Setembro	18	R\$ 266.868,00
<b>UATU</b>	Julho	33	R\$ 419.364,00
	Agosto	33	R\$ 419.364,00
	Setembro	36	R\$ 706.680,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.900,445,00</b>

#### 4.3.1.2. Fornecimento de água mineral

A Fundação Renova disponibiliza 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa por dia. O volume de água mineral distribuído considera o total de 600 (seiscentas) pessoas, conforme o Acordo Emergencial Krenak. A quantidade em litros (L) de água mineral fornecida no trimestre de julho, agosto e setembro de 2024 aos beneficiários da TI Krenak, está representado na Figura 3 e os comprovantes de entrega estão disponíveis em anexo.


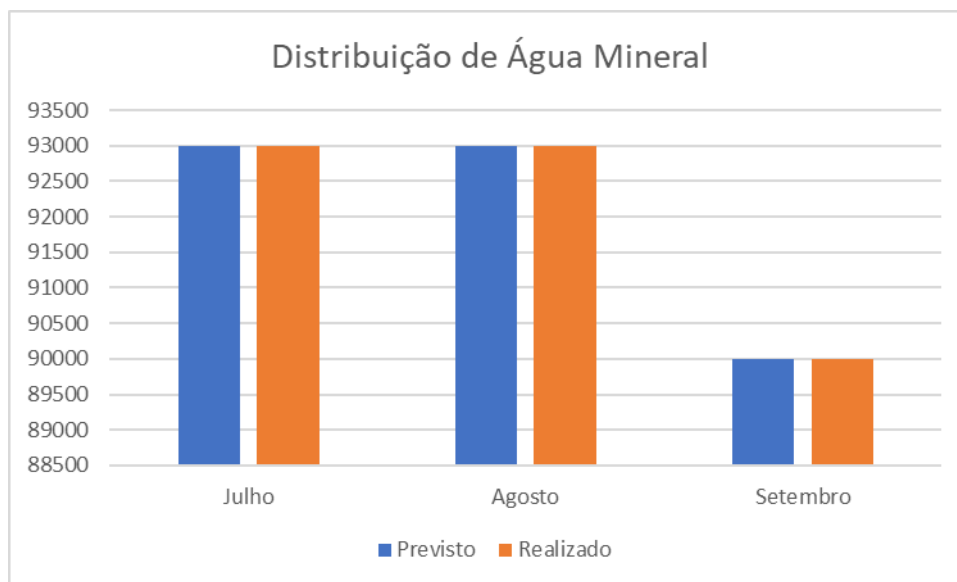


Figura 3 - Indicador de progresso para o fornecimento de água mineral na TI Krenak – julho, agosto e setembro de 2024

A localização dos pontos de entrega de água na TI Krenak são apresentados no Mapa 1

Mapa 1 - Localização dos pontos de entrega de água mineral na TI Krenak

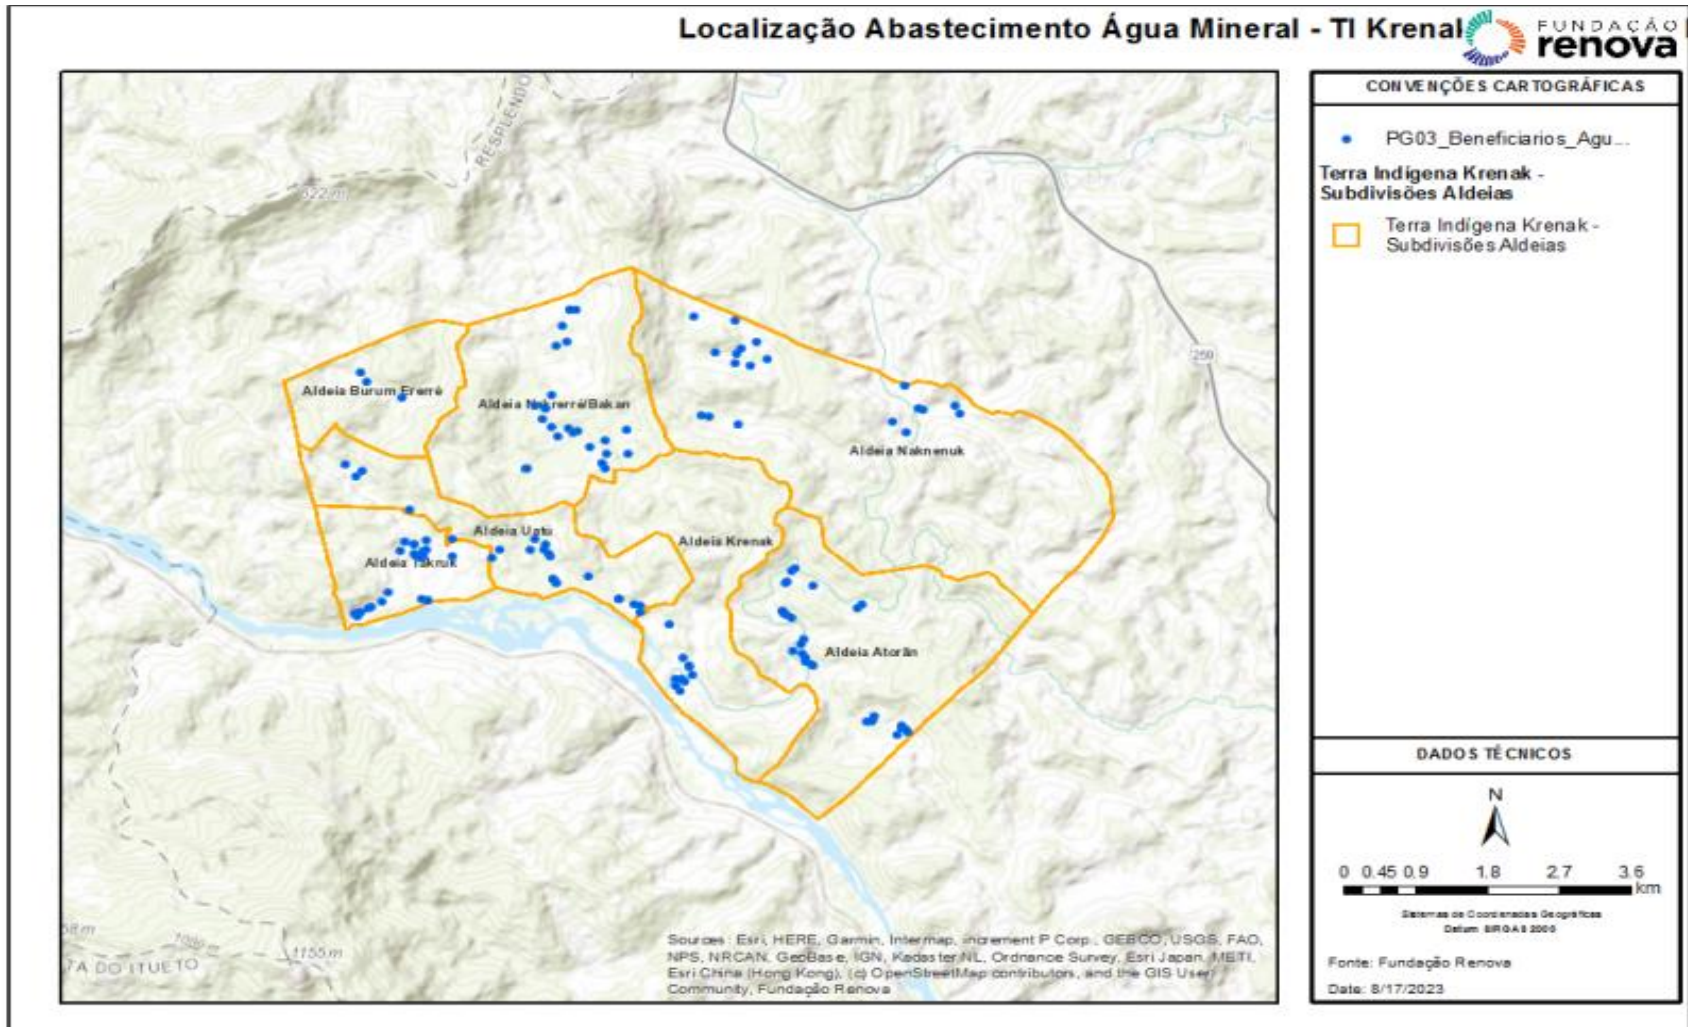

#### 4.3.1.3. Fornecimento de água bruta e potável

A distribuição de água bruta e potável é realizada na TI Krenak por meio de caminhões-pipa. O quantitativo de água potável e bruta é de 1.000 (um mil) litros (cada) ao dia, distribuídos em 142 (cento e quarenta e dois) pontos de abastecimento (potável) e em 103 (cento e três) pontos de abastecimento (bruta).

Devido a resistência da comunidade indígena quanto ao registro fotográfico do hidrômetro eletrônico (instalado no caminhão pipa) e do local de abastecimento, o que supriria a necessidade de assinatura de recibos e evitaria o contato próximo entre entregador e beneficiário, houve em maio/2020 uma alteração no formato de comprovação de abastecimento, passando a ser realizado por meio de registro fotográfico do hidrômetro antes e após a entrega de água bruta e potável na terra indígena, não sendo possível determinar com exatidão o quantitativo individual de volume de água entregue.

É importante frisar que o abastecimento de água potável é realizado sob demanda, conforme volume disponível na caixa d'água quando da reposição diária, podendo influenciar em alterações no fornecimento mensal (m<sup>3</sup>) e diferença entre o previsto e o realizado. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no Anexo 4.3.2.3.

Tabela 16 - Média do fornecimento de água bruta e potável na TI Krenak.

TIPO/MÊS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Potável (m <sup>3</sup> )	6.678	6.216	7.238
Bruta (m <sup>3</sup> )	1.509	1.366	2.099

#### 4.3.1.4. Fornecimento de suplementação bovina

A suplementação bovina consiste em: a) fornecimento mensal de 21 sacos de ração por família (total de 108 famílias); b) fornecimento mensal de alimentação volumosa, de 2,4 toneladas por família (total de 100 famílias); e c) fornecimento mensal de 3 (três) sacos de sal mineral por família (total de 100 famílias).

Tabela 17 - Suplementação bovina por mês e indicadores de progresso

PRODUTO	Nº DE FAMÍLIAS	QUANTIDADE	Julho	Agosto	Setembro
Ração	108	21 sacos*	2.268	2.268	2.268

Sal mineral	100	3 sacos**	300	300	300
Silagem de milho	100	2,4 toneladas	240	240	240

\*Cada saco contém 40 quilos;

\*\*Cada saco contém 25 quilos.

O Mapa 3 a seguir apresenta a entrega de insumos realizada no período de composição deste relatório:



#### 4.3.1.5. Manutenção das vias de acesso

As obras de manutenção nas vias do Território Krenak vêm acontecendo sob responsabilidade da empresa JC Lima, sob a gestão contratual da Infraestrutura Rio Doce.

Abaixo, fotos de atividades rotineiras de manutenção de vias no mês de julho, agosto e setembro.



Foto 9 – Área de Manutenção de Vias

Destaca-se neste trimestre o apoio logístico com o carregamento de estacas ao projeto de Recuperação de Nascentes executado pelo PG 26 – Uso Sustentável da Terra. Nesta etapa, os beneficiários estão executando as cercas ao redor das nascentes mapeadas. O PG 03 tem apoiado com o diálogo, mobilização dos participantes do projeto e demais necessidades de logística para que as ações sejam realizadas dentro do cronograma previsto.



Foto 10 - Carregamento de Estacas

#### 4.3.1.6. Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referente do monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço é <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>, no qual estão disponíveis o boletim trimestral de lagoas, zona costeira e estuários e o boletim mensal de rios. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma online interativa.

Conforme apresentado, o ponto de monitoramento em Resplendor (MG) próximo a essa Terra Indígena é o Ponto RDO 10, localizado na margem direita do rio Doce, em Resplendor (Coordenadas UTM: 263318,88 leste/ 7861251,39 norte/zona 24 k).

#### 4.3.2. Ações transitórias

O ECI está paralisado desde maio de 2017. O plano de trabalho (PT) do ECI elaborado pela consultoria independente foi protocolado na Funai e aprovado pelo órgão indigenista em fevereiro de 2017, Ofício nº 5/2017/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. Contudo, não foi aprovado pela comunidade indígena Krenak em reunião realizada maio de 2017. Desde então, não houve avanço nas tratativas referentes ao ECI.

Mediante a necessidade de se realizar o Estudo Circunstanciado de Impacto Krenak e que este atenda às necessidades e especificidades da comunidade, a Fundação Renova solicitou e aguarda o Termo de Referência que deve ser emitido pela FUNAI, este será o documento balizador das atividades de identificação, detalhamento e Plano de Ação Permanente, no âmbito do processo de reparação de impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.

#### 4.3.2.2. Elaboração de projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água

Por meio de diálogo, a Fundação Renova tem realizado conversas sobre o assunto e solicitado reuniões com a comunidade para tratar sobre o tema. Trata-se de uma ação transitória para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em 2015 na comunidade indígena Krenak.

Dentre as reuniões realizadas, destaca-se a agenda ocorrida em 13/08/24 em Brasília visando estabelecer uma comunicação assertiva com a Secretária Especial de Saúde “SESAI”, a Fundação Renova solicitou o momento para tratar das ações concluídas, em andamento e próximos passos para implantação dos SAAs Krenak e Aracruz. Dentre os temas trabalhados, estão: Diretrizes governamentais para elaboração dos projetos; tecnologias disponíveis para implantação de SAA em terras indígenas; instrumento jurídico para parcerias.

#### 4.3.3. Ações estruturantes

##### 4.3.3.1. Recuperação de nascentes e áreas degradadas

O apoio ao projeto de Recuperação de Nascentes englobou não apenas a logística para transportar materiais às áreas de construção de cercas em regiões de difícil acesso, mas também o diálogo constante com os envolvidos no projeto. Os beneficiários estão recebendo os materiais necessários para construir as cercas para proteção das nascentes. No período entre julho e setembro de 2024 foram realizados 1.107 metros de cercas.

#### 4.3.4. Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho do escopo de atuação do PG03. A comunicação entre Fundação e comunidades indígenas é uma ação transversal que perpassa todas as fases do programa.

Foram realizadas idas a campo periódicas e diálogo direto com a comunidade indígena para esclarecimentos sobre as ações da Fundação Renova e garantindo que seja respeitado o protocolo de consulta Krenak.

### 3. AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE

Tabela 18 - Cronograma das Próximas Atividades

TERRA INDÍGENA	EIXO	AÇÃO	DETALHAMENTO
COMBOIOS	Emergencial e Transitórias	Distribuição de água mineral	A distribuição ocorre nas comunidades de Córrego do Ouro e Comboios
		Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)	Segue mantida para o próximo trimestre.
		Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	Monitoramento que ocorre na estação de tratamento de água de Aracruz. Passará a ocorrer em outros 3 pontos distribuídos nas aldeias Comboios e Córrego do Ouro
		Auxílio de Subsistência Emergencial	Pagamento das Famílias.
		Detalhamento do PBAI	Realização de oficinas participativas para detalhamento dos programas do PBAI.
		SAA – Sistema de Abastecimento de Água	Elaboração do projeto básicos de Comboios. Envio dos dados de perfilagem do poço de Córrego do Ouro para subsidiar a aprovação do projeto detalhado pela SESAI-DSEI.
		TUPINIQUIM GUARANI	Emergencial
Transitório	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)		Monitoramento que ocorre na estação de tratamento de água de Aracruz. Passará a ocorrer em outros 9 pontos distribuídos nas aldeias Olho D'água, Nova Esperança, Pau Brasil e Amarelos.
	SAA – Sistema de Abastecimento de Água		Apresentação do projeto básico para as comunidades Amarelos e Nova Esperança e na sequência a elaboração do projeto detalhado de ambas aldeias. Levantamento dos imóveis de Pau Brasil e Olho D'água
	Detalhamento do PBAI		Realização de oficina participativa de detalhamento dos Programas do PBAI.

KRENAK	Emergencial	Auxílio Financeiro Extra Emergencial	Pagamento do auxílio financeiro extra emergencial contínua.
		Fornecimento de Água Mineral	Segue prevista a continuidade, para o próximo trimestre, do fornecimento de água mineral para o povo Krenak, de 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa por dia, para 600 (seiscentas) pessoas.
		Fornecimento de Água Bruta e potável	A distribuição de água bruta e potável será mantida na TI Krenak no próximo trimestre.
		Fornecimento de Suplementação Bovina	O fornecimento de suplementação bovina alimentar segue mantido para o próximo trimestre.
		Manutenção de vias de acesso	A manutenção das vias de acesso à Terra Indígena Krenak será mantida para o próximo trimestre, tendo em vista a viabilização do tráfego regular dos caminhões-pipa.
		Implantação de cisternas de captação de água de chuva	Implantação de 120 cisternas de placas nos moldes dos programas governamentais.
		Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)	Segue mantida para o próximo trimestre.
		Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	Segue mantida para o próximo trimestre (conforme a retomada parcial), através da manutenção da frequência de coleta e parâmetros analisados.
	Estruturante	Recuperação de Nascentes	Houve o retorno do projeto de recuperação de nascentes, a execução das áreas mapeadas continua para o próximo trimestre.

		SAA – Sistema de Abastecimento de Água	Permanecer com o diálogo e tratativas para elaboração do projeto de sistema de abastecimento de água potável para atendimento das oito aldeias que formam a Terra Indígena Krenak.
--	--	--	--
