

FUNDAÇÃO  
**renova**

**PROJETOS AGROEOLÓGICOS DO ESPÍRITO  
SANTO E MINAS GERAIS NOS ASSENTAMENTOS  
DA REFORMA AGRÁRIA DA BACIA DO RIO DOCE.**

Relatório de avanço físico e financeiro – Ações realizadas até dezembro de 2023.

**Dezembro de 2023**

## 1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO.

Este relatório tem o objetivo de apresentar os avanços físicos e financeiros dos projetos agroecológicos do Espírito Santo e Minas Gerais nos Assentamentos da Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce.

## 2. QUADRO RESUMO – PROJETOS APROVADOS PELA DELIBERAÇÃO CIF 343/2019

Programa		Cláusula	UF	Parceiro	Ação	Projetos	Valor total (R\$)	Prazo
18	Diversificação Econômica	Compensatório	MG	CONCENTRA	Desenvolvimento da cadeia produtiva da Fruticultura	Projeto Original	R\$ 4.200.000,00	36 meses
						Aditivo	R\$ 1.499.018,11	
		cls.129 e 130	ES	COOPTERRA	Desenvolvimento das cadeias da Pimento do Reino, Café e Fruticultura	Projeto Original	R\$ 2.696.848,34	30 meses
						Aditivo	R\$ 998.251,03	
<b>Total</b>							<b>R\$ 9.394.117,48</b>	

### **3 – EIXO PRODUTIVO\_DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA.**

Com o objetivo de promover o fomento a diversificação da produção, inserção de tecnologias sociais agrícolas e definição de uma estratégia de comercialização dos produtos (café, pimenta e frutas), o programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica atua diretamente nas cadeias produtivas de interesse dos assentados. São realizados investimentos em áreas produtivas, infraestrutura e assistência técnica especializada e em estratégia de comercialização necessárias para desenvolvimento dessas cadeias.

#### **3.1. PROJETO AGROEOLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO.**

Instituição:	COOPTERRA (Cooperativa de Beneficiamento, Comercialização e Prestação de Serviços dos Agricultores Assentados)
Vigência:	30 meses
Valor Final:	R\$ 3.695.099,37

O valor de R\$ 3.695.099,37 foi aprovado por meio de Deliberação CIF nº 600, de 05 de agosto de 2022 e NOTA TECNICA CONJUNTA Nº 0104/2022 CT-EI. O aditivo de valor possui acréscimo de R\$ 998.251,03, em relação ao projeto original.

##### **➤ Objetivo Geral da Parceria:**

O objetivo da parceria foi de fomentar a diversificação da produção e a inserção de tecnologias sociais agrícolas, no intuito de elevar o grau de desenvolvimento e da geração de renda nos assentamentos do norte capixaba.

##### **➤ Objetivo Específico:**

- Implantação e renovação de 80 hectares de café variedade conilon;
- Instalação de unidades de beneficiamento de café e pimenta do reino;
- Apoio a melhorias de infraestrutura físicas existentes, aquisição e instalação de equipamentos para beneficiamento de café e pimenta do reino;
- Assessoria técnica especializada nas cadeias produtivas do café, pimenta do reino para as famílias assentadas participantes do projeto;

- Qualificar/potencializar os processos de comercialização dos produtos dos assentados;

➤ **Assentamentos Atendidos:**

- Projeto mobilizou 580 famílias de 10 assentamentos no norte capixaba.

ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO	ESTADO	Nº FAMILIAS
1. Nova Esperança	Aracruz	ES	50
2. Piranema	Fundão	ES	65
3. Georgina	São Mateus	ES	81
4. Vale da Vitória	São Mateus	ES	39
5. Pratinha	São Mateus	ES	17
6. Zumbi dos Palmares	São Mateus	ES	151
7. Valdício Barbosa dos Santos	Conceição da Barra	ES	89
8. Paulo Vinhas	Conceição da Barra	ES	63
9. Independência	Conceição da Barra	ES	10
10. Chapadão do Rio Quartel*	Linhares	ES	15
<b>TOTAL</b>			<b>580</b>

➤ **Execução de Metas, conforme item 12 – Plano de Trabalho.**

Projeto iniciado em 30 de outubro de 2020, durante período de pandemia com restrições de atividades de campo, sendo necessário realizar alterações no cronograma físico de atividades de forma a realizar as etapas de engajamento do público, após autorização das autoridades públicas e Fundação Renova

Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
Oportunizar a participação de 100% das famílias dos assentamentos beneficiários com engajamento de pelo menos 33 % das famílias.	Realização de reuniões de apresentação do projeto e cadastramento das famílias participantes	Lista de Presença e relatório.	100%
	Realização de um diagnóstico rural participativo de cada família cadastrada e produção de um relatório-síntese de cada assentamento.	Diagnóstico.	

Foram realizadas reuniões de apresentação do projeto com público reduzido para evitar aglomerações, atendendo os 09 assentamentos e após aprovação do aditivo, foi incluindo o Assentamento Chapadão do Rio Quartel em substituição do Assentamento Sezínio que obteve manifestação de não interesse em participação das famílias.

Nesses eventos feitas apresentações sobre o conceito e a importância da organização das cadeias produtivas do café e da pimenta do reino nos assentamentos. Na sequência foi realizado a apresentação completa do projeto, critérios de participação, seguindo com a adesão e cadastramento das famílias participantes e a organização destas em grupos.

As reuniões tiveram a duração de em torno de 01 horas (respeitando todos os protocolos de combate a pandemia), e para participar do projeto os interessados buscou-se enquadrá-lo nos seguintes critérios. A participação das famílias ocorreu por meio da comprovação de que a família é formalmente assentada pelo INCRA ou Secretaria de Estado a agricultura.

## Reuniões de apresentação, cadastramento de famílias e planejamento das ações

Atividades realizadas no contexto da pandemia – reuniões com pequenos grupos, mantendo o distanciamento, ao ar livre



Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
Implantar 80 hectares de plantio de mudas de Café conilon de variedades melhoradas geneticamente em 10 assentamentos.	Elaboração dos projetos técnicos de plantio de mudas de café.	Lista de Presença	100%
	Implantação dos projetos de plantios de café	Termo de Adesão	

Foram elaborados projetos técnicos de plantio de mudas de café correspondente ao total de 80 hectares de café de acordo com a distribuição em cada assentamento, contemplando as atividades de identificação das áreas, coleta e análise de solo, determinação de espaçamento, coveamento, adubação de base.

Em paralelo, ocorreram assitências técnicas especializadas nas cadeias e capacitações com as famílias assentadas participantes do projeto sobre o tema de manejo sustentável de lavouras e beneficiamento de café e pimenta do reino com foco na qualidade da produção.

No total foram realizadas 02 capacitações em cada assentamento e 01 no Rio Quartel, totalizando 19 capacitações e 492 horas de assessorias técnicas realizadas.

**Assessoria técnica especializada nas cadeias produtivas do café, pimenta do reino para as famílias assentadas participantes do projeto;**

Assentamento	Horas ATER/Assent
Georgina	36:04
V. Vitória	50:40
Pratinha	21:00
Zumbi	80:00
P. Vinhas	57:00
Valdicio	66:20
Independência	54:30
N. Esperança	39:00
Piranema	56:00
Rio Quartel	32:00
<b>Total</b>	<b>492:00</b>

**Principais temas abordados**

- ✓ Orientações sobre preparo de solo, instalação de irrigação, plantio de café, manejo de lavouras, poda e desbrota, nutrição, controle fitossanitário



O projeto forneceu insumos básicos para o plantio ( mudas de café clonal, corretivo de solo, matéria orgânica e adubos), além dos serviços de análise e preparo de solo. No total foram entregues 266.640 plantas para 168 famílias que fizeram opção de implantar lavouras de café.


**Objeto do Projeto**

Implantação e renovação de 80 hectares de café variedade conilon;

ASSENTAMENTO	FAMÍLIAS	HECTARES	PLANTAS
Zumbi dos Palmares	38	16	53.328
Valdicio Barbosa	34	12	39.996
Independência	06	04	13.332
Piranema	19	06	19.998
Nova Esperança	03	03	9.999
Paulo Vinhas	19	05	16.665
Pratinha	06	05	16.665
Vale da Vitoria	12	08	26.664
Georgina	22	16	53.328
Chapadão do Rio Quartel	09	05	16.665
<b>Total</b>	<b>168</b>	<b>80</b>	<b>266.640</b>

➤ **Quadro por assentamento.**

## Implantação e renovação de 80 hectares de café variedade conilon

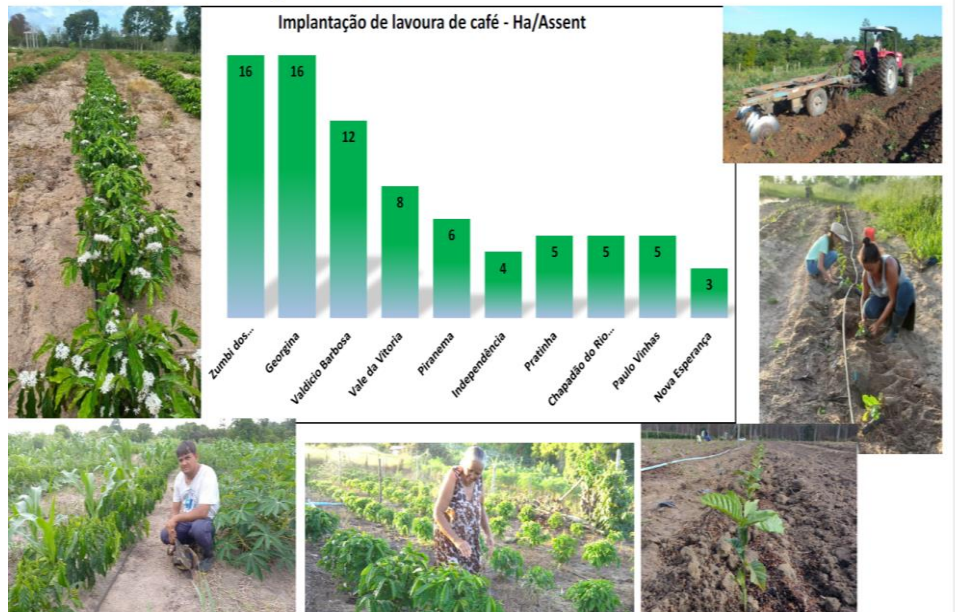

Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
Agregar valor à produção de café e pimenta do reino produzidos nos assentamentos.	Elaboração de Projeto Executivo de Obra - Unidade Valdício Barbosa	Projeto de Obra	100%
	Implantação das unidades de beneficiamento de café e pimenta	Instalação das Unidades	
	Instalação dos equipamentos de beneficiamento de café e Pimenta do Reino nos assentamentos.	Compra e Instalação dos equipamentos	

Todas as unidades receberam equipamentos, máquinas e desembolso para contratação de licenciamento ambiental e alvará de funcionamento.

### ➤ **Unidade de Beneficiamento Café e Pimenta do Reino.**

A Implantação da maior de unidade de beneficiamento de café e pimenta do reino no Assentamento Valdício Barbosa dos Santos em Conceição da Barra, foi escolhido pela importância do número de famílias do assentamento e pela quantidade da produção já existente, foram investidos o total de R\$ 890.958,76.

### Unidade de Beneficiamento de Café e Pimenta do Reino Assent. Valdício Barbosa

QUAN T.	ITENS
2	Secador Rotativo para Café comp (7.500 litros)
1	1 Silo Alimentador (7.500 litros) Secador Rotativo
1	Silo Armazenador de Café (7.500 litros)
1	Elevador de café Tubular 10m altura
1	Transportador Tubular (10 m)
1	Sariador (Elevador) para sacos
1	Esteira transportadora de sacos 6 mt + frete
1	Descascador de amostras de grãos
1	Secadores de Inox para Pimenta (3,3 mil litros)
1	Debulhadeira para Pimenta do reino com Rosca sem fim
1	Elevador tubular 10 mt alt. para Pimenta
1	Medidor de Umidade de Grãos com balança e termômetro digital incorporados.
2	Balança digital com plataforma sem coluna capacidade 300 kg



### ➤ Unidades de Beneficiamento de Pimenta do Reino.

As unidades de Paulo Vinhas em Conceição da Barra, Zumbi dos Palmares em São Mateus e Piranema em Fundão receberam adequação as instalações (galpões) já existentes, com aquisição de secadores de pimenta do reino e licenciamento ambiental para o funcionamento, totalizando investimento de R\$ 400.640,47.

### ➤ Unidade Zumbi dos Palmares;

#### Apoio à instalação de Pimenta do Reino Assentamento Zumbi dos Palmares




QUANT.	ITENS
2	Secador de Inox para Pimenta (3,3 mil litros)
1	Debulhadeira para Pimenta do reino com Rosca sem fim
1	Elevador tubular 10 mt alt. para Pimenta
1	Medidor de Umidade de Grãos com balança e termômetro digital incorporados.
1	Balança digital com plataforma sem coluna capacidade 300 kg
1	Descascador de amostra de grãos de café



➤ **Unidade Paulo Vinhas;**

<b>Unidade de Beneficiamento de Pimenta do Reino</b>	
<b>Assentamento Paulo Vinhas;</b>	

QUANT.	ITENS
1	Secador de Inox para Pimenta (3,3 mil litros)
1	Debulhadeira para Pimenta do reino com Rosca sem fim
1	Maquina de pré - limpeza
1	Medidor de Umidade de Grãos com balança e termômetro digital incorporados.
1	Balança digital com plataforma sem coluna capacidade 300 kg

➤ **Unidade Piranema;**

<b>Apoio à instalação de Pimenta do Reino Assentamento Piranema</b>	
---	--

QUANT	ITENS
1	Secador de Inox para Pimenta (3,3 mil litros)
1	Debulhadeira para Pimenta do reino com Rosca sem fim
1	Maquina de pré – limpeza
1	Medidor de Umidade de Grãos com balança e termômetro digital incorporados.
1	Balança digital com plataforma sem coluna capacidade 300 kg





<b>Meta</b>	<b>Atividade</b>	<b>Meio de Verificação</b>	<b>Executado</b>
-------------	------------------	----------------------------	------------------

Realização de duas reuniões de planejamento da comercialização e construção do arranjo instrucional a ser adotado pelos grupos participantes do projeto junto à COOPTERRA.	Reuniões realizadas	Lista de Presença e Relatório	100%
--	---------------------	-------------------------------	------

Foram realizadas 02 reuniões de planejamento da comercialização com representação dos participantes do projeto. Na oportunidade foram abordados temas como: tendências de mercado e de preços, estratégias de comercialização, políticas de governança da COOPTERRA e seu papel no processo de comercialização dos produtos dos assentados e os aspectos legais para vinculação das pessoas ou grupos na cooperativa para garantir o processo de comercialização de seus produtos.

**Qualificar/potencializar os processos de comercialização dos produtos dos assentados**

Duas atividades realizadas, abordando sobre o mercado do café e pimenta do reino, plano safra 2023/24 e o acesso às políticas públicas pelas famílias assentadas, associações e cooperativa enquanto instrumento de organização das famílias



Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
------	-----------	---------------------	-----------

Realizar 02 reuniões de avaliação e monitoramento durante a execução do projeto.	Reuniões realizadas	Lista de Presença e Relatório	100%
--	---------------------	-------------------------------	------

Foram realizadas duas reuniões de avaliação do projeto entre a Coopterra e a Fundação Renova, ao qual realizaram considerações de cada etapas, avaliações documentais referentes as obrigações contratuais e de execução, resultados tangíveis e intangíveis do projeto entre outros pontos abordados.



### ➤ Execução Financeira.

Execução financeira aprovada em medição, após apresentação dos comprovantes de compras, fotos de equipamentos adquiridos e instalados, por etapas e porcentagem de avanço, fotos e demais evidências comprobatórias.

Resumo da Execução financeira					
Valor Repassado	R\$ 3.695.099,37	Valor executado	R\$ 3.694.636,61	% de Avanço	100%

## ➤ **Resultados Preliminares.**

Os resultados preliminares com o funcionamento das primeiras unidades de beneficiamentos inauguradas são importantes para relevância do projeto para o desenvolvimento econômico da região, sendo elas:

Unidade de beneficiamento Zumbi dos Palmares beneficiou 20.000 kg de pimenta do reino, com faturamento aproximado de 260.000,00 e a unidade de Piranema beneficiou 13.200 kg em 2023, com faturamento de R\$ 171.600,00. A unidade Valdício Barbosa em seu primeiro ano beneficiou 2.000 sacas de cafés, com faturamento aproximado de 1.230.000,00.

Todavia, o volume de produção das famílias assentadas que são comercializados pela COOPTERRA, instrumento jurídico de negociação e comercialização ainda é bem pequeno frente ao volume de produção existente nos assentamentos, não ultrapassando as 10 mil sacas de café e 200 toneladas de pimenta do reino anualmente.

## **3.2 PROJETO AGROEOLÓGICO DO MINAS GERAIS.**

Instituição:	CONCENTRA (Cooperativa Camponesa Central de Minas Gerais)
Vigência:	36 meses
Valor Final:	R\$ 5.942.774,41

O valor de R\$ 5.942.774,41 foi aprovado por meio de Deliberação CIF nº 721, de 28 de Setembro de 2023. O aditivo de valor possui acréscimo de R\$ 1.499.018,11, em relação ao projeto original.

## ➤ **Objetivo Geral da Parceria:**

O objetivo da parceria é contribuir para revitalização de forma ampla (ambiental, produtiva, econômica, social e cultural) nos assentamentos da reforma agrária atingidos na região por meio do fortalecimento das cadeias produtivas de frutíferas adaptadas à região do Vale do Rio Doce, por meio incentivo à produção, promoção ao cooperativismo, conscientização e qualificação dos produtores e beneficiamento da matéria prima gerada.

➤ **Objetivo Específico:**

- Executar planejamento e contratar plano de negócios;
- Mobilizar das famílias assentadas;
- Elaborar de Projetos de Fomento Produtivo;
- Relatório Técnico de Espécies Frutíferas Potenciais para a Implantação de Pomares Agroecológicos nos Municípios de Tumiritinga e Periquito na Bacia do Rio Doce em Minas Gerais
- Integrar das famílias e capacitação;
- Acompanhar da implantação dos projetos de fomento produtivo;
- Elaborar execução do projeto de agroindústria;
- Acompanhar operacional da agroindústria;
- Realizar seminário de encerramento do Projeto.

➤ **Assentamentos Atendidos:**

- Projeto mobilizou 151 famílias de 5 assentamentos.

ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO	ESTADO	Nº FAMILIAS
Liberdade	Periquito	MG	36
Terra Prometida	Tumiritinga	MG	30
Águas da Prata I	Tumiritinga	MG	13
Águas da Prata II	Tumiritinga	MG	15
1º de Junho	Tumiritinga	MG	58

<b>TOTAL</b>	<b>151</b>
--------------	------------

➤ **Execução de Metas, conforme item 8 – Plano de Trabalho.**

Projeto em execução, iniciado em 02 de setembro de 2021, com a estruturação da equipe e planejamento das atividades para início de atuação nos cinco assentamentos mineiros de Tumiritinga e Periquito, beneficiando famílias assentadas para implementação de pomares de frutas, aos quais recebem mudas, equipamentos, insumos, além de assistência e capacitação para manejo adequado das culturas; e, em Governador Valadares, também em Minas Gerais, encontra-se em andamento a construção da Agroindústria de beneficiamento de frutas e alimentos minimamente processados.

<b>Meta</b>	<b>Atividade</b>	<b>Meio de Verificação</b>	<b>Executado</b>
1.Elaboração do Plano de Negócios da agroindústria	Contratar Plano de Negócios	Plano de negócio	100%

O Plano de Negócios foi finalizado em 29/11/2021, tendo sido cumprido todo o cronograma estabelecido, sendo entregue as análise de viabilidade do negócio do ponto de vista legal, social, ambiental, tecnológico, mercadológico e financeiro, com entrega de parecer técnico de viabilidade de negócio.

<b>Meta</b>	<b>Atividade</b>	<b>Meio de Verificação</b>	<b>Executado</b>
2. Realização de seminários de apresentação do projeto e critérios de participação das famílias beneficiárias.	Famílias mobilizadas para a recuperação ambiental dos assentamentos.	Relatório dos seminários.	100%
3. Inscrição das famílias beneficiárias.	Cadastro das famílias.	Ficha de Cadastro	

Iniciado processo em paralelo de mobilização das famílias com a realização dos primeiros seminários nos assentamentos, sendo: 01 no Assentamento Águas da Prata I , 01 no

Assentamento Águas da Prata II, 03 divididos no Assentamento Primeiro de Junho, 01 no Assentamento Terra Prometida e 01 no Assentamento Liberdade, todos devidamente comprovados com a elaboração dos relatórios com fotos e lista de presença.



Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
4 Elaboração de Projetos de Fomento Produtivo;	Realizar Diagnósticos	Diagnóstico.	100%
	Elaboração de Projetos Executivos	Projetos	

Durante os inscrições, 173 famílias assentadas foram mobilizadas e no decorrer do processo de elaboração dos projetos executivos, aplicação dos diagnósticos, implantação dos pomares entre outras etapas, ocorreram desistências de famílias relacionadas ao não interesse em trabalhar no ramo de fruticultura. Sendo assinado 22 termos de desistência e totalizando o universo de 151 famílias que participam atualmente do projeto.

DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DA PROPRIEDADE - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE - Contrato nº 4800059280

Projeto executivo de fomento produtivo individual referente ao projeto de Implementação da Cadeia Produtiva Da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária Da Bacia do Rio Doce.

Nº Contrato/Parceria 4800059280

NOME DO ASSISTIDO: Levi Gonçalves Nunes

ASSENTAMENTO: Águas da Prata II

NÚMERO DO LOTE: 06

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: La: 18°57'49.87"S/ Lo:41°44'7.24"O

TAMANHO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 2.335m<sup>2</sup>

APRESENTAÇÃO

O Projeto de Apoio a produção nos assentamentos de reforma agrária de Minas Gerais na Bacia do Rio Doce tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental equilibrado nos assentamentos localizados na bacia do rio Doce, através da organização de cadeia produtiva da fruticultura, proporcionando uma diversificação no plantio e aumento na geração de renda. O projeto de fomento produtivo prevê beneficiar cerca de 173 famílias de assentamentos de reforma agrária na região. As ações previstas são desde a implantação de unidades de produção de frutas, diagnósticos individuais para se levantar as demandas, cursos de capacitação e troca de experiências.

A - IDENTIFICAÇÃO						
BENEFICIÁRIO (A)	Maria Imaculada de Oliveira				Nº LOTE	003
ASSENTAMENTO	Terre Prometida		LOCALIZAÇÃO DO LOTE	LAT.	18°58'32.65"S	
ÁREA DO LOTE				LONG.	41°41'08.44"O	
DATA	26/01/22	APLICADOR	Levi Hupelwina			

B - CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR					
1. COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR X RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES PRODUTIVAS					
Nº	PARENTESCO	IDADE	RENDA MÉDIA MENSAL (LOTE)	RENDA MÉDIA MENSAL (EXTERNO)	HORAS DIÁRIAS DE TRAB. NO LOTE
1	Maria Imaculada	55 anos			4h
2	Robiano Adriano	33 anos			4h
3					
4					

Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
5. Integração das famílias e capacitação;	Seminários de Integração	Relatório e Lista de Presença.	90%
	Capacitações		



As atividades coletivas tiveram objetivos de apresentar a metodologia do projeto, com as etapas da implantação de pomares de frutas e instalação dos sistemas de irrigação instalados, análise, preparo de solo e plantio de 5 mil mudas de frutas e mais 5 mil a se plantar. Ocorreram também capacitações para manejo, técnicas e orientações às famílias quando da fruticultura e instalação dos quintais. Os seminários ocorreram ao longo do segundo semestre de 2023 e iniciaram as etapas de 2024, com

acompanhamento das famílias.



Foram realizados 10 seminários de troca de experiências e capacitação em atividades produtivas de fruticulturas, Sistemas Agroflorestas - Safs, Consorciação, tecnologias alternativas e irrigação envolvendo as famílias participantes ao longo dos assentamentos.

Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
6. Acompanhamento da implantação dos projetos de fomento produtivo;	Atividade de campo	Relatório e Lista de Presença.	70%



No total foram investidos em R\$ 10.000,00 por famílias para implantação dos pomares com aquisição de equipamentos para irrigação, adubos e mudas de frutas, sendo o total de 70 hectares de pomares em Tumiritinga e Periquito Minas Gerais.

As atividades de acompanhamento aos quintais produtivos e apoios as famílias estão em

andamento, sendo executadas as entregas de mudas durante o segundo semestre de 2023 com apoio para o plantio.

Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
7. Elaboração execução do projeto de agroindústria;	Contratação de Empresa Executora	Projeto Executivo	100%
8. Acompanhamento operacional da agroindústria;	Acompanhamento de Obra	Relatório de avanço	90%



A obra possui investimento de R\$ 1.998.163,06 com previsão de inauguração em fevereiro de 2024, no assentamento Oziel Alves Pereira em Governador Valadares/MG.

A agroindústria de frutas e mini processados terá capacidade produtiva processamento de 600 kg de frutas por hora para comercialização dos produtos de valor agregado com mercado local e regional.

Em agosto de 2023, foi concluído o curso de capacitação com foco na formação de assentados de total de 240 horas em gestão de agroindústria, com ênfase no beneficiamento de frutas e assistência técnica para fortalecimento da atividade da cooperativa e dos assentados.



Meta	Atividade	Meio de Verificação	Executado
9. Seminário de encerramento do Projeto.	Realização de seminário	Relatório e lista de presença.	0%

Atividade ainda não realizada, estamos programada para finalização do projeto previstas para julho de 2024.

### ➤ Execução Financeira.

Projeto se encontra no 8º trimestre de medição com as execuções financeiras aprovadas em medição, após apresentação dos comprovantes de compras, fotos de equipamentos adquiridos e instalados, por etapas e porcentagem de avanço, fotos e demais evidências comprobatórias.

Resumo da Execução financeira					
Valor Repassado	R\$ 3.678.256,81	Valor executado	R\$ 3.678.251,03	% de Avanço	99%

