





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
625	Planejamento da Execução	17/06/16	21/02/17																		
626	Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais	21/02/17	26/11/19																		
627	Encerramento do Projeto	26/11/19	24/02/20																		
628	PF0142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e)	15/06/16	25/05/20																		
631	Avaliação de Alternativas	15/06/16	10/01/17																		
632	Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (URTs)	11/01/17	09/01/18																		
633	Planejamento da Execução	10/01/18	05/06/18																		
634	Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda	06/06/18	25/02/20																		
635	Encerramento do Projeto	25/02/20	25/05/20																		
636	PF0143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo)	27/06/16	19/11/20																		
639	Avaliação de Alternativas	27/06/16	10/03/17																		
640	Definição do Escopo	13/03/17	14/07/17																		
641	Planejamento da Execução	17/07/17	17/11/17																		
642	Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas	20/11/17	21/08/20																		
643	Encerramento do Projeto	21/08/20	19/11/20																		
644	Processos de Monitoramento e Manutenção	11/11/15	21/08/22																		
645	Processo de fornecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j)	11/11/15	21/08/20																		
646	Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PF0143)	12/08/16	21/08/22																		
647	Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa)	24/08/20	23/07/21																		
648	Encerramento do Programa	21/08/22	19/11/22																		
650	PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 à 131)	30/09/16	31/12/30																		
653	Definição do Programa	30/09/16	16/10/17																		
654	Contratação do Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas	30/09/16	30/09/16																		
655	Conclusão do Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econômicas	01/08/17	01/08/17																		
656	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	16/09/17	16/09/17																		
657	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	16/10/17	16/10/17																		
658	Execução do Programa	17/10/17	31/12/30																		
659	Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)	17/10/17	31/12/30																		
660	Encerramento do Programa	02/10/30	31/12/30																		
662	PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)	29/12/15	20/06/20																		
666	Definição do Programa	30/10/16	23/03/17																		

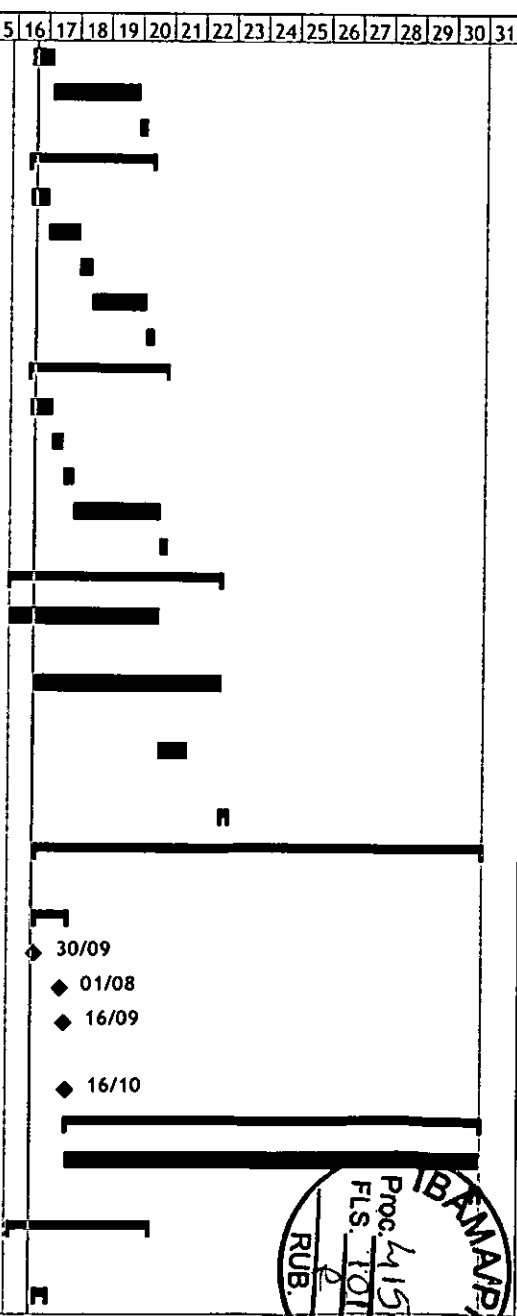


EM BRANCO





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
667	Contratação do Estudo de Recuperação de micro e pequenos negócios	30/10/16	30/10/16			◆	30/10													
668	Conclusão do Estudo de Recuperação de micro e pequenos negócios	17/02/17	17/02/17			◆	17/02													
669	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	08/03/17	08/03/17			◆	08/03													
670	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	23/03/17	23/03/17			◆	23/03													
671	Execução do Programa	29/12/15	22/03/20																	
672	Processo de recuperação de micro e pequenos negócios	29/12/15	22/03/20																	
673	Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	29/12/15	23/03/17			■														
674	Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	23/03/17	25/07/18				■													
675	Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (36 meses após Formalização do Programa)	23/03/17	22/03/20				■													
676	Encerramento do Programa	22/03/20	20/06/20																	
678	PG020-G-Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)	11/11/15	31/12/30																	
681	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16			■														
682	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16			◆	30/09													
683	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16			◆	30/10													
684	Execução do Programa	11/11/15	31/12/30																	
685	Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	11/11/15	03/10/16			■														
686	Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)	03/10/16	31/12/30				■													
687	Encerramento do Programa	02/10/30	31/12/30																	
689	PG021-R-Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 à 140)	11/11/15	26/09/20																	
692	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16			■														
693	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16			◆	30/09													
694	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16			◆	30/10													
695	Execução do Programa	11/11/15	28/06/20																	
696	Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)	11/11/15	28/06/20			■														
697	Encerramento do Programa	28/06/20	26/09/20																	
699	PG022-R-Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos (Cláusula 144) - Tratado no PG0	11/11/15	13/11/30																	
700	PG042-R-Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (Cláusulas 141 à 143)	28/06/16	30/12/17																	
703	Definição do Programa	28/06/16	31/12/16			■														
704	Definição e Formalização do Programa junto ao CIF	28/06/16	31/12/16			■														




EM BRANCO





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
705	Execução do Programa	01/01/17	30/12/17																		
706	Ressarcimento dos COMPROMITENTES	01/01/17	30/12/17																		
707	Encerramento do Programa	01/10/17	30/12/17																		
709	Programas Socioambientais	11/11/15	31/12/30																		
710	PG023-R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160)	29/12/15	25/06/26																		
717	Definição do Programa	28/02/16	24/04/17																		
718	Emissão do Plano de Recuperação Ambiental	28/02/16	28/02/16																		
719	Emissão dos Estudos Biogeoquímico, Geomorfológico e Hidrosedimentológico	30/06/16	30/06/16																		
720	Emissão das Diretrizes Iniciais de Manejo de Rejeito	29/07/16	29/07/16																		
721	Conclusão da Avaliação de Risco Ecotoxicológico	30/12/16	30/12/16																		
722	Validação do Plano de Recuperação Ambiental após conclusão dos estudos	30/03/17	30/03/17																		
723	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	09/04/17	09/04/17																		
724	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	24/04/17	24/04/17																		
725	Execução do Programa	29/12/15	27/03/26																		
726	Ações emergenciais	30/12/15	29/07/16																		
727	Execução da Revegetação Inicial (800 ha)	30/12/15	29/07/16																		
728	PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues	17/08/16	21/03/17																		
732	Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição)	17/08/16	27/08/16																		
733	Execução da Limpeza de Bento Rodrigues	27/08/16	21/12/16																		
734	Encerramento do Projeto	21/12/16	21/03/17																		
735	PF0020 - Reabilitação dos Tributários	29/12/15	10/05/17																		
738	Execução de recuperação ambiental dos tributários	29/12/15	09/02/17																		
739	Encerramento do Projeto	09/02/17	10/05/17																		
740	PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias)	01/06/16	22/01/18																		
759	Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias	01/06/16	01/07/16																		
760	Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal	29/07/16	26/03/17																		
761	Execução de recuperação ambiental da calha principal (Incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017)	01/07/16	24/10/17																		
762	Encerramento do Projeto	24/10/17	22/01/18																		
763	Projetos para recuperação de áreas degradadas (incluindo os 2000 ha)	02/01/16	31/05/20																		
771	Caracterização de Impacto nas áreas degradadas	02/01/16	30/12/16																		
772	Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental	30/12/16	30/03/17																		
773	Obras de Manejo de Rejeito e Revegetação	30/03/17	02/03/20																		
774	Encerramento do Projeto	02/03/20	31/05/20																		




EM BRANCO





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
775	PF0133 - UHE Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)	02/01/17	20/11/22																		
779	Avaliação de Alternativas	02/01/17	10/04/17																		
780	Definição do Escopo	10/04/17	07/10/17																		
781	Planejamento da Execução	07/10/17	05/04/18																		
782	Execução do manejo de rejeitos da UHE Risoleta Neves (início da execução da Fase 2 está considerando o término da Fase 1 com acréscimo de volume - abr/18)	05/04/18	22/08/22																		
783	Encerramento do Projeto	22/08/22	20/11/22																		
784	Processo de Monitoramento e Manutenção	29/12/15	27/03/26																		
785	Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)	24/04/17	27/03/26																		
786	Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Principais	29/12/15	23/12/23																		
787	Encerramento do Programa	27/03/26	25/06/26																		
789	PG024-R - Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157)	11/11/15	16/05/20																		
794	Definição do Programa	02/03/16	30/09/16																		
795	Definição e Formalização do Programa junto ao CIF	02/03/16	30/09/16																		
796	Execução do Programa	11/11/15	16/02/20																		
797	Ações emergenciais de contenção de rejeito	11/11/15	09/05/16																		
798	Reforço da Barragem de Santarém	11/11/15	09/05/16																		
799	Dique S1A	01/02/16	29/02/16																		
800	Dique S2A	01/12/15	29/02/16																		
801	Dique S3	11/11/15	19/02/16																		
802	PF0018 - Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo	02/04/16	25/07/17																		
815	Planejamento da Execução	02/04/16	30/09/16																		
816	Execução dos Diques do Gualaxo e Estações de Dosagem	08/06/16	26/04/17																		
817	Encerramento do Projeto	26/04/17	25/07/17																		
818	PF0056 - Fundão Eixo 1 - Fase 1	01/03/16	09/03/17																		
828	Planejamento da Execução	01/03/16	22/07/16																		
829	Execução do Projeto	04/03/16	09/12/16																		
830	Encerramento do Projeto	09/12/16	09/03/17																		
831	PF0132 - Fundão Eixo 1 - Fase 2 (EL.860)	01/11/16	16/02/20																		
835	Definição do Escopo	01/11/16	31/12/16																		
836	Planejamento da Execução	02/01/17	21/02/17																		
837	Execução do Projeto	02/04/17	18/11/19																		
838	Encerramento do Projeto	18/11/19	16/02/20																		
839	PF0057 - Nova Barragem Santarém	10/03/16	09/03/17																		




EM BRANCO



MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
855	Planejamento da Execução	10/03/16	15/07/16																		
856	Execução do Projeto	22/04/16	09/12/16																		
857	Encerramento do Projeto	09/12/16	09/03/17																		
858	PF0062 - Alçamento do Dique S3 - Fase 1	19/02/16	18/07/16																		
859	Execução do Projeto	19/02/16	19/04/16																		
860	Encerramento do Projeto	19/04/16	18/07/16																		
861	PF0065 - Alçamento do Dique S3 - Fase 2	10/03/16	14/01/17																		
864	Planejamento da Execução	10/03/16	07/07/16																		
865	Execução do Projeto	06/06/16	16/10/16																		
866	Encerramento do Projeto	16/10/16	14/01/17																		
867	PF0130 - Dragagem dique S3	28/04/16	07/06/17																		
868	Execução do Projeto	28/04/16	09/03/17																		
869	Encerramento do Projeto	09/03/17	07/06/17																		
870	PF0055 - Dique S4	12/07/16	10/02/17																		
875	Planejamento da Execução	12/07/16	27/08/16																		
876	Execução do Projeto (Pendente autorização dos Órgãos Públicos)	29/07/16	12/11/16																		
877	Encerramento do Projeto	12/11/16	10/02/17																		
878	PF0131 - Manejo de águas superficiais em Germano	01/06/16	07/03/17																		
885	Planejamento da Execução	01/06/16	05/08/16																		
886	Execução do Projeto	29/07/16	07/12/16																		
887	Encerramento do Projeto	07/12/16	07/03/17																		
888	Processo de Operação/Manutenção nas bacias de sedimentação do Gualaxo	02/02/17	30/12/19																		
889	Operação de clarificação de água e remoção de rejeitos nas bacias de sedimentação do Gualaxo (incluindo o descomissionamento dos Diques)	02/02/17	30/12/19																		
890	Encerramento do Programa	16/02/20	16/05/20																		
892	PG026-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce controle de processos erosivos (Cláusulas 161 e 162) / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163)	30/09/16	02/03/26																		
896	Definição do Programa	30/09/16	27/02/17																		
897	Contratação de consultoria para identificação de áreas críticas, impactos e causas para elaboração do Plano de Priorização de áreas de Recuperação (APP/Nascentes)	30/09/16	30/09/16																		
898	Emissão do Plano de Priorização de áreas de Recuperação das 500 primeiras Nascentes (Emergencial)	30/10/16	30/10/16																		
899	Emissão do Plano de Priorização de áreas de Recuperação (APP/Nascentes)	28/01/17	28/01/17																		
900	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	12/02/17	12/02/17																		
901	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	27/02/17	27/02/17																		
902	Execução do Programa	30/10/16	02/03/26																		





EM BRANCO





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
903	PF0135 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula	30/10/16	03/03/17																		
907	Execução da reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163, com premissa de início imediato após emissão do Plano de forma emergencial)	30/10/16	27/02/17																		
908	Projetos/Processos de recuperação de APPs, Nascentes degradadas e monitoramento da efetividade da recuperação das mesmas	02/03/17	02/03/26																		
909	Encerramento do Programa	02/12/25	02/03/26																		
911	PG028-R - Programa de conservação da biodiversidade aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada (Cláusulas 164 à 166)	30/06/16	29/11/21																		
918	Definição do Programa	31/08/16	30/07/17																		
919	Aprovação da proposta metodológica para monitoramento marinho pelo ICMBio	31/08/16	31/08/16																		
920	Contratação do estudo de caracterização ambiental (fundo marinho)	15/09/16	15/09/16																		
921	Conclusão do estudo de caracterização ambiental (fundo marinho)	31/05/17	31/05/17																		
922	Apresentação da proposta metodológica para monitoramento da ictiofauna para o ICMBio	17/09/16	17/09/16																		
923	Aprovação da proposta metodológica para monitoramento da ictiofauna pelo ICMBio (Premissa: 15 dias após a apresentação da proposta)	15/06/17	15/06/17																		
924	Contratação do estudo populacional da ictiofauna	30/06/17	30/06/17																		
925	Conclusão do estudo populacional da ictiofauna	30/12/16	30/12/16																		
926	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	15/07/17	15/07/17																		
927	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/07/17	30/07/17																		
928	Execução do Programa	31/08/16	31/08/21																		
929	Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inclui o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)	31/08/16	31/08/21																		
930	Encerramento do Programa	31/08/21	29/11/21																		
932	PG029-C - Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre (Cláusula 167)	02/08/17	30/05/23																		
935	Definição do Programa	02/08/17	02/03/18																		
936	Definição e Formalização do Programa junto ao CIF	02/08/17	02/03/18																		
937	Execução do Programa	02/03/18	01/03/23																		
938	Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG	02/03/18	01/03/20																		
939	Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em ES	02/03/18	01/03/20																		
940	Processo/Manutenção operacional dos CETAS	01/03/20	01/03/23																		
941	Encerramento do Programa	01/03/23	30/05/23																		
943	PG030-R - Programa de conservação da fauna e flora terrestre (Cláusula 168)	31/08/16	30/11/21																		
947	Definição do Programa	31/08/16	30/12/16																		

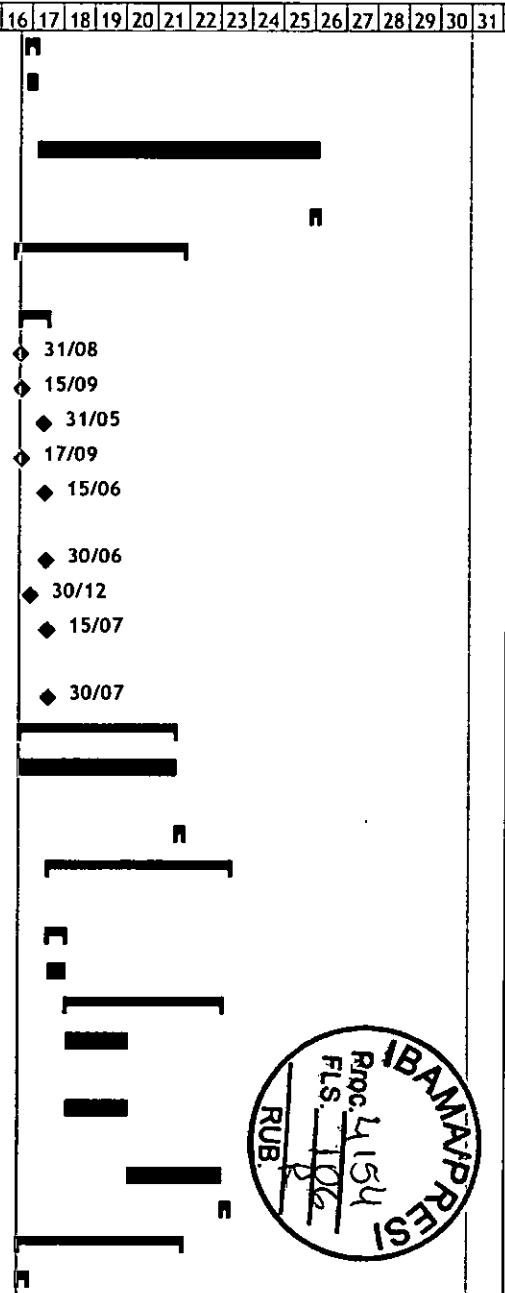


EM BRANCO





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
948	Apresentação da proposta metodológica para monitoramento de fauna terrestre para o IBAMA	31/08/16	31/08/16				◆													
949	Aprovação da proposta metodológica para monitoramento de fauna terrestre para o IBAMA (Premissa: 15 dias após a apresentação)	15/09/16	15/09/16				◆													
950	Contratação do estudo de caracterização ambiental de fauna e flora terrestre	30/09/16	30/09/16				◆													
951	Conclusão do estudo de caracterização ambiental de fauna e flora terrestre	29/11/16	29/11/16				◆													
952	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	14/12/16	14/12/16				◆													
953	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/12/16	30/12/16				◆													
954	Execução do Programa	01/09/16	01/09/21																	
955	Monitoramento/execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (inclui o monitoramento necessário para realização dos estudo de Definição do Programa)	01/09/16	01/09/21																	
956	Encerramento do Programa	01/09/21	30/11/21																	
958	PG031-C - Programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos (Cláusulas 169 e 170)	30/09/16	15/03/19																	
959	Metas do Programa	30/10/16	30/10/16				◆													
960	Aprovação do CIF da Definição do Programa (incluindo regras para disponibilização de recursos financeiros)	30/10/16	30/10/16				◆													
961	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16																	
962	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16				◆													
963	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16				◆													
964	Execução do Programa	15/12/16	15/12/18																	
965	Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item I - R\$ 50.000.000,00	15/12/16	15/12/16				◆													
966	Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item II - R\$ 100.000.000,00	15/06/17	15/06/17				◆													
967	Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item III - R\$ 100.000.000,00	15/12/17	15/12/17				◆													
968	Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item IV - R\$ 125.000.000,00	15/06/18	15/06/18				◆													
969	Disponibilização do Valor previsto na Cláusula 170, item V - R\$ 125.000.000,00	15/12/18	15/12/18				◆													
970	Encerramento do Programa	15/12/18	15/03/19																	
972	PG032-R/C - Programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água (Cláusula 171)	11/11/15	01/04/21																	
976	Definição do Programa	15/09/16	15/10/16																	
977	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	15/09/16	15/09/16				◆													
978	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	15/10/16	15/10/16				◆													
979	Execução do Programa	11/11/15	24/06/20																	
980	PF0022 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Governador Valadares	02/03/16	20/08/20																	
987	Levantamento de campo e elaboração de projetos conceituais	02/03/16	30/12/16																	
988	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	31/12/16	28/08/17																	
989	Construção do Projeto de Governador Valadares	28/08/17	25/05/20																	




EMBRANCO



MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
990	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	25/05/20	23/08/20																	
991	PF0023 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Lagoa Nova	06/06/16	27/01/17																	
994	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
995	Execução do Projeto Lagoa Nova	03/07/16	31/10/16																	
996	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																	
997	PF0024 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Santa Maria	20/04/16	27/01/17																	
1000	Execução do Projeto Santa Maria	20/04/16	31/10/16																	
1001	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																	
1002	PF0025 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pancas	22/04/16	28/04/17																	
1006	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	22/04/16	31/10/16																	
1007	Execução do Projeto Pancas	31/10/16	29/01/17																	
1008	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	29/01/17	29/04/17																	
1009	PF0028 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Rio Guandú	22/04/16	29/05/17																	
1013	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	22/04/16	30/11/16																	
1014	Execução do Projeto Rio Guandú	30/11/16	28/02/17																	
1015	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	28/02/17	29/05/17																	
1016	PF0029 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Córrego Barroso	25/04/16	28/04/17																	
1020	Execução do Projeto Córrego Barroso	25/04/16	30/01/17																	
1021	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	30/01/17	30/04/17																	
1022	PF0045 - Nova Estação de Tratamento de água de Galileia-MG	07/01/16	29/05/17																	
1027	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	07/01/16	07/01/16																	
1028	Execução da Nova Estação de Tratamento de água de Galileia-MG	15/01/16	01/03/17																	
1029	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	01/03/17	30/05/17																	
1030	PF0103 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Alpercata	06/06/16	24/01/17																	
1033	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1034	Execução de Projeto em Alpercata	29/06/16	26/10/16																	
1035	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/10/16	24/01/17																	
1036	PF0104 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Cachoeira Escura	06/06/16	24/01/17																	
1039	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1040	Execução de Projeto em Cachoeira Escura	29/06/16	26/10/16																	
1041	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/10/16	24/01/17																	
1042	PF0105 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Ipaba	06/06/16	27/01/17																	
1045	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1046	Execução de Projeto em Ipaba	04/07/16	31/10/16																	
1047	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																	
1048	PF0106 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pedra Corrida	06/06/16	27/01/17																	
1051	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	




EMBRANCO



MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1052	Execução de Projeto em Pedra Corrida	04/07/16	31/10/16																	
1053	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																	
1054	PF0107 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de São Tomé do Rio Doce	09/06/16	24/03/17																	
1058	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	09/06/16	10/09/16																	
1059	Execução de Projeto em São Tomé do Rio Doce	10/09/16	24/11/16																	
1060	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	25/12/16	25/03/17																	
1061	PF0108 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Itueta	09/06/16	22/03/17																	
1065	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	09/06/16	10/09/16																	
1066	Execução de Projeto em Itueta	10/09/16	24/11/16																	
1067	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	22/12/16	22/03/17																	
1068	PF0109 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Marilândia	09/06/16	24/03/17																	
1072	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	09/06/16	10/09/16																	
1073	Execução de Projeto em Marilândia	10/09/16	24/11/16																	
1074	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	25/12/16	25/03/17																	
1075	PF0110 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Mascarenhas	09/06/16	24/03/17																	
1079	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	09/06/16	10/09/16																	
1080	Execução de Projeto em Mascarenhas	10/09/16	24/11/16																	
1081	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	25/12/16	25/03/17																	
1082	PF0111 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Santo Antonio do Rio Doce	09/06/16	22/03/17																	
1086	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	09/06/16	10/09/16																	
1087	Execução de Projeto em Santo Antonio do Rio Doce	10/09/16	24/11/16																	
1088	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	22/12/16	22/03/17																	
1089	PF0112 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Regencia	06/06/16	30/03/17																	
1093	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1094	Execução de Projeto em Regencia	29/06/16	30/12/16																	
1095	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	30/12/16	30/03/17																	
1096	PF0113 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de São Vitor	06/06/16	27/01/17																	
1099	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1100	Execução de Projeto em São Vitor	04/07/16	31/10/16																	
1101	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																	
1102	PF0114 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Senhora da Penha	06/06/16	27/01/17																	
1105	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1106	Execução de Projeto em Senhora da Penha	04/07/16	31/10/16																	
1107	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																	
1108	PF0115 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Tumiritinga	06/06/16	27/01/17																	
1111	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	06/06/16	28/06/16																	
1112	Execução de Projeto em Tumiritinga	04/07/16	31/10/16																	




EM BRANCO



MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1113	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	31/10/16	29/01/17																		
1114	PF0136 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Barreto	31/10/16	24/10/17																		
1118	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	31/10/16	09/02/17																		
1119	Execução de Projeto em Barreto	10/02/17	26/07/17																		
1120	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/07/17	24/10/17																		
1121	PF0137 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Gesteira	31/10/16	24/10/17																		
1125	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	31/10/16	09/02/17																		
1126	Execução de Projeto em Gesteira	10/02/17	26/07/17																		
1127	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/07/17	24/10/17																		
1128	PF0138 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Camargos	31/10/16	24/10/17																		
1132	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	31/10/16	09/02/17																		
1133	Execução de Projeto em Camargos	10/02/17	26/07/17																		
1134	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/07/17	24/10/17																		
1135	PF0139 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Pedras	31/10/16	24/10/17																		
1139	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	31/10/16	09/02/17																		
1140	Execução de Projeto em Pedras	10/02/17	26/07/17																		
1141	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/07/17	24/10/17																		
1142	PF0140 - Melhoria do sistema de abastecimento de água de Paracatu de Baixo	31/10/16	24/10/17																		
1146	Elaboração dos Projetos Básicos e Planejamento da Execução	31/10/16	09/02/17																		
1147	Execução de Projeto em Paracatu de Baixo	10/02/17	26/07/17																		
1148	Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	26/07/17	24/10/17																		
1149	Encerramento do Programa	01/01/21	01/04/21																		
1151	PG034-C - Programa de educação ambiental e preparação para as emergências ambientais (Cláusulas 172 e 173)	01/02/16	31/10/26																		
1156	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16																		
1157	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16																		
1158	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16																		
1159	Execução do Programa	01/02/16	07/07/26																		
1160	Projetos de incremento da estrutura de apoio ao sistema de emergência e alerta	01/02/16	26/05/17																		
1161	PF0041 - Abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência	01/02/16	26/04/17																		
1164	Construção de Acessos para implantação do sistema de emergência	01/02/16	26/01/17																		
1165	Encerramento do Projeto	26/01/17	26/04/17																		
1166	PF0071 - Instalação de sirenes de emergência	14/04/16	26/05/17																		
1169	Implantação do Sistema de Alerta para Emergência	14/04/16	25/02/17																		
1170	Encerramento do Projeto	25/02/17	26/05/17																		




EM BRANCO



MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1171	PF0072 - Reestruturação da brigada e das defesas civis à jusante das barragens para atendimento a emergência de barragens	31/08/16	31/05/17																		
1176	Dimensionamento da estrutura para atendimento à Emergência de Barragens	31/08/16	03/11/16																		
1177	Implantação das medidas de reestruturação da Brigada e Defesa Civil	03/11/16	02/03/17																		
1178	Encerramento do Projeto	02/03/17	31/05/17																		
1179	PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das cidades às margens do Rio Doce	31/07/16	26/11/16																		
1180	Projeto de Implantação das medidas de Educação Ambiental	31/07/16	28/08/16																		
1181	Encerramento do Projeto	28/08/16	26/11/16																		
1182	Processos de Monitoramento e Manutenção	02/03/16	07/07/26																		
1183	Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência	27/02/17	03/03/22																		
1184	Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de Mariana e Barra Longa para plena atuação e resposta às situações de emergência	02/03/16	02/03/21																		
1185	Processo de Manutenção e Apoio à Defesa Civil	02/03/17	04/02/22																		
1186	Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental	28/08/16	07/07/26																		
1187	Encerramento do Programa	02/08/26	31/10/26																		
1189	PG035-C - Programa de informação para a população da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusula 174)	01/06/16	02/03/26																		
1192	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16																		
1193	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16																		
1194	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16																		
1195	Execução do Programa	01/06/16	02/03/26																		
1196	PF0092 - Centros de Informação técnica	01/06/16	30/03/17																		
1200	Planejamento de estruturação dos centros de informação técnica	01/06/16	15/11/16																		
1201	Implantação do centro de informação técnica	15/11/16	30/12/16																		
1202	Encerramento do Projeto	30/12/16	30/03/17																		
1203	Processos estruturados de comunicação	30/09/16	02/03/26																		
1204	Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais	30/09/16	02/03/26																		
1205	Manutenção das estruturas implantadas	30/12/16	02/03/26																		
1206	Encerramento do Programa	02/12/25	02/03/26																		
1208	PG036-C - Programa de comunicação nacional e internacional (Cláusula 175)	16/06/16	02/03/26																		
1215	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16																		
1216	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16																		
1217	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16																		
1218	Execução do Programa	16/06/16	02/03/26																		
1219	PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital	16/06/16	29/12/16																		




EM BRANCO





MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1222	Implantação da Plataforma Digital	16/06/16	30/09/16																		
1223	Encerramento do Projeto	30/09/16	29/12/16																		
1224	Processos estruturados de comunicação	30/09/16	02/03/26																		
1225	Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico	30/09/16	02/03/26																		
1226	Encerramento do Programa	02/12/25	02/03/26																		
1228	PG037-R - Programa de gestão de riscos ambientais na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (Cláusul.	05/09/16	29/06/17																		
1233	Definição do Programa	17/10/16	31/03/17																		
1234	Conclusão da Definição dos ativos da SAMARCO diretamente afetados pelo EVENTO que possam impactar na Bacia do Rio Doce	17/10/16	17/10/16																		
1235	Conclusão do estudo de identificação de riscos e proposição de ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos	01/03/17	01/03/17																		
1236	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	16/03/17	16/03/17																		
1237	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	31/03/17	31/03/17																		
1238	Execução do Programa	31/03/17	31/03/17																		
1239	Ações preventivas e mitigatórias associadas aos riscos identificados serão realizadas pela SAMARCO (a definir com base no Estudo e Definição do Programa)	31/03/17	31/03/17																		
1240	Encerramento do Programa	31/03/17	29/06/17																		
1242	PG038-R/C - Programa de investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeira e marinha impactadas (Cláusulas 177 à 180)	11/11/15	31/12/30																		
1246	Definição do Programa	31/08/16	15/01/17																		
1247	Conclusão da contratação do estudo de identificação de áreas de irrigação ao longo do Rio Doce	31/08/16	31/08/16																		
1248	Conclusão do estudo de identificação de áreas de irrigação ao longo do Rio Doce	29/11/16	29/11/16																		
1249	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	31/12/16	31/12/16																		
1250	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	15/01/17	15/01/17																		
1251	Execução do Programa	11/11/15	31/12/30																		
1252	Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das águas do Rio Doce e Tributários para Intervenções REPARATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)	11/11/15	31/12/29																		
1253	Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo das águas do Rio Doce e Tributários para Intervenções COMPENSATÓRIAS da FUNDAÇÃO (Cláusula 178)	02/03/17	31/12/30																		
1254	PF0148 - Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado	31/08/16	30/07/17																		
1260	Planejamento da Implantação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado (Até 30/12 - Cláusula 177)	31/08/16	20/10/16																		
1261	Compra e instalação do Sistema de Monitoramento de Água Automatizado	02/01/17	30/07/17																		
1262	Processo de Monitoramento Estruturado da Água	30/07/17	30/12/30																		
1263	Processo de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (Cláusula 177)	30/07/17	30/12/30																		




EM BRANCO






MasterPlan dos Programas da Fundação Renova

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1264	Encerramento do Programa	02/10/30	31/12/30																		
1266	PG039-R/C - Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as seguintes medidas reparatórias e compensatórias (Cláusulas 181 e 182)	18/09/16	30/03/22																		
1271	Definição do Programa	18/09/16	31/01/17																		
1272	Conclusão do levantamento de demandas de consolidação junto ao ICMBio para Unidade de Conservaçã	18/09/16	18/09/16																		
1273	Conclusão do levantamento de demandas de consolidação junto ao IEF para Unidade de Conservação er	18/09/16	18/09/16																		
1274	Contratação para elaboração/consolidação do plano de Manejo das Unidades de Conservação no ES	02/11/16	02/11/16																		
1275	Contratação para elaboração/consolidação do plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce, em MG	02/11/16	02/11/16																		
1276	Contratação para caracterização e diagnóstico dos impactos nas Unidades de Conservação	18/09/16	18/09/16																		
1277	Estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação	30/12/16	30/12/16																		
1278	Consolidação do plano de manejo de 2 unidades de Conservação (Rio Doce e Vida Silvestre)	30/12/16	30/12/16																		
1279	Emissão do Plano de Manejo e definição para construção da sede da APA na foz do Rio Doce	30/12/16	30/12/16																		
1280	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	14/01/17	14/01/17																		
1281	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	31/01/17	31/01/17																		
1282	Execução do Programa	30/12/16	30/12/21																		
1283	Execução de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades de Conservação	30/12/16	29/06/17																		
1284	Processo de monitoramento das ações compensatórias	30/12/16	30/12/21																		
1285	Processo de monitoramento do subsídio às ações de consolidação de 2 unidades de Conservação e implementação da Área de Proteção Ambiental (incluindo a construção da sede)	30/12/16	30/12/21																		
1286	Encerramento do Programa	30/12/21	30/03/22																		
1288	PG040-C - Programa de fomento à implantação do CAR e dos PRAs na ÁREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce de cunho compensatório (Cláusula 183)	11/11/15	31/05/26																		
1291	Definição do Programa	30/09/16	30/10/16																		
1292	Aprovações internas da FUNDAÇÃO e formalização da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/09/16	30/09/16																		
1293	Aprovação do CIF da Definição do Programa (objetivos, escopo, masterplan, indicadores, etc.)	30/10/16	30/10/16																		
1294	Execução do Programa	11/11/15	02/03/26																		
1295	Processo de cadastro ambiental rural (CAR) e regularização ambiental (PRA)	11/11/15	02/03/26																		
1296	Encerramento do Programa	02/03/26	31/05/26																		
1298	PG022/PG041-R - Programa de gerenciamento dos programas socioeconômicos e socioambientais (Cláusulas 144 e 184)	13/03/16	31/12/30																		
1301	Definição do Programa	13/03/16	30/09/16																		
1302	Definição e Formalização do Programa junto ao CIF	13/03/16	30/09/16																		
1303	Execução do Programa	13/03/16	31/12/30																		
1304	Processo de gestão de programas socioeconômicos e socioambientais	13/03/16	31/12/30																		
1305	Encerramento do Programa	02/10/30	31/12/30																		



EM BRANCO




PLANO DE 3 ANOS



Revisão: 00

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2016

EM BRANCO



INFORMAÇÃO IMPORTANTE


O plano ora apresentado foi desenvolvido com base nas melhores informações e definições disponíveis no momento de sua concepção e naturalmente contém incertezas e indefinições típicas das fases em que os vários programas e seus projetos se encontram, conforme a literatura técnica disponível e as melhores práticas disponíveis. Dessa forma, é possível e esperado que haja a necessidade da realização de ajustes e adequações em função da superveniência de situações de fato distintas das que atualmente se tem conhecimento e que foram utilizadas como referência para a emissão de tal documento.

A estimativa de custos dos programas foi desenvolvida utilizando-se a combinação de três abordagens típicas: estimativa paramétrica, analógica e *bottom up*. A utilização de cada uma destas abordagens foi guiada principalmente pela disponibilidade de informações e pelo nível de maturidade dos projetos associados a cada programa, conforme a literatura técnica disponível e as melhores práticas disponíveis.

Além disso, as estimativas de custos estão sendo apresentadas em valores nominais, tendo como referência os valores limites estabelecidos no ACORDO que deverão ser corrigidos pelo IPCA conforme cláusula 257.

Assim, a Fundação Renova, suas mantenedoras, administradores, empregados e representantes não garantem nem assumem qualquer responsabilidade pela correção, suficiência, consistência ou completude de qualquer informação apresentada neste documento por qualquer omissão ou por quaisquer perdas ou danos, de qualquer natureza, que decorram do uso das informações atualmente disponíveis.

EM BRANCO




CONTEÚDO

1. OBJETIVO	5
2 METODOLOGIA E CONCEITOS	6
2.1 Metodologia de Gestão dos Programas	6
2.2 Indicadores	6
3 SUMÁRIO DO PLANEJAMENTO DE 3 ANOS	7
3.1 Plano dos programas socioeconômicos	7
3.1.1 Medidas reparatórias	8
3.1.2 Medidas compensatórias	9
3.2 Plano dos programas socioambientais	9
3.2.1 Medidas reparatórias	9
3.2.2 Medidas compensatórias	10
3.3 Visão consolidada dos desembolsos	10
4 DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO	11
4.1 Programas Socioeconômicos	11
4.1.1 PG001 – Cadastro dos Impactados	11
4.1.2 PG002 – Ressarcimento e indenização dos impactados	12
4.1.3 PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	13
4.1.4 PG004 - Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	14
4.1.5 PG005 - Proteção social	15
4.1.6 PG006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	16
4.1.7 PG007 - Assistência aos Animais	17
4.1.8 PG008 - Reconstrução de vilas	18
4.1.9 PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	19
4.1.10 PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas	20
4.1.11 PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	22
4.1.12 PG012 - Memória histórica, cultural e artística	23
4.1.13 PG013 - Turismo, cultura, esporte e lazer	24
4.1.14 PG014 - Saúde física e mental da população impactada	25
4.1.15 PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	26
4.1.16 PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	27
4.1.17 PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	28
4.1.18 PG018 - Diversificação da Economia Regional	29
4.1.19 PG019 - Micro e Pequenos Negócios	30
4.1.20 PG020 - Estímulo à Contratação Local	31
4.1.21 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	32
4.1.22 PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	33
4.2 Programas Socioambientais	34
4.2.1 PG023 - Manejo dos rejeitos	34
4.2.2 PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	35
4.2.3 PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos	36
4.2.4 PG026 - Recuperação de APPs	37
4.2.5 PG027 - Recuperação de nascentes	38


EM BRANCO



4.2.6	PG028 - Conservação da biodiversidade	39
4.2.7	PG029 - Recuperação da fauna silvestre	40
4.2.8	PG030 - Fauna e flora terrestre.....	41
4.2.9	PG031 - Coleta e tratamento de esgoto.....	42
4.2.10	PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água.....	43
4.2.11	PG034 - Educação ambiental	44
4.2.12	PG035 - Informação para a população.....	45
4.2.13	PG036 - Comunic. nacional/internacional.....	46
4.2.14	PG037 - Gestão de riscos ambientais.....	47
4.2.15	PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	48
4.2.16	PG039 - Unidades de conservação.....	49
4.2.17	PG040 - CAR e PRAs.....	50
4.2.18	PG022/PG041 - Gerenciamento programas Socioeconômico e Socioambiental.....	51



EM BRANCO



1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar o planejamento inicial dos programas que serão conduzidos pela FUNDAÇÃO Renova com o intuito de recuperar, mitigar, remediar e reparar, inclusive através de indenização, os impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG, pertencente à Samarco Mineração S/A, ocorrido em 05 de novembro de 2015.

A Fundação Renova é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, criada para gerir e executar as medidas previstas nos programas socioeconômicos e socioambientais definidos no Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) celebrado em 02 de março de 2016, entre a União, os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e entidades Governamentais ¹, com a Samarco Mineração S/A e suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

Ela foi constituída em 30 de junho de 2016 iniciando suas atividades em 02 de agosto de 2016. A figura abaixo mostra a Visão, Missão, Objetivos e valores definidos para a Fundação.

<p>VISÃO</p> <p>Como uma parceira confiável, a Fundação capacita e apoia as comunidades afetadas para reconstruir suas vidas e meios de subsistência. Restaura e aumenta os valores ambientais da bacia do Rio Doce e seus afluentes, bem como suas comunidades vizinhas, ao mesmo tempo em que demonstra elevados padrões de transparência, integridade e responsabilidade</p>
<p>MISSÃO</p> <p>Implementar programas de reabilitação e compensação social e ambiental descritos no Acordo, trabalhando de forma eficiente, ética e respeitosa em parceria com as comunidades, governos e sociedade civil.</p>
<p>OBJETIVOS</p> <ul style="list-style-type: none">• Fundamentar a conceituação dos programas socioambientais e socioeconômicos em estudos com embasamento científico e engajamento• Implementar, monitorar e comunicar ações socioeconômicas e ambientais focadas em reparar e recuperar danos resultantes do acidente• Indenizar quando as ações de reparação ou mitigação não forem suficientes ou viáveis• Desenvolver e implementar projetos de boa fé que estejam alinhados com as necessidades e expectativas do poder público e das comunidades.
<p>VALORES</p> <ul style="list-style-type: none">• Integridade, transparência, colaboração, respeito, sustentabilidade

Figura 1 – Visão, Missão, Objetivos e Valores da Fundação

As informações apresentadas neste documento compreendem o período entre novembro de 2015 e dezembro de 2019 e visam atender os requisitos estabelecidos nas cláusulas 6 - inciso XIII e 187 do TTAC.

(1) IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos recursos naturais renováveis; ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade; ANA – Agência Nacional de Águas; FUNAI – Fundação Nacional do Índio; DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral; IEF – Instituto Estadual de Florestas; IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas; FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente; IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo; AGERH – Agência Estadual de Recursos Hídricos.

EM BRANCO

Faint circular stamp or mark in the bottom right corner.

2 METODOLOGIA E CONCEITOS

2.1 Metodologia de Gestão dos Programas

A metodologia utilizada para implementação dos programas definidos no acordo é baseada nos conceitos da quinta edição do Guia PMBOK e terceira edição do Padrão para Gerenciamento de Programas do PMI² e considera a existência de três fases no ciclo de implementação dos programas, conforme ilustrado na figura abaixo:




Figura 2 – Ciclo de vida dos programas

Abaixo, apresenta-se de forma sucinta o propósito de cada fase.

- **Definição do programa:** fase essencial para garantir que todas as questões relevantes e necessárias para definição do escopo e dos resultados esperados estejam claramente explicitadas entre a FUNDAÇÃO e o Comitê Interfederativo (CIF). A formalização e registro destas definições servirão como base para que os programas sejam dados por encerrados após o término de sua execução.
- **Execução do programa:** nesta fase, os projetos e processos definidos devem ser implementados para o alcance dos objetivos do programa. Esta fase se encerra quando os benefícios e exigências, definidos na fase de definição do programa, são efetivamente alcançados. Para os projetos, a implementação é composta das seguintes fases:




Figura 3 – Ciclo de vida dos projetos

Vale destacar que as fases e portões 1 e 2 são dispensáveis em situações em que a definição do programa indicar qual é a melhor alternativa e escopo para implementação do projeto.

- **Encerramento do programa:** nesta fase há a formalização da conclusão do programa através da devida quitação pelo CIF das entregas e benefícios acordados.

2.2 Indicadores


Para acompanhamento da implementação dos programas e projetos serão utilizados indicadores de desempenho e indicadores de benefícios.

Os indicadores de desempenho têm por objetivo avaliar se um projeto está sendo conduzido conforme planejado. Para isto serão utilizados os indicadores de progresso físico (razão do progresso físico real pelo planejado) e cumprimento de prazo (razão entre a duração prevista para execução do projeto pela duração planejada). Os indicadores de benefício têm por objetivo avaliar quantitativamente o progresso dos benefícios gerados pelos programas e seus projetos. Como estes indicadores podem exigir estudos aprofundados e complexos, além de ainda não terem sido objeto de discussão junto ao CIF, neste documento serão abordados apenas aqueles que estão explicitamente indicados no ACORDO.

(2) PMI: *Project Management Institute* é uma das maiores associações do mundo com o objetivo de reunir profissionais da área de gerenciamento de projetos para trocarem experiências e conhecimentos, identificar e reunir boas práticas nesta área, estabelecer uma ética na profissão e certificar profissionais da área.

EM BRANCO





3 SUMÁRIO DO PLANEJAMENTO DE 3 ANOS

Esta seção demonstra de forma sucinta o planejamento dos programas para os próximos 3 anos. Conforme as definições presentes no TTAC, o portfólio de programas foi dividido em dois grupos:

- **Programas socioeconômicos:** representam o conjunto de medidas e de ações a serem executadas, necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos **socioeconômicos** decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.
- **Programas socioambientais:** representam o conjunto de medidas e de ações a serem executadas, necessárias à reparação e compensação pelos danos **socioambientais** decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Os programas também são classificados conforme sua natureza:

- **Programas reparatórios:** compreendem as medidas e ações de cunho reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de Fundão.
- **Programas compensatórios:** compreendem as medidas e ações que visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não seja possível ou viável, nos termos dos programas reparatórios.

Na definição do planejamento, os programas socioeconômicos de natureza reparatória têm preferência em relação aos demais programas. Com relação ao desembolso a ser realizado no período, o TTAC estabelece as seguintes regras:

- Aporte de dois bilhões de reais em 2016.
- Aportes de um bilhão e duzentos milhões de reais nos anos de 2017 e 2018.
- Aporte entre oitocentos milhões e um bilhão e seiscentos milhões de reais em 2019.
- Aporte de duzentos e quarenta milhões de reais por ano para as ações e projetos de natureza compensatória.
- Além desses valores, está previsto o aporte de cinquenta milhões de reais em 2016, duzentos milhões de reais em 2017 e duzentos e cinquenta milhões de reais em 2018 (Programa Coleta e Tratamento de Esgoto).

Os capítulos a seguir demonstram as previsões de desembolso que compõem os planos dos programas socioeconômicos e socioambientais.

3.1 Plano dos programas socioeconômicos

O plano dos programas socioeconômicos foi estruturado conforme as definições do TTAC, sendo constituído de 7 (sete) eixos temáticos e 23 (vinte e três) programas conforme ilustrado na figura abaixo.

São consideradas como modalidades de reparação socioeconômica: a reposição, a restituição e a recomposição de bens; a indenização pecuniária em prestação única ou continuada, enquanto identificada tecnicamente a necessidade; o reassentamento padrão rural ou urbano, nos termos do TTAC e observadas as políticas e normas públicas; o autoreassentamento; a permuta e a assistência para remediação e mitigação dos efeitos do rompimento da barragem.

EM BRANCO

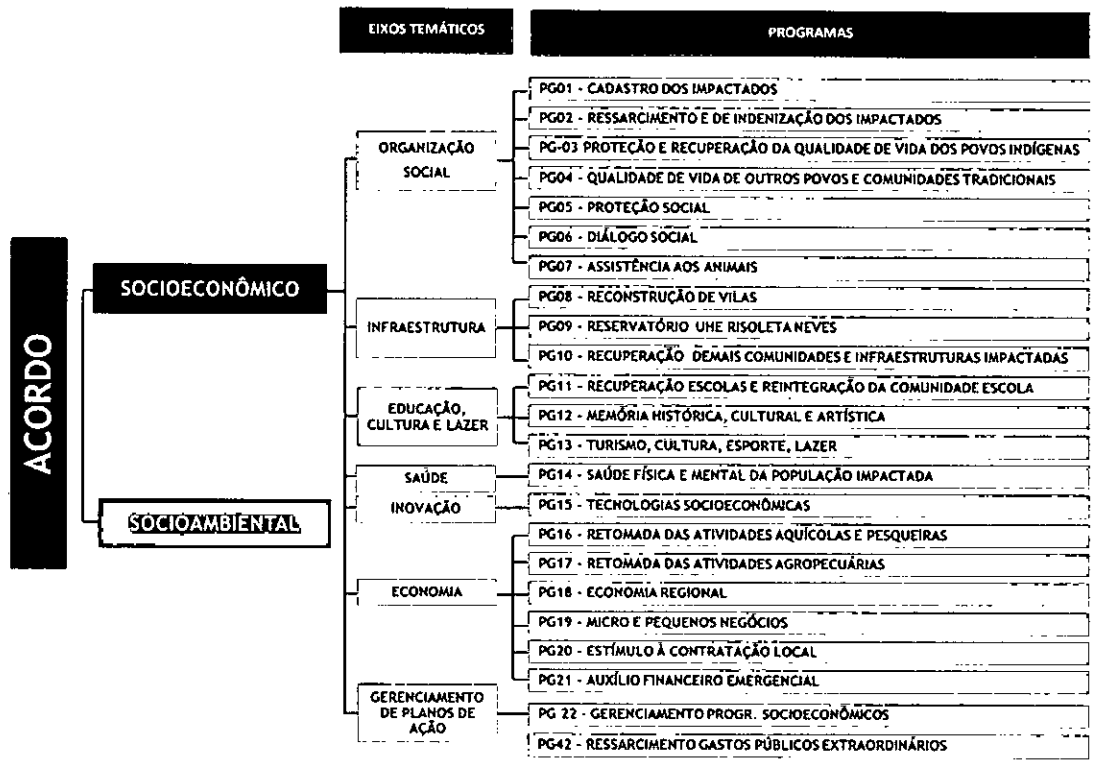



Figura 4 – Estrutura dos programas socioeconômicos

3.1.1 Medidas reparatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioeconômicos de natureza reparatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG001 - Cadastro dos Impactados	nov-15	set-16	Jun-19	out-19	45,9	10,2	23,5	14,2	3,8	2,1
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez-15	out-16	out-19	jan-20	244,7	10,8	117,3	97,6	6,7	21,4
PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas	mar-16	out-18	out-18	jan-19	61,7	5,3	19,9	25,6	14,6	1,1
PG004 - Qualidade de vida de outros povos e comunidades tradicionais	ago-16	mar-18	mar-18	jun-18	0,5	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
PG005 - Proteção social	abr-16	jul-17	abr-19	jun-19	38,6	0,0	3,8	15,3	12,3	7,2
PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	nov-15	out-16	dez-30	dez-30	224,5	5,6	24,7	37,5	22,1	19,8
PG007 - Assistência aos Animais	nov-15	out-16	mai-19	jul-19	16,4	10,1	10,1	2,8	1,3	0,1
PG008 - Reconstrução de vilas	nov-15	out-16	mar-22	mar-22	322,5	12,9	26,1	56,3	191,3	38,7
PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves	nov-15	nov-16	jul-18	out-18	261,3	29,2	96,4	137,6	27,2	0,0
PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas	nov-15	out-16	nov-18	fev-19	293,1	150,1	220,2	59,2	7,0	0,0
PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar	jan-16	out-16	mar-21	mai-21	9,7	0,1	0,9	1,9	2,3	2,2
PG012 - Memória histórica, cultural e artística	fev-16	ago-17	jul-22	out-22	34,8	3,3	14,6	11,4	3,2	2,5
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer	abr-16	mar-17	mar-22	jun-22	18,3	0,0	1,6	6,4	5,0	2,5
PG014 - Saúde física e mental da população impactada	nov-15	out-16	nov-25	nov-25	162,6	10,7	23,8	41,0	40,1	26,7
PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	mar-17	abr-17	mar-20	mai-20	10,2	0,0	0,0	0,0	6,3	2,9
PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	nov-15	out-16	ago-22	nov-22	125,5	3,5	18,2	52,1	27,8	14,9
PG019 - Micro e Pequenos Negócios	dez-15	mar-17	mar-20	jun-20	26,5	0,7	4,4	4,1	4,0	4,0
PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	nov-15	out-16	jun-20	set-20	464,1	124,4	202,9	113,6	81,9	40,9
PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários	Jun-16	dez-16	dez-17	dez-17	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0
Total medidas reparatórias					2.390	377	808	706	457	187

Figura 5 – Desembolso dos programas socioeconômicos de cunho reparatório

EM BRANCO



3.1.2 Medidas compensatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioeconômicos de natureza compensatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG002 - Ressarcimento e de indenização dos impactados	dez-15	out-16	out-19	jan-20	144,1	0,0	44,3	99,9	0,0	0,0
PG013 - Turismo, cultura, esporte, lazer ³	abr-16	mar-17	mar-22	jun-22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PG015 - Tecnologias Socioeconômicas	dez-16	out-17	out-17	jan-18	7,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1
PG018 - Diversificação da Economia Regional	set-16	out-17	dez-30	dez-30	42,7	0,0	0,9	11,8	4,6	3,7
PG020 - Estímulo à Contratação Local	nov-15	out-16	dez-30	dez-30	2,3	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
Total medidas compensatórias					197	0	45	112	6	5

Figura 6- Desembolso dos programas socioeconômicos de cunho compensatório

(1) Valores realizados até Julho/2016.

(2) Valores previstos até Dezembro/2016.

(3) Valores a serem definidos após a realização do diagnóstico e definição das ações necessárias

3.2 Plano dos programas socioambientais

O plano dos programas socioeconômicos foi estruturado conforme as definições do TTAC, sendo constituído de 8 (oito) eixos temáticos e 18 (dezoito) programas conforme ilustrado na figura abaixo.

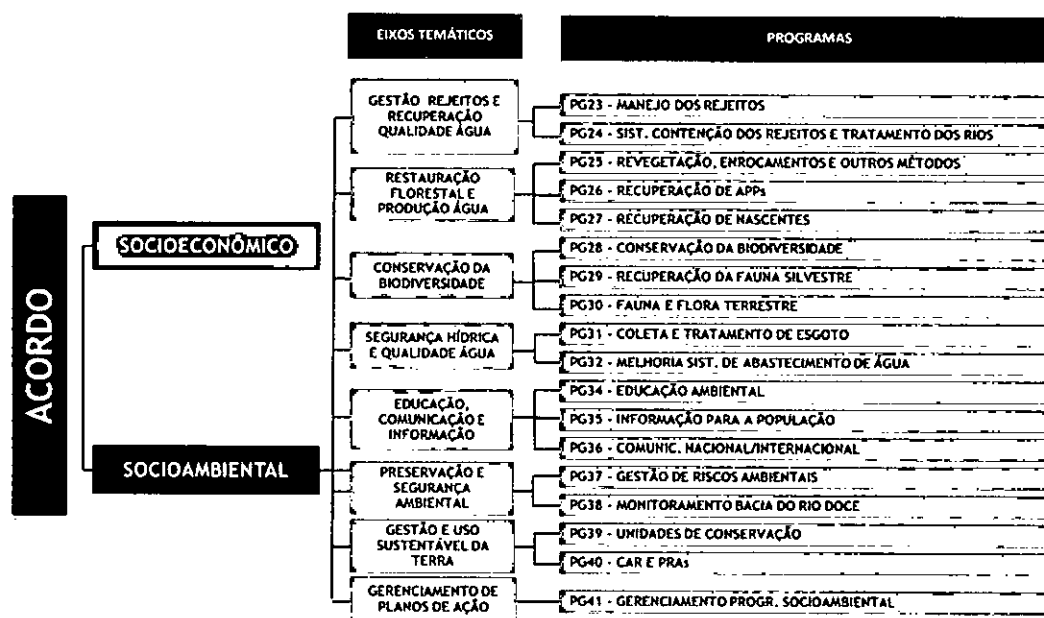



Figura 7 – Estrutura dos programas socioambientais

3.2.1 Medidas reparatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioambientais de natureza reparatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG023 - Manejo dos rejeitos	dez-15	abr-17	mar-26	jun-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

EM BRANCO



PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios	nov-15	set-16	fev-20	mai-20	648,5	45,4	276,8	203,3	98,1	61,2
PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos	dez-15	abr-17	mar-26	jun-26	1022,6	108,4	194,6	279,6	108,7	120,8
PG028 - Conservação da biodiversidade	jun-16	jul-17	ago-21	nov-21	39,2	0,0	7,4	6,4	7,0	7,0
PG030 - Fauna e flora terrestre	ago-16	dez-16	set-21	nov-21	18,0	0,0	6,0	2,4	2,4	2,4
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan-16	out-16	ago-20	abr-21	96,3	0,2	15,0	30,4	50,4	0,2
PG037 - Gestão de riscos ambientais	set-16	mar-17	mar-17	jun-17	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov-15	jan-17	dez-30	dez-30	263,7	51,7	86,5	29,4	46,4	11,1
PG039 - Unidades de conservação	set-16	jan-17	dez-21	mar-22	6,0	0,0	0,6	1,3	1,0	1,0
PG022/PG041 - Gerenciamento progr. Socioeconômicos e Socioambientais	mar-16	set-16	dez-30	dez-30	590,6	0,3	33,1	114,2	83,5	64,9
Total medidas reparatórias					2.687	206	620	669	398	269

Figura 8 – Desembolso dos programas socioambientais de cunho reparatório

3.2.2 Medidas compensatórias

A tabela a seguir relaciona os programas socioambientais de natureza compensatória indicando os marcos previstos para a conclusão das fases, os valores totais estimados e os desembolsos previstos para cada programa nos próximos 3 anos.

Programa	Início do programa	Término da Fase			Desembolso em R\$ MM					
		Definição	Execução	Encerr.	Total	Real. ¹	2016 ²	2017	2018	2019
PG026 - Recuperação de APPs	set-16	fev-17	mar-26	mar-26	1261,6	0,0	15,1	59,1	63,4	77,7
PG027 - Recuperação de nascentes	set-16	fev-17	mar-26	mar-26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PG029 - Recuperação da fauna silvestre	mar-18	mar-18	mar-23	mai-23	29,3	0,0	0,1	0,1	14,8	3,6
PG031 - Coleta e tratamento de esgoto	set-16	out-16	dez-18	mar-19	500,0	0,0	50,0	200,0	250,0	0,0
PG032 - Melhoria sist. de abastecimento de água	jan-16	out-16	ago-20	abr-21	67,6	0,5	9,5	24,3	30,1	1,2
PG034 - Educação ambiental	fev-16	out-16	jul-26	out-26	35,6	1,9	16,8	6,0	2,2	3,1
PG035 - Informação para a população	jun-16	out-16	mar-26	mar-26	24,8	0,0	1,4	2,3	2,3	2,3
PG036 - Comunic. nacional/internacional	jun-16	out-16	mar-26	mar-26	5,2	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5
PG038 - Monitoramento Bacia do Rio Doce	nov-15	jan-17	dez-30	dez-30	13,5	0,0	1,0	10,2	2,0	0,2
PG039 - Unidades de conservação	set-16	jan-17	dez-21	mar-22	15,0	0,0	6,5	8,5	0,0	0,0
PG040 - CAR e PRAs	nov-15	out-16	mar-26	mai-26	6,0	0,0	0,7	2,0	0,5	0,4
Total medidas compensatórias					1.959	2	101	313	366	89

Figura 9 – Desembolso dos programas socioambientais de cunho compensatório

(1) Valores realizados até Julho/2016.

(2) Valores previstos até Dezembro/2016.

3.3 Visão consolidada dos desembolsos

Abaixo são apresentados os custos gerais em milhões de reais planejados até dezembro de 2019.

Visão por capítulo	Total	Total 2017 -2019	Realizado²	2016³	2017³	2018³	2019³
Programas socioeconômicos	2.587	1.474	377,2	853,8	818,7	463,1	192,3
Programas socioambientais	4.645	2.103	208,4	721,3	981,9	763,4	357,6
Ações emergenciais ¹	199	43	141,3	94,0	26,5	16,6	0,0
Saldo medidas compensatórias	1.945	278	0,0	143,2	14,6	117,9	145,6
Visão pela natureza	Total	Total 2017 -2019	Realizado²	2016³	2017³	2018³	2019³
Medidas reparatórias	5.275	2.729	724,4	1.522,3	1.401,8	871,1	455,6
Medidas compensatórias	4.100	1.170	2,4	290,0	440,0	490,0	240,0
Total	9.375	3.899	727	1.812	1.842	1.361	696


Figura 10 – Sumário do orçamento até 2019

(1) As ações emergenciais/mitigatórias cobertas neste planejamento são aquelas que se iniciaram em sequência ao evento de rompimento da barragem e que tem seus custos e gestão absorvidos pelo ACORDO, apesar de não estarem diretamente associadas a nenhum dos programas socioeconômicos ou socioambientais.

(2) Valores realizados até Julho/2016.

(3) Valores previstos até Dezembro de cada ano.

EM BRANCO



4 DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO


4.1 Programas Socioeconômicos

4.1.1 PG001 – Cadastro dos Impactados

TOTAL	REALIZADO	ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
45,9	10,2	23,5	14,2	3,8	2,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Realizar cadastro de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e pequenas empresas), famílias e comunidades, contendo o levantamento dos impactos sociais, culturais, econômicos ou ambientais e posteriormente, a condução de monitoramento socioeconômico destas famílias e municípios afetados. Além disso, efetuar estudos para identificar e avaliar impactos socioeconômicos com base em requisitos de direitos humanos. CLÁUSULAS: 19 a 30.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cadastro emergencial de 5.296 famílias e 18.135 pessoas em MG e 3.217 famílias e 11.441 pessoas no ES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome de Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th><th>Sep</th><th>Out</th><th>Nov</th><th>Dez</th><th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th><th>Sep</th><th>Out</th><th>Nov</th><th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="26">PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)</td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 19 - Término do cadastramento dos Impactados (Cadastramento socioeconômico de</td> <td></td> <td>12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados</td> <td></td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo</td> <td></td> <td>4/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo</td> <td></td> <td>9/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>6/2016</td> <td>9/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="26">- PF0019 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>9/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Execução do Projeto</td> </tr> <tr> <td>Execução do Projeto</td> <td>11/2015</td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)</td> <td>11/2015</td> <td>7/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)</td> <td>6/2016</td> <td>12/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados</td> <td>8/2016</td> <td>3/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo</td> <td>10/2016</td> <td>4/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Elaboração de relatório de impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos impactados.</td> <td>1/2017</td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)</td> <td>7/2017</td> <td>9/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados</td> </tr> <tr> <td>Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados</td> <td>1/2017</td> <td>6/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas</td> </tr> <tr> <td>Monitoramento socioeconômico dos municípios</td> <td>6/2017</td> <td>6/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Estudos de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares</td> <td>6/2017</td> <td>6/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="26">- Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>6/2019</td> <td>10/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome de Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)																										- Metas do Programa																										Cláusula 19 - Término do cadastramento dos Impactados (Cadastramento socioeconômico de		12/2016																									Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados		3/2017																									Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		4/2017																									Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo		9/2017																									- Definição do Programa																										Definição do Programa	6/2016	9/2016																									- Execução do Programa																										- PF0019 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas																										Execução do Programa	11/2015	9/2017																									- Execução do Projeto																										Execução do Projeto	11/2015	7/2017																									Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	11/2015	7/2016																									Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)	6/2016	12/2016																									Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados	8/2016	3/2017																									Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo	10/2016	4/2017																									Elaboração de relatório de impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos impactados.	1/2017	7/2017																									Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	7/2017	9/2017																									- Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados																										Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados	1/2017	6/2019																									- Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas																										Monitoramento socioeconômico dos municípios	6/2017	6/2019																									Estudos de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares	6/2017	6/2019																									- Encerramento do Programa																										Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	6/2019	10/2019																								
Nome de Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PG001-R - Programa de levantamento e de cadastro dos impactados (Cláusulas 19 à 30)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
- Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cláusula 19 - Término do cadastramento dos Impactados (Cadastramento socioeconômico de		12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 24 - Término do levantamento das perdas materiais dos Impactados		3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 22 - Término da Validação do Cadastro Socioeconômico e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo		4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 20 - Validação do Estudo de Identificação de todas as áreas afetadas com Comitê Interfederativo		9/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Definição do Programa	6/2016	9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
- PF0019 - Levantamento e cadastro dos impactados e produção de informações para demais programas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Execução do Programa	11/2015	9/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Execução do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Execução do Projeto	11/2015	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Emergencial)	11/2015	7/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Execução do Diálogo, Coleta, Organização e Tratamento de dados do Cadastro de Impactados (Cadastramento Socioeconômico Definitivo)	6/2016	12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Execução da Coleta, Organização e Tratamento de dados do Levantamento de Perdas Materiais dos Impactados	8/2016	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Validação do Cadastro e do Levantamento de perdas materiais dos Impactados pelo Comitê Interfederativo	10/2016	4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Elaboração de relatório de impacto socioeconômico a partir de análise de indicadores do cadastro socioeconômico e identificação de danos dos impactados.	1/2017	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	7/2017	9/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Processos de Atualização do Cadastro Socioeconômico dos Impactados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Atualização, revisão e correção do Cadastro dos Impactados	1/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Processos de Monitoramento dos Impactos Socioeconômicos nas áreas afetadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Monitoramento socioeconômico dos municípios	6/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Estudos de avaliação de impactos socioeconômicos e culturais complementares	6/2017	6/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
- Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	6/2019	10/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

EM BRANCO






4.1.2 PG002 – Ressarcimento e indenização dos impactados

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
388,8	10,8	161,5	197,4	6,7	21,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Por meio de negociação coordenada, reparar e indenizar os impactados que sofreram prejuízos e danos devido ao evento. CLÁUSULAS: 31 a 38.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> • Lista de danos e matriz de danos aprovada internamente. • Verba para contratações de mão-de-obra, obras civis, TI, método de pagamento e toda infra estrutura operacional dos escritórios liberada. • Validação pelo CIF do cronograma de diálogo com entidades públicas, técnicas e famílias impactadas. • Desenvolvido o módulo de indenização antecipada. • Realizado treinamento com as equipes de Mariana, Barra Longa, Governador Valadares e Colatina no módulo de indenização antecipada. • Iniciadas reuniões de validação da matriz de danos com os representantes da população impactada (pescadores, agricultores e comerciantes) no ES e em MG. • Iniciadas obras de adequação dos 10 escritórios da fase 1. • Apresentado programa e obtido aceitação das prefeituras da fase 1 e entes técnicos principais (Incaper, Emater, Ministério da Agricultura e Abastecimento, CDL, SEBRAE, SECOVI, IBAPE). • Desenvolvida metodologia de atualização da matriz de danos. • Concluindo processos de contratação (cartões pré-pagos, atendimento ao público, segurança e limpeza dos escritórios e outros). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Item do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19">PG002 R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 a 38) 12/2015 1/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="19">• Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001)</td> <td></td> <td>6/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada)</td> <td></td> <td>7/2017</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">• Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">• Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td>Ações Emergenciais</td> <td>12/2015</td> <td>10/2019</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">• PR 0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="19">• Marcos do Projeto</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bãozinho e Linhares</td> <td>10/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas</td> <td>3/2016</td> <td>10/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">• Execução do Projeto</td> </tr> <tr> <td>Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bãozinho e Linhares</td> <td>6/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td>Implantar Centros de Negociação - Demais áreas</td> <td>5/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td>Realizar a Etapa de Negociação Coordenada</td> <td>10/2016</td> <td>6/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td>Efetuar os Pagamentos de indenizações</td> <td>10/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>7/2017</td> <td>10/2017</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">• Processo de Negociações e indenizações Remanescentes</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>10/2019</td> <td>1/2020</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2019</td> <td>1/2020</td> <td colspan="16">[Gantt bar]</td> </tr> </tbody> </table>						Item do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Mar	Jul	Out	Jan	Mar	Jul	Out	Jan	Mar	Jul	Out	Jan	Mar	Jul	Out	PG002 R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 a 38) 12/2015 1/2020																			• Metas do Programa																			Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001)		6/2017																		Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada)		7/2017																		• Definição do Programa																			• Execução do Programa																			Ações Emergenciais	12/2015	10/2019	[Gantt bar]																• PR 0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS																			• Marcos do Projeto																			Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bãozinho e Linhares	10/2016	7/2017	[Gantt bar]																Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas	3/2016	10/2017	[Gantt bar]																• Execução do Projeto																			Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bãozinho e Linhares	6/2016	10/2016	[Gantt bar]																Implantar Centros de Negociação - Demais áreas	5/2016	7/2017	[Gantt bar]																Realizar a Etapa de Negociação Coordenada	10/2016	6/2017	[Gantt bar]																Efetuar os Pagamentos de indenizações	10/2016	7/2017	[Gantt bar]																Encerramento do Projeto	7/2017	10/2017	[Gantt bar]																• Processo de Negociações e indenizações Remanescentes																			Encerramento do Programa	10/2019	1/2020	[Gantt bar]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2019	1/2020	[Gantt bar]															
Item do Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Jan	Mar	Jul	Out	Jan	Mar	Jul	Out	Jan	Mar	Jul	Out	Jan	Mar	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG002 R/C - Programa de ressarcimento e de indenização dos impactados (Cláusulas 31 a 38) 12/2015 1/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cláusula 38 - Conclusão da Etapa de Negociação Coordenada (previsão de 02/Mar/17 pelo ACORDO Impactada pelo PG001)		6/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cláusula 38 - Pagamento das indenizações (previsão de 02/Jun/17 pelo ACORDO Impactada)		7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
• Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
• Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ações Emergenciais	12/2015	10/2019	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
• PR 0060 - Ressarcimento e indenização dos IMPACTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
• Marcos do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Planejamento da Execução do Projeto em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bãozinho e Linhares	10/2016	7/2017	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Planejamento da Execução do Projeto nas Demais Áreas	3/2016	10/2017	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
• Execução do Projeto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Implantar Centros de Negociação - Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Governador Valadares, Colatina, Bãozinho e Linhares	6/2016	10/2016	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Implantar Centros de Negociação - Demais áreas	5/2016	7/2017	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Realizar a Etapa de Negociação Coordenada	10/2016	6/2017	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Efetuar os Pagamentos de indenizações	10/2016	7/2017	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Projeto	7/2017	10/2017	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
• Processo de Negociações e indenizações Remanescentes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Programa	10/2019	1/2020	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2019	1/2020	[Gantt bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

EM BRANCO




4.1.3 PG003 - Proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas

		ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
61,7	5,3	19,9	25,6	14,6	1,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>Manter as medidas de monitoramento contínuo de aspectos previstos no acordo celebrado com a VALE com os povos Krenak e também medidas de apoio emergencial e monitoramento contínuo das medidas de apoio emergencial aos povos Tupiniquim e Guarani. Outro objetivo é a contratação de consultoria independente conforme termo de referência da FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado dos impactos socioambientais e socioeconômicos do evento sobre os povos Krenak, Tupiniquim e Guarani. CLÁUSULAS: 39 a 45.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> • Krenak: Provisão de 14 mil litros de água mineral e 30 mil de água potável, auxílio emergência de 9 salários mínimos (R\$7.092) por família a 126 famílias, disponibilização de R\$20 mil como fundo de emergência para mitigação de danos ambientais e a saúde, recuperação do sistema de distribuição de água. • Tupiniquim (TI Comboios): Auxílio emergencial no valor de 2,5 salários mínimos, cesta básica(DIEESE) e 20% dependente para 156 famílias. • Tupiniquins e Guaranis (Caieiras Velhas II): Pagamento de auxílio emergencial no valor de R\$3.314.731,50 em 5 parcelas no valor de R\$ 662.942,70, depositado em uma conta vinculada à associação indígena. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Inicio</th> <th rowspan="2">Termino</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th> <th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 a 45)</td> <td>3/2016</td> <td>1/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart showing progress bars and milestones]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak</td> <td>3/2016</td> <td>4/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado</td> <td>4/2016</td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak</td> <td>7/2016</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 43 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)</td> <td>8/2018</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani</td> <td>3/2016</td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani</td> <td>3/2016</td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani</td> <td>7/2016</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 44 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)</td> <td>8/2018</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Execução do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="19">PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak</td> </tr> <tr> <td>Ereção de infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak</td> <td>11/2016</td> <td>5/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>5/2018</td> <td>8/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">(Início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processos de Apoio Emergencial</td> </tr> <tr> <td>Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro</td> <td>8/2016</td> <td>8/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro</td> <td>3/2016</td> <td>10/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Tupiniquim e Guarani (Comboios) - monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro</td> <td>3/2016</td> <td>11/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td>Fornecimento Emergencial de Água - Krenak</td> <td>8/2016</td> <td>5/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (capta e formalização de benefícios)</td> <td>10/2018</td> <td>1/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart]</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Inicio	Termino	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 a 45)	3/2016	1/2019	[Gantt chart showing progress bars and milestones]																Metas do Programa																			Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	3/2016	4/2016	[Gantt chart]																Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado	4/2016	7/2016	[Gantt chart]																Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak	7/2016	8/2018	[Gantt chart]																Cláusula 43 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)	8/2018	10/2018	[Gantt chart]																Cláusula 44 - Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani	3/2016	7/2016	[Gantt chart]																Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	3/2016	7/2016	[Gantt chart]																Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani	7/2016	8/2018	[Gantt chart]																Cláusula 44 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)	8/2018	10/2018	[Gantt chart]																Definição do Programa																			Execução do Programa																			PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak																			Ereção de infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak	11/2016	5/2018	[Gantt chart]																Encerramento do Projeto	5/2018	8/2018	[Gantt chart]																Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)																			(Início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)																			Processos de Apoio Emergencial																			Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	8/2016	8/2019	[Gantt chart]																Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	10/2016	[Gantt chart]																Tupiniquim e Guarani (Comboios) - monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	11/2016	[Gantt chart]																Fornecimento Emergencial de Água - Krenak	8/2016	5/2018	[Gantt chart]																Encerramento do Programa																			Encerramento do Programa (capta e formalização de benefícios)	10/2018	1/2019	[Gantt chart]															
Nome da Tarefa	Inicio	Termino	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr	Jan	Fev	Mar	Abr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PG003-R - Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida dos povos indígenas (Cláusulas 39 a 45)	3/2016	1/2019	[Gantt chart showing progress bars and milestones]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cláusula 43 - Início das medidas emergenciais - Krenak	3/2016	4/2016	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 43 - Entrega do Termo de Referência pela FUNAI para elaboração de estudo circunstanciado	4/2016	7/2016	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 43 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Krenak	7/2016	8/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 43 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Krenak (Depende do resultado do estudo)	8/2018	10/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 44 - Diagnóstico inicial sobre os Tupiniquim e Guarani	3/2016	7/2016	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 44 - Início das medidas emergenciais - Tupiniquim e Guarani	3/2016	7/2016	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 44 - Contratação do estudo de impactos socioambientais e socioeconômicos - Tupiniquim e Guarani	7/2016	8/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cláusula 44 - Detalhamento e implementação de um Plano de Ação Permanente - Tupiniquim e Guarani (depende do resultado do estudo)	8/2018	10/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PF0163 - Projeto de Abastecimento de Água - Krenak																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ereção de infraestrutura para Abastecimento de Água - Krenak	11/2016	5/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Encerramento do Projeto	5/2018	8/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Plano de Ação Permanente - Krenak; Tupiniquim e Guarani (a definir)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(Início da implementação do Plano de Ação Permanente caso seja necessário após conclusão do estudo de componente indígena)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Processos de Apoio Emergencial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Krenak - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	8/2016	8/2019	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tupiniquim e Guarani (Tupiniquim e Caieira) - Monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	10/2016	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Tupiniquim e Guarani (Comboios) - monitoramento contínuo de água, bovinocultura, saúde, diálogo e aporte financeiro	3/2016	11/2016	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Fornecimento Emergencial de Água - Krenak	8/2016	5/2018	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Encerramento do Programa (capta e formalização de benefícios)	10/2018	1/2019	[Gantt chart]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

EM BRANCO


EMBRANO



4.1.5 PG005 - Proteção social

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																							
38,6	0,0	3,8	15,3	12,3	7,2																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																												
Promover a proteção social por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com deslocamento físico. CLÁUSULAS: 54 a 58.																																																																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> Referenciamento das famílias impactadas por deslocamento físico nas unidades de Proteção Social Básica (CRAS). Apoio à rede pública de atendimento socioassistencial. Fortalecimento do sistema de vigilância socioassistencial no território. 																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																												
Os objetivos do programa serão realizados por meio de processos que contemplam ações socioassistenciais no período de 36 meses. Durante este período, a FUNDAÇÃO estará dando continuidade às ações emergenciais e, a partir de jun/17, estará implantando ações estruturadas até a efetiva definição do programa.																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 a 58)</td> <td>4/2016</td> <td>6/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social</td> <td>4/2016</td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social</td> <td></td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>4/2016</td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social</td> <td>4/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução de ações socioassistenciais emergenciais</td> <td>4/2016</td> <td>7/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)</td> <td>7/2017</td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme Acordo)</td> <td>7/2017</td> <td>4/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>4/2019</td> <td>6/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>4/2019</td> <td>6/2019</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 a 58)	4/2016	6/2019	[Gantt chart bars]																Metas do Programa			[Gantt chart bars]																Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social	4/2016		[Gantt chart bars]																Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		4/2019	[Gantt chart bars]																Definição do Programa	9/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																Execução do Programa	4/2016	4/2019	[Gantt chart bars]																Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																Execução de ações socioassistenciais emergenciais	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme Acordo)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]															
Nome do Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																											
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																										
PG005-R - Programa de Proteção Social (Cláusulas 54 a 58)	4/2016	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Metas do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 58 - Início do Programa de Proteção Social	4/2016		[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Cláusula 58 - Encerramento do Programa de Proteção Social		4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definição do Programa	9/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução do Programa	4/2016	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Processo de Ações Emergenciais de Proteção Social	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução de ações socioassistenciais emergenciais	4/2016	7/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Projetos/Processos de Ações Socioassistenciais (a definir)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Execução de ações socioassistenciais (36 meses após o início conforme Acordo)	7/2017	4/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	4/2019	6/2019	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																									


EM BRANCO



4.1.6 PG006 – Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
224,5	5,6	24,7	37,5	22,1	19,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>Criar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em espaços fixos ou itinerantes que contempla a instituição de mesa de diálogo e negociação permanente; a construção e manutenção do sítio virtual na internet; a criação e manutenção de espaços dialógicos com as comunidades; central 0800 de atendimento à população; criação de um manual de "perguntas e respostas"; divulgação em redes sociais sobre iniciativas da FUNDAÇÃO, esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação. CLÁUSULAS: 59 a 72.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de fóruns permanentes de diálogo com as comunidades impactadas, que permitem a definição de temas prioritários, antecipação de cenários de conflito e espaços de resolução. • Acumulado de reuniões: 258 com 8.554 participantes no trecho I (Mariana ao município de Rio Doce) e 189 com 7.710 participantes nos trechos II (municípios ao longo do rio Doce em MG) e III (municípios ao longo do rio Doce no ES). • Disponibilização de canais de comunicação: central 0800, <i>Fale conosco</i> no site da empresa, Facebook e postos físicos de atendimento. • Capacidade de atendimento de 100% das ligações no 0800. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>As medidas deste programa estão em andamento através de quatro processos básicos que foram iniciados em caráter emergencial após o EVENTO e que estão sendo adequadamente estruturados. São eles: a) Processo de comunicação institucional; b) Processo de participação e diálogo; c) Processo de canais de relacionamentos e d) Processo de ouvidoria.</p> <p>Para implantação do processo definitivo de ouvidoria, a FUNDAÇÃO prevê a realização do projeto "PF0149 – Implantação do Processo Definitivo de Ouvidoria da FUNDAÇÃO" com previsão de término para abr/17.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<p>Nome do Tarefas</p> <p>PG006-R - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (Cláusulas 59 a 117/2015) 12/2030</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tarefas</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Fim</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Mai</th> <th>Jul</th> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Mai</th> <th>Jul</th> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Mai</th> <th>Jul</th> <th>Jan</th> <th>Mar</th> <th>Mai</th> <th>Jul</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO</td> <td></td> <td>12/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria</td> <td></td> <td>4/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> • Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</td> <td>11/2015</td> <td>4/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo emergencial de comunicação institucional</td> <td>12/2015</td> <td>12/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo emergencial de participação e diálogo</td> <td>11/2015</td> <td>3/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo emergencial de canais de relacionamento</td> <td>11/2015</td> <td>3/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO</td> <td>11/2015</td> <td>4/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> • PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO</td> <td>8/2016</td> <td>7/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Diagnóstico do processo emergencial e teste de ouvidoria</td> <td>8/2016</td> <td>9/2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Implantação e adequação do processo de ouvidoria</td> <td>9/2016</td> <td>4/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Encerramento do Projeto</td> <td>4/2017</td> <td>7/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> • Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social</td> <td>12/2016</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo de comunicação institucional</td> <td>12/2016</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo de participação e diálogo</td> <td>3/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo de canais de relacionamento</td> <td>3/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO</td> <td>4/2017</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> • Encerramento do Programa</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tarefas	Início	Fim	2015				2017				2018				2019				Jan	Mar	Mai	Jul	Jan	Mar	Mai	Jul	Jan	Mar	Mai	Jul	Jan	Mar	Mai	Jul	• Metas do Programa																			Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO		12/2016																	Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria		4/2017																	Definição do Programa	9/2016	10/2016																	• Execução do Programa	11/2015	12/2030																	• Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	11/2015	4/2017																	Processo emergencial de comunicação institucional	12/2015	12/2016																	Processo emergencial de participação e diálogo	11/2015	3/2017																	Processo emergencial de canais de relacionamento	11/2015	3/2017																	Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO	11/2015	4/2017																	• PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	8/2016	7/2017																	Diagnóstico do processo emergencial e teste de ouvidoria	8/2016	9/2016																	Implantação e adequação do processo de ouvidoria	9/2016	4/2017																	Encerramento do Projeto	4/2017	7/2017																	• Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	12/2016	12/2030																	Processo de comunicação institucional	12/2016	12/2030																	Processo de participação e diálogo	3/2017	12/2030																	Processo de canais de relacionamento	3/2017	12/2030																	Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	4/2017	12/2030																	• Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																	Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																
Tarefas	Início	Fim	2015						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Jan	Mar	Mai	Jul	Jan	Mar	Mai	Jul	Jan	Mar	Mai	Jul	Jan	Mar	Mai	Jul																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cláusula 64/65 - Desenvolvimento de plataforma interativa sobre o EVENTO		12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cláusula 68 - Adequação de Ouvidoria		4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Definição do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
• Execução do Programa	11/2015	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
• Processos emergenciais em Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	11/2015	4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo emergencial de comunicação institucional	12/2015	12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo emergencial de participação e diálogo	11/2015	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo emergencial de canais de relacionamento	11/2015	3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo emergencial de ouvidoria - Atendido pela SAMARCO	11/2015	4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
• PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	8/2016	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Diagnóstico do processo emergencial e teste de ouvidoria	8/2016	9/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Implantação e adequação do processo de ouvidoria	9/2016	4/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Encerramento do Projeto	4/2017	7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
• Processos estruturados de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	12/2016	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo de comunicação institucional	12/2016	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo de participação e diálogo	3/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo de canais de relacionamento	3/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Processo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	4/2017	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
• Encerramento do Programa	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

EM BRANCO




4.1.7 PG007 - Assistência aos Animais


ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																							
16,4	10,1	10,1	2,8	1,3	0,1																																																																																																																																																																																																																							
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																												
Assistência aos animais extraviados e desalojados pelo EVENTO na região de Mariana e Barra Longa. CLÁUSULAS: 73 a 75.																																																																																																																																																																																																																												
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																												
<ul style="list-style-type: none"> • Conclusão da 3ª campanha de visitas de pós adoção. • 73 animais adotados (54% do total disponível para adoções). • 100% dos animais atendidos pelo programa possuem identificação e prontuário médico. • 111 animais de pequeno porte sob guarda do programa (55 disponíveis para adoção e 56 reconhecidos por seus tutores) • 244 animais de grande porte sob guarda do programa. • 3 fazendas mantidas pelo programa para assistência aos animais. 																																																																																																																																																																																																																												
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																												
Este programa foi iniciado logo após o EVENTO com previsão de manutenção por até 60 dias após a finalização do reassentamento, prazo que entendemos ser suficiente para que todos os animais já estejam com seus donos ou tenham sido efetivamente doados a seus tutores, dispensando assim, a necessidade de construção de um Santuário.																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)</td> <td>11/2015</td> <td>7/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 73 - Término da Assistência aos Animais</td> <td></td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>01/00</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>01/00</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)</td> <td>11/2015</td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)</td> <td>11/2015</td> <td>5/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>5/2019</td> <td>7/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de beneficiários)</td> <td>5/2019</td> <td>7/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)	11/2015	7/2019																		Metas do Programa																				Cláusula 73 - Término da Assistência aos Animais		5/2019																	01/00	Definição do Programa	9/2016	10/2016																	01/00	Execução do Programa	11/2015	5/2019																		Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)	11/2015	5/2019																		Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)	11/2015	5/2019																		Encerramento do Programa	5/2019	7/2019																		Encerramento do Programa (captura e formalização de beneficiários)	5/2019	7/2019																	
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																											
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																										
PG007-R - Programa de Assistência aos Animais (Cláusulas 73 à 75)	11/2015	7/2019																																																																																																																																																																																																																										
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 73 - Término da Assistência aos Animais		5/2019																	01/00																																																																																																																																																																																																									
Definição do Programa	9/2016	10/2016																	01/00																																																																																																																																																																																																									
Execução do Programa	11/2015	5/2019																																																																																																																																																																																																																										
Processo de Assistência aos Animais (Incluindo Ações Emergenciais)	11/2015	5/2019																																																																																																																																																																																																																										
Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção (não prevista a necessidade de implantar Santuário, conclusão prevista para 60 dias após Reassentamento)	11/2015	5/2019																																																																																																																																																																																																																										
Encerramento do Programa	5/2019	7/2019																																																																																																																																																																																																																										
Encerramento do Programa (captura e formalização de beneficiários)	5/2019	7/2019																																																																																																																																																																																																																										

EM BRANCO



EM BRANCO






4.1.9 PG009 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																					
261,3	29,2	96,4	137,6	27,2	0,0																																																																																																																																																																																																																																																					
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																										
Execução da dragagem em 400 metros a montante do barramento da UHE Risoleta Neves para permitir retorno da operação da UHE Risoleta Neves. CLÁUSULAS: 79 a 81.																																																																																																																																																																																																																																																										
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> • Dragagem de material para o Setor 4A. • Início da operação da draga dentro da área dos 400 m. 																																																																																																																																																																																																																																																										
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																										
Inicialmente previsto em 550.000m³, o volume necessário para dragagem deverá ficar entre 1.300.000m³ (melhor cenário com conclusão prevista para jun/17) e 2.300.000m³ (cenário possível com conclusão prevista para abr/18). Estes dois cenários estão sendo considerados no planejamento.																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 a 81, 11/2015) 10/2011</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 79 - Recuperação das condições para retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)</td> <td>4/2018</td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>10/2016</td> <td>11/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>11/2015</td> <td>7/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)</td> <td>11/2015</td> <td>7/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na Infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves</td> <td>11/2015</td> <td>6/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m</td> <td>6/2017</td> <td>4/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)</td> <td>4/2018</td> <td>7/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>7/2018</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>7/2018</td> <td>10/2018</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> </tbody> </table>							Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 a 81, 11/2015) 10/2011			[Gantt chart bars]																Metas do Programa			[Gantt chart bars]																Cláusula 79 - Recuperação das condições para retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)	4/2018		[Gantt chart bars]																Definição do Programa	10/2016	11/2016	[Gantt chart bars]																Execução do Programa	11/2015	7/2018	[Gantt chart bars]																PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)	11/2015	7/2018	[Gantt chart bars]																Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na Infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	11/2015	6/2017	[Gantt chart bars]																Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m	6/2017	4/2018	[Gantt chart bars]																Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	4/2018	7/2018	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa	7/2018	10/2018	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	7/2018	10/2018	[Gantt chart bars]															
Nome da Tarefa	Início	Término	2016							2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																								
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																								
PG009-R - Programa de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (Cláusulas 79 a 81, 11/2015) 10/2011			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Metas do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Cláusula 79 - Recuperação das condições para retomada da operação da UHE Risoleta Neves (Dez/16 - formalizada impossibilidade de cumprimento desta Meta do ACORDO)	4/2018		[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Definição do Programa	10/2016	11/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Execução do Programa	11/2015	7/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1 (liberação para retomada da operação da UHE Risoleta Neves)	11/2015	7/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Execução da Fase 1 para Dragagem de rejeitos nos primeiros 400m do Reservatório e reparos na Infraestrutura da UHE Risoleta Neves para retomada das condições operacionais da UHE Risoleta Neves	11/2015	6/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Possível Dragagem adicional de rejeitos nos primeiros 400m	6/2017	4/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Encerramento do Projeto (captura e formalização de benefícios)	4/2018	7/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Encerramento do Programa	7/2018	10/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	7/2018	10/2018	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																							

EM BRANCO






4.1.10 PG010 - Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas impactadas

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
293,1	150,1	220,2	59,2	7,0	0,0
OBJETIVO					
<p>Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas pelo evento tais como:</p> <p>a) reestabelecimentos de acessos. b) limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do EVENTO. c) demolição de estruturas comprometidas remanescentes e consequente limpeza. d) reconstrução de pontes. e) drenagens. f) reconstrução ou reforma de cercas, currais e paiol. g) reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos religiosos. h) reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público. i) reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer. j) reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas. k) recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo EVENTO. l) contenções de taludes e encostas para acessos. m) reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas. n) reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas. CLÁUSULAS: 82 a 88.</p>					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none">• 100% da construção de pontes de cabos de aço concluídas.• 100% de abertura de acessos para sirenes da "Fase 1".• 100% dos dispositivos de drenagens mapeados foram reestabelecidos.• 100% abertura e acabamento final das estradas não pavimentadas.• 100% de asfalto recuperado em Barra Longa.• 88 casas reformadas em Barra Longa e Gesteira.• 12 currais e 4 mata burros reformados em Barra Longa.• 38 quintais finalizados em Barra Longa.• Reformas concluídas em 23 propriedades rurais e 17 espaços públicos em distritos atingidos.					

EM BRANCO

100


EM BRANCO



4.1.11 PG011 - Recuperação escolas e reintegração da comunidade escolar

TOTAL	REALIZADO	ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9,7	0,1	0,9	1,9	2,3	2,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Providenciar a reconstrução, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários às escolas impactadas de Fundão até Candonga e providenciar os meios para reintegração de seus respectivos alunos e profissionais envolvidos nas rotinas escolares. CLÁUSULAS: 89 a 94.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos estudantes (900 alunos) das áreas impactadas concluíram o ano letivo de 2015 e seguem o calendário regular de 2016. • Reforma nas duas escolas de Barra Longa: E. E. Padre José Epifânio Gonçalves e E. M. José de Vasconcelos • Melhoria da acessibilidade nas escolas. • Maior integração da comunidade escolar por meio das atividades educativas complementares. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
O objetivo relacionado à reconstrução, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários está sendo tratado nos programas de infraestrutura PG008 e PG010 e neste o foco está na reintegração da comunidade escolar.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Ma</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Ma</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)</td> <td>1/2016</td> <td>5/2021</td> <td colspan="20">[Gantt chart showing task progress across months and years]</td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C 12/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P 3/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues 3/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B 10/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Definição do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> 9/2016 10/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Execução do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> 1/2016 3/2021 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Planejamento da Execução 8/2016 3/2017 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira 8/2016 10/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> 12/2016 3/2017 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Planejamento da Execução 6/2018 10/2018 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu 10/2018 3/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Planejamento da Execução 8/2018 9/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues 8/2018 12/2018 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Encerramento do Projeto 9/2018 3/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> 3/2019 5/2019 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) 1/2016 10/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 3/2016 3/2021 </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Encerramento do Programa </td> </tr> <tr> <td colspan="23"> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2021 5/2021 </td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Out	PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)	1/2016	5/2021	[Gantt chart showing task progress across months and years]																				Metas do Programa																							Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C 12/2016																							Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P 3/2019																							Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues 3/2019																							Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B 10/2016																							Definição do Programa																							9/2016 10/2016																							Execução do Programa																							1/2016 3/2021																							PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira																							Planejamento da Execução 8/2016 3/2017																							Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira 8/2016 10/2016																							Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016																							12/2016 3/2017																							PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu																							Planejamento da Execução 6/2018 10/2018																							Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu 10/2018 3/2019																							Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019																							PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																							Planejamento da Execução 8/2018 9/2019																							Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues 8/2018 12/2018																							Encerramento do Projeto 9/2018 3/2019																							3/2019 5/2019																							PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa																							Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) 1/2016 10/2016																							Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016																							Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais																							Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 3/2016 3/2021																							Encerramento do Programa																							Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2021 5/2021																						
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Jan	Feb	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PG011-R - Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (Cláusulas 89 a 94)	1/2016	5/2021	[Gantt chart showing task progress across months and years]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - C 12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - P 3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues 3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 89 - Conclusão de Recuperação da Escola e Reintegração da Comunidade Escolar - B 10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9/2016 10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1/2016 3/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PF0083A - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Planejamento da Execução 8/2016 3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reintegração da Comunidade Escolar de Gesteira 8/2016 10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
12/2016 3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PF0083B - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Planejamento da Execução 6/2018 10/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reintegração da Comunidade Escolar de Paracatu 10/2018 3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Projeto 3/2019 5/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PF0083C - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Planejamento da Execução 8/2018 9/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reintegração da Comunidade Escolar de Bento Rodrigues 8/2018 12/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Projeto 9/2018 3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3/2019 5/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PF0083D - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reintegração da Comunidade Escolar de Barra Longa (escopo realizado no PG010) 1/2016 10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Projeto 10/2016 12/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de Monitoramento e apoio aos aspectos educacionais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas 3/2016 3/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2021 5/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

EM BRANCO




4.1.12 PG012 - Memória histórica, cultural e artística

ORÇAMENTO (R\$MM)											
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019						
34,8	3,3	14,6	11,4	3,2	2,5						
OBJETIVO											
Recuperar bens culturais de natureza material e preservar patrimônio cultural das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira atingidas pelo EVENTO. CLÁUSULAS: 95 a 100.											
STATUS ATUAL											
Coleta de aproximadamente 1672 peças sacras (419 na arquidiocese e 1617 reserva técnica) e 1312 capacitações no âmbito da temática arqueológica.											
CRONOGRAMA E METAS											
Será realizado um diagnóstico para definir o programa até ago/17, onde projetos e processos necessários para esta preservação serão apresentados e conduzidos por 60 meses. Além disso, em virtude da necessidade de resgate e salvaguarda de bens materiais, a FUNDAÇÃO dará continuidade a este processo até a definição da solução definitiva que será apontada pelo diagnóstico.											
Nome da Tarefa		Início	Término	2016		2017		2018		2019	
PG012-R - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística (Cláusulas 95)		7/2016	10/2022	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out
Metas do Programa											
Cláusula 100 - Condição da recuperação dos bens materiais e imateriais			7/2020								
Definição do Programa		5/2016	8/2017								
Execução do Programa		2/2016	7/2022								
Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais		2/2016	7/2017								
Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais		2/2016	7/2017								
Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (a definir)		7/2017	7/2022								
Processo/Projetos para recuperação de bens materiais e imateriais (3 anos para conclusão das ações referentes aos bens materiais e imateriais - 2 anos de		7/2017	7/2022								
Encerramento do Programa		7/2022	10/2022								
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		7/2022	10/2022								

EM BRANCO






4.1.13 PG013 - Turismo, cultura, esporte e lazer

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
18,3	0,0	1,6	6,4	5,0	2,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Realizar o diagnóstico de impacto no turismo, cultura, esporte e lazer que deverá nortear a estruturação de projetos e processos para fomento dessas atividades nas localidades que tiverem impactos apontados. CLÁUSULAS: 101 a 105.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> • Detalhamento do Programa e definição do Termo de Referência e demais documentos licitatórios. • Apoio emergencial às áreas mais afetadas no tema objeto do Programa (Mariana e Linhares – Regência). • Contato formal com os 40 municípios da área de abrangência socioeconômica informando do futuro próximo dos trabalhos por meio de consultoria especializada e encaminhando questionário para coleta de informações prévias. • Recebimento das propostas técnicas para realização do diagnóstico em 17/08 (vendedor list : 10 empresas. Propostas Recebidas: 5. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Excepcionalmente, a FUNDAÇÃO poderá apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico, previsto num processo emergencial para tal finalidade.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG013 R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)</td> <td>4/2016</td> <td>6/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>↳ Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer</td> <td></td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer</td> <td></td> <td>3/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>↳ Definição do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> 9/2016</td> <td></td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>↳ Execução do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> 4/2016</td> <td></td> <td>3/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> ↳ Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer</td> <td></td> <td>4/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIP)</td> <td></td> <td>4/2016</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> ↳ Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn. Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)</td> <td></td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> 3/2017</td> <td></td> <td>3/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td>↳ Encerramento do Programa</td> <td></td> <td></td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> 3/2022</td> <td></td> <td>6/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> <tr> <td> Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td></td> <td>3/2022</td> <td colspan="16">[Gantt chart bars]</td> </tr> </tbody> </table>							Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG013 R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)	4/2016	6/2022	[Gantt chart bars]																↳ Metas do Programa			[Gantt chart bars]																Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer		3/2017	[Gantt chart bars]																Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer		3/2022	[Gantt chart bars]																↳ Definição do Programa			[Gantt chart bars]																9/2016		3/2017	[Gantt chart bars]																↳ Execução do Programa			[Gantt chart bars]																4/2016		3/2022	[Gantt chart bars]																↳ Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer		4/2016	[Gantt chart bars]																Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIP)		4/2016	[Gantt chart bars]																↳ Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn. Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)		3/2017	[Gantt chart bars]																3/2017		3/2022	[Gantt chart bars]																↳ Encerramento do Programa			[Gantt chart bars]																3/2022		6/2022	[Gantt chart bars]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		3/2022	[Gantt chart bars]															
Nome da Tarefa	Início	Término	2016							2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PG013 R/C - Programa de apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer (Cláusulas 101 à 105)	4/2016	6/2022	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↳ Metas do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 102 - Diagnóstico do impacto no turismo, cultura, esporte e lazer		3/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cláusula 105 - Encerramento das ações de fomento de turismo, cultura, esporte e lazer		3/2022	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↳ Definição do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9/2016		3/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↳ Execução do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4/2016		3/2022	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↳ Processo de ações emergenciais para apoio ao turismo, cultura, esporte e lazer		4/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico (depende de aprovação da Fundação e CIP)		4/2016	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↳ Processos/Projetos de fomento ao turismo, cultura, esporte e lazer (a definir após Diagn. Processos/Projetos a serem definidos após o diagnóstico (60 meses)		3/2017	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3/2017		3/2022	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
↳ Encerramento do Programa			[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3/2022		6/2022	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		3/2022	[Gantt chart bars]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

EM BRANCO




4.1.14 PG014 - Saúde física e mental da população impactada

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
162,6	10,7	23,8	41,0	40,1	26,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS e desenvolver estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de Mariana até a foz do Rio Doce, de forma a avaliar riscos e correlações decorrentes do EVENTO. CLÁUSULAS: 106 a 112.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<ul style="list-style-type: none"> Cumprimento do cronograma previsto nos planos das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social de Mariana e de Saúde de Barra Longa: 309 ações levantadas, com 44 finalizadas e 265 no prazo (14% de evolução). Taxa de incidência e prevalência de doenças: mapa do perfil epidemiológico retrospectivo. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A premissa é que os estudos sejam executados até nov/25 com informações geradas para subsidiar ações de apoio à saúde durante o período previsto.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19">PG014 R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10 - 11/2015 - 11/2025)</td> </tr> <tr> <td colspan="19">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à saúde Física e Mental</td> <td></td> <td>3/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>03/20</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 111 - Encerramento de Estudo epidemiológico e toxicológico</td> <td></td> <td>11/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Definição do Programa</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS</td> </tr> <tr> <td>Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)</td> <td>11/2015</td> <td>3/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)</td> <td>11/2015</td> <td>3/2019</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas</td> </tr> <tr> <td>Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)</td> <td>6/2016</td> <td>11/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)</td> <td>6/2016</td> <td>11/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="19">Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>8/2025</td> <td>11/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>8/2025</td> <td>11/2025</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	PG014 R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10 - 11/2015 - 11/2025)																			Metas do Programa																			Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à saúde Física e Mental		3/2019																	03/20	Cláusula 111 - Encerramento de Estudo epidemiológico e toxicológico		11/2025																		Definição do Programa																			Execução do Programa	9/2016	10/2016																		Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS																			Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)	11/2015	3/2019																		Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)	11/2015	3/2019																		Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas																			Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)	6/2016	11/2025																		Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)	6/2016	11/2025																		Encerramento do Programa																			Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2025	11/2025																		Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2025	11/2025																	
Nome da Tarefa	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out	Jan	Fev	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PG014 R - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (Cláusulas 10 - 11/2015 - 11/2025)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cláusula 110 - Encerramento do Processo de apoio à saúde Física e Mental		3/2019																	03/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 111 - Encerramento de Estudo epidemiológico e toxicológico		11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Definição do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Execução do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Processo de apoio à saúde física e mental dos IMPACTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)	11/2015	3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ações na área de atenção primária/secundária, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, laboratorial e atenção em saúde mental (36 meses)	11/2015	3/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Processo/Estudo epidemiológico e toxicológico das regiões impactadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)	6/2016	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, exploratória e descritiva com mapeamento de perfil epidemiológico e sanitário (10 anos antes e após o EVENTO)	6/2016	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2025	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	8/2025	11/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

EM BRANCO






4.1.15 PG015 - Tecnologias Socioeconômicas

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
7,6	0,0	0,0	0,1	1,1	1,1
OBJETIVO					
Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à recuperação das áreas impactadas pelo desastre, através da criação e fortalecimento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com internalização das tecnologias geradas para o processo de recuperação. CLAUSULAS: 113 a 115.					
STATUS ATUAL					
CRONOGRAMA E METAS					
<p>Nome da Tarefa Mês/Terço 2016 2017 2018 2019</p> <p>PG015-C - Programa de Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas Aplicadas à Remediação dos Impactos, de natureza compensatória (Cláusulas 113 a 115) 12/2016 1/2018</p> <p>Metas do Programa</p> <p>Cláusula 113 - Conclusão da Definição e Formalização do Programa junto ao CIB 10/2017</p> <p>Definição do Programa 12/2016 10/2017</p> <p>Execução do Programa (e definir)</p> <p>Ações compensatórias para este programa deverão ser definidas após a Definição do Programa</p> <p>Encerramento do Programa 10/2017 1/2018</p> <p>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 10/2017 1/2018</p>					


EM BRANCO



4.1.16 PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																									
10,2	0,0	0,0	0,0	6,3	2,9																																																																																																																																																																									
OBJETIVO																																																																																																																																																																														
<p>Recomposição das áreas produtivas e das condições para produção dos pescadores iguais ou melhores as condições anteriores a passagem da pluma; Elaborar plano de recuperação de atividades de aquicultura e pesca impactadas; Regularização da situação de pescadores não registrados; Prestar assistência técnica aos pescadores impactados pelo EVENTO e às suas respectivas cooperativas e associações, de modo a viabilizar a retomada de suas atividades; Ofertas de cursos de qualificação profissional em outras atividades e realocação em casos de retomada impossível da atividade de pesca. O presente programa também se aplica aos areiros IMPACTADOS, desde que legalmente autorizados para a atividade. O plano de recuperação de atividades de aquicultura impactadas deverá ser articulado com os estudos ambientais. CLÁUSULAS: 116 a 123.</p>																																																																																																																																																																														
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																														
<ul style="list-style-type: none"> Cartões entregues pelo PG021: 5.294 Pescadores, 136 areiros e 136 marisqueiros. Contratação de consultoria para elaboração de TR. 																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																														
<p>A fase de execução terá duração de 24 meses e, em virtude da necessidade da melhoria da qualidade da água e para maior efetividade do programa, a realização desta fase está prevista entre mar/18 e mar/20. Ainda assim, é prevista a conclusão da fase de definição do programa para mar/17, o que possibilitará a eventual antecipação de ações em 2017 que possibilitem a retomada de potenciais atividades econômicas que beneficiem os IMPACTADOS no âmbito desse programa.</p>																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Tarefa</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17"> PG016-R: Progresso da Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123 em 3/2017 em 5/2020) </td> </tr> <tr> <td colspan="17">Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) 4/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Definição do Programa 3/2017 4/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Execução do Programa 3/2018 3/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) 3/2018 3/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Encerramento do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2020 5/2020</td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Tarefa	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG016-R: Progresso da Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123 em 3/2017 em 5/2020)																	Metas do Programa																	Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) 4/2017																	Definição do Programa 3/2017 4/2017																	Execução do Programa 3/2018 3/2020																	Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) 3/2018 3/2020																	Encerramento do Programa																	Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2020 5/2020																
Nome do Tarefa	2016				2017				2018				2019																																																																																																																																																																	
	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																														
PG016-R: Progresso da Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Cláusulas 116 à 123 em 3/2017 em 5/2020)																																																																																																																																																																														
Metas do Programa																																																																																																																																																																														
Cláusula 122 - Emissão do Plano de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (Definição do Programa) 4/2017																																																																																																																																																																														
Definição do Programa 3/2017 4/2017																																																																																																																																																																														
Execução do Programa 3/2018 3/2020																																																																																																																																																																														
Processos/Projetos para retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (24 meses previstos no ACORDO para qualificação e assistência técnica) 3/2018 3/2020																																																																																																																																																																														
Encerramento do Programa																																																																																																																																																																														
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 3/2020 5/2020																																																																																																																																																																														

EM BRANCO




4.1.17 PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
125,5	3,5	18,2	52,1	27,8	14,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Disponibilização de área aos produtores que tiveram suas atividades agropecuárias permanentemente inviabilizadas em decorrência do EVENTO, equivalente à SITUAÇÃO ANTERIOR; Recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das condições para produzir conforme SITUAÇÃO ANTERIOR, incluindo solo, animais, equipamentos e instalações; Recuperação de pastagens nas áreas impactadas, quando tecnicamente viável; Formação de pastagens equivalentes em outras áreas da propriedade em substituição às pastagens tecnicamente não recuperáveis; Substituição de pastagens por outras fontes de alimentação animal com maior produtividade que possam ser cultivadas na propriedade impactada; Reestabelecimento das estruturas de captação de água para irrigação e dessedentação animal impactadas à SITUAÇÃO ANTERIOR ou, não sendo possível, desenvolver alternativas ao reestabelecimento das estruturas de captação de água; e Fomecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até recuperação da pastagem. CLÁUSULAS: 124 a 128.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<ul style="list-style-type: none"> Finalizados os plantios em caráter de substituição de forragem animal em 94 propriedades. Construção de 188 km de cerca. Entrega de silagem aos produtores, sendo o acumulado de 4263t até Julho (referente aos silos construídos, foram 1.500t de silagem estocadas nas propriedades em Barra Longa e Mariana). 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome do Projeto</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Ma</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Mar</th> <th>Abr</th> <th>Ma</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ago</th> <th>Sep</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="26">PG017 R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128) 11/2015 11/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* Metas do Programa</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 10/2017 30/10</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem 8/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades 8/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Definição do Programa 9/2016 10/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* Execução do Programa 11/2015 8/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* PFD061 - Cercamento das demais propriedades afetadas 4/2016 5/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Execução do cercamento das demais propriedades afetadas 4/2016 2/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Encerramento do Projeto 2/2017 5/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* PFD089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f) 12/2015 1/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Planejamento da Execução 12/2015 4/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 1/2016 10/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Encerramento do Projeto 10/2017 1/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* PFD141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a: b: c) 6/2016 2/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Planejamento da Execução 6/2016 2/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais 2/2017 11/2019</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Encerramento do Projeto 11/2019 2/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* PFD142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e) 6/2016 5/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Avaliação de Alternativas 6/2016 1/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (1) 1/2017 1/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Planejamento da Execução 1/2018 6/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda 6/2018 2/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Encerramento do Projeto 2/2020 5/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* PFD143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo) 6/2016 11/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">avaliação de Alternativas 6/2016 3/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Definição do Escopo 3/2017 7/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Planejamento da Execução 7/2017 11/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas 11/2017 8/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Encerramento do Projeto 8/2020 11/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* Processos de Monitoramento e Manutenção 11/2015 8/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Processo de fomecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j) 11/2015 8/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PFD143) 8/2016 8/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa) 8/2020 7/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="26">* Encerramento do Programa 8/2022 11/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="26">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 8/2022 11/2022</td> </tr> </tbody> </table>						Nome do Projeto	Início	Término	2016				2017				2018				2019				Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	PG017 R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128) 11/2015 11/2022																										* Metas do Programa																										Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 10/2017 30/10																										Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem 8/2020																										Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades 8/2022																										Definição do Programa 9/2016 10/2016																										* Execução do Programa 11/2015 8/2022																										* PFD061 - Cercamento das demais propriedades afetadas 4/2016 5/2017																										Execução do cercamento das demais propriedades afetadas 4/2016 2/2017																										Encerramento do Projeto 2/2017 5/2017																										* PFD089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f) 12/2015 1/2018																										Planejamento da Execução 12/2015 4/2016																										Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 1/2016 10/2017																										Encerramento do Projeto 10/2017 1/2018																										* PFD141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a: b: c) 6/2016 2/2020																										Planejamento da Execução 6/2016 2/2017																										Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais 2/2017 11/2019																										Encerramento do Projeto 11/2019 2/2020																										* PFD142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e) 6/2016 5/2020																										Avaliação de Alternativas 6/2016 1/2017																										Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (1) 1/2017 1/2018																										Planejamento da Execução 1/2018 6/2018																										Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda 6/2018 2/2020																										Encerramento do Projeto 2/2020 5/2020																										* PFD143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo) 6/2016 11/2020																										avaliação de Alternativas 6/2016 3/2017																										Definição do Escopo 3/2017 7/2017																										Planejamento da Execução 7/2017 11/2017																										Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas 11/2017 8/2020																										Encerramento do Projeto 8/2020 11/2020																										* Processos de Monitoramento e Manutenção 11/2015 8/2022																										Processo de fomecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j) 11/2015 8/2020																										Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PFD143) 8/2016 8/2022																										Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa) 8/2020 7/2021																										* Encerramento do Programa 8/2022 11/2022																										Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 8/2022 11/2022																									
Nome do Projeto	Início	Término	2016						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PG017 R - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (Cláusulas 124 à 128) 11/2015 11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cláusula 125f - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 10/2017 30/10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cláusula 125b - Recuperação das áreas produtivas impactadas e final da entrega de silagem 8/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cláusula 125c - Encerramento da assistência técnica aos produtores, cooperativas e associações devido à retomada de suas atividades 8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Definição do Programa 9/2016 10/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* Execução do Programa 11/2015 8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* PFD061 - Cercamento das demais propriedades afetadas 4/2016 5/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Execução do cercamento das demais propriedades afetadas 4/2016 2/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Projeto 2/2017 5/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* PFD089 - Recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo (Cláusula 125f) 12/2015 1/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Planejamento da Execução 12/2015 4/2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Execução da recomposição da alimentação animal através de plantio alternativo 1/2016 10/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Projeto 10/2017 1/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* PFD141 - Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais (Cláusula 125 a: b: c) 6/2016 2/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Planejamento da Execução 6/2016 2/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Reconstrução de benfeitorias e garantia de acesso a bens e serviços essenciais 2/2017 11/2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Projeto 11/2019 2/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* PFD142 - Diversificação das fontes de renda (Cláusula 125 e) 6/2016 5/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Avaliação de Alternativas 6/2016 1/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Definição do Escopo, incluindo implantação de até 4 unidades de referência tecnológica (1) 1/2017 1/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Planejamento da Execução 1/2018 6/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Execução do Projeto de Diversificação das fontes de renda 6/2018 2/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Projeto 2/2020 5/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* PFD143 - Recuperação das áreas produtivas impactadas (Cláusula 125b parte de solo) 6/2016 11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
avaliação de Alternativas 6/2016 3/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Definição do Escopo 3/2017 7/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Planejamento da Execução 7/2017 11/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Execução da Recuperação das áreas produtivas impactadas 11/2017 8/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Projeto 8/2020 11/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* Processos de Monitoramento e Manutenção 11/2015 8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Processo de fomecimento de alimentação para animais nas propriedades rurais diretamente impactadas, até a recuperação da pastagem (Cláusula 125j) 11/2015 8/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Processo de capacitação e assistência técnica para aumento da produtividade (conclusão 24 meses após a recuperação total das áreas produtivas - PFD143) 8/2016 8/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Monitoramento de efetividade das ações de recuperação do solo e plantio (Premissa adotada para verificação da efetividade do programa) 8/2020 7/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* Encerramento do Programa 8/2022 11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios) 8/2022 11/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

EM BRANCO


100



4.1.18 PG018 - Diversificação da Economia Regional

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																									
42,7	0,0	0,9	11,8	4,6	3,7																																																																																																																																																																									
OBJETIVO																																																																																																																																																																														
Implementar estratégias para o desenvolvimento de outras atividades econômicas na região que promovam a diminuição de sua dependência com relação à indústria minerária, estimulando o surgimento de novas indústrias na região, baseada em alternativas tecnológicas de base sustentável e capaz de promover uma maior integração produtiva da população. CLÁUSULAS: 129 a 131.																																																																																																																																																																														
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																														
Alinhamentos conceituais junto ao CIF e Prefeitura de Mariana.																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 a 131)</td> <td colspan="16">9/2016 12/2030</td> </tr> <tr> <td>Metas do Programa</td> <td colspan="16">8/2017</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econôm</td> <td colspan="16">8/2017</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td colspan="16">9/2016 10/2017</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td colspan="16">10/2017 12/2030</td> </tr> <tr> <td>Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)</td> <td colspan="16">10/2017 12/2030</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td colspan="16">10/2030 12/2030</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td colspan="16">10/2030 12/2030</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	2016				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 a 131)	9/2016 12/2030																Metas do Programa	8/2017																Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econôm	8/2017																Definição do Programa	9/2016 10/2017																Execução do Programa	10/2017 12/2030																Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)	10/2017 12/2030																Encerramento do Programa	10/2030 12/2030																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030 12/2030															
Nome da Tarefa	2016				2017				2018				2019																																																																																																																																																																	
	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																														
PG018-C - Programa de Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria (Cláusulas 129 a 131)	9/2016 12/2030																																																																																																																																																																													
Metas do Programa	8/2017																																																																																																																																																																													
Cláusula 129 - Emissão de Diagnóstico das potencialidades e incentivo às atividades econôm	8/2017																																																																																																																																																																													
Definição do Programa	9/2016 10/2017																																																																																																																																																																													
Execução do Programa	10/2017 12/2030																																																																																																																																																																													
Processo/Projetos compensatórios para recuperação e diversificação da economia (a definir)	10/2017 12/2030																																																																																																																																																																													
Encerramento do Programa	10/2030 12/2030																																																																																																																																																																													
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030 12/2030																																																																																																																																																																													

EM BRANCO




4.1.19 PG019 - Micro e Pequenos Negócios

ORÇAMENTO (R\$MM)																		
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019													
26,5	0,7	4,4	4,1	4,0	4,0													
OBJETIVO																		
Recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo impactados e localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação, diretamente impactados pelo EVENTO. CLÁUSULAS: 132 a 133.																		
STATUS ATUAL																		
<ul style="list-style-type: none"> • Barra Longa: 92 Processos mapeados (33 Autônomos, 59 Comércios, 66 Processos concluídos). • Mariana: 176 Processos mapeados (120 Autônomos, 15 Comércios, 41 Produtores Rurais, 168 Processos Concluídos). 																		
CRONOGRAMA E METAS																		
Fase de execução com prazo previsto de 36 meses.																		
Nome da Tarefa	Início	Fim	2016				2017				2018				2019			
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out
PG019-R - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo (Cláusulas 132 e 133)	12/2015	6/2020																
• Metas do Programa																		
Cláusula 132 - Término das ações de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação (24 meses após aprovação do ORÇAMENTO da FUNDAÇÃO)		8/2018																
Cláusula 133 - Término da incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais		3/2020																
Definição do Programa	10/2016	3/2017																
• Execução do Programa	12/2015	3/2020																
• Processo de recuperação de micro e pequenos negócios	12/2015	3/2020																
Processo Emergencial de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	12/2015	3/2017																
Processo de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	3/2017	7/2018																
Processo de incubação de novos negócios em substituição aos anteriores em caso de impossibilidade de retomada das atividades originais (26 meses após formalização do	3/2017	3/2020																
• Encerramento do Programa	3/2020	6/2020																
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2020	6/2020																

EM BRANCO






4.1.20 PG020 - Estímulo à Contratação Local

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																		
2,3	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5																																																																																																																																																																																																																																		
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																							
Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso de força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem desenvolvidas de Fundação à Regência. CLÁUSULAS: 134 a 136.																																																																																																																																																																																																																																							
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																							
Medição da Mão de Obra local contratada nas regiões atingidas:																																																																																																																																																																																																																																							
<ul style="list-style-type: none"> • 1320 trabalhadores locais das cidades impactadas (64 %). • 850 trabalhadores fora das regiões impactadas (36%). 																																																																																																																																																																																																																																							
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Má</th> <th>Abr</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> <th>Jan</th> <th>Fev</th> <th>Má</th> <th>Abr</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Nov</th> <th>Dez</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)</td> <td>11/2015</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Metas do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 134 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações erectadas pela Samarco)</td> <td>10/2016</td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>9/2016</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Execução do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)</td> <td>11/2015</td> <td>10/2016</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)</td> <td>10/2016</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>• Encerramento do Programa</td> <td></td> <td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>10/2030</td> <td>12/2030</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2015				2017				2018				2019				Jan	Fev	Má	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Má	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)	11/2015	12/2030																			• Metas do Programa																					Cláusula 134 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações erectadas pela Samarco)	10/2016																				Definição do Programa	9/2016	10/2016																			• Execução do Programa																					Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	11/2015	10/2016																			Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)	10/2016	12/2030																			• Encerramento do Programa																					Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																		
Nome da Tarefa	Início	Término	2015						2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																						
			Jan	Fev	Má	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Má	Abr	Jun	Jul	Out	Nov	Dez																																																																																																																																																																																																																			
PG020-C - Programa de Estímulo à Contratação Local (Cláusulas 134 à 136)	11/2015	12/2030																																																																																																																																																																																																																																					
• Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																							
Cláusula 134 - Início do Programa de Estímulo à Contratação Local na Fundação (Programa já ativo nas contratações erectadas pela Samarco)	10/2016																																																																																																																																																																																																																																						
Definição do Programa	9/2016	10/2016																																																																																																																																																																																																																																					
• Execução do Programa																																																																																																																																																																																																																																							
Processo emergencial de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Samarco)	11/2015	10/2016																																																																																																																																																																																																																																					
Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local (Fundação)	10/2016	12/2030																																																																																																																																																																																																																																					
• Encerramento do Programa																																																																																																																																																																																																																																							
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	10/2030	12/2030																																																																																																																																																																																																																																					

EM BRANCO






4.1.21 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																											
464,1	124,4	202,9	113,6	81,9	40,9																																																																																																																																																																																											
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																
Prestar auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades produtivas ou econômicas em decorrência do evento, até o restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou econômicas. CLÁUSULAS: 137 a 140.																																																																																																																																																																																																
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> Elegíveis: 7.969. Cartões confeccionados: 8.021. Cartões entregues: 7.531. Abrangência territorial: 38 municípios da Bacia do Rio Doce, área costeira, Mariana e Barra Longa. 																																																																																																																																																																																																
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																
Este programa foi iniciado logo após o EVENTO e ficará ativo até que as condições pré-existent sejam restabelecidas.																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Início</th> <th rowspan="2">Término</th> <th colspan="4">2015</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> <th>Jan</th> <th>Abr</th> <th>Jul</th> <th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140, 11/2015)</td> <td>9/2015</td> <td>9/2020</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">↳ Metas do Programa</td> <td colspan="16"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal</td> <td colspan="16">6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">↳ Definição do Programa</td> <td colspan="16">9/2016 10/2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">↳ Execução do Programa</td> <td colspan="16">11/2015 6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)</td> <td colspan="16">11/2015 6/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">↳ Encerramento do Programa</td> <td colspan="16">6/2020 9/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td colspan="16">6/2020 9/2020</td> </tr> </tbody> </table>						Nome da Tarefa	Início	Término	2015				2017				2018				2019				Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140, 11/2015)	9/2015	9/2020																	↳ Metas do Programa																			Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal			6/2020																↳ Definição do Programa			9/2016 10/2016																↳ Execução do Programa			11/2015 6/2020																Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)			11/2015 6/2020																↳ Encerramento do Programa			6/2020 9/2020																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)			6/2020 9/2020															
Nome da Tarefa	Início	Término	2015						2017				2018				2019																																																																																																																																																																															
			Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out	Jan	Abr	Jul	Out																																																																																																																																																																														
PG021-R - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial aos IMPACTADOS (Cláusulas 137 a 140, 11/2015)	9/2015	9/2020																																																																																																																																																																																														
↳ Metas do Programa																																																																																																																																																																																																
Cláusula 140 - Retomada das atividades econômicas dos IMPACTADOS e encerramento do auxílio financeiro mensal			6/2020																																																																																																																																																																																													
↳ Definição do Programa			9/2016 10/2016																																																																																																																																																																																													
↳ Execução do Programa			11/2015 6/2020																																																																																																																																																																																													
Processo de pagamento de auxílio financeiro emergencial (até retomada das atividades econômicas originais dos IMPACTADOS)			11/2015 6/2020																																																																																																																																																																																													
↳ Encerramento do Programa			6/2020 9/2020																																																																																																																																																																																													
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)			6/2020 9/2020																																																																																																																																																																																													

EM BRANCO






4.1.22 PG042 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários

ORÇAMENTO (R\$MM)											
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019						
29,4	0,0	0,00	29,4	0,00	0,00						
OBJETIVO											
Ressarcir os compromitentes pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento. CLÁUSULAS: 141 a 143.											
STATUS ATUAL											
Análise do Termo e desenho do macroprocesso e fluxo do Programa.											
CRONOGRAMA E METAS											
Nome da Tarefa		Início	Término	2016		2017		2018		2019	
				Jan	Mar	Mai	Jul	Set	Nov	Jan	Mar
PG042-R - Programa de Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos COMPROMITENTES (CLÁUSULAS 141 à 143)		6/2016	12/2017								
- Metas do Programa		12/2017	12/2017								
Cláusula 141 - Conclusão do Ressarcimento dos COMPROMITENTES											
- Definição do Programa		6/2016	12/2016								
Definição e Formalização do Programa junto ao CIP											
- Execução do Programa		1/2017	12/2017								
Ressarcimento dos COMPROMITENTES											
- Encerramento do Programa		10/2017	12/2017								
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)											

EM BRANCO






4.2 Programas Socioambientais

4.2.1 PG023 - Manejo dos rejeitos

ORÇAMENTO (R\$MM)					
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OBJETIVO					
Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 e realizar o manejo de rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, conforme resultados decorrentes dos estudos previstos neste programa, bem como considerando os fatores ambientais, sociais e econômicos da região. CLÁUSULAS: 150 a 153.					
STATUS ATUAL					
<ul style="list-style-type: none">• Resultado final do estudo biogeoquímico e geomorfológico entregue aos órgãos reguladores em atendimento à cláusula 150• Orientações para manejo de rejeito entregue aos órgãos reguladores em atendimento à cláusula 150.					
CRONOGRAMA E METAS					
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos - e tanto o cronograma como o custo dos dois programas está sendo apresentado neste documento no PG025.					

EM BRANCO






4.2.2 PG024 - Sist. contenção dos rejeitos e tratamento dos rios

ORÇAMENTO (R\$MM)																				
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019															
648,5	45,4	298,2	181,8	98,1	61,2															
OBJETIVO																				
Construir e operar estruturas emergenciais de contenção de sedimentos e/ou sistemas de tratamento in situ da área contida entre a Barragem de Fundão até a UHE Risoleta Neves. CLÁUSULAS: 154 à 157.																				
STATUS ATUAL																				
<ul style="list-style-type: none"> Realizada limpeza de ~160 mil m³ de fundação em Santarém, 523 mil m³ no Eixo 1 de Fundão e 12 mil na região do dique S3. Lançamento de aproximadamente 30 mil m³ de aterro compactado em Nova Santarém. Número de trabalhadores nas obras das barragens: 1.635. Retenção de sedimentos à montante do Rio do Carmo. Redução da turbidez à jusante do Rio Gualaxo. Ampliação das estruturas de contenção à montante do Rio do Carmo. 																				
CRONOGRAMA E METAS																				
Nome da Tarefa	Início	Término	2016		2017		2018		2019											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez						
PG024 R - Programa de implantação de sistemas de contenção dos rejeitos e de tratamento in situ dos rios impactados (Cláusulas 154 à 157)	11/2015	5/2020																		
<ul style="list-style-type: none"> Metas do Programa <ul style="list-style-type: none"> Cláusula 155 - Estudo para adoção de melhores técnicas de contenção de rejeitos: 8/2016 Cláusula 154 - Construção das estruturas emergenciais para contenção de sedimentos - Primeiro período chuvoso: 12/2016 Cláusula 157 - Redução da turbidez dos Rios Gualaxo, Carmo e Doce abaixo de 100 HTU (Inclui ações em outros programas): 3/2019 Definição do Programa: 3/2016 a 9/2016 Definição e Formalização do Programa junto ao CF: 3/2016 a 9/2016 Execução do Programa: 11/2015 a 2/2020 <ul style="list-style-type: none"> Ações emergenciais de contenção de rejeito: 11/2015 a 5/2016 Reforço da Barragem de Santarém: 11/2015 a 5/2016 Dique S1A: 2/2016 a 2/2016 Dique S2A: 12/2015 a 2/2016 Dique S3: 11/2015 a 2/2016 PF0018 - Bacias de sedimentação no Rio Gualaxo: 4/2016 a 7/2017 <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução: 4/2016 a 9/2016 Execução dos Diques do Gualaxo e Estações de Dosagem: 6/2016 a 4/2017 Encerramento do Projeto: 4/2017 a 7/2017 PF0056 - Fundão Eixo 1 - Fase 1: 3/2016 a 3/2017 <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução: 3/2016 a 7/2016 Execução do Projeto: 3/2016 a 12/2016 Encerramento do Projeto: 12/2016 a 3/2017 PF0132 - Fundão Eixo 1 - Fase 2 (EL. 860): 11/2016 a 2/2020 <ul style="list-style-type: none"> Definição do Escopo: 11/2016 a 12/2016 Planejamento da Execução: 1/2017 a 2/2017 Execução do Projeto: 4/2017 a 11/2019 Encerramento do Projeto: 11/2019 a 2/2020 PF0057 - Nova Barragem Santarém: 3/2016 a 3/2017 <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução: 3/2016 a 7/2016 Execução do Projeto: 4/2016 a 12/2016 Encerramento do Projeto: 12/2016 a 3/2017 PF0062 - Aterramento do Dique S3 - Fase 1: 2/2016 a 7/2016 <ul style="list-style-type: none"> Execução do Projeto: 2/2016 a 4/2016 Encerramento do Projeto: 4/2016 a 7/2016 PF0065 - Aterramento do Dique S3 - Fase 2: 3/2016 a 1/2017 <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução: 3/2016 a 7/2016 Execução do Projeto: 6/2016 a 10/2016 Encerramento do Projeto: 10/2016 a 1/2017 PF0130 - Dragagem dique S3: 4/2016 a 6/2017 <ul style="list-style-type: none"> Execução do Projeto: 4/2016 a 3/2017 Encerramento do Projeto: 3/2017 a 6/2017 PF0055 - Dique S4: 7/2016 a 2/2017 <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução: 7/2016 a 8/2016 Execução do Projeto (Pendente autorização dos Órgãos Públicos): 7/2016 a 11/2016 Encerramento do Projeto: 11/2016 a 2/2017 PF0131 - Manejo de águas superficiais em Germano: 6/2016 a 3/2017 <ul style="list-style-type: none"> Planejamento da Execução: 6/2016 a 8/2016 Execução do Projeto: 7/2016 a 12/2016 Encerramento do Projeto: 12/2016 a 3/2017 Processo de Operação/Manutenção nas Bacias de sedimentação do Gualaxo: 2/2017 a 12/2019 <ul style="list-style-type: none"> Operação de clarificação de água e remoção de rejeitos nas bacias de sedimentação do Gualaxo (Incluindo o descomissionamento dos Diques): 2/2017 a 12/2019 Encerramento do Programa: 2/2020 a 5/2020 Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios): 2/2020 a 5/2020 																				

EM BRANCO




4.2.3 PG025 - Revegetação, enrocamentos e outros métodos

ORÇAMENTO (R\$MM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1022,6	108,4	194,6	279,6	108,7	120,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBJETIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Revegetar inicialmente 800 ha e em seguida recuperar 2.000 ha na área ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. CLÁUSULAS: 158 à 160.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
STATUS ATUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<ul style="list-style-type: none"> Relatório final de revegetação dos 800ha protocolado junto aos órgãos ambientais (Cláusula 158). Recuperação de 48 tributários (fase 1). Reconformação de áreas impactadas nas margens dos rios. 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CRONOGRAMA E METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG023 – Manejo de Rejeitos. O cronograma e os custos dos dois programas estão nesta ficha.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nome da Tarefa</th> <th rowspan="2">Inicio</th> <th rowspan="2">Termino</th> <th colspan="4">2016</th> <th colspan="4">2017</th> <th colspan="4">2018</th> <th colspan="4">2019</th> </tr> <tr> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Out</th> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Out</th> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Out</th> <th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Out</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="19"> PG023 R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160) </td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Metas do Programa </td> </tr> <tr> <td>Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosecim</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">◆ 29/07</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeiras</td> <td></td> <td>3/2020</td> <td colspan="16"></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 158 - Revegetação Inicial (800 ha)</td> <td></td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">◆ 29/07</td> </tr> <tr> <td>Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1</td> <td></td> <td>3/2020</td> <td colspan="16"></td> </tr> <tr> <td>Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1</td> <td></td> <td>12/2017</td> <td colspan="16">◆ 30/12</td> </tr> <tr> <td>Definição do Programa</td> <td>7/2016</td> <td>4/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Execução do Programa</td> <td>12/2015</td> <td>3/2026</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td colspan="19"> Ações emergenciais </td> </tr> <tr> <td>Execução da Revegetação Inicial (800 ha)</td> <td>12/2015</td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues</td> <td>8/2016</td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição)</td> <td>8/2016</td> <td>8/2016</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Execução da Limpeza de Bento Rodrigues</td> <td>8/2016</td> <td>12/2016</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>12/2016</td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>PF0020 - Reabilitação dos Tributários</td> <td>12/2015</td> <td>5/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Execução de recuperação ambiental dos tributários</td> <td>12/2015</td> <td>2/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>2/2017</td> <td>5/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias)</td> <td>6/2016</td> <td>1/2018</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias</td> <td>6/2016</td> <td>7/2016</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal</td> <td>7/2016</td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Execução de recuperação ambiental da calha principal (incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017)</td> <td>7/2016</td> <td>10/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>10/2017</td> <td>1/2018</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Projetos para recuperação de áreas degradadas (incluindo os 2000 ha)</td> <td>1/2016</td> <td>5/2020</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Caracterização de impacto nas áreas degradadas</td> <td>1/2016</td> <td>12/2016</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental</td> <td>12/2016</td> <td>3/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Obras de Manejo de Rejeito e Revegetação</td> <td>3/2017</td> <td>3/2020</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>3/2020</td> <td>5/2020</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>PF0133 - UME Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)</td> <td>1/2017</td> <td>11/2022</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Avaliação de Alternativas</td> <td>1/2017</td> <td>4/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Definição do Escopo</td> <td>4/2017</td> <td>10/2017</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Planejamento da Execução</td> <td>10/2017</td> <td>4/2018</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Execução do manejo de rejeitos da UME Risoleta Neves (início da execução da Fase 2 está considerando o término da Fase 1 com acréscimo de volume - abr/18)</td> <td>4/2018</td> <td>8/2022</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Projeto</td> <td>8/2022</td> <td>11/2022</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Processo de Monitoramento e Manutenção</td> <td>12/2015</td> <td>3/2026</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)</td> <td>4/2017</td> <td>3/2026</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Pi</td> <td>12/2015</td> <td>12/2023</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa</td> <td>3/2026</td> <td>6/2026</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> <tr> <td>Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)</td> <td>3/2026</td> <td>6/2026</td> <td colspan="16">[Barra]</td> </tr> </tbody> </table>							Nome da Tarefa	Inicio	Termino	2016				2017				2018				2019				Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	PG023 R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160)																			Metas do Programa																			Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosecim		7/2016	◆ 29/07																Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeiras		3/2020																	Cláusula 158 - Revegetação Inicial (800 ha)		7/2016	◆ 29/07																Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1		3/2020																	Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1		12/2017	◆ 30/12																Definição do Programa	7/2016	4/2017	[Barra]																Execução do Programa	12/2015	3/2026	[Barra]																Ações emergenciais																			Execução da Revegetação Inicial (800 ha)	12/2015	7/2016	[Barra]																PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues	8/2016	3/2017	[Barra]																Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição)	8/2016	8/2016	[Barra]																Execução da Limpeza de Bento Rodrigues	8/2016	12/2016	[Barra]																Encerramento do Projeto	12/2016	3/2017	[Barra]																PF0020 - Reabilitação dos Tributários	12/2015	5/2017	[Barra]																Execução de recuperação ambiental dos tributários	12/2015	2/2017	[Barra]																Encerramento do Projeto	2/2017	5/2017	[Barra]																PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias)	6/2016	1/2018	[Barra]																Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias	6/2016	7/2016	[Barra]																Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal	7/2016	3/2017	[Barra]																Execução de recuperação ambiental da calha principal (incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017)	7/2016	10/2017	[Barra]																Encerramento do Projeto	10/2017	1/2018	[Barra]																Projetos para recuperação de áreas degradadas (incluindo os 2000 ha)	1/2016	5/2020	[Barra]																Caracterização de impacto nas áreas degradadas	1/2016	12/2016	[Barra]																Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental	12/2016	3/2017	[Barra]																Obras de Manejo de Rejeito e Revegetação	3/2017	3/2020	[Barra]																Encerramento do Projeto	3/2020	5/2020	[Barra]																PF0133 - UME Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)	1/2017	11/2022	[Barra]																Avaliação de Alternativas	1/2017	4/2017	[Barra]																Definição do Escopo	4/2017	10/2017	[Barra]																Planejamento da Execução	10/2017	4/2018	[Barra]																Execução do manejo de rejeitos da UME Risoleta Neves (início da execução da Fase 2 está considerando o término da Fase 1 com acréscimo de volume - abr/18)	4/2018	8/2022	[Barra]																Encerramento do Projeto	8/2022	11/2022	[Barra]																Processo de Monitoramento e Manutenção	12/2015	3/2026	[Barra]																Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)	4/2017	3/2026	[Barra]																Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Pi	12/2015	12/2023	[Barra]																Encerramento do Programa	3/2026	6/2026	[Barra]																Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2026	6/2026	[Barra]															
Nome da Tarefa	Inicio	Termino	2016							2017				2018				2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out	Jan	Feb	Mar	Out																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PG023 R - Programa de manejo dos rejeitos (Cláusulas 150 à 153) / PG025 - Programa de recuperação da ÁREA AMBIENTAL 1 (Cláusulas 158 à 160)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Metas do Programa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Cláusula 150 - Entrega dos estudos de avaliação biogeoquímica, hidrodinâmica e hidrosecim		7/2016	◆ 29/07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 151 - Manejo de Rejeitos atendendo às ações de recuperação das áreas fluviais, estuarinas e costeiras		3/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 158 - Revegetação Inicial (800 ha)		7/2016	◆ 29/07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cláusula 159 - Recuperação de 2000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1		3/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cláusula 160 - Encerramento do projeto de regularização de calhas e margens e controle de processos erosivos da ÁREA 1		12/2017	◆ 30/12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Definição do Programa	7/2016	4/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução do Programa	12/2015	3/2026	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ações emergenciais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Execução da Revegetação Inicial (800 ha)	12/2015	7/2016	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0166 - Limpeza de Bento Rodrigues	8/2016	3/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Atividades Preparatórias (Acessos e limpeza da área de disposição)	8/2016	8/2016	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução da Limpeza de Bento Rodrigues	8/2016	12/2016	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	12/2016	3/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0020 - Reabilitação dos Tributários	12/2015	5/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução de recuperação ambiental dos tributários	12/2015	2/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	2/2017	5/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0021 - Controle de Erosão da Calha Principal (Áreas Prioritárias)	6/2016	1/2018	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Planejamento da Execução das Obras de controle de erosão nas áreas prioritárias	6/2016	7/2016	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Elaboração de Projetos de Controle de Erosão na Calha Principal	7/2016	3/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução de recuperação ambiental da calha principal (incluindo ações emergenciais para o período chuvoso 2016-2017)	7/2016	10/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	10/2017	1/2018	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Projetos para recuperação de áreas degradadas (incluindo os 2000 ha)	1/2016	5/2020	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Caracterização de impacto nas áreas degradadas	1/2016	12/2016	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Elaboração do Plano de Recuperação Ambiental	12/2016	3/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Obras de Manejo de Rejeito e Revegetação	3/2017	3/2020	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	3/2020	5/2020	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PF0133 - UME Risoleta Neves - Fase 2 (definição deste projeto ainda depende do avanço da Fase 1 no PG009)	1/2017	11/2022	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Avaliação de Alternativas	1/2017	4/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Definição do Escopo	4/2017	10/2017	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Planejamento da Execução	10/2017	4/2018	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Execução do manejo de rejeitos da UME Risoleta Neves (início da execução da Fase 2 está considerando o término da Fase 1 com acréscimo de volume - abr/18)	4/2018	8/2022	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Projeto	8/2022	11/2022	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Processo de Monitoramento e Manutenção	12/2015	3/2026	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Monitoramento e Manutenção de Flora do Projeto de Recuperação de áreas degradadas (2000 ha) - 6 anos após implantação das ações (Cláusula 159)	4/2017	3/2026	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Monitoramento da qualidade do solo e controle de erosão ao longo de Tributários e rios Pi	12/2015	12/2023	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Programa	3/2026	6/2026	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)	3/2026	6/2026	[Barra]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

EM BRANCO

5



4.2.4 PG026 - Recuperação de APPs

ORÇAMENTO (R\$MM)											
TOTAL	REALIZADO	2016	2017	2018	2019						
1261,6	0,0	15,1	59,1	63,4	77,7						
OBJETIVO											
Recuperar 40.000 ha de Áreas de Preservação Permanente (APPs) degradadas na Bacia do Rio Doce. Desta área 10.000 ha deverão ser executado por meio de reflorestamento e 30.000 ha deverão ser executados por meio de regeneração. CLAUSULAS: 161 à 162.											
STATUS ATUAL											
Iniciado o processo de contratação do Instituto Bioatlântica (IBIO) para gestão do programa, com previsão de entrega do Plano de Trabalho dentro de 90 dias após a contratação.											
CRONOGRAMA E METAS											
Este programa está sendo tratado em conjunto com o PG027 – Recuperação de nascentes. O cronograma e os custos dos dois programas estão nesta ficha.											
Nome da Tarefa		Início	Término	2016		2017		2018		2019	
				Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago
PG026-C - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) - áreas de recarga da Bacia do Rio Doce - controle de processos erosivos (Cláusulas 161 e 162) / PG027 - Programa de recuperação de Nascentes (Cláusula 163)		9/2016	3/2026								
- Metas do Programa											
Cláusula 161 - Recuperação de APPs degradadas - 40000 ha			3/2026								
Cláusula 162 - Recuperação de nascentes - 5000 nascentes (500/ano)			3/2026								
- Definição do Programa		9/2016	2/2017								
- Execução do Programa		10/2016	3/2026								
- PFO133 - Projeto de reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163)		10/2016	3/2017								
Execução da reabilitação de 500 nascentes (escopo referente ao 1º ano conforme Cláusula 163, com premissa de início imediato após emissão do Plano de forma		10/2016	2/2017								
- Projetos/Processos de recuperação de APPs, Nascentes degradadas e monitoramento da efetividade da recuperação das mesmas		3/2017	3/2026								
- Encerramento do Programa		12/2025	3/2026								
Encerramento do Programa (captura e formalização de benefícios)		12/2025	3/2026								

EM BRANCO
