


**Cronograma Completo Plataforma On-line - Monitoramento Rio Doce**  
www.monitoramentoriodoce.org

	Tarefa	Data de Início Prevista	Data de Término Prevista	Data de Início Reprogramada	Data de Término Reprogramada	Responsável	Motivo da reprogramação
1	Elaborar o documento "Especificação de Requisitos e Conteúdo" para criação da plataforma	14/fev	10/jul	-	29/jul	Renova/GTA	Necessário incluir especificação para o Download dos dados customizado, que não estava previsto no documento inicial.
2	Cadastrar informações dos apêndices da NT46 no MP5	23/mar	31/jul	-	Concluída em 31/jul	Renova	Concluída
3	Realizar as adequações do DataLake para leitura dos dados no GIS	01/jul	31/jul	-	21/ago	TI Renova	Reprogramada em função de diversas dificuldades encontradas: - reformulação da atividade de download dos dados (revisão do documento da tarefa 1) - aprovação dos modelos do apêndice B realizada em 27/07 - necessidade de alinhamentos entre equipes do PG38, DataLake e GIS - necessidade de criação de testes de conexão de dados entre DataLake e GIS
4	Realizar compra do domínio para a plataforma	29/jun	31/ago	-	Concluída em 12/08	TI Renova	Concluída
5	Desenvolvimento do Protótipo	13/jul	10/ago	-	01/set	TI Renova	Reprogramada em função do atraso da tarefa 3
6	Validação do Protótipo pela Câmara Técnica e Órgãos Ambientais	10/ago	25/ago	01/set	10/set	Renova/GTA	Reprogramada para 10 dias de duração para coincidir com a data da reunião da CTHQA
7	Consolidar alterações para TI	26/ago	02/set	10/set	15/set	Renova/GTA	Reprogramada para 5 dias de duração
8	Realizar alterações conforme necessidades levantadas	02/set	08/out	15/set	15/out	TI Renova	Reprogramada em função do atraso da tarefa 5. <u>Comentário:</u> Este prazo está estimado em no máximo 30 dias, mas depende da natureza das alterações solicitadas. Será necessário visitar o documento "Especificação de Requisitos e Conteúdo" para avaliar se estas alterações são possíveis de serem implementadas de imediato ou melhorias para etapas futuras da Plataforma.
9	Realizar aprovação da plataforma na CT com as alterações mapeadas (Reunião da CT)	02/set	30/set	-	-	Renova/GTA	Data da 47ª reunião da CTSQA prevista para 10/09
10	Realizar aprovação da plataforma pelo CIF (Reunião do CIF)	01/out	30/out	-	-	GTA/CT-SHQA	Data da 48ª Reunião do CIF prevista para 22 a 23/10
11	Plataforma Homologada pelo CIF	01/nov	05/nov	-	-	TI Renova	-

Cronograma Resumo Plataforma On-line - Monitoramento Rio Doce (www.monitoramentoriodoce.org)

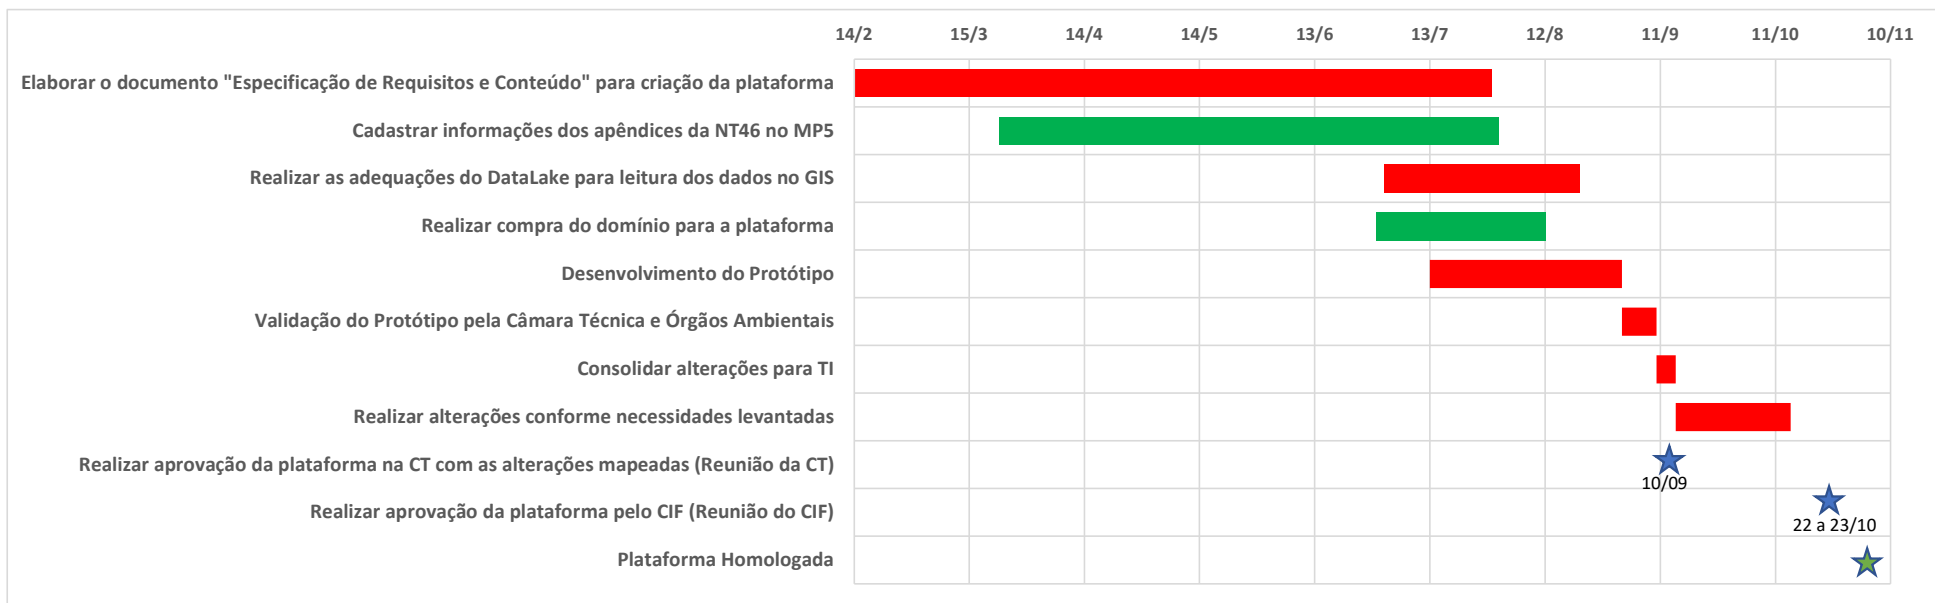

■ Tarefa concluída  
■ Tarefa reprogramada
