



RELATÓRIO TRIMESTRAL

PG 03 – Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Julho / Agosto / Setembro - 2021



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. STATUS DO PROGRAMA – PG 03	6
2.1 CRONOGRAMA 2021	7
2.2 EQUIPE TÉCNICA DO PG 03	12
2.3 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA	15
2.4 ANÁLISES DE DESVIOS E CONTRAMEDIDAS	16
2.5 INTERFACES	17
2.6 ORÇAMENTO DO PG 03	18
2.7 GRUPOS DE TRABALHO (GT) COM A CT IPCT	24
2.8 GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES	24
2.8.1 PRINCIPAIS CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES	24
2.8.1.1 <i>Itens a vencer em andamento</i>	25
2.8.1.2 <i>Itens a vencer não iniciados</i>	27
2.8.1.3 <i>Itens concluídos no prazo</i>	27
2.8.2 <i>Terra Indígena Krenak</i>	28
2.8.2.2 <i>Itens concluídos no prazo</i>	29
2.8.2.3 <i>Itens concluídos após o prazo</i>	30
2.8.3 TERRAS INDÍGENAS COMBOIOS E TUPINIQUIM GUARANI	32
2.8.3.1 <i>Principais Conceitos e Considerações:</i>	32
2.8.3.2 <i>Itens a vencer e em andamento</i>	33
2.8.3.3 <i>Aguardando informações</i>	33
2.8.3.4 <i>Itens concluídos no prazo</i>	33
2.8.3.5 <i>Itens concluídos após o prazo</i>	36
2.8.3.6 <i>Itens em descumprimento</i>	37
2.8.3.7 <i>Itens encerrado sem resposta</i>	37
3. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021	54
3.1 TERRA INDÍGENA COMBOIOS – CONTEXTUALIZAÇÃO	54
3.1.1 AÇÕES EMERGENCIAIS	54
3.1.1.1 <i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i>	54
3.1.1.2 <i>Fornecimento de água mineral</i>	56
3.1.1.3 <i>Plano de contingência de cheias</i>	58
3.1.1.4 <i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	58

3.1.1.5	<i>Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre</i>	60
3.1.2	AÇÕES TRANSITÓRIAS	60
3.1.2.1	<i>Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)</i>	61
3.1.2.2	<i>Fundo de Apoio as iniciativas Comunitárias (FAIC)</i>	62
3.1.2.3	<i>Projeto Lótus</i>	63
3.1.2.4	<i>Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre</i>	64
3.1.3	AÇÕES ESTRUTURANTES	64
3.1.3.1	<i>Reparação Integrada</i>	65
3.1.3.2	<i>Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i>	66
3.1.3.3	<i>Projeto Rede de Sementes e Mudas do Rio Doce</i>	67
3.1.3.4	<i>Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre</i>	68
3.1.5	AGENDAS	68
3.1.5.1	<i>Agenda realizada no trimestre</i>	68
3.2	TI TUPINIQUIM/GUARANI – CONTEXTUALIZAÇÃO	69
3.2.1.1	<i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i>	70
3.2.1.2	<i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	73
3.2.1.3	<i>Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre</i>	74
3.2.2	AÇÕES TRANSITÓRIAS	74
3.2.2.1	<i>Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)</i>	75
3.2.2.2	<i>Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC</i>	76
3.2.2.3	<i>Projeto Lótus</i>	78
3.2.2.4	<i>Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre</i>	79
3.2.3	AÇÕES ESTRUTURANTES	79
3.2.3.1	<i>Reparação Integrada</i>	79
3.2.3.2	<i>Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i>	80
3.2.3.3	<i>Projeto Rede de Sementes e Mudas do Rio Doce</i>	81
3.2.3.4	<i>Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre</i>	82
3.2.5	AGENDA	68
3.2.5.1	<i>Agenda de ações realizadas no trimestre</i>	68
3.3	TI KRENAK – CONTEXTUALIZAÇÃO	70
3.3.1	AÇÕES EMERGENCIAIS	70
3.3.1.1	<i>Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência</i>	71
3.3.1.2	<i>Fornecimento de água mineral</i>	72
3.3.1.3	<i>Fornecimento de água bruta e potável</i>	74
3.3.1.4	<i>Processo concorrencial participativo dos caminhões-pipas</i>	75
3.3.1.6	<i>Manutenção das vias de acesso</i>	77
3.3.1.7	<i>Obras estruturantes de melhoria nos acessos</i>	77
3.3.1.8	<i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	77

3.3.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS	78
3.3.3 AÇÕES ESTRUTURANTES.....	78
3.3.3.1 <i>Recuperação de nascentes e áreas degradadas</i>	79
3.3.3.2 <i>Elaboração de projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água</i>	79
3.3.3.3 <i>Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre</i>	79
3.3.4 RELACIONAMENTO	79
3.3.4.1 <i>Contratação de Assessoria Técnica (AT) para a Terra Indígena Krenak</i>	79
4. AÇÕES PLANEJADAS	81
4.1 TI COMBOIOS.....	81
4.1.1 AÇÕES EMERGENCIAIS	81
4.1.1.1 <i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i>	81
4.1.1.2 <i>Distribuição de água mineral</i>	81
4.1.1.3 <i>Plano de contingência de cheias</i>	81
4.1.1.4 <i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	81
4.1.1.5 <i>Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)</i>	81
4.1.1.6 <i>Interfaces para as ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre</i>	82
4.1.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS	82
4.1.2.1 <i>Projeto Lótus</i>	82
4.1.2.2 <i>Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias</i>	82
4.1.2.3 <i>Detalhamento do PBAI</i>	83
4.1.2.4 <i>Interfaces das ações transitórias planejadas para o próximo trimestre</i>	83
4.1.3 AÇÕES ESTRUTURANTES.....	83
4.1.3.1 <i>Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i>	83
4.1.3.3 <i>Reparação Integrada</i>	83
4.1.3.3 <i>Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre</i>	84
4.1.4 RELACIONAMENTO	84
4.2 TI TUPINIQUIM/GUARANI	85
4.2.1 AÇÕES EMERGENCIAIS	85
4.2.1.1 <i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i>	85
4.2.1.2 <i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	85
4.2.1.4 <i>Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo Trimestre</i>	86
4.2.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS	86
4.2.2.1 <i>Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias na TI Tupiniquim/Guarani</i>	86
4.2.2.2 <i>Detalhamento do PBAI</i>	86
4.2.2.3 <i>Projeto Lótus</i>	86
4.2.3 AÇÕES ESTRUTURANTES.....	87
4.2.3.1 <i>Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i>	87
4.1.3.3 <i>Reparação Integrada</i>	87

4.2.3.3	<i>Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre</i>	87
4.2.4	RELACIONAMENTO	87
4.3	TI KRENAK	88
4.3.1	AÇÕES EMERGENCIAIS	88
4.3.1.1	<i>Auxílio Financeiro Extra Emergencial de Subsistência</i>	88
4.3.1.2	<i>Fornecimento de água mineral</i>	88
4.3.1.3	<i>Fornecimento de água bruta e potável</i>	88
4.3.1.4	<i>Processo concorrencial participativo para contratação dos caminhões-pipas</i>	88
4.3.1.5	<i>Fornecimento de suplementação bovina</i>	88
4.3.1.6	<i>Manutenção das vias de acesso</i>	89
4.3.1.7	<i>Obras estruturantes de melhoria nos acessos</i>	89
4.3.1.8	<i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	89
4.3.1.9	<i>Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)</i>	89
4.3.1.10	<i>Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre</i>	89
4.3.2	AÇÕES TRANSITÓRIAS	90
4.3.3.1	<i>Recuperação de nascentes e áreas degradadas</i>	90
4.3.4	RELACIONAMENTO	90
4.3.4.1	<i>Contratação de Assessoria Técnica Independente (ATI) para a Terra Indígena Krenak</i>	90
4.3.5	AGENDA	90

1. INTRODUÇÃO

A Fundação Renova é a organização constituída para conduzir ações para reparação, mitigação e/ou minimização dos danos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, orientada pelo Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Dentre os programas que compõem a estrutura da instituição, o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG 03) tem por objetivo implementar as ações reparatórias e/ou compensatórias para os povos e comunidades indígenas, em conformidade com os impactos socioambientais e socioeconômicos identificados a partir de estudos, conforme as Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Para atender a esse objetivo, o programa estrutura-se em três fases: A) **emergencial**, em que se desenvolvem ações de mitigação de vulnerabilidades e de riscos associados aos povos indígenas atendidos pelo programa; B) **transitória**, em que se articula com órgãos reguladores e comunidades a realização de estudos para identificação de impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais; e C) **estruturante**, em que se elaboram, executam e monitoram os planos de ações permanentes. O processo de implementação das ações prevê a sobreposição das fases, e os projetos estruturantes devem estar assentados em estudos especializados previstos no TTAC. Para o diálogo, a integração e a tomada de decisão com a participação efetiva das comunidades atendidas e, em paralelo às três fases, o **relacionamento** configura-se como uma ação transversal na efetividade da gestão de informação e comunicação entre Fundação Renova e comunidades.

Diante do exposto, a Fundação Renova apresenta este relatório trimestral, referente às comunidades das Terras Indígenas - TIs Comboios, Tupiniquim Guarani (engloba TIs Tupiniquim e Caieiras Velhas II) e Krenak no período de julho, agosto e setembro de 2021, no qual apresenta-se uma síntese das ações executadas referentes às três fases supracitadas do Programa.

2. STATUS DO PROGRAMA – PG 03

No Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG 03), as ações objetivam a implementação de ações reparatórias e/ou compensatórias nas terras indígenas identificadas no TTAC, restabelecendo suas atividades socioculturais e socioambientais, a partir dos impactos identificados nos estudos pertinentes. A atuação é subdividida nos três eixos: **emergencial**, **transitório** e **estruturante**, a partir dos quais as atividades são alocadas e planejadas com metas estabelecidas para atendimento das comunidades.

Nas terras indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani, localizadas no município de Aracruz (ES), atualmente estão em desenvolvimento ações do eixo emergencial, transitório e estruturante.

Para a viabilização das inscrições e validações das atividades do FAIC (Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias), retomada da continuidade da elaboração do projeto do Sistema de Abastecimento de Água, bem como a reparação integrada (PBAI e indenização) e ações administrativas relacionadas aos acordos emergenciais, foram estabelecidas novas formas de contato por meio de softwares personalizados, mídias digitais e um replanejamento concentrado em atividades possíveis de serem desenvolvidas remotamente, considerando a permanência do cenário de pandemia e a necessidade de manter o distanciamento social.

Em relação a Terra Indígena Krenak, localizada no município de Resplendor (MG), permanecem sendo realizadas as ações emergenciais previstas no TTAC.

Considerando os protocolos de saúde firmados para prevenção ao contágio e disseminação pelo novo Coronavírus, as ações a serem desenvolvidas no território permaneceram adiadas e pendentes de reagendamento, conforme preconizado pelo Plano de Contingência da Saúde Indígena, ativado em 22 de janeiro de 2020 e revalidado em março de 2021.

2.1 CRONOGRAMA 2021

Os cronogramas aqui apresentados têm o intuito de sistematizar as ações previstas e realizadas para os 3 (três) territórios do PG03. Uma apresentação sistêmica das informações possibilitará a compreensão em amplitude temporal referente ao trimestre composto pelos meses de julho, agosto e setembro de 2021.

2.1.1.A Cronograma previsto/realizado para o período deste relatório trimestral – julho, agosto e setembro/2021

Eixo	Ação prevista	Público-alvo	Interface	Início previsto	Em andamento ou término previsto	Status*	Justificativa**
Emergencial	Fornecimento de água mineral	TI Comboios	-	Fevereiro 2020	Novembro/2021	1	-
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	TI Krenak	Infraestrutura	2016	2021	1	-
	Auxílio Extra Emergencial	TI Krenak	-	2015	2021	1	-
	Auxílio Subsistência Emergencial	TI Comboios	-	2016	2021	1	-
	Auxílio Financeiro Emergencial	TI TG	-	2016	2021	1	-
	Distribuição de Insumos para animais	TI Krenak	-	2016	2021	1	-
	Obras de melhoria nos acessos (8 pontos críticos)	TI Krenak	Infraestrutura	Janeiro 2019	Abril/2021	4.1	A ação está suspensa desde março/20 devido a pandemia pelo novo coronavírus, a FR solicitou à Funai autorização para retomada. Contrato foi encerrado em abril/21.
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	2.3	A ação vinha sendo executada normalmente, porém, com a pandemia, foi suspensa em abril/20, mas retornou em julho/20.
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	TI Comboios e TI TG	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	1	A ação vinha sendo executada normalmente, porém, com a pandemia, foi suspensa em abril/20, mas retornou em julho/20.
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	2.3	A ação vinha sendo executada normalmente, porém, com a pandemia, desde julho/20 vem sendo realizado de forma parcial.

Eixo	Ação prevista	Público-alvo	Interface	Início previsto	Em andamento ou término previsto	Status*	Justificativa**
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TI Comboios e TI TG	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	2.3	A ação vinha sendo executada normalmente, porém, com a pandemia, desde julho/20 vem sendo realizado de forma parcial.
Transitório	C Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena	TI Comboios e TI TG		2020	2021	2.3	-
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC)	TI Comboios		2020	Em andamento	2.3	Chamamento ao Projeto Publicado em 15.03.2021 -Prorrogação do Período de Inscrições e Submissão das Propostas.
	Projeto Lótus	TI Comboios e TI TG	PG 33 – Programa de Educação Para Revitalização da Bacia do Rio Doce - Engenharia	2020	2021	1	-
Estruturante	Elaboração de projeto de SAA – Sistema de Abastecimento de Água	TI Comboios	Engenharia	2019	Em andamento	2.3	A programação de atividades necessárias em campo foi retomada em julho/2021.
	Elaboração de projeto de SAA – Sistema de Abastecimento de Água	TI TG	Engenharia	2019	Em andamento	2.3	A programação de atividades necessárias em campo foi retomada em julho/2021
	Acompanhamento do diálogo para elaboração da proposta de indenização e reparação integrada individual/família por perda de renda	TI Comboios e TI TG	PG 02	2020	Em andamento	1	

** Justificativa para as categorias de status relacionadas.

Quadro 2.1.1.B – Apoio para o Quadro 2.1.1.A

Nº	Status (legenda) *	Nº	Justificativa **
1 – Em dia			
2 – Iniciada			
2.1	No prazo previsto		
2.2	Antes do prazo previsto		
2.3	Com atraso (atrasou, mas iniciou no trimestre)	2.3	**
3 – Não iniciada			
3.1	Em atraso (atrasou, mas o início tem nova data fora do trimestre vigente)	3.1	**
3.2	Suspensa (sem nova data prevista para início)	3.2	**
3.3	Cancelada (a ação não ocorrerá mais)	3.3	**
4 – Descontinuada			
4.1	Suspensa (será retomada)	4.1	**
4.2	Cancelada (não será mais retomada)	4.2	**
5 – Concluída			
5.1.	No prazo		
5.2	Antes do prazo		
5.3	Com atraso	5.3	**

** Apresentar justificativa para essas situações (2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2 e 5.3).

Quadro 2.1.1.C – Cronograma 2021 – Ações não previstas que foram realizadas

Eixo	Ação incluída	Território	Data início	Data término previsto	Justificativa*
-	-	-	-	-	-

* Justificar a inclusão da nova ação

2.2 EQUIPE TÉCNICA DO PG 03

O Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas (PG 03) conta com oito colaboradores que atuam diretamente nas demandas relacionadas a esse PG, além da coordenação, realizada por Gabriela Leite de Almeida Prado, interinamente por Carla de Almeida Moura, e da gerência, por Ricardo Burg.

Tabela 2.2 - Equipe técnica PG 03 organizada por território

Nome	Formação	Território	Cargo
Alessandro Correa	Geógrafo	Tupiniquim/Guarani e Krenak	Especialista de Programa Socioeconômico
Bruna Aarão	Cientista Social e Mestre em Ciência Política	Comboios e Tupiniquim/Guarani	Especialista de Programa Socioeconômico
Carla de Almeida Moura*	Engenheira Sanitarista e Mestre em Engenharia Ambiental	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Especialista de Programa Socioeconômico
Caroline Marci Fagundes Coutinho*	Cientista Social e Mestre em Desenvolvimento Social	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Analista de Programa Socioeconômico
Fábio Moreira	Biólogo	Krenak/Comboios	Analista de Programa Socioeconômico
Fernanda Balestro *	Engenheira Ambiental e Mestre em Planejamento Urbano e Regional	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Analista de Programa Socioeconômico
Felipe de Drummond Alves*	Engenheiro Florestal	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Especialista de Programa Socioeconômico
Carolline Araujo Rocha *	Engenheira Mecânica e Administradora	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Engenheira de Planejamento
Adebal de Andrade*	Antropólogo, Doutor em Antropologia Cultural e Mestre em Ciências Sociais	Krenak, Comboios e Tupiniquim/Guarani	Analista de Programa Socioeconômico
Sarah Angélica S. de Oliveira Nunes	Advogada, Administradora e Especialista em Direitos Humanos	Krenak	Analista de Programa Socioeconômico

* **Observação:** Colaboradores que atuam nos dois programas da Gerência de Povos e Comunidades Tradicionais.

2.2.1 Equipe Técnica – Atividades desempenhadas por território

Na sequência, serão apresentados os responsáveis por cada ação executada no respectivo território, bem como pelas informações contidas neste relatório. Já os dados e os esclarecimentos da gestão do Programa 03 (Item 2 – Status do PG 03) estão sob responsabilidade do coordenador.

A) TI Comboios

Tabela 2.2.1.A – TI Comboios: ações por eixo, respectivos responsáveis.

Eixo	Atividade	Responsável
Emergencial	Fornecimento de água mineral	Fábio Moreira / Bruna Aarão
	Auxílio de Subsistência Emergencial	Bruna Aarão
	Elaboração do Plano de Contingência de Cheias	Carla Moura / Bruna Aarão/ Fernanda Balestro
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Carla Moura / Fernanda Balestro
Transitório	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)	Adebal Junior / Bruna Aarão / Carla Moura
	Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias	Alessandro Corrêa / Fábio Moreira
	Projeto Lótus	Alessandro Corrêa
Estruturante	Reparação Integrada	Carla Moura / Bruna Aarão/
	Elaboração de projeto de Sistemas de Abastecimento de Água – SAA	Carla Moura / Fernanda Balestro
	Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce	Fábio Moreira

B) TI Tupiniquim/Guarani

Tabela 2.2.1.B – TI Tupiniquim/Guarani: ações por eixo, respectivos responsáveis

Eixo	Atividade	Responsável
Emergencial	Auxílio de Subsistência Emergencial	Bruna Aarão
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Carla Moura / Fernanda Balestro
Transitório	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)	Adebal Junior / Bruna Aarão / Carla Moura
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias	Alessandro Corrêa
	Projeto Lótus	Alessandro Corrêa
Estruturante	Reparação Integrada	Bruna Aarão / Carla Moura
	Elaboração de projeto de SAA	Carla Moura
	Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce	Fábio Moreira

C) TI Krenak

Tabela 2.2.1.C–TI Krenak: Ações por eixo, respectivos responsáveis

Eixo	Atividade	Responsável
Emergencial	Auxílio de subsistência extra emergencial	Sarah Nunes / Alessandro Correa
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	Sarah Nunes / Alessandro Correa
	Manutenção das vias de acesso	Sarah Nunes
	Distribuição de insumos para animais	Sarah Nunes / Alessandro Correa
	Obras de melhoria nos acessos (8 pontos críticos)	Carla Moura
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Carla Moura / Fernanda Balestro
Relacionamento	Processo de contratação assessoria técnica – Krenak	Sarah Nunes

2.3 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA

Durante o período trimestral de composição deste relatório (meses de **julho, agosto e setembro** de 2021), nas atividades previstas, executadas e em execução pelo PG03 nos eixos emergencial, transitório e estruturante, foram mantidas a reestruturação e adequação das ações devido às limitações causadas pela pandemia de Covid-19.

Nas comunidades indígenas Tupiniquim e Guarani, foram realizadas agendas virtuais e presenciais no contexto da reparação que possibilitaram o avanço em ações importantes. Dentre estas, destacam-se:

- Acompanhamento da construção da reparação integrada por meio do processo indenizatório e elaboração de cronograma para detalhamento do PBAI para as terras indígenas Comboios, Tupiniquim e Guarani e Caieiras Velhas II;
- Inclusão das famílias para recebimento do Auxílio Subsistência Emergencial – ASE, conforme previsto no acordo 2020/2021;
- Acompanhamento dos acordos emergenciais;
- Apresentação dos modelos de prestação de contas aos proponentes do Projeto Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias (FAIC);
- Realização da reunião de Kick Off e formalização dos Termos de investimento Social aos proponentes do Projeto Fundo de Apoios às iniciativas comunitárias (FAIC);
- Realização de reunião de alinhamento entre Fundação Renova, lideranças indígenas e DSEI para a realização do serviço de geofísica nas aldeias de Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos d'Água;
- Realização de reunião para validação do Plano de Trabalho do PBAI Tupiniquim e Guarani para FUNAI e Comunidades Indígenas, no dia 24/09/2021.
- Na Terra Indígena Krenak foram continuadas as ações de fornecimento e entrega de água mineral, bruta e potável, gerenciamento e distribuição de insumos agropecuários e alimentação animal e serviço de manutenção de vias, devido ao tráfego de caminhões pipa.

Considerando a permanência do cenário de Covid-19, as ações desenvolvidas na terra indígena foram adequadas para atender os protocolos sanitários vigentes, em conformidade com o Plano de Contingência da Saúde Indígena. Assim, foram implementados, por meio do

plano de engajamento novos fluxos de comunicação, viável em contexto de pandemia, com objetivo de viabilizar o diálogo e aprovação dos fornecedores na TI Krenak.

Vale destacar, contudo, que todos os indígenas (integrantes das 08 aldeias do território Krenak) tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19, contribuindo com o retorno gradativo de algumas atividades em campo, condicionadas a liberação interna da sala de situação e solicitação da comunidade indígena, sendo, para tanto, observado o protocolo de segurança de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

2.4 ANÁLISES DE DESVIOS E CONTRAMEDIDAS

A Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, classificou como pandemia a contaminação causada pelo novo coronavírus. A partir de então, foram adotadas medidas sanitárias preventivas ao contágio e disseminação do Coronavírus (COVID-19) em nível mundial.

Considerando o avanço no aumento dos casos de contaminação pelo novo Coronavírus, no Brasil, foi ativado o [Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus - COE-nCoV](#), em 22 de janeiro de 2020.

No dia 17 de março de 2020, a Funai emitiu a Portaria nº 419, que estabelece “medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do Índio – FUNAI”. Esse documento versa sobre as medidas de prevenção para evitar o contágio e a disseminação do novo coronavírus, bem como, garantir a proteção das comunidades indígenas.

Em 16 de março de 2020, a Fundação Renova iniciou a restrição das ações nos territórios aos colaboradores diretos e indiretos, as quais deverão permanecer enquanto perdurarem as medidas de distanciamento social, estabelecidas pelas autoridades em saúde. Sendo assim, foram realizadas ações específicas nos territórios após análise da área de saúde e segurança da Fundação Renova, que em caso de pertinência, condiciona a entrada no território também à solicitação e emissão de autorização da Funai através do PG03.

Na data de 05 de março de 2021, foi emitida pela Funai a Portaria 183, a qual estabelece alteração no art. 1º da Portaria nº 419 de 13 de março de 2020, que passa a determinar que a vigência desta Portaria se encontra condicionada ao estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no país.

Com o avanço da vacinação em todo o país, a Fundação Renova começou, de forma gradativa, a retomada de algumas atividades em campo, condicionadas a liberação interna da sala de situação. Para a realização das atividades presenciais, todo um protocolo de segurança é observado de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

2.5 INTERFACES

A matriz de interfaces do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas apresenta a sistematização dos programas da Fundação Renova que atuam de forma articulada nas ações desenvolvidas.

O objetivo proposto com a elaboração dessa matriz é assegurar o alcance dos resultados no desenvolvimento destas ações, considerando-se os eixos emergencial, transitório e estruturante.

Para o desenvolvimento das ações previstas no escopo do PG 03 foram consideradas um total de 20 (vinte) interfaces. Desse total, 16 (dezesesseis) interfaces encontram-se descritas na definição preliminar do Programa.

Desse modo, a tabela abaixo relaciona todos os Programas da FR que realizaram alguma interface com o PG 03 até o momento.

Tabela 2.5 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova

Área	Programas em interface
Socioeconômica	02 – Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados*
	05 – Programa de Proteção Social *
	06 - Programa Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social *
	12 – Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística *
	13 – Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer *
	14 - Programa de Saúde Física e Mental da População impactada *
	15 – Programa Promoção da Inovação *
16 – Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesquisas *	

	18 – Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica *
	19 – Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios
	21 – Programa de Auxílio Financeiro Emergencial *
	23 – Programa de Manejo de Rejeitos *
Socioambiental	26 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPS) e Recargas Hídricas *
	27 – Programa de Recuperação de Nascentes
	28 – Programa de Conservação da Biodiversidade *
	30 – Programa de Fauna e Flora Terrestre
	33 – Programa de Educação para Revitalização da bacia do rio Doce *
	38 – Monitoramento da bacia do rio Doce *
Infraestrutura	32 – Programa Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água *
Funcional	Área de Engenharia

* Interfaces previstas no documento - Definição Preliminar do Programa (2018)

As interfaces específicas e as ações realizadas em conjunto com os programas citados serão indicadas ao longo deste relatório, nos tópicos sobre as ações executadas no trimestre e planejadas para os próximos meses.

2.6 ORÇAMENTO DO PG 03

O orçamento planejado para a execução das ações do PG03 foi apresentado na 36ª reunião da CT-IPTC e encaminhado, em versão revisada, em 30 de março de 2021. Cumpre ressaltar que os valores apresentados em desembolso indicam as medições contratuais executadas no período.

O glossário apresentado na sequência é referente às linhas da tabela nas quais encontram-se dispostos os valores previstos no orçamento 2021 para o PG03.

Eixo Emergencial

• Apoio subsistência emergencial (ASE) – TI Tupiniquim/Guarani Comboios

Contempla o acordo das Terras Indígenas (TIs) Comboios e Tupiniquim/Guarani – Até junho de 2021 foram efetivados o pagamento de Apoio Subsistência Emergencial - ASE para 293 famílias do acordo de Comboios e 1.345 famílias do acordo Tupiniquim/Guarani que atenderam os critérios estabelecidos.

- **Apoio subsistência extra emergencial – TI Krenak**

Contempla a previsão para o pagamento de apoio subsistência extra emergencial para 137 famílias, referente ao acordo emergencial firmado entre a empresa Vale S.A e o Povo Krenak (“Acordo Vale-Krenak”).

- **Distribuição de água potável, bruta e mineral – TI Krenak**

Fornecimento de água potável e bruta por caminhões pipa; serviços de transporte, armazenamento e distribuição de água mineral.

- **Distribuição de água mineral - TI Comboios**

Fornecimento de água mineral.

- **Distribuição de insumos para animais - TI Krenak**

Fornecimento de ração animal para 108 famílias; Fornecimento de silagem de milho, sal mineral para 100 famílias.

- **Manutenção de vias de acessos do caminhão pipa – TI Krenak**

Manutenção realizada nas vias de acesso para viabilizar o tráfego de caminhões pipa.

- **Obras de melhoria nos acessos (08 pontos) – TI Krenak**

Contratação de serviços específico para infraestrutura, terraplenagem, pavimentação em pontos de acesso avaliados como críticos para o deslocamento de caminhões pipa na TI Krenak. O contrato foi encerrado no contexto da pandemia e as melhorias foram concluídas em 5 pontos, restando 3 em aberto.

Eixo Transitório

- **ECI Plano de Trabalho – TI Krenak**

Valor destinado a pagamento de consultoria para elaboração do plano de trabalho para o Estudo do Componente Indígena (ECI).

- **Estudo de Componente Indígena (ECI) e Detalhamento Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) Krenak**

Valor previsto para pagamento de consultoria para elaboração do ECI e detalhamento do PBAI.

- **Elaboração ECI (Até 2020) + e Detalhamento Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)**

TI Tupiniquim/Guarani e Comboios – ECI e Detalhamento do PBAI.

- **Análises Técnicas - TI Krenak**

Consultorias externas independentes para *Peer Review* de peças técnicas analíticas.

- **Análises Técnicas – TI Tupiniquim/Guarani e Comboios**

Consultorias externas independentes para *Peer Review* de peças técnicas analíticas.

- **GT Indenização Indígena**

Previsão de despesas do grupo de trabalho (GT) indenização, para as TIs Tupiniquim/Guarani, Comboios e Krenak.

- **Depósito Judicial TRF (2016)**

Valor pago ao TRF 12ª Vara em 2016 referente a depósito judicial.

- **Apoio às Iniciativas comunitárias**

Compreende a execução de ações de recuperação e fortalecimento sociocultural, a serem definidas em conjunto com as comunidades no âmbito do etnodesenvolvimento – Projeto Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC.

Eixo Estruturante

- **Infraestrutura**

Nos primeiros planejamentos orçamentários da Fundação Renova, as ações de qualquer natureza relacionadas às obras e manutenções estruturais eram alocadas como infraestrutura, sem a descrição atualmente utilizada.

- **Sistema de Abastecimento de Água SAA – TI Comboios**

Elaboração de projetos (aldeias Comboios e Córrego do Ouro), levantamento topográfico, estudos de geofísica, serviços de sondagem, serviço de perfuração de poços, coleta de amostras para análise de qualidade de água.

- **Sistema de Abastecimento de Água SAA – TI Tupiniquim-Guarani**

Elaboração de projetos (aldeias Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos D'água, levantamento topográfico, estudos de geofísica, serviços de sondagem, serviço de perfuração de poços, coleta de amostras para análise de qualidade de água.

- **Serviço Topográfico e Sistema de Abastecimento de Água SAA – TI Krenak**

TI Krenak: Serviços de monitoramento de descarga atmosférica, utilizados para segurança dos colaboradores e comunidade indígena, em especial para deslocamento dos caminhões pipa, manutenção das vias para viabilizar o deslocamento dos caminhões pipa e execução das obras dos 08 pontos críticos.

- **Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) – Execução TI Tupiniquim-Guarani e Comboios**

TIs Tupiniquim/Guarani e Comboios - Execução do PBAI.

Relacionamento

- **Planejamentos integradores**

O Planejamento integrador é proposta que visa assegurar a efetividade do programa de reparação. Pretende-se realizar ação para o direcionamento das expectativas, esforços e entendimento das entregas entre TI's e Fundação Renova.

Geral

- **Gerenciamento do programa**

Serviços gerenciamento e fiscalização de obras e serviços a serem realizados pelo programa. Inclui a consultoria de definição do documento diretivo do PG03.

- **Gerenciamento Saúde e Segurança**

Serviços de gerenciamento em Saúde e Segurança para as ações realizadas pelo programa.

- **Monitoramento Social**

Serviços de cadastro e monitoramento socioeconômico e ambiental.

- **Licenciamento ambiental**

Custos com elaboração de projeto para solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação em TI Krenak, na época de elaboração dos projetos dos 08 pontos críticos.

• **Custo de paralisação pandemia – Gerenciamento Saúde e Segurança**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo de paralisação pandemia – Manutenção de vias de acesso do caminhão pipa – TI Krenak**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo de paralisação pandemia – Melhorias acessos**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo de paralisação pandemia – SAA TI Comboios**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo adicional Covid-19 – Gerenciamento Saúde e Segurança**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

Tabela 2.6 – Orçamento 2021 | PG03

Descrição	Julho	Agosto	Setembro
Ações Emergenciais			
Apoio subsistência emergencial - TI Tupiniquim/Guarani e Comboios	4.153.521	4.160.400	4.169.090
Apoio subsistência extra emergencial - TI Krenak	1.356.300	1.356.300	1.356.300
subtotal AFE			
Distribuição de água potável, bruta e mineral - TI Krenak	825.964	798.523	1.043.244
Distribuição de água mineral - TI Comboios	12.845	13.549	10.452
subtotal Distribuição água			

Distribuição de insumos para animais TI Krenak	539.050	459.708	158.684
subtotal Alimentação Animal			
Manutenção das vias de acesso do caminhão pipa - TI Krenak			
subtotal Manutenção estradas			
Obras de melhoria nos acessos (08 pontos) - TI Krenak	21.892	471.523	547.706
subtotal obras de melhoria nos acessos			
Ações Transitórias			
Elaboração ECI + PBAI TI Tupiniquim/Guarani e Comboios	59.348	8.652	83.054
ECI e PBAI - TI Krenak			
subtotal			
Análise Técnica - TI Krenak			
Análise Técnica - TI Tupiniquim e Comboios			
subtotal Análise Técnica			
GT Indenização Indígena			
subtotal GT indenização			
Apoio a iniciativas comunitárias			
subtotal Apoio a iniciativas comunitárias			
Ações Estruturantes			
SAA - TI Comboios	24.136	18.905	18.151
SAA - TI Tupiniquim			
SAA - TI Krenak			
subtotal			
Plano Básico Ambiental (PBA) - Execução - TI Tupiniquim/Guarani e Comboios			
subtotal			
Relacionamento			
Planejamentos integradores			
Geral			
Gerenciamento do programa	123.512	87.532	91.572
Gerenciamento Saúde e Segurança	37.686	236.603	24.759
Monitoramento Social			
Consultoria para revisão do programa			
Licenciamento ambiental			
Custo adicional Covid-19 - Gerenciamento Saúde e Segurança			

2.7 GRUPOS DE TRABALHO (GT) COM A CT IPCT

Durante o período de composição deste relatório (julho a setembro de 2021), não ocorreram reuniões específicas de Grupos de Trabalho com a CT-IPCT. Porém, no dia 24/09/2021, foi realizada reunião para validação do PBAI em Tupiniquim Guarani com a participação de membros da CT-IPCT.

2.8 GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES

2.8.1 Principais Conceitos e Considerações

Conceitos:

- **Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova. Exemplo: Caput Cláusula 39.

- **Itens de requisitos:** São itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Caput Cláusula 40.


Considerações:

- Há um total de 13 itens de ação de cláusulas distribuídos para o programa PG03. **Não** constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos acima.

- As demais cláusulas relacionadas ao programa dependem da elaboração da definição/escopo do programa.

- A distribuição dos itens de ação por status é apresentada no **Gráfico 2.8.1** a seguir.

Gráfico 2.8.1: Distribuição dos itens de ação por status

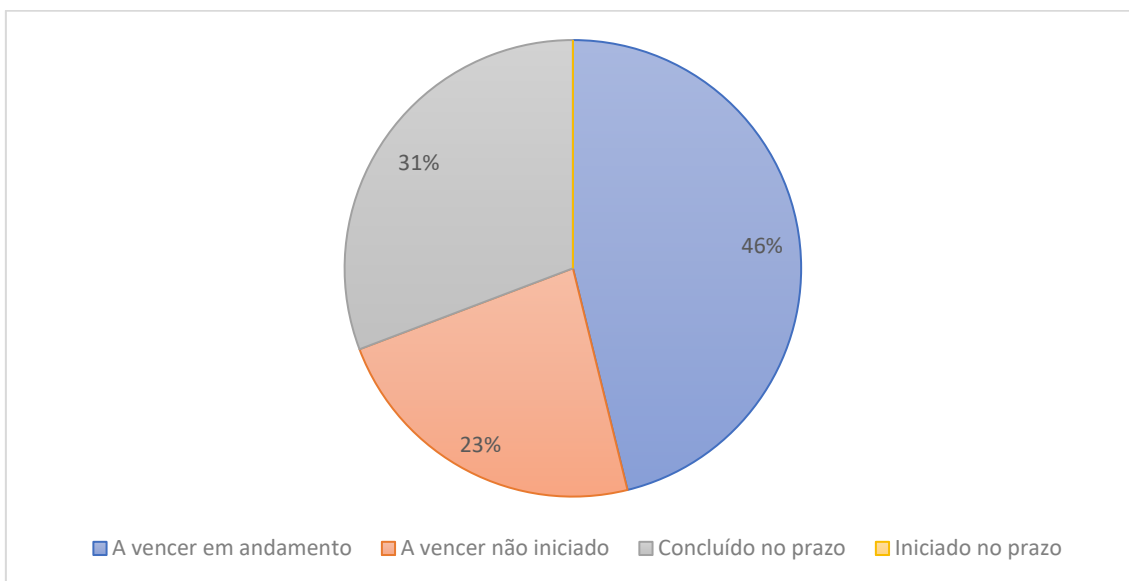

Ressaltamos que os status de conclusão acima representados se referem às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF, as quais ainda serão avaliadas para validar o seu encerramento.

- As evidências de cumprimento encontram-se disponíveis no SharePoint no seguinte link: <https://bit.ly/2EDMxfS>

A seguir, é apresentado o detalhamento dessas cláusulas em conformidade com cada *status*.

2.8.1.1 Itens a vencer em andamento

Quadro 2.8.1.1 – Itens a vencer em andamento

Cláusula	Prazo TTAC	Observações
39. A FUNDAÇÃO deverá executar um programa para oferecer atendimento especializado aos povos indígenas do território KRENAK e das terras indígenas de COMBOIOS, TUPINIQUIM e CAIEIRAS VELHAS II.	Não definido	Programa em execução.
43 (§1º). As medidas previstas nos incisos I e II, caso não tenham sido iniciadas, deverão ter início no prazo de até 10 (dez) dias da assinatura deste Acordo,	Não definido	Ação concluída em 12/03/16. Relatório emitido pelo Jurídico da

Cláusula	Prazo TTAC	Observações
devendo ser mantidas até a entrada em vigor do Plano de Ação Permanente (Krenak).		Renova para a 12ª vara Federal da seção judiciária de MG.
43 (Inc. I). Manutenção das medidas de apoio emergencial previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A. (Krenak)	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações contidas neste.
43 (Inc. II). Monitoramento contínuo das seguintes situações, previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A (Krenak): a) abastecimento de água; b) qualidade da água; c) bovinocultura; d) apoio financeiro mensal às famílias; e) saúde; e f) atualização das necessidades em diálogo com os indígenas KRENAK.	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações.
44 (Inc. II). Execução e monitoramento contínuo das medidas de apoio emergencial, caso cabíveis nos termos do inciso I (Tupiniquim Guarani).	Não definido	Desde a criação da Renova esta vem cumprindo os acordos emergenciais para estes povos, estes vêm sendo renovados, último assinado em dez/20 e válido até dez/21.
44 (Inc. IV). Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III.	Não definido	Trata-se da contratação do detalhamento do PBAI.

2.8.1.2 Itens a vencer não iniciados

Quadro 2.8.1.2 – Itens a vencer não iniciados

Cláusula	Prazo TTAC	Observações
43 (Inc. IV). Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo previsto no inciso III (Krenak).	Não definido	Não houve permissão por parte dessa comunidade indígena para a execução dos estudos (ECI) até o momento, o qual é necessário para o detalhamento do PBA.
43 (Inc. V). Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente (Krenak).	Não definido	Ação prevista por meio da execução e monitoramento do PBA.
44 (Inc. V). Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III.	Não definido	Ação prevista durante a execução e monitoramento do PBA.

2.8.1.3 Itens concluídos no prazo

Quadro 2.8.1.3 – Itens concluídos no prazo

Cláusula	Prazo TTAC	Observação
43 (Inc III). Contratar consultoria independente a partir do TR a ser apresentado pela Funai para elaboração de estudo dos eventuais impactos do evento sobre os Krenak.	Não definido	Ação concluída em 30/06/16. Estudo foi contratado para os indígenas de Aracruz e Krenak, porém no momento de assinar o Acordo para execução, os Krenak se opuseram, seguindo apenas com os Tupiniquim Guarani.
44 (Inc I - ação 1). Caso seja identificada necessidade por meio de diagnóstico	22/03/16	Concluída em 22/03/16 com a

Cláusula	Prazo TTAC	Observação
específico realizado pela FUNDAÇÃO ou pela SAMARCO e disponibilizado à Funai e aos povos indígenas em até 20 (vinte) dias da assinatura deste Acordo, serão implementadas medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participação da Funai, observado o previsto nas CLÁUSULAS 40, 41 e 42, sem prejuízo de a Funai elaborar o seu diagnóstico às suas próprias expensas.		emissão de um parecer técnico preliminar emitido pela Samarco.
44 (Inc I-ação 2). Caso seja identificada necessidade, implementar medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participação da Funai.	Não definido	Concluído em 26/02/16 com a assinatura do acordo emergencial.
44 (Inc III e §3º). Contratação de consultoria independente, conforme Termo de Referência a ser apresentado pela FUNAI, para elaboração de estudo circunstanciado dos eventuais impactos socioambientais e socioeconômicos do EVENTO sobre os TUPINIQUIM e os GUARANI.	Não definido	Concluído em 30/06/16 com a contratação da empresa de consultoria independente (Polifônicas)

2.8.2 Terra Indígena Krenak

2.8.2.1 Principais Conceitos e Considerações

Conceitos:

- **Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova.

Exemplo: Deliberação 299


- **Itens de requisitos:** São itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Não há no momento.

Considerações:

- Há um total de 10 itens de ação nas deliberações dessa comunidade. **Não** constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos acima.

- A distribuição dos itens de ação por status é apresentada no **Gráfico 2.8.2.1** a seguir.

Gráfico 2.8.2.1: Distribuição dos itens de ação por status

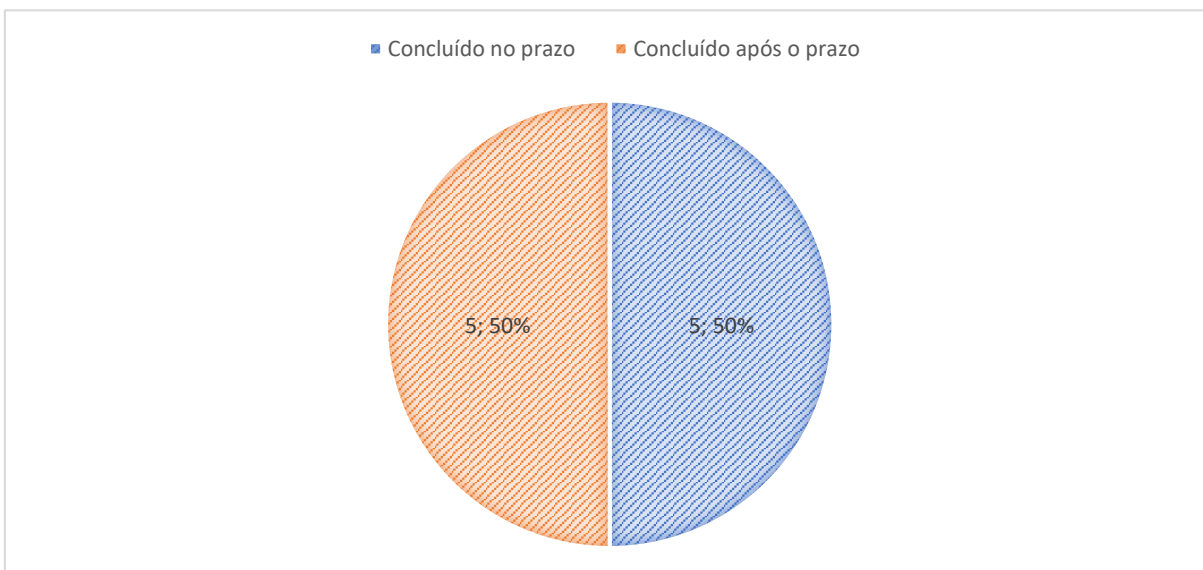

Ressaltamos que os status de conclusão acima representados se referem às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF, as quais ainda precisam ser avaliadas para validar o seu encerramento.

As evidências de cumprimento encontram-se disponíveis no SharePoint no seguinte link: <https://bit.ly/31Nyhtn>

2.8.2.2 Itens concluídos no prazo

Quadro 2.8.2.2 Itens concluídos no prazo.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 155 (item 2). Aprovar que a participação dos representantes das comunidades tradicionais atingidas seja realizada conforme parâmetros definidos entre Fundação e CTIPCT, respeitando orientação prévia do CIF.	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF. A Fundação Renova deverá apresentar versão reestruturada do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas, considerando as	20/08/18	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 emOFI.NII.082018.3863 OFI.NII.082018.386320/08/18.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
recomendações contidas na NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF, no prazo de 20 dias.		
DEL. 187 (item 2) / NT nº. O documento elaborado pela Fundação Renova deverá ser entregue à CT-IPCT para nova avaliação, juntamente com o Plano de Comunicação ao público-alvo.	20/08/18	Encaminhado o documento "Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas" Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 205 (item 3) / NT nº 11/2018/CTIPCT /NT nº 19/2018/CTIPCT. A Fundação Renova deverá apresentar o Plano de Contingência para Cheias referente a todas as terras indígenas atingidas até 15 de outubro de 2018.	15/10/18	Apresentado para TI Comboios na data determinada. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018.4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas. OFI.NII.102018.4315
DEL. 360 (item 1.1) / NT nº 19/2019 / Notif. nº 18/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. À inobservância da determinação constante no "Item 1" da referida Deliberação quanto a inclusão imediata, a partir de julho de 2019, das 7 (sete) famílias Krenak no pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial e nas demais ações previstas no âmbito do Acordo emergencial firmado entre o Povo Indígena Krenak e a Vale S/A, operacionalizado pela Fundação Renova.	Não definido	Enviado em 06/01 o documento OFI.NII.122019.8638 a manifestação ressaltando a necessidade de evidências do repasse da associação às famílias Krenak. Solicitando suspensão de multa (deliberação relacionada às deliberações 299 e 335)

2.8.2.3 Itens concluídos após o prazo

Quadro 2.8.2.3 Itens concluídos após prazo.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 169 (item 1) / NT nº 08/2018/CT-IPCT/CIF. Aprovar a inclusão, a partir de julho de 2018, das famílias Krenak referenciadas na Nota Técnica 008/2018/CT-IPCT/CIF, em respeito à Convenção OIT 169, da qual o Brasil é signatário.	31/07/18	Realizado o protocolo em 29/08 conforme documento OFI.NII.082018.3883 confirmando a inclusão das 4 famílias Krenak.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT. Determinar a reapresentação do PG03 contemplando o atendimento integral da NT nº 11/2018/CT-IPCT/CIF, com as complementações apontadas na NT nº 19/2018/CT-IPCT/CIF, devidamente acompanhado dos Planos de Ação, Projetos e Processos pertinentes, até 29 de outubro de 2018.	29/10/18	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
DEL. 299 / NT nº 05/2019/CT-IPCT / Notif. nº 19/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. Determinar a inclusão imediata, a partir de julho de 2019, das 7 famílias Krenak, listadas abaixo, no pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial e nas demais ações previstas no âmbito do Acordo emergencial firmado entre o Povo Indígena Krenak e a Vale S/A, operacionalizado pela Fundação Renova.	31/07/19	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias.
DEL. 335 (item 2) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. Conferir prazo de cinco dias para que a Fundação Renova busque a documentação de identificação individual das sete famílias.	29/10/19	Encaminhado em 09/06 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019
DEL. 335 (item 3) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. Efetuar o pagamento devido em 10 dias, conforme Deliberação 299/2019 do CIF.	03/11/19	Encaminhado em 09/06 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019

2.8.3 Terras Indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani

2.8.3.1 Principais Conceitos e Considerações:

Conceitos:

• **Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova. Exemplo: Deliberação 227 itens 1 e 2.


• **Itens de requisitos:** São itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Deliberação 227 item 3.

Considerações:

• Há um total de 15 itens de ação nas deliberações dessa comunidade. **Não** constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos acima.

• A distribuição dos itens de ação por status é apresentada no **Gráfico 2.8.3.1** a seguir.

Gráfico 2.8.3.1: Distribuição dos itens de ação por status

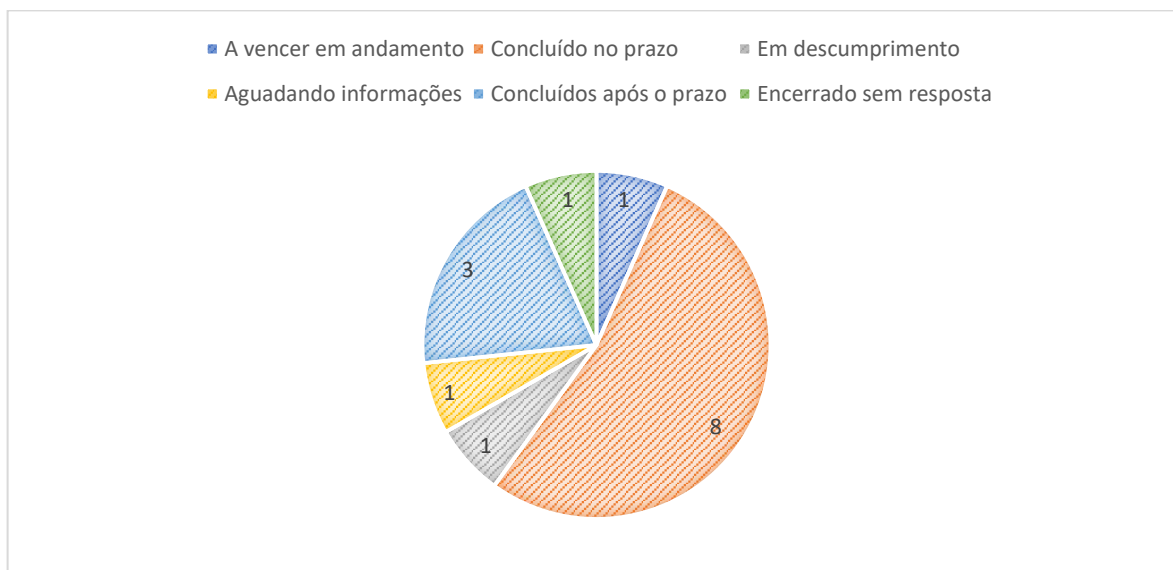

Ressaltamos que os status de conclusão acima representados se referem às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF, as quais ainda serão avaliadas para validar o seu encerramento.

As evidências de cumprimento encontram-se disponíveis no SharePoint no seguinte link: <https://bit.ly/31Nyhtn>

2.8.3.2 Itens a vencer e em andamento

Quadro 2.8.3.2 Itens a vencer em andamento

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 201 (item 1) / NT nº 14/2018/CTIPCT. Determinar à Renova o fornecimento imediato de água para consumo em até 15 dias para os(as) residentes nas aldeias Comboios, Córrego do Ouro, Amarelos, Pau Brasil, Olhos D'Água e Nova Esperança, das Terras Indígenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz/ES, em galões retornáveis de água mineral, de 20 litros, na razão de 15 litros de água/pessoa/dia, até que as medidas estruturantes a serem executadas pela Renova garantam água potável de qualidade para os residentes nestas aldeias e permitam a interrupção deste fornecimento.	Não definido	Conforme ata do da 33ª reunião do CIF de dez/18, a questão de descumprimento foi retirada da pauta uma vez que foi consensado que o foco deveria ser nas soluções definitivas de abastecimento. Projetos estruturantes em andamento.

2.8.3.3 Aguardando informações

Quadro 2.8.3.3 Aguardando informações

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 206 (item 1) / NT nº 20/2018/CT-IPCT/CIF. Determinar à Fundação Renova a apresentação de complementação do delineamento do Plano de Comunicação para Terras Indígenas de acordo com as análises e recomendações da Nota Técnica nº 20/2018/CT-IPCT/CIF, até 19 de outubro de 2018.	19/10/18	Comunidade indígena estava com outras pautas como prioridade. Aguardando término cenário COVID para retomada.

2.8.3.4 Itens concluídos no prazo

Quadro 2.8.3.4 Itens concluídos no prazo

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 155 (item 2). Aprovar que a participação dos representantes das comunidades tradicionais atingidas seja realizada	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
conforme parâmetros definidos entre Fundação e CTIPCT, respeitando orientação prévia do CIF.		
DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF. A Fundação Renova deverá apresentar versão reestruturada do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas, considerando as recomendações contidas na NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF, no prazo de 20 dias.	20/08/18	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 e OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 187 (item 2) / NT nº. O documento elaborado pela Fundação Renova deverá ser entregue à CT - IPCT para nova avaliação, juntamente com o Plano de Comunicação ao público-alvo.	20/08/18	Encaminhado o documento "Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas" Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 205 (item 3) / NT nº. A Fundação Renova deverá apresentar o Plano de Contingência para Cheias referente a todas as terras indígenas atingidas até 15 de outubro de 2018.	15/10/18	Encaminhado em 15/10/18 o documento OFI.NII.102018.4315 Com o Plano de Cheias para a TI Comboios. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018.4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas.
DEL. 227 (item 1) / NT nº. Ressalvadas as especificidades de cada aldeia, deve ser assegurada a isonomia de tratamento aos Tupiniquim e Guarani residentes nas Terras Indígenas de Aracruz/ES, referente as ações emergenciais, estruturantes, indenizatórias de caráter reparatório, considerando o território único e afetado igualmente pelos danos ocasionados pelo rompimento da Barragem de Fundão, garantindo o melhor benefício para toda a comunidade.	Não definido	Em relação aos acordos emergenciais, no dia 26/12 foram assinados os acordos conforme proposta da Fundação Renova.
DEL. 231 (item 1) / NT nº. A Fundação Renova deverá realizar reuniões com as Comunidades em até 30 dias e enviar memória da reunião com a discussão e	29/12/18	Encaminhadas em 20/12/18

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
encaminhamentos sobre o assunto, e cópia da lista de presença, para a CT-IPCT.		
DEL. 231 (item 3) / NT n° 23/2018/CTIPCT/ CIF. Determinar que a Fundação Renova insira no Plano Anual de Contingência para o Período Chuvoso 2018/2019 o detalhamento das atividades relacionadas aos povos indígenas e demais comunidades tradicionais atingidas, incluindo as informações contidas no plano conjunto de ações emergenciais Samarco Mineração S/A e Consórcio Aliança (UHE Risoleta Neves - Candonga) e, ainda, a atualização periódica, com frequência mensal, sobre o desenvolvimento das atividades nos territórios acompanhados pela CT-IPCT.	Não definido	Equipe técnica está preparando relatório sobre o tema. Previsão de entrega em setembro/20.
DEL. 231 (item 2) / NT n° 23/2018/CTIPCT/ CIF. Sendo constatado que as áreas podem ser atingidas pelas cheias dos rios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova deverá apresentar Planos de Contingência de Cheias, utilizando a mesma metodologia aplicada a Terra Indígena de Comboios, para as demais comunidades tradicionais acompanhadas por esta CT-IPCT: CRQ Degredo (Linhares/ES) e demais Terras Indígenas.	Não definido	02/10/2020

2.8.3.5 Itens concluídos após o prazo

Quadro 2.8.3.5 Itens concluídos após prazo

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 201 (item 2) / NT nº 14/2018/CTIPCT. Determinar à Fundação Renova o início imediato de ações estruturantes nas mesmas aldeias, com vistas a garantir, o mais breve possível, o fornecimento de água de qualidade para o consumo dos residentes, independentemente da finalização do Estudo do Componente Indígena, como parte da mitigação dos efeitos deletérios do rompimento da barragem de Fundão nos Territórios Indígenas de Aracruz/ES.	16/10/18	Enviado o OFI.NII.032019.5775 em 28/03/19, citando que as ações estruturantes em relação ao abastecimento de água já foram iniciadas no workshop de intercâmaras realizado em 15/03/10, e que os encaminhamentos desta estão em andamento.
DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT. Determinar a reapresentação do PG03 contemplando o atendimento integral da NT nº 11/2018/CT-IPCT/CIF, com as complementações apontadas na NT nº 19/2018/CT-IPCT/CIF, devidamente acompanhado dos Planos de Ação, Projetos e Processos pertinentes, até 29 de outubro de 2018.	29/10/18	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
DEL. 227 (item 2) / NT nº 21/2018. Determinar o início imediato das ações estruturantes de caráter reparatório (sejam transitórias ou definitivas) nas Terras Indígenas Tupiniquim e Guarani, com base nos danos sofridos pelos territórios e no diálogo com os atingidos, tendo em vista que estão denotadas questões emergenciais que precisam de intervenção (como o abastecimento de água para as aldeias citadas na Deliberação CIF nº 201/2018), com apresentação de plano de atividades, devidamente justificado, e cronograma, em até 20 dias.	19/11/18	Enviado o documento OFI.NII.032019.5775 em 28/03/19, citando que as ações estruturantes em relação ao abastecimento de água já foram iniciadas no workshop de intercâmaras realizado em 15/03/19, e que os encaminhamentos desta estão em andamento.

2.8.3.6 Itens em descumprimento

Quadro 2.8.3.6 Itens em descumprimento

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 452 (item 5) - Nota Técnica nº 35/2020/CT-IPCT Analisa os pedidos de impugnação feitos pela Fundação Renova em relação às Deliberações CIF 417, 420, 434, 435 e 436 e 445 e aplica sanção(...) 5. Em relação à Deliberação 445/2020, rejeitar, na forma das manifestações em ata, a manifestação apresentada pela Fundação Renova, e outorgar prazo de 15 (quinze) dias para que adote as medidas de cumprimento. Para o caso do fornecimento de água previsto no item 1 da referida deliberação, não deverá haver interrupção.	-	Fornecimento de água continuado.

2.8.3.7 Itens encerrado sem resposta

Quadro 2.8.3.7 Itens encerrados sem resposta

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 445* (item 2.1)- Nota Técnica nº 35 da CT-IPCT Determinar a continuação do abastecimento de água potável na Terra Indígena Comboios - Item 2.1). Determinar que a Fundação Renova apresente em um prazo de 30 (trinta) dias proposta de integração do conteúdo do monitoramento da qualidade ambiental recomendado na Nota Técnica nº 35 da CT-IPCT relativo às Terras Indígenas do ES (Tupiniquim, Caieiras Velha II e Comboios), aos programas existentes no TTAC para posterior aprovação das comunidades e das Câmaras Técnicas permanentes, de forma a gerar um relatório específico para estes territórios no âmbito de cada um dos programas.	-	Fornecimento de água continuado.

*NOTA: As deliberações CIF nº 445 itens 2.1 a 2.5 e 452 item 5 foram contestados os cumprimentos junto ao Sistema CIF.

3. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021

3.1 TERRA INDÍGENA COMBOIOS – CONTEXTUALIZAÇÃO

A Terra Indígena (TI) de Comboios foi demarcada e homologada pelo Decreto Presidencial de 05/11/2010, abrangendo uma área de 3.872 (três mil, oitocentos e setenta e dois) hectares, situada entre o rio Comboios e o mar, no município de Aracruz (ES). É constituída por uma população de 534 (quinhentas e trinta e quatro) pessoas (SESAI/SIASI, 2013) pertencentes à etnia tupiniquim, que se dividem em duas aldeias: **aldeia Comboios e aldeia Córrego do Ouro**.

Os Tupiniquim de Comboios vêm sendo atendidos pela Fundação Renova, no âmbito do TTAC. A realização de ações deve se configurar como ferramenta para a promoção da reparação.

3.1.1 Ações emergenciais

As atividades realizadas neste eixo são voltadas às ações de mitigação, vulnerabilidades e aos riscos associados para povos e comunidades tradicionais identificadas no TTAC.

Tabela 3.1.1 – Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre
AÇÕES EMERGENCIAIS TI COMBOIOS

AÇÕES EMERGENCIAIS TI COMBOIOS	
Ações	Auxílio de Subsistência Emergencial
	Fornecimento de água mineral
	Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos - (PMQQS)
	Elaboração do Plano de Contingência de Cheias

3.1.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)

Em dezembro de 2020 foi assinado a renovação do Termo de Acordo para o ano de 2021 (TAC 2021), que prevê o atendimento de até 300 famílias para a terra indígena em de Comboios, desde que cumpram os critérios estabelecidos no acordo vigente.

Está previsto o pagamento mensal de dois salários-mínimos e meio (vigente no ano) por titular de cada família atendida, acrescidos a 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo para cada dependente mais uma cesta básica para cada família (DIEESE). No acordo também é previsto o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal repassado à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (AITC) a título de cobertura de gastos administrativos da associação. Os valores são repassados no dia 15 de cada mês para a associação indígena que é responsável por repassar os valores às famílias (**Quadro 3.1.1.1**).

Quadro 3.1.1.1 Indicador de cumprimento do acordo ASE – Acordo 2021

Ação	Nº Previsto	Nº Realizado	% Realizado
Pagamento mensal ASE-AITC	300	293	97,6

Os casos de nascimentos são computados como novos dependentes conforme envio de solicitação realizada pela associação e da documentação comprovatória de vínculo com o titular.

Tabela 3.1.1.1 – Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Comboios

ASSOCIAÇÃO	TITULARES (ANO)	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
		Titulares	Dep.	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.
AITC	2021	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.
	300	293*	530	293	530	293	529

*titulares considerados elegíveis pela associação

É importante ressaltar que a associação/lideranças indígenas possuem autonomia para a sua organização administrativa e a integração com seus membros e pode excluí-los ou adicioná-los conforme sua governança, respeitando-se o número de possibilidades de inclusão e as regras estabelecidas do acordo vigente.

Cabe à associação realizar a prestação de contas junto a Fundação Renova por meio da entrega de recibos coletivos (a associação recebe todos os meses um recibo da Fundação Renova constando o quantitativo de famílias, dependentes, cesta básica e o percentual destinado a associação) e individuais (cabe à associação encaminhar mensalmente para a Fundação Renova os recibos os valores repassados às famílias). A ausência da entrega dos recibos pode acarretar suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

3.1.1.2 Fornecimento de água mineral

Está previsto o atendimento para 423 indígenas da aldeia de Comboios e 325 na aldeia de Córrego do Ouro na quantidade de 5 litros por dia e por pessoa. Durante o período abrangido por este relatório, o fornecimento de água mineral foi realizado semanalmente na TI Comboios nas aldeias de Comboios e Córrego do Ouro. A reposição dos galões vazios foi realizada de acordo com a demanda. Como registro das entregas realizadas são colhidas as assinaturas nos recibos de entrega. As evidências do desenvolvimento dessa ação são apresentadas no **Anexo 3.1.1.2**.

Figuras 3.1.1.2 -1 e 3.1.1.2-2 – Entrega de água para a Aldeia Comboios



Figura 3.1.1.3-1. Entrega de água mineral na aldeia Comboios



Figura.3.1.1.3-2 Entrega de água mineral na aldeia Comboios

Tabela 3.1.1.2.A – Entrega de água na Aldeia Comboios e na Aldeia Córrego do Ouro entre os meses de julho, agosto e setembro de 2021

Pontos de entrega acordados	Galões de 20 litros		
	Julho	Agosto	Setembro
Aldeia Comboios	1466	1062	1390
Aldeia Córrego do Ouro	453	278	260
Total	1919	1340	1650

A entrega de água mineral nas aldeias Córrego do Ouro e Comboios é realizada de acordo com a demanda de consumo de água apresentada pela comunidade mediante a devolução do vasilhame vazio.


Tabela 3.1.1.2.B – Indicadores de Progresso para o Trimestre

Ação	Nº previsto Trimestre (pessoas)	% Previsto	Nº Realizado	% Realizado
Fornecimento de água mineral emergencial TI Comboios para 748 pessoas*.	2244	100%	2244	100%

*A quantidade total demandada pela comunidade é entregue.

Apresentamos na sequência (**Figura 3.1.1.2**) o indicador de progresso dessa ação para o Trimestre em relação ao fornecimento de água mineral para as aldeias Comboios e aldeia Córrego do Ouro da TI Comboios.

Figura 3.1.1.2 – Indicador de Progresso para o Trimestre

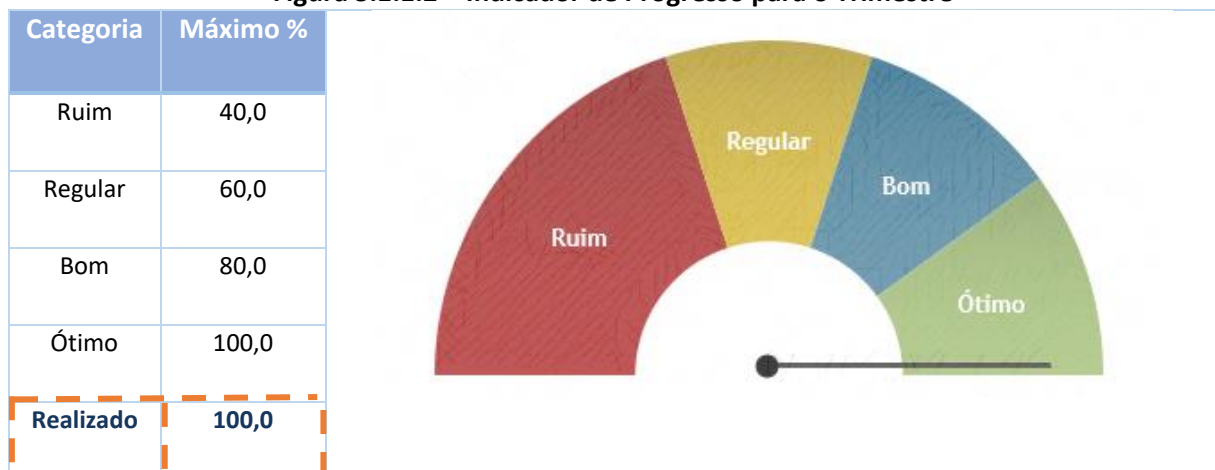

3.1.1.3 Plano de contingência de cheias

No mês de maio foi realizada reunião entre Fundação Renova, Defesa Civil do município de Aracruz e o Cacique da aldeia de Comboios. Nesse encontro foi reapresentado o plano de cheias que havia sido encaminhado no final do ano de 2020.

O secretário de Defesa Civil solicitou que a Fundação Renova reenviasse o documento para análise e que fosse agendada uma nova reunião para tratativas relacionadas ao assunto. A Defesa Civil enviou uma versão atualizada do documento em 06/07/2021 e a reunião foi realizada no dia 01/09/2021. Nesta reunião a Fundação Renova e a Defesa Civil validaram conjuntamente ajustes finais do plano. A ata da reunião encontra-se no **Anexo 3.1.1.3**.

A Fundação Renova entregou no dia 30/06/21 à Defesa Civil as placas que deverão ser instaladas pela mesma na TI Comboios (Figuras 3.1.1.3-1 e 3.1.1.3-2). A evidência de entrega para a Defesa Civil é apresentada no **Anexo 3.1.1.3**.

Figuras 3.1.1.3-1 e 3.1.1.3-2 – Placas entregues pela Fundação Renova à Defesa Civil



Figura 3.1.1.3-1. Placas entregues para a Defesa Civil



Figura.3.1.1.3-2 Placas entregues para a Defesa Civil

3.1.1.4 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

Conforme apresentado em relatório anterior, para a região da TI Comboios, os pontos dos grupos Zona Costeira e Estuarina que estão próximos à mesma são apresentados na tabela abaixo.

Em todos os pontos de monitoramento da zona costeira são coletadas amostras em duas profundidades: superfície (15 cm abaixo da superfície do mar) e fundo (50 cm acima do leito submarino). Já nas regiões estuarinas, se houver diferença significativa de condutividade, entre o medido na superfície e o medido no fundo, significa que a coluna d'água está estratificada. Neste caso são feitas coletas de água na superfície e no fundo. Se não houver estratificação, será coletada água só no fundo. Ou seja, a partir de fevereiro as coletas P15 e P50 não serão mais fixas como anteriormente, vai depender da estratificação da condutividade, inferior a 10.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ coleta de água na profundidade de 50cm (P50). Estas profundidades permitem avaliar a influência da pluma de sedimentos do rio sobre as camadas superficial e de fundo, que podem ser influenciadas de forma diferente por este fator e pela ressuspensão de sedimentos do fundo provocada por processos meteocanográficos. Os pontos do grupo Zona Costeira indicam apenas a posição em relação à costa e serão deslocados em direção ao mar para coincidirem com a isóbata de 10 m durante a primeira campanha de campo.

Tabela 3.1.1.4 – Pontos de Amostragem do PMQQS

Código	Nome do Ponto	Latitude	Longitude
EPA 01R*	Estuário Piraquê-Açú 01R	-19,9502	-40,1561
EPA 02R*	Estuário Piraquê-Açú 02R	-19,92863	-40,17543

* Os pontos realocados foram renomeados conforme sua disposição no corpo hídrico, de modo que o ponto realocado recebeu a letra R ao seu código. O deslocamento destes pontos ocorreu, pois se encontravam em áreas instáveis, rasas, em bancos de areia ou sob forte influência de corrente de maré.

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referentes ao monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço de armazenamento é: <https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/> no qual estão disponíveis o boletim trimestral de lagoas, zona costeira e estuários referente a outubro, novembro e dezembro de 2020 e o boletim mensal de rios até janeiro 2021. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma *online* interativa.

Ressalta-se que os dados referentes aos meses de 2021 que não estão disponíveis online serão adicionados conforme ocorra a sua validação e poderão ser consultados de forma pública a partir de sua publicação, que pode ocorrer antes da elaboração de novo Relatório Trimestral.

3.1.1.5 Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre

As interfaces consolidadas no trimestre para a realização das ações emergenciais estão consolidadas no **Quadro 3.1.1.5**.

Quadro 3.1.1.5 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Financeiro	ASE	3.2.1.1
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	Elaboração do Plano de Cheias	3.1.1.3
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQQS	3.1.1.4

3.1.2 Ações transitórias

As ações transitórias previstas no escopo do PG 03 para a Terra Indígena Comboios têm por objetivo promover a articulação com órgãos reguladores a realização dos estudos para identificação dos impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais (**Tabela 3.1.2**).

Tabela 3.1.2 – Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre

AÇÕES TRANSITÓRIAS TI COMBOIOS	
Ações	PBAI- Plano Básico Ambiental Indígena
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC
	Projeto Lótus

O detalhamento das ações transitórias será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

3.1.2.1 Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)

A consultoria independente para o detalhamento do PBAI voltado às Terras Indígenas Tupiniquim Caieiras Velhas II e Comboios, em Aracruz (ES) foi contratada na segunda quinzena de maio de 2021.

A consultoria em conjunto com a Fundação Renova realizou proposição de um cronograma de atividades considerando o Termo de Referência emitido pela FUNAI. O cronograma foi apresentado ao órgão indigenista e lideranças indígenas em reunião realizada em 24.06.2021 e protocolado em 30.06.2021.

Entre os dias 18.06 e 30.06.2021 foi realizada a apresentação da consultoria e houve início dos diálogos entre a consultoria e as lideranças indígenas para a construção do Plano de Trabalho do PBAI (PT PBAI).

A Fundação protocolou o PT PBAI para a FUNAI e comunidades indígenas em 02.07.2021 por meio do ofício FR 2021.1037. O órgão indigenista realizou sua análise técnica e emitiu parecer por meio do ofício Nº 946/2021/DPDS/FUNAI. A análise técnica expedita acerca do referido Plano de Trabalho foi efetuada por meio da Informação Técnica nº 78/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. Foi solicitado pela FUNAI uma nova versão PT PBAI com os ajustes das lacunas e insuficiências apontadas, antes da realização das reuniões de apresentação e validação final.

A revisão do PT PBAI foi protocolada (ofício FR.2021.1220) à FUNAI e comunidades indígenas em 30.07.2021. A revisão apresentada foi realizada em atendimento à Informação Técnica nº 78/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI.

A FUNAI realizou sua análise técnica e emitiu parecer por meio do ofício Nº 1057/2021/DPDS/FUNAI. A análise efetuada considerou a Informação Técnica nº 91/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI e a Informação Técnica nº 78/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. De acordo com órgão de referência, a versão revisada atendeu as solicitações. Contudo, foram requeridas correções/adaptações, as quais, no entanto, não comprometeram o conjunto do PT PBAI, mas que deveriam ser enviadas à FUNAI antes de apresentá-lo às comunidades indígenas para a consulta e validação.

A terceira versão do PT PBAI e o protocolo de segurança foi encaminhado pela Fundação (FR.2021.1390) em 31.08.2021 e, em 08.09.2021, o órgão indigenista emitiu parecer sobre a terceira versão solicitando modificações pontuais no que tange ao protocolo de segurança e emitiu diretrizes da execução das atividades em campo pela empresa consultora.

Devido a outros processos em andamento na TI Comboios as lideranças indígenas solicitaram que a reunião de consulta e validação do PBAI ocorresse em outubro de 2021.

3.1.2.2 Fundo de Apoio as iniciativas Comunitárias (FAIC)

O Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC, tem por objetivo, apoiar pequenos projetos comunitários realizados pelos indígenas em seu território, ou que sejam de interesse das comunidades indígenas.

Os projetos apresentados pelas comunidades indígenas da TI Comboios, foram aprovados após a avaliação técnica/comercial ocorrida no mês de julho. Durante o mês de agosto as minutas do Termo de Investimento Social (termo de parceria) foram validados e posteriormente encaminhados para assinatura dos proponentes.

Os 04 (quatro) projetos encaminhados pelas comunidades indígenas da TI Comboios estão em conformidade com as temáticas definidas em edital. Os projetos propostos pelas comunidades indígenas das aldeias Comboios e Córrego do Ouro focaram nas linhas temáticas: **Cultura, Geração de Renda, Lazer/Educação e Agricultura**, evidenciando a importância desses projetos à essas comunidades. O **Quadro 3.1.2.2** apresenta as informações gerais dos projetos encaminhados.

Quadro 3.1.2.2 Projetos FAIC das Comunidades Indígenas TI Comboios

Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática
Comboios	Córrego do Ouro	Fortalecimento da Agricultura Familiar na Terra Indígena Comboios	Agricultura
		Fortalecimento da EduComunicação na Terra Indígena Comboios	Educação/Lazer

Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática
	Comboios	Fortalecimento do Grupo de Mulheres da Terra Indígena Comboios	Geração de renda
		Fortalecimento da Juventude Indígena da Terra Indígena Comboios	Cultura

No mês de setembro foi realizada então a reunião de Kick Off, reunião de partida predecessora a liberação dos recursos, onde foram apresentadas as informações referentes a prestação de contas e procedimentos para execução financeira em conformidade aos orçamentos apresentados.

No mes de outubro será disponibilizada a 1ª parcela dos recursos orçados em cada um dos projetos, sendo assim, os projetos serão iniciados conforme cronograma físico-financeiro aprovado.

A equipe técnica do PG 03 está acompanhando e irá prestar apoio aos proponentes, quando necessário.

3.1.2.3 Projeto Lótus

O Projeto Lótus tem por objetivo apoiar a formação de lideranças e o estabelecimento de uma Rede de Jovens atuantes na busca de soluções aos problemas identificados em suas comunidades ou regiões.

Trata-se de Projeto de Educação Socioambiental e Tecnológico que oferece aos jovens, a oportunidade de descobrir seu potencial de liderança por meio de ações que desenvolvam o pertencimento ambiental, o olhar jovem para a realidade de sua comunidade e a construção de projetos socioambientais. As oficinas formativas abordam diversos temas ambientais relacionando-os com os desafios encontrados para revitalização da bacia do Rio doce.

Para o período deste relatório as ações foram desenvolvidas de maneira remota, na modalidade de Ensino à Distância – EAD. Atualmente encontram-se matriculados no projeto 12 jovens indígenas nas TI'S de Aracruz, destes 11 são da TI Comboios.

Tabela 3.1.2.3 – Ações do Projeto Lótus desenvolvidas no trimestre

Tema do Encontro Virtual	Data
Técnicas de Investigação Social	07/07
Técnicas de investigação social	17/07
Técnicas de Investigação Social	28/07
Elaboração de projetos	11/08
Oficina de projetos	17/07
Oficina de projetos	25/08
Oficina de projetos	01/09
“Aulão” de Robótica	11/09
Oficina de Projetos	22/09

As ações do Projeto Lótus são desenvolvidas no âmbito do PG33 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em interface com o PG03 - Programa de Povos Indígenas.

3.1.2.4 Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre

Quadro 3.1.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre

Área	Programas FR com interface - PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Área Funcional da FR	Suprimentos	PBAI	3.1.2.2
Área Funcional da FR	Suprimentos	FAIC	3.1.2.3
Socioeconômico	PG-33	Projeto Lótus	3.1.2.4

3.1.3 Ações estruturantes

As ações previstas neste eixo são voltadas à elaboração, execução e monitoramento dos planos de ações permanentes, que visam garantir o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades atendidas e em paralelo a todos as fases do processo de reparação.

Quadro 3.1.3 – Ações do eixo estruturante desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES ESTRUTURANTES TI TUPINIQUIM/GUARANI

Ações	Reparação Integrada
	Elaboração de projetos de SAA
	Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce

O detalhamento das ações estruturantes será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

3.1.3.1 Reparação Integrada

Durante o trimestre de composição deste relatório, a Fundação Renova realizou 06 (seis) reuniões de diálogo com as lideranças indígenas das aldeias Comboios e Córrego do Ouro – TI Comboios para tratativas do processo indenizatório.

Participaram desses encontros os Caciques e lideranças indígenas das respectivas aldeias, bem como representantes do Ministério Público Federal, FUNAI, CTIPCT, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Defensoria Pública da União e Secretaria de Direitos Humanos do estado do Espírito Santo.

Nos meses de julho, agosto e setembro, a Fundação Renova compartilhou versões da minuta do acordo de reparação integrada para análise das lideranças indígenas e órgãos de referência. As lideranças indígenas e órgãos encaminharam a devolutiva com considerações.

FUNAI

Durante o período de referência desse relatório, o programa de Povos Indígenas da Fundação realizou diálogos com a AITC para regularização dos documentos pessoais e bancários das famílias beneficiárias do acordo.

No dia 29.09.2021 as lideranças indígenas de Comboios apresentaram ofício com aceite da proposta. Neste mesmo ofício, manifestaram interesse em dar continuidade no processo em separado da Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani e sem a inclusão da Funai como partícipe do acordo (anexo 3.1.3.1).

3.1.3.2 Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

A Fundação Renova enviou um ofício no dia 14/07/21 informando sobre a programação das atividades de demarcação e perfuração do poço na aldeia Comboios (Anexo 3.1.3.2). Após a confirmação da disponibilidade, informada pelo cacique Toninho, foi enviado novo ofício, informando a data precisa para realização dos serviços de demarcação do local da perfuração (21/07/21), e do início do serviço de perfuração do poço (23/07/21). Neste ofício também foram encaminhados os Termos de Compromisso Individuais – TCI - assinados para todos os colaboradores envolvidos nas atividades (Anexo 3.1.3.2). Os serviços, no entanto, não foram realizados nas datas supracitadas, pois o cacique Toninho informou a Fundação Renova de que a comunidade estaria envolvida com ações de reparação integrada. Acertou-se, assim, uma nova data junto ao cacique (Anexo 3.1.3.2) e os serviços foram realizados no dia 11/08/21.

Após a verificação nas condições de acesso feita pela empresa responsável pela perfuração, constatou-se dificuldades logísticas e operacionais ao acesso aos pontos. Atualmente, a Fundação Renova está elaborando alternativas para esta questão, visando a continuidade do processo de elaboração do projeto do Sistema de Abastecimento de Água. Também estão sendo realizadas tratativas com as lideranças indígenas para verificar a possibilidade da antecipação da perfuração do poço em Córrego do Ouro, que seria realizada após a perfuração na aldeia Comboios.

Figuras 3.1.3.2-1 e 3.1.3.2-2 – Realização dos serviços de demarcação do local de perfuração do poço e verificação das condições de acesso dos caminhões ao local na aldeia Comboios



Figura 3.1.3.2-1. Equipe em campo



Figura.3.1.3.2-2 Equipe em campo

A Fundação Renova também iniciou as tratativas para realização de levantamento de campo pela empresa que elaborará os projetos dos Sistemas de Abastecimento de Água, os quais deverão ocorrer no início de outubro.

3.1.3.3 Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce

As ações do projeto Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, sob responsabilidade dos programas PG26, estão sendo redesenhadas para atender aos novos critérios de segurança e saúde devido a pandemia do Covid-19.

Buscando esclarecimentos sobre o status do projeto e acompanhamento das ações a serem desenvolvidas, a FUNAI solicitou o agendamento de uma reunião de esclarecimentos junto aos responsáveis pelo projeto. Em concordância, a Fundação Renova ressaltou a importância desse diálogo tendo em vista o necessário alinhamento sobre a interação com a comunidade, inserção de novos integrantes, contextualização e status das atividades desenvolvidas (por meio de interação remota e virtual), dentre outros pontos, tendo o PG03 atuado como interlocutor do projeto na apresentação entre FUNAI e a Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce.

Cabe destacar que, o projeto Rede de Sementes é uma das vias possíveis de projetos no Programa de Retomada Econômica, visando a reparação integrada. Dessa forma, foi realizada reunião com a FUNAI, com o objetivo de esclarecer o projeto de protagonismo dos PGs 26 e 27. A Fundação Renova aguarda a autorização da FUNAI para a retomada das ações presenciais junto aos grupos coletores.

Enquanto não há a sinalização da FUNAI para a retomada das atividades presenciais, são desenvolvidas atividades on-line para capacitação dos agentes multiplicadores, coletores e técnicos das casas de sementes.

Entre os dias 23 e 30 de julho, foi realizada a primeira oficina envolvendo representantes de todos os grupos em mobilização pelo projeto. Esta capacitação teve o objetivo de trazer aos coletores conhecimentos iniciais nas temáticas de técnicas de manejo, coleta, controle de qualidade da produção.

3.1.3.4 Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre

Tabela 3.1.3.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre

Área	Programas FR com interface - PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Socioeconômico	PG-02	Reparação Integrada	3.1.3.1
Funcional da FR	Engenharia	Elaboração de projeto	3.1.3.2
Socioambiental	PG-26 e PG -27	Projeto Rede de Sementes	3.1.3.3

3.1.5 Agendas

3.1.5.1. Agenda realizada no trimestre

Tabela 3.1.5.1 - Agenda Realizada no Trimestre

Reunião	Data	Programas/ áreas vinculadas	Objetivo da reunião	Evidência	Objetivo alcançado
Reparação integrada – TI Comboios	12/07	PG 03 /PG 02/Juridico	Construção de proposta de reparação integrada com comunidade indígena da TI Comboios	Gravação	Sim.
Reparação integrada – TI Comboios	13/07	PG 03/Juridico	Regularização dos documentos das famílias de Comboios	Gravação	Sim.
Capacitação Rede de Sementes	23 e 30/07	PG03/PG26	Trazer aos coletores conhecimentos iniciais nas temáticas de técnicas de manejo, coleta, controle de qualidade da produção	-	Sim
39ª Reunião CT-IPCT	23/08	PG 03	Acompanhar ações realizadas no território	-	Sim

Reunião	Data	Programas/ áreas vinculadas	Objetivo da reunião	Evidência	Objetivo alcançado
Reparação Integrada – TI Comboios	23/08	PG 03/PG 02/Juridico	Construção de proposta de reparação integrada com a comunidade indígena da TI Comboios	Gravação	Sim.
Reparação Integrada – TI Comboios	24/08	PG 03/ Jurídico	Revisão da minuta de reparação integrada	Gravação	SIM.
Reparação Integrada – TI Comboios	26/08	PG 03/ Jurídico	Revisão da minuta de reparação integrada e esclarecimento da proposta da Fundação	Gravação	SIM.
Plano de Contingência de Cheias TI Comboios	01/09	PG 03/ PG38	Reapresentação do Plano de Cheias a Defesa Civil e encaminhamentos	Gravação	Sim.
Reuniões entre empresa consultora para detalhamento do PBAI e Lideranças Indígenas	julho	Empresa Consultora (MPB) e lideranças indígenas	Construção do PT PBAI	-	Sim.
Reunião de Kick Off - FAIC	08/09	PG 03/ADMCT/Proponentes Faci	Nivelar as informações sobre o início da execução dos projetos FAIC e as etapas de prestação de contas.	ATA	Sim

3.2 TI TUPINIQUIM/GUARANI – CONTEXTUALIZAÇÃO

A Terra Indígena Tupiniquim, situada ao sul da TI Comboios, no município de Aracruz/ES, também foi demarcada e homologada pelo Decreto Presidencial de 05 de novembro de 2010, abrangendo uma área de 14.282 hectares. Se divide em nove aldeias;

quatro delas são compostas pela etnia tupiniquim (**Aldeia de Caieiras Velha, Aldeia Pau-Brasil, Aldeia Irajá e Aldeia Areal**), e quatro pela etnia guarani (**Aldeia Olhos d'Água, Aldeia Boa Esperança, Aldeia Três Palmeiras e Aldeia Nova Esperança**). Existe ainda a aldeia mista na TI, composta pelas duas etnias (**Aldeia Amarelos**).

Já a Terra Indígena Caieiras Velha II, homologada por decreto presidencial em 20/04/2004 tem um território de 57 hectares, que constituída pela **Aldeia Piraqueçu**, composta pela etnia Guarani.¹

A Fundação adota a denominação “TI Tupiniquim Guarani” em referência ao conjunto das duas Terras Indígenas.

3.2.1 Ações emergenciais

As atividades realizadas neste eixo são voltadas às ações de mitigação, vulnerabilidades e aos riscos associados para povos e comunidades tradicionais identificadas no TTAC, conforme a **Tabela 3.2.1**.

Tabela 3.2.1– Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES ESTRUTURANTES TI TUPINIQUIM/GUARANI	
Ações	Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)
	Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos - (PMQQS)

3.2.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)

O pagamento de Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) é efetivado às famílias indígenas das terras indígenas Tupiniquim/Guarani como parte do acordo renovado em 2020 entre a Comissão de Caciques, as associações indígenas e a Fundação Renova. Está previsto o atendimento de até 1.350 famílias desde que atendam os critérios estabelecidos no acordo vigente.

Mensalmente, realiza-se o pagamento de 1 (um) salário-mínimo por titular de cada família atendida, acrescido 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo por dependente e adicionado o valor de uma cesta básica para cada família. O valor da cesta básica

¹ Fonte: ECI – Polifônicas.

é cotado por estimativa apresentada pelo DIEESE. No acordo, também é previsto o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal, repassado às associações a título de cobertura de seus gastos administrativos. Os valores são repassados no dia 15 (quinze) de cada mês para as 07 associações indígenas atendidas:

- Associação Tupiniquim Guarani da Aldeia de Amarelos (AITUGUAA)
- Associação Indígena Tupiniquim da Aldeia de Pau Brasil (AITUPIAPABRA)
- Associação Indígena Tupiniquim da Aldeia Irajá (AITUPAIRA)
- Associação Indígena Tupiniquim da Aldeia (AITAA)
- Associação Indígena Mboapy Pindó (AIG)
- Associação Indígena Tupiniquim e Guarani (AITG)
- Associação Indígena Tupiniquim de Caieiras Velhas (AITCV)

Mensalmente, realiza-se o pagamento de 1 (um) salário-mínimo por titular de cada família atendida, acrescido 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo por dependente e adicionado o valor de uma cesta básica para cada família. O valor da cesta básica é cotado por estimativa apresentada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) conforme o parâmetro para a capital Vitória (ES). No acordo, também é previsto o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal, repassado às associações a título de cobertura de seus gastos administrativos. Os valores são repassados no dia 15 (quinze) de cada mês.

Quadro 3.1.1.1 Indicador de atendimento do acordo ASE – Acordo 2021

Ação	Nº Previsto	Nº Realizado	% Realizado
Pagamento mensal do ASE	1.350	1.350	100

O detalhamento do atendimento por associação é apresentado na **Tabela 3.2.1.1**.

Tabela 3.2.1.1 – Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Tupiniquim/Guarani

Associações	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO	
	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.
AITUGUAA	56	83	57	83	57	83
AITUPIAPABRA	276	434	278	435	278	433
AITUPAIRA	165	310	165	311	165	312
AITAA	56	116	56	116	56	116
AIG	56	125	56	124	56	124
AITG	718	1380	719	1382	719	1382
AITCV	19	29	19	29	19	30
TOTAL	1.346	2.477	1350	2.480	1.350	2.480

Ao longo deste ano, os casos de nascimentos são computados como novos dependentes, conforme envio de solicitação, documentação comprovatória de vínculo com o titular.

É importante ressaltar que as associações possuem autonomia para a sua organização administrativa e a integração com seus membros, e podem excluí-los ou adicioná-los conforme sua governança, respeitando-se os critérios de elegibilidade previstas no acordo vigente.

Cabe às associações realizar a prestação de contas junto a Fundação Renova por meio da entrega de recibos coletivos (a associação recebe todos os meses um recibo da Fundação Renova constando o quantitativo de famílias, dependentes, cesta básica e o valor dos 5%) e individuais (cabe às associações encaminhar mensalmente para a Fundação Renova os recibos os valores repassados às famílias). A ausência da entrega dos recibos pode acarretar suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

3.2.1.2 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

Conforme apresentado em relatório anterior, para a região da TI TG, os pontos dos grupos Zona Costeira e Estuarina que estão próximos à mesma, são apresentados na tabela abaixo. Em todos os pontos de monitoramento da zona costeira são coletadas amostras em duas profundidades: superfície (15 cm abaixo da superfície do mar) e fundo (50 cm acima do leito submarino). Já nas regiões estuarinas, se houver diferença significativa de condutividade, entre o medido na superfície e o medido no fundo, significa que a coluna d'água está estratificada. Neste caso são feitas coletas de água na superfície e no fundo. Se não houver estratificação, será coletada água só no fundo. Ou seja, a partir de fevereiro as coletas P15 e P50 não serão mais fixas como anteriormente, vai depender da estratificação da condutividade, inferior a 10.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ coleta de água na profundidade de 50cm (P50). Estas profundidades permitem avaliar a influência da pluma de sedimentos do rio sobre as camadas superficial e de fundo, que podem ser influenciadas de forma diferente por este fator e pela ressuspensão de sedimentos do fundo provocada por processos meteoceanográficos. Os pontos do grupo Zona Costeira indicam apenas a posição em relação à costa e serão deslocados em direção ao mar para coincidirem com a isóbata de 10 m durante a primeira campanha de campo.

Tabela 3.2.1.2 – Pontos de Amostragem do PMQQS

Código	Nome do Ponto	Latitude	Longitude
EPA 01R *	Estuário Piraquê-Açú 01R	-19,9502	-40,1561
EPA 02R *	Estuário Piraquê-Açú 02R	-19,92863	-40,17543

* Os pontos realocados foram renomeados conforme sua disposição no corpo hídrico, de modo que o ponto realocado recebeu a letra R ao seu código. O deslocamento destes pontos ocorreu, pois se encontravam em áreas instáveis, rasas, em bancos de areia ou sob forte influência de corrente de maré.

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referente do monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço é <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>> no qual estão disponíveis o boletim trimestral de lagoas, zona costeira e estuários referente a outubro, novembro e dezembro de 2020 e o boletim mensal de rios até janeiro 2021. A interface de

navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma online interativa.

Ressalta-se que os dados referentes aos meses de 2021 que não estão disponíveis online serão adicionados conforme ocorra a sua validação e poderão ser consultados de forma pública a partir de sua publicação, que pode ocorrer antes da elaboração de novo Relatório Trimestral.

3.2.1.3 Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre

Quadro 3.2.1.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Financeiro	ASE	3.2.1.1
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQQS	3.2.1.2

3.2.2 Ações transitórias

As ações transitórias previstas no escopo do PG 03 para a terra indígena Tupiniquim/Guarani têm por objetivo promover a articulação com órgãos reguladores a realização dos estudos de impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais.

Quadro 3.2.2 – Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre

AÇÕES TRANSITÓRIAS	
Ações	Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)
	Fundo de Apoio a Iniciativas Comunitárias (FAIC)
	Projeto Lótus

O detalhamento das ações transitórias será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

3.2.2.1 Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)

A consultoria independente para o detalhamento do PBAI voltado às Terras Indígenas Tupiniquim Caieiras Velhas II e Comboios, em Aracruz (ES) foi contratada na segunda quinzena de maio de 2021.

A consultoria em conjunto com a Fundação Renova realizou proposição de um cronograma de atividades considerando o Termo de Referência emitido pela FUNAI. O cronograma foi apresentado ao órgão indigenista e lideranças indígenas em reunião realizada em 24.06.2021 e protocolado em 30.06.2021.

Entre os dias 18.06 e 30.06.2021 foi realizada a apresentação da consultoria e se iniciou os diálogos entre a consultoria e as lideranças indígenas para a construção do Plano de Trabalho do PBAI (PT PBAI).

A Fundação protocolou o PT PBAI para a FUNAI e comunidades indígenas em 02.07.2021 por meio do ofício FR 2021.1037. O órgão indigenista realizou sua análise técnica e emitiu parecer por meio do ofício Nº 946/2021/DPDS/FUNAI. A análise técnica expedita acerca do referido Plano de Trabalho foi efetuada por meio da Informação Técnica nº 78/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. Foi solicitado pela FUNAI uma nova versão PT PBAI com os ajustes das lacunas e insuficiências apontadas, antes da realização das reuniões de apresentação e validação final.

A revisão do PT PBAI foi protocolada (ofício FR.2021.1220) à FUNAI e comunidades indígenas em 30.07.2021. A revisão apresentada foi realizada em atendimento à Informação Técnica nº 78/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI.

A FUNAI realizou sua análise técnica e emitiu parecer por meio do ofício Nº 1057/2021/DPDS/FUNAI. A análise efetuada considerou a Informação Técnica nº 91/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI e a Informação Técnica nº 78/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI. De acordo com órgão de referência, a versão revisada atendeu as solicitações. Contudo, foram requeridas correções/adaptações, as quais, no entanto, não comprometeram o conjunto do PT PBAI, mas que deveriam ser enviadas à FUNAI antes de apresentá-lo às comunidades indígenas para a consulta e validação.

A terceira versão do PT PBAI e o protocolo de segurança foi encaminhado pela Fundação (FR.2021.1390) em 31.08.2021. Em 08.09.2021 o órgão indigenista emitiu parecer sobre a terceira versão solicitando modificações pontuais no que tange ao protocolo de segurança e emitiu diretrizes da execução das atividades em campo pela empresa consultora.

Em setembro de 2024 em reunião realizada com a presença da Comissão de Caciques, FUNAI, empresa consultora e Fundação Renova ocorreu o processo de consulta e validação do PT PBAI.

3.2.2.2 Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC

O Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC, tem por objetivo, apoiar pequenos projetos comunitários são realizados pelos indígenas em seu território, ou que sejam de interesse das comunidades indígenas.

Os projetos apresentados pelas comunidades indígenas da TI Tupiniquim e Guarani, foram aprovados após a avaliação técnica/comercial ocorrida no mês de julho. Durante o mês de agosto as minutas do Termo de Investimento Social (termo de parceria) foram validados e posteriormente encaminhados para assinatura dos proponentes.

Os projetos propostos pelas comunidades indígenas das aldeias Amarelos, Areal, Boa Esperança, Caieiras Velhas, Irajá, Nova Esperança, Olhos d’água, Pau-brasil e Piraqueçu e Três Palmeiras, focaram nos temas: **Saúde, Proteção Social, Geração de renda, Cultura, Meio ambiente e Educação.**

Os 20 (vinte) projetos encaminhados pelas comunidades indígenas das TI’s Caieiras Velhas II e Tupiniquim e Guarani estão em conformidade com as temáticas definidas em edital.

Os temas dos projetos encaminhados são apresentados no **Quadro 3.2.2.2.**

Quadro 3.2.2.2 Projeto TI’s Caieiras Velhas II e Tupiniquim e Guarani.

Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática
	Amarelos	Enriquecimento de quintais	Agricultura
		Reforma de espaço coletivo (cabana)	Cultura
	Areal	Aquisição de equipamentos de costura e despoldadora de frutas	Geração de renda

Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática
Tupiniquim e Guarani		Aquisição de equipamentos para associação	Proteção Social
	Irajá	Aquisição de equipamentos para UBSI	Saúde
		Pintura e Aquisição de equipamentos para UBSI	Saúde
	Três Palmeiras	Enriquecimento de quintais e criação de aves	Agricultura
		Aquisição de equipamentos para associação	Proteção Social
	Boa Esperança	Reforma de espaço coletivo (cabana)	Cultura
		Equipamentos UBSI	Saúde
	Piraqueçu	Reforma Aldeia Temática	Cultura
		Reforma Aldeia Temática	Cultura
	Pau Brasil	Grafismo Escola e UBSI	Saúde e educação
Aquisição de equipamentos UBSI		Saúde	
Olho D'água	Reforma do Portal da aldeia	Proteção Territorial	
	Reforma de espaço coletivo (cabana)	Cultura	
Nova Esperança	Reforma da associação e Ponto de apoio à Saúde Indígena	Proteção Social/Saúde	
	Fortalecimento dos coletivos de agricultura, mulheres, jovens e audiovisual da aldeia	Cultura	
Caieiras Velhas	Reforma UBSI	Saúde	
	Aquisição de materiais para reforma UBSI	Saúde	

No mês de setembro foi realizada a reunião de Kick Off, reunião de partida predecessora a liberação dos recursos, onde foram apresentadas as informações referentes a prestação de contas e procedimentos para execução financeira em conformidade aos orçamentos apresentados.

No mes de outubro será disponibilizada a 1ª parcela dos recursos orçados em cada um dos projetos, sendo assim, os projetos serão iniciados conforme cronograma físico-financeiro aprovado.

A equipe técnica do PG 03 está acompanhando e irá prestar apoio aos proponentes, quando necessário.

3.2.2.3 Projeto Lótus

O Projeto Lótus tem por objetivo apoiar a formação de lideranças e o estabelecimento de uma Rede de Jovens atuantes na busca de soluções aos problemas identificados em suas comunidades ou regiões.

É um Projeto de Educação Socioambiental e Tecnológico que oferece aos jovens, a oportunidade de descobrir seu potencial de liderança por meio de ações que desenvolvam o pertencimento ambiental, o olhar jovem para a realidade de sua comunidade e a construção de projetos socioambientais. As oficinas formativas abordam diversos temas ambientais relacionando-os com os desafios encontrados para revitalização da bacia do Rio doce

Para o período deste relatório as ações foram desenvolvidas de maneira remota, na modalidade de Ensino à Distância – EAD. Atualmente estão matriculados no projeto 12 jovens indígenas das Tis de Aracruz, destes 01 é da TI Caieiras Velhas II.,

Tabela 3.2.2.3 – Ações do Projeto Lótus desenvolvidas no trimestre

Tema do Encontro Virtual	Data
Técnicas de Investigação Social	07/07
Técnicas de investigação social	17/07
Técnicas de Investigação Social	28/07
Elaboração de projetos	11/08
Oficina de projetos	17/07
Oficina de projetos	25/08
Oficina de projetos	01/09
“Aulão” de Robótica	11/09
Oficina de Projetos	22/09

As ações do Projeto Lótus são desenvolvidas no âmbito do PG 33 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em interface com o PG 03 - Programa de Povos Indígenas.

3.2.2.4 Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre

Quadro 3.2.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre

Área	Programas FR com interface - PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Saúde e Segurança/ADMCT	PBAI	3.1.2.2
Funcional da FR/Comunicação	Suprimentos	FAIC	3.2.2.3
Socioeconômico	PG-33	Projeto Lótus	3.2.2.4

3.2.3 Ações estruturantes

As ações previstas no eixo estruturante são voltadas a elaboração, execução e monitoramento dos planos de ações permanentes; que visam garantir o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades atendidas e em paralelo a todos as fases do processo de reparação.

Quadro 3.2.3 – Ações do eixo estruturante desenvolvidas no Trimestre

AÇÕES ESTRUTURANTES TI TUPINIQUIM/GUARANI	
Ações	Reparação integrada
	Elaboração de projeto de SAA
	Projeto Rede de Sementes e mudas do rio Doce

3.2.3.1 Reparação Integrada

Durante o trimestre de composição deste relatório foi realizado 01 (uma) reunião de diálogo com a Comissão de Caciques para tratativas do processo indenizatório.

Nos meses de julho e agosto a Fundação compartilhou versões da minuta do acordo de reparação integrada para análise das lideranças indígenas e FUNAI. As lideranças indígenas e FUNAI encaminharam a devolutiva com considerações.

O processo de reparação integrada da terra indígena Tupiniquim Guarani foi levado a apreciação da 12ª Vara de Belo Horizonte pela Comissão de Caciques.

3.2.3.2 Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

No dia 26 de agosto de 2021, a empresa responsável pela elaboração do projeto do Sistema de Abastecimento de Água, Poyry, realizou o levantamento de campo nas quatro aldeias (Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos d'Água). O levantamento de campo teve o objetivo de verificar a situação de abastecimento de água e das infraestruturas existentes para essa finalidade nas aldeias, bem como de identificar, considerando os aspectos técnicos e conhecimentos da comunidade, os pontos para a realização do serviço de geofísica, etapa preliminar à perfuração dos poços e que visa identificar o melhor local para perfuração (Anexo 3.2.3.2).

Figuras 3.2.3.2-1, 3.2.3.2-2, 3.2.3.2-3 e 3.2.3.2-4 – Realização da atividade de levantamento de campo e identificação de pontos para realização do serviço de geofísica nas aldeias de Amarelos, Olhos d'Água, Nova Esperança e Pau Brasil



Figura 3.1.3.2-1. Levantamento de campo na Aldeia Amarelos



Figura 3.1.3.2-2 Levantamento de campo na Aldeia Nova Esperança



Figura 3.1.3.2-3. Levantamento de campo na Aldeia Olhos d'Água



Figura 3.1.3.2-4. Levantamento de campo na Aldeia Pau Brasil

No dia 15/09/21, foi realizada uma reunião entre a Fundação Renova, o DSEI e as lideranças indígenas, com o intuito de apresentar os pontos demarcados em campo para realização do serviço de geofísica para os presentes e conversar sobre as próximas etapas para elaboração do SAA (**Anexo 3.2.3.2**). A previsão de realização do serviço de geofísica nas aldeias é a segunda quinzena de outubro.

3.2.3.3 Projeto Rede de Sementes e Mudas do Rio Doce

As ações do projeto Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce, sob responsabilidade dos programas PG26 e PG27, estão sendo redesenhadas para atender aos novos critérios de segurança e saúde devido a pandemia do Covid-19.

Buscando esclarecimentos sobre o status do projeto e acompanhamento das ações a serem desenvolvidas, a FUNAI solicitou o agendamento de uma reunião de esclarecimentos junto aos responsáveis pelo projeto. Em concordância, a Fundação Renova ressaltou a importância desse diálogo tendo em vista o necessário alinhamento sobre a interação com a comunidade, inserção de novos integrantes, contextualização e status das atividades desenvolvidas (por meio de interação remota e virtual), dentre outros pontos, tendo o PG03 atuado apenas como interlocutor do projeto e apoio na apresentação entre FUNAI e a Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce. Cabe destacar que, o projeto Rede de Sementes é uma das vias possíveis de projetos no Programa de Retomada Econômica, visando a reparação integrada. Dessa forma, foi realizada reunião com a FUNAI, com o objetivo de esclarecer o projeto de protagonismo dos PGS 26 e 27. A Fundação Renova aguarda a autorização da FUNAI para a retomada das ações presenciais junto aos grupos coletores.

Enquanto não há a sinalização da FUNAI para a retomada das atividades presenciais, são desenvolvidas atividades on-line para capacitação dos agentes multiplicadores, coletores e técnicos das casas de sementes. Entre os dias 23 e 30 de julho, foi realizada a primeira oficina envolvendo representantes de todos os grupos em mobilização pelo projeto. Esta capacitação teve o objetivo de trazer aos coletores conhecimentos iniciais nas temáticas de técnicas de manejo, coleta, controle de qualidade da produção.

3.2.3.4 Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre

Quadro 3.2.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Socioeconômico	PG-02/ Jurídico	Reparação Integrada	3.2.3.1
Socioambiental	PG-26; PG-27	Projeto Rede de Sementes	3.2.3.3
Funcional da FR	Engenharia	Elaboração de projeto	3.2.3.2

3.2.5 Agenda

3.2.5.1 Agenda de ações realizadas no trimestre

Quadro 3.2.5.1 – Agenda de ações realizadas no trimestre

Reunião	Data	Programas/ áreas vinculadas	Objetivo da reunião	Evidência	Objetivo alcançado
Reparação Integrada– TG	13/07	PG 03/PG 02	Esclarecimentos sobre a proposta de reparação integrada da Fundação Renova	Gravação	Sim
Capacitação Rede de Sementes	23 e 30/07	PG03/PG26	Trazer aos coletores conhecimentos iniciais nas temáticas de técnicas de manejo, coleta, controle de qualidade da produção	-	Sim
39ª Reunião CTI-IPCT	23/08	PG 03	Acompanhar ações realizadas no território	-	Sim
Reunião de Kick Off – FAIC	08/09	PG 03/ADMCT/Proponentes Faci	Nivelar as informações sobre o início da execução dos projetos FAIC e as etapas de prestação de contas.	ATA	Sim

3.3 TI KRENAK – CONTEXTUALIZAÇÃO

A Terra Indígena Krenak foi homologada por meio do Decreto S/N 19/04/2001. Fica localizada no município de Resplendor (MG) e possui uma área total de 4.000 (ha) demarcados. Encontra-se regularizada, tendo sido registrada no Serviço Patrimônio da União (SPU). A organização sociopolítica se estrutura em 8 (oito) grupos: **Atorãñ, Bakan, Borum Ererré, Krenak, Nak Nenuk, Nakrerré, Takruk e Uatú.**

3.3.1 Ações emergenciais

As atividades realizadas no eixo emergencial são voltadas as ações de mitigação às vulnerabilidades e riscos associados para povos indígenas no âmbito do TTAC, conforme o **Quadro 3.3.1.**

Quadro 3.3.1 – Ações do eixo emergencial desenvolvidas no trimestre

AÇÕES EMERGENCIAIS TERRITÓRIO	
Ações	3.3.1.1 Auxílio financeiro extra emergencial de Subsistência
	3.3.1.2 Fornecimento de água mineral
	3.3.1.3 Fornecimento de água bruta e potável
	3.3.1.4 Processo concorrencial participativo dos caminhões-pipas
	3.3.1.5 Fornecimento de suplementação bovina
	3.3.1.6 Manutenção das vias de acesso
	3.3.1.7 Obras de melhoria nos acessos (08 pontos críticos)
	3.3.1.8 Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)

O detalhamento das ações emergenciais será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

3.3.1.1 Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência

O pagamento de **auxílio financeiro extra emergencial de subsistência** é efetivado às famílias indígenas do território Krenak como parte do Acordo realizado entre lideranças das comunidades e Vale S.A em novembro de 2015, o qual foi posteriormente incorporado ao Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (“TTAC”). Os valores firmados no Acordo são pagos às associações indígenas, que têm a responsabilidade de efetuar o repasse às famílias atendidas.

O auxílio financeiro extra emergencial de subsistência é direcionado às 8 (oito) associações indígenas Krenak, cabendo a cada uma delas repassar às famílias do seu grupo. Conforme previsto no acordo Vale-Krenak, cada família recebe mensalmente o equivalente a 9 (nove) vezes o valor do salário-mínimo vigente. Em sua totalidade, o pagamento do auxílio financeiro extra emergencial de subsistência é direcionado à 137 (cento e trinta e sete) famílias.

Na **tabela 3.3.1.1** abaixo é demonstrado o levantamento quantitativo das famílias atendidas e o valor mensal recebido pelas associações para repasse. Devido à não alteração dos valores do salário-mínimo no Brasil (2021), a tabela representa os pagamentos efetivados em julho, agosto e setembro de 2021

Tabela 3.3.1.1 Pagamento financeiro às associações indígenas Krenak

Associação	Número de famílias	Salário-Mínimo base	Número de salários-mínimos	Valor total (mensal)	Valor total pago no trimestre (jul, ago, set)
ATORÃN	31	R\$ 1.100,00	9	R\$ 306.900,00	R\$ 920.700,00
BAKAN	10	R\$ 1.100,00	9	R\$ 99.000,00	R\$ 297.000,00
BURUM ERERRE	17	R\$ 1.100,00	9	R\$ 168.300,00	R\$ 504.900,00
KRENAK	18	R\$ 1.100,00	9	R\$ 178.200,00	R\$ 534.600,00
NAKNENUK	12	R\$ 1.100,00	9	R\$ 118.800,00	R\$ 356.400,00
NAKERRE	11	R\$ 1.100,00	9	R\$ 108.900,00	R\$ 326.700,00
TAKRUK	11	R\$ 1.100,00	9	R\$ 108.900,00	R\$ 326.700,00
UATU	27	R\$ 1.100,00	9	R\$ 267.300,00	R\$ 801.900,00
Total	137			R\$ 1.356.300,00	R\$ 4.068.900,00


3.3.1.2 Fornecimento de água mineral

O fornecimento de água mineral para o povo Krenak se insere na Cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC). A Fundação Renova disponibiliza 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa por dia. O volume de água mineral distribuído considera o total de 600 (seiscentas) pessoas, conforme o Acordo Vale-Krenak.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, foi adotada a entrega de água mineral a cada 4 (quatro) dias, sem comprometer o volume total previsto de entrega a cada beneficiário. Todo o quantitativo previsto foi executado. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no **Anexo 3.3.1.2**.

A quantidade em litros (L) de água mineral fornecida no trimestre de abril, maio e junho aos beneficiários da TI Krenak, está representado no **Gráfico 3.3.1.2**.

Gráfico 3.3.1.2 - Indicador de progresso para o fornecimento de água mineral na T.I. Krenak – Julho, Agosto e Setembro.

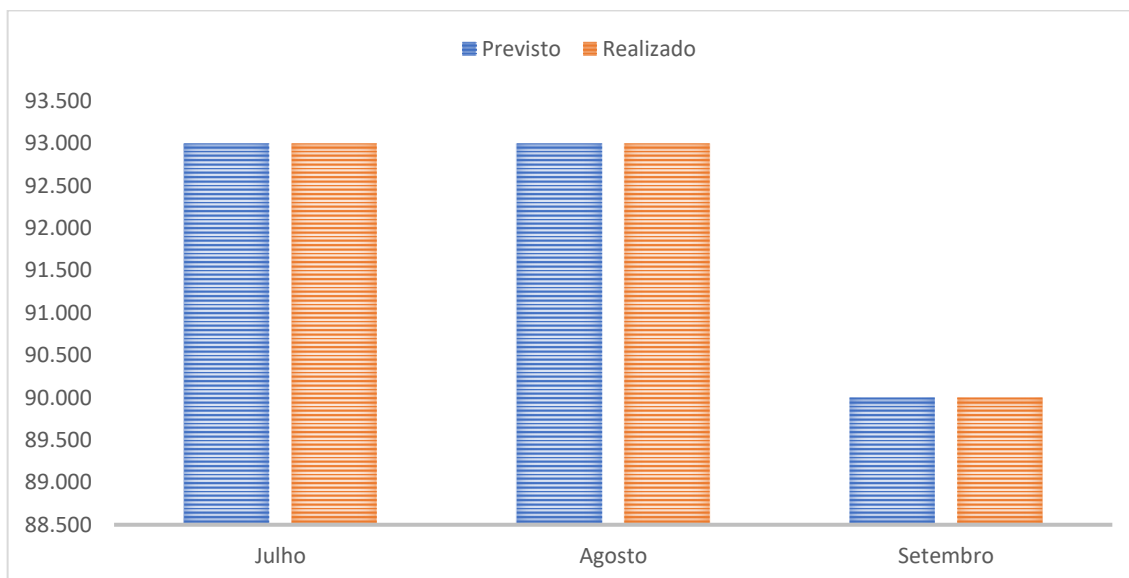

A localização dos pontos de entrega de água na TI Krenak são apresentados no **Mapa 3.3.1.2**.

3.3.1.3 Fornecimento de água bruta e potável

A distribuição de água bruta e potável é realizada na TI Krenak pela empresa Linear por meio de caminhões-pipa. O quantitativo de água potável e bruta é de 1.000 (um mil) litros (cada) ao dia, distribuídos em 142 (cento e quarenta e dois) pontos de abastecimento (potável) e em 103 (cento e três) pontos de abastecimento (bruta). O abastecimento de água ao povo Krenak, vale lembrar, está inserido na Cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Em maio/2020 houve uma alteração na etapa de comprovação da entrega de água, que passaria a ser registrada por uma

Devido à resistência da comunidade indígena quanto ao registro fotográfico do hidrômetro eletrônico (instalado no caminhão pipa) e do local de abastecimento, o que supriria a necessidade de assinatura de recibos e evitaria o contato próximo entre entregador e beneficiário, houve em maio/2020 uma alteração no formato de comprovação de abastecimento, passando a ser realizado por meio de registro fotográfico do hidrômetro antes e após a entrega de água bruta e potável na terra indígena, não sendo possível determinar com exatidão o quantitativo individual de volume de água entregue.

É importante frisar que o abastecimento de água potável é realizado sob demanda, conforme volume disponível na caixa d'água quando da reposição diária, podendo influenciar em alterações no fornecimento mensal (m³) e diferença entre o previsto e o realizado. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no **Anexo 3.3.1.3**.

Tabela 3.3.1.3: Média do fornecimento de água bruta e potável na T.I. Krenak.

Tipo/Mês	Julho	Agosto	Setembro
Potável (m ³)	3.910	4.176	4.479
Bruta (m ³)	1.878	2.136	2.060

3.3.1.4 Processo concorrencial participativo dos caminhões-pipas

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração.

3.3.1.5 Fornecimento de suplementação bovina

O fornecimento de suplementação bovina também está previsto no TTAC, Cláusula 43, conforme a seguir descrito: a) fornecimento mensal de 21 sacos de ração por família (total de 108 famílias); b) fornecimento mensal de alimentação volumosa, de 2,4 toneladas por família (total de 100 famílias); e c) fornecimento mensal de 3 (três) sacos de sal mineral por família (total de 100 famílias).

As ações de bovinocultura foram executadas em sua totalidade, conforme previsto para o período deste relatório, e continuam sendo realizadas. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no **Anexo 3.3.1.5**.

Tabela 3.3.1.5 - Suplementação bovina por mês e indicadores de progresso.

Produto	Nº de famílias	Quantidade	Julho	Agosto	Setembro
Ração	108	21 sacos*	2.268	2.268	2.268
Sal mineral	100	3 sacos**	300	300	300
Silagem de milho	100	2,4 toneladas	240	240	240

*Cada saco contém 40 quilos; **Cada saco contém 25 quilos.

3.3.1.6 Manutenção das vias de acesso

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração.

3.3.1.7 Obras estruturantes de melhoria nos acessos

A ação permanece paralisada devido o contexto da pandemia pelo Covid-19.

3.3.1.8 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referente do monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço é <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>, no qual estão disponíveis o boletim trimestral de lagoas, zona costeira e estuários referente a outubro, novembro e dezembro de 2020 e o boletim mensal de rios até janeiro 2021. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma online interativa.

Conforme apresentado em relatório anterior, o ponto de monitoramento em Resplendor (MG) próximo a essa Terra Indígena é o Ponto RDO 10, localizado na margem direita do rio Doce, em Resplendor (Coordenadas UTM: 263318,88 leste/ 7861251,39 norte/zona 24 k). Como os dados relativos aos demais meses de 2021 ainda se encontram em aprovação, para este trimestre não será possível a apresentação dos mesmos. Ressalta-se que os dados referentes aos meses de 2021 que não estão disponíveis online serão adicionados conforme ocorra a sua validação e poderão ser consultados de forma pública a partir de sua publicação, que pode ocorrer antes da elaboração de novo Relatório Trimestral.

3.3.1.9 Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre

Quadro 3.3.1.9 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
PG03	PG02 – Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)	Pagamento de Auxílio extra emergencial	3.3.1.1
Funcional FR	Infraestrutura	Fornecimento de água mineral, bruta e potável	3.3.1.2 e 3.3.1.3
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Ambiental	PMQQS	3.3.1.7

3.3.2 Ações transitórias

As ações transitórias previstas no escopo do PG 03 para a terra indígena Krenak tem por objetivo promover a articulação com órgãos reguladores a realização dos estudos de impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais.

As etapas do Estudo de Impacto do Componente Indígena (ECI) estão paralisadas desde maio de 2017. O plano de trabalho (PT) do ECI elaborado pela empresa Polifônicas foi protocolado na Funai e aprovado pelo órgão indigenista em fevereiro de 2017, Ofício nº 5/2017/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI.

O Povo Krenak, a princípio, sugerira a data da apresentação do PT-ECI para segunda quinzena de maio de 2017 (Ofício nº 7/2017/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI). No entanto, esse encontro não se consolidou por manifestação do Povo Krenak e, desde então, não houve avanço nas tratativas referentes ao ECI.

3.3.3 Ações estruturantes

As ações previstas no eixo estruturante são voltadas a elaboração, execução e monitoramento dos planos de ações permanentes; que visam garantir o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades atendidas e em paralelo a todos as fases do processo de reparação.

3.3.3.1 Recuperação de nascentes e áreas degradadas

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração, porque foram paralisadas, devido às medidas de prevenção adotadas contra a Covid-19 – tendo em vista que estas ações não são consideradas essenciais.

3.3.3.2 Elaboração de projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração.

3.3.3.3 Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre

Quadro 3.3.3.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
-	-	-	-

3.3.4 Relacionamento

3.3.4.1 Contratação de Assessoria Técnica (AT) para a Terra Indígena Krenak

Conforme disposto pelo Termo de Ajustamento Preliminar (“TAP”), assinado em 18 de janeiro de 2017, e pelo Termo Aditivo ao TAP, assinado em 16 de novembro de 2017, os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão poderão, se assim desejarem, contar com o apoio de assessorias técnicas independentes para orientá-los e acompanhar os processos de reparação de seus direitos. A Assessoria Técnica Independente (ATI) tem por objetivo geral garantir aos atingidos a sua participação ativa no processo de Reparação Integral, considerando as especificidades de seu território e de sua população, conforme a legislação vigente.

Nesse sentido, o povo indígena Krenak, que é atendido pelo Programa Qualidade de Vida de Povos Indígenas – PG 03, manifestou desejo em contar com o apoio de uma assessoria

técnica independente, indicando para esse papel o Instituto de Pesquisas e Ações Sustentáveis (iPAZ). A solicitação de contratação do iPAZ foi definida em reunião realizada na terra indígena Indígena Krenak em 15 de julho de 2019, com a participação de 73 (setenta e três) indígenas, além de representantes do Ministério Público Federal, do Fundo Brasil de Direitos Humanos e da Funai. Durante essa reunião, as entidades credenciadas, Centro Agroecológico Tamanduá (CAT), Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA) e Instituto de Pesquisas e Ações Sustentáveis (iPAZ), apresentaram propostas preliminares de trabalho de Assessoria Técnica Independente na TI Krenak; e após as apresentações, os indígenas escolheram a entidade iPAZ.

O Plano de Trabalho do iPAZ foi submetido ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, que autorizou a negociação direta com as empresas (Vale, BHP e Samarco) e Fundação Renova para viabilizar a sua contratação, o que ocorreu em 1º de julho de 2020. Posteriormente, o perito judicial nomeado pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte constatou algumas irregularidades no iPAZ, que inviabilizariam a sua contratação. Diante dessa informação, o juízo da 12ª Vara Federal suspendeu a contratação do iPAZ, e desde então não há assessoria técnica independente específica para o território Krenak.

3.3.5 Agendas

Não houve nenhuma agenda realizada nesse trimestre.

4. AÇÕES PLANEJADAS

4.1 TI COMBOIOS

4.1.1 Ações emergenciais

4.1.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)

Continuidade do processo de prestação de contas por meio do envio de recibos coletivos e individuais, considerando as dificuldades enfrentadas no contexto da pandemia e as regras de isolamento social.

4.1.1.2 Distribuição de água mineral

O fornecimento de água mineral na Aldeia Comboios e na Aldeia Córrego do Ouro continuará ocorrendo no próximo trimestre.

4.1.1.3 Plano de contingência de cheias

Consulta e validação do Plano de contingência de Cheias pelas lideranças indígenas de Comboios.

4.1.1.4 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

Até o momento, mesmo diante do cenário de Covid-19, as ações relativas ao monitoramento do PMQQS foram retomadas em julho/20 e assim, existe a previsão de continuidade do monitoramento para o próximo trimestre. Ainda, há previsão de consolidação e disponibilização das análises dos meses mais recentes no site <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>.

4.1.1.5 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

A ação de monitoramento vem sendo realizada (conforme a retomada parcial) e a previsão para o próximo trimestre é de manutenção da frequência de coleta e parâmetros analisados.

4.1.1.6 Interfaces para as ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre

Quadro 4.1.1.6 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Financeiro	Pagamento de ASE	4.1.1.1
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	Plano de Contingência de cheias	4.1.1.3
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQQS	4.1.1.4
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQACH	4.1.1.5

4.1.2 Ações transitórias

4.1.2.1 Projeto Lótus

Segue prevista a continuidade de realização das próximas etapas do projeto Lótus para a TI Comboios por meio da plataforma EAD.

4.1.2.2 Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias

Implementação das ações do Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias e gestão das atividades para o próximo trimestre. Acompanhamento técnico e apoio na estruturação das prestações de contas dos Projetos FAIC.

4.1.2.3 Detalhamento do PBAI

Para o próximo trimestre estão previstas a execução das oficinas participativas com as comunidades indígenas para o detalhamento dos programas do Plano Básico Ambiental.

4.1.2.4 Interfaces das ações transitórias planejadas para o próximo trimestre

Quadro 4.1.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Educação	PG 033 Educação	Projeto lotus	4.1.2.1
Funcional FR	Suprimentos/ADMCT/Jurídico	FAIC	4.1.2.2

4.1.3 Ações estruturantes

4.1.3.1 Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

Para o próximo trimestre, para a aldeia Córrego do Ouro está prevista a realização do serviço de perfuração de poço.

4.1.3.2 Projeto Rede de Sementes e mudas do rio Doce

Os programas 26 e 27 da FR deverão alinhar um cronograma de ação em conjunto a Funai para definição sobre a continuidade do projeto.

4.1.3.3 Reparação Integrada

Previsão de assinatura do acordo de Indenização e continuidade das coletas de documento *in loco* para atendimento do acordo.

4.1.3.3 Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre

Quadro 4.1.3.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional FR	Engenharia	Elaboração de projeto de SAA	4.1.3.1
Socioambiental	PG-26; PG-27	Projeto Rede de Sementes	4.1.3.2
-	Jurídico/Políticas de Indenização	Reparação Integrada	4.1.3.3

4.1.4 Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho de todo o escopo de atuação do PG03.

Nesse sentido, o relacionamento efetuado pelo Programa de Povos Indígenas segue as premissas da OIT 169, legislação vigentes e consulta as lideranças indígenas. Todas as ações a serem executadas em território são previamente solicitadas e se autorizadas pelas lideranças indígenas são executadas.

4.1.5. Agenda

Quadro 4.1.5.1 – Agendas prevista para trimestral

Reunião	Data	Programas vinculados	Objetivo da reunião
Reparação Integrada	08/10/2021	Jurídico e Relacionamento Institucional	Assinatura do acordo de reparação integrada
Reparação Integrada	13/10 a 20/10	Área Funcional da FR - Financeiro	Assinatura do termo de quitação individual das famílias
Validação do Plano de Cheias	a definir-segunda quinzena de outubro	PG032	Validação do Plano de Cheias

SAA	Segunda quinzena de outubro e novembro		Demarcação de perfuração de poço da aldeia de Córrego do Ouro; Sondagem nas aldeias de Comboios e Córrego do Ouro Perfuração de poço Córrego do Ouro
PBAI	Outubro, novembro e dezembro	Sem interfaces	- Oficinas para detalhamento dos programas do PBAI; - Protocolo do PBAI para FUNAI indígenas

4.2 TI TUPINIQUIM/GUARANI

4.2.1 Ações emergenciais

4.2.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)

Continuidade do processo de prestação de contas por meio do envio de recibos coletivos e individuais, considerando as dificuldades enfrentadas no contexto da pandemia e as regras de isolamento social.

4.2.1.2 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

Até o momento, mesmo diante do cenário de Covid-19, as ações relativas ao monitoramento do PMQQS foram retomadas em julho/20 e até o momento existe a previsão de continuidade do monitoramento para o próximo trimestre. Ainda, há previsão de consolidação e disponibilização das análises dos meses mais recentes no site <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>.

4.2.1.3 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

A ação de monitoramento vem sendo realizada (conforme a retomada parcial) e a previsão para o próximo trimestre é de manutenção da frequência de coleta e parâmetros analisados.

4.2.1.4 Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo Trimestre

Quadro 4.2.1.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Funcional da FR	Financeiro	Pagamento de ASE
Socioambiental	PG 38 - PMQQS	4.2.1.2

4.2.2 Ações transitórias

4.2.2.1 Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias na TI Tupiniquim/Guarani

Implementação das ações do Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias e gestão das atividades para o próximo trimestre. Acompanhamento técnico e apoio na estruturação das prestações de contas dos Projetos FAIC.

4.2.2.2 Detalhamento do PBAI

Para o próximo trimestre estão previstas a execução das oficinas participativas com as comunidades indígenas para o detalhamento dos programas do Plano Básico Ambiental.

4.2.2.3 Projeto Lótus

Segue previsto a continuidade de realização das próximas etapas do projeto Lótus para a TI Comboios por meio da plataforma EAD.

4.2.2.4 Interfaces das ações transitórias planejadas para o próximo trimestre

Quadro 4.2.2.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Educação	PG 33	Projeto Lótus

4.2.3 Ações estruturantes

4.2.3.1 Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

Para o próximo trimestre, está previsto o início da realização do serviço técnico de estudos de geofísica nas 04 aldeias supracitadas.

4.2.3.2 Projeto Rede de Sementes e Mudas do rio Doce

Os programas 26 e 27 da FR deverão alinhar um cronograma de ação em conjunto a Funai para definição sobre a continuidade do projeto.

4.1.3.3 Reparação Integrada

Previsão de assinatura do acordo de Indenização e continuidade das coletas de documento *in loco* para atendimento do acordo.

4.2.3.3 Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre

Quadro 4.2.3.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Funcional FR	Engenharia – Projeto de SAA	4.2.3.1

4.2.4 Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho de todo o escopo de atuação do PG03.

Nesse sentido, o relacionamento efetuado pelo Programa de Povos Indígenas segue as

premissas da OIT 169, legislação vigentes e consulta as lideranças indígenas. Todas as ações a serem executadas em território são previamente solicitadas e se autorizadas pelas lideranças indígenas são executadas.

4.3 TI KRENAK

4.3.1 Ações emergenciais

4.3.1.1 Auxílio Financeiro Extra Emergencial de Subsistência

O **auxílio financeiro extra emergencial de subsistência** será mantido conforme o acordo vigente para 137 famílias para o próximo trimestre.

4.3.1.2 Fornecimento de água mineral

Segue prevista a continuidade, para o próximo trimestre, do fornecimento de água mineral para o povo Krenak, de 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa/por dia, para 600 (seiscentas) pessoas.

4.3.1.3 Fornecimento de água bruta e potável

A distribuição de água bruta e potável será mantida na TI Krenak no próximo trimestre.

4.3.1.4 Processo concorrencial participativo para contratação dos caminhões-pipas

Durante período de composição deste relatório, não houve manifestações ou retorno das lideranças indígenas quanto ao processo concorrencial participativo. Aguardando o posicionamento da comunidade Krenak.

4.3.1.5 Fornecimento de suplementação bovina

O fornecimento de suplementação bovina alimentar segue mantido para o próximo trimestre.

4.3.1.6 Manutenção das vias de acesso

A manutenção das vias de acesso à Terra Indígena Krenak será mantida para o próximo trimestre, tendo em vista a viabilização do tráfego regular dos caminhões-pipa.

4.3.1.7 Obras estruturantes de melhoria nos acessos

A ação permanece paralisada devido o contexto da pandemia pelo Covid-19.

4.3.1.8 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

As ações relativas ao monitoramento do PMQQS permanecem para o próximo trimestre. Ainda, há previsão de consolidação e disponibilização das análises dos meses mais recentes no site <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>.

4.3.1.9 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)

A ação de monitoramento da qualidade da água para consumo humano segue mantida para o próximo trimestre (conforme a retomada parcial), através da manutenção da frequência de coleta e parâmetros analisados.

4.3.1.10 Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre

Quadro 4.3.1.10 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Socioambiental	PG 38 – PMQQS	4.3.1.8
Socioambiental	PG 38 – PMQACH	4.3.1.9

4.3.2 Ações transitórias

As etapas do Estudo de Impacto do Componente Indígena (ECI) estão paralisadas desde maio de 2017.

4.3.3 Ações estruturantes

4.3.3.1 Recuperação de nascentes e áreas degradadas

Para os próximos meses, a paralisação da recuperação está mantida, até que haja um posicionamento oficial da Funai para a retomada das ações que não são consideradas essenciais.

4.3.4 Relacionamento

4.3.4.1 Contratação de Assessoria Técnica Independente (ATI) para a Terra Indígena Krenak

Aguardando decisão do juízo.

4.3.5 Agenda

Para o próximo trimestre está programada a retomada das ações da rede de recuperação de nascentes, com interface do PG027, sendo observado protocolo de segurança de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

5. AVANÇO FÍSICO DO PG 03

As ações desenvolvidas no âmbito do PG 03 para o trimestre **julho a setembro de 2021** contribuíram para o avanço do cronograma planejado. Com o avanço da vacinação em todo o país, a Fundação Renova começou, de forma gradativa, a retomada de algumas atividades em campo, condicionadas a liberação interna da sala de situação. Para a realização das atividades presenciais, todo um protocolo de segurança é observado de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

Contudo, na maioria das ações realizadas neste trimestre, foram sustentadas a reestruturação e adequação das ações devido às limitações causadas pela pandemia de Covid-19, tendo as agendas junto às comunidades indígenas ocorrido em caráter remoto. Dentre estas, destacam-se: acompanhamento do processo de reparação integrada, inclusão de famílias para recebimento do Auxílio Subsistência Emergencial – ASE, conforme critérios de elegibilidade previstos no TAC 2020/2021, acompanhamento dos acordos emergenciais, prorrogação do edital de chamamento para o Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC), submissão das propostas e projetos socioambientais do FAIC no edital e finalização do processo de contratação da consultoria especializada para realizar do detalhamento do PBAI Tupiniquim e Guarani.


Dentre as cláusulas e deliberações acerca das ações atribuídas ao PG03, em resumo, 31% das ações foram “concluídas no prazo” e 41%, até setembro de 2021, apresentam o status de “a vencer – em andamento” e 23% “a vencer – não iniciada”,

Quanto a Terra Indígena Krenak, em itens e deliberações específicas para essa comunidade, 50% das ações foram “concluídas no prazo” e 50% “concluídas após o prazo”, o que se justifica pelo contexto por Covid-19, que influencia o cumprimento parcial ou integral de algumas entregas ou ações do PG03.

Das cláusulas e deliberações sobre as Terras Indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani, 53% das ações foram “concluídas no prazo”, 20% “concluídas após o prazo”, 7% estão “aguardando informações”, 7% “encerrado por não ter resposta”, 7% “em descumprimento” e 7% “a vencer – em andamento”.

Os índices e resultados são a seguir apresentadas por meio do gráfico em curva S, com avanço real x avanço previsto das ações realizadas no presente trimestre.

Gráfico 5. Avanço real x avanço previsto% das ações realizadas

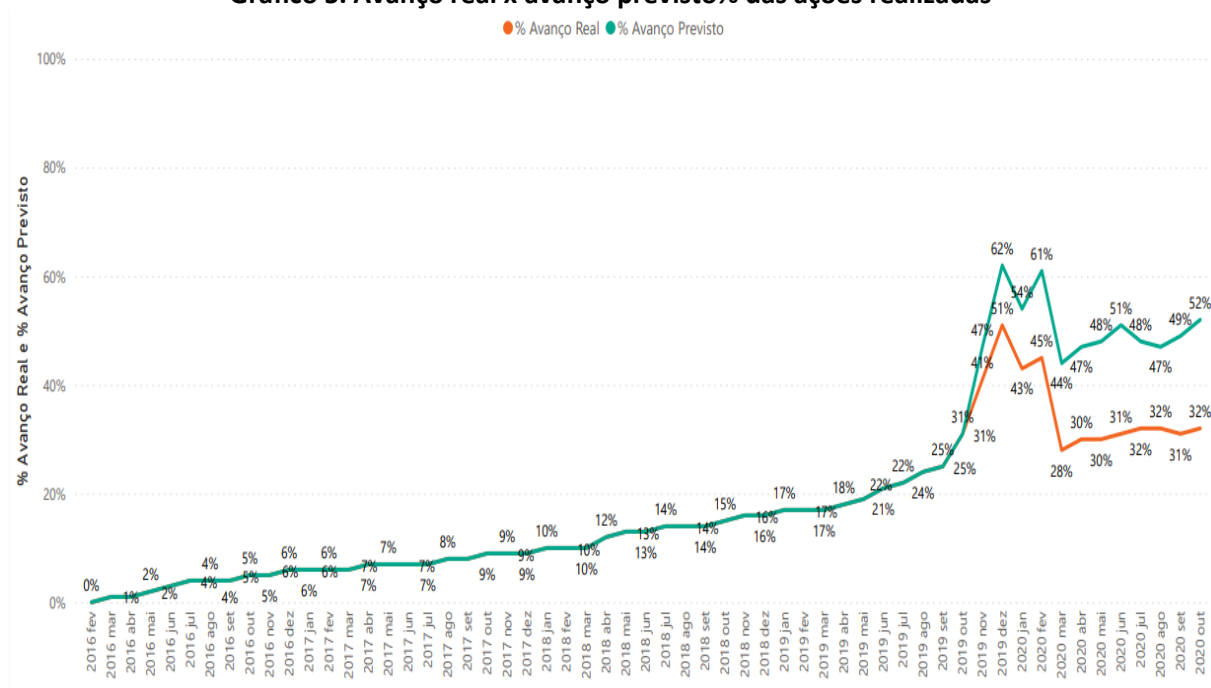

Para além das ações desenvolvidas, foram também implementados, por meio do plano de ação para engajamento com os indígenas, novos fluxos de comunicação, em contexto de pandemia, o qual vem apresentando resultados positivos junto à comunidade indígena Krenak.

No contexto de retomada, foi necessária a atuação conjunta do PG03 com outros Programas de interface da Fundação Renova, dentre as áreas socioeconômica, socioambiental, infraestrutura e funcional, os quais atuam de forma articulada nas ações desenvolvidas, buscando assegurar o alcance dos resultados no desenvolvimento dos eixos emergencial, transitório e estruturante.
