



## RELATÓRIO TRIMESTRAL

PG 03 – Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Outubro / Novembro / Dezembro - 2021



# SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>2. STATUS DO PROGRAMA – PG 03</b>	<b>6</b>
2.1 CRONOGRAMA 2021	7
2.2 EQUIPE TÉCNICA DO PG 03	12
2.3 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA	15
2.4 ANÁLISES DE DESVIOS E CONTRAMEDIDAS	16
2.5 INTERFACES	17
2.6 ORÇAMENTO DO PG 03	18
2.7 GRUPOS DE TRABALHO (GT) COM A CT IPCT	23
2.8 GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES	23
2.8.1 PRINCIPAIS CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES	23
2.8.1.1 Itens a vencer em andamento	25
2.8.1.2 Itens a vencer não iniciados	26
2.8.1.3 Itens concluídos no prazo	27
2.8.2 Terra Indígena Krenak	28
2.8.2.2 Itens concluídos no prazo	29
2.8.2.3 Itens concluídos após o prazo	30
2.8.3 TERRAS INDÍGENAS COMBOIOS E TUPINIQUIM GUARANI	31
2.8.3.1 Principais Conceitos e Considerações:	31
2.8.3.2 Itens a vencer e em andamento	32
2.8.3.3 Aguardando informações	33
2.8.3.4 Itens concluídos no prazo	33
2.8.3.5 Itens concluídos após o prazo	35
2.8.3.6 Itens em descumprimento	36
2.8.3.7 Itens encerrado sem resposta	36
<b>3. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE – OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>37</b>
3.1 TERRA INDÍGENA COMBOIOS – CONTEXTUALIZAÇÃO	37
3.1.1 AÇÕES EMERGENCIAIS	37
3.1.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)	37
3.1.1.2 Fornecimento de água mineral	39
3.1.1.3 Plano de contingência de cheias	41
3.1.1.4 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)	41

3.1.1.5	<i>Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre</i>	42
3.1.2	AÇÕES TRANSITÓRIAS	42
3.1.2.1	<i>Reparação Integrada- Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)</i>	43
3.1.2.2	<i>Fundo de Apoio as iniciativas Comunitárias (FAIC)</i>	46
3.1.2.3	<i>Projeto Lótus</i>	50
3.1.2.4	<i>Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre</i>	51
3.1.3	AÇÕES ESTRUTURANTES	51
3.1.3.1	<i>Reparação Integrada - Indenização</i>	52
3.1.3.2	<i>Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i>	52
3.1.3.3	<i>Projeto Rede de Sementes e Mudas do Rio Doce</i>	53
3.1.3.4	<i>Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre</i>	53
3.1.5	AGENDAS	54
3.1.5.1	<i>Agenda realizada no trimestre</i>	54
3.2	TI TUPINIQUIM/GUARANI – CONTEXTUALIZAÇÃO	54
3.2.1.1	<i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i>	55
3.2.1.2	<i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	58
3.2.1.3	<i>Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre</i>	59
3.2.2	AÇÕES TRANSITÓRIAS	59
3.2.2.1	<i>Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)</i>	60
3.2.2.2	<i>Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC</i>	63
3.2.2.3	<i>Projeto Lótus</i>	58
3.2.2.4	<i>Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre</i>	60
3.2.3	AÇÕES ESTRUTURANTES	60
3.2.3.1	<i>Reparação Integrada</i>	60
3.2.3.2	<i>Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i>	61
3.2.3.3	<i>Projeto Rede de Sementes e Mudas do Rio Doce</i>	62
3.2.3.4	<i>Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre</i>	62
3.2.5	AGENDA	68
3.2.5.1	<i>Agenda de ações realizadas no trimestre</i>	68
3.3	TI KRENAK – CONTEXTUALIZAÇÃO	70
3.3.1	AÇÕES EMERGENCIAIS	70
3.3.1.1	<i>Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência</i>	71
3.3.1.2	<i>Fornecimento de água mineral</i>	72
3.3.1.3	<i>Fornecimento de água bruta e potável</i>	74
3.3.1.4	<i>Processo concorrencial participativo dos caminhões-pipas</i>	74
3.3.1.6	<i>Manutenção das vias de acesso</i>	77
3.3.1.7	<i>Obras estruturantes de melhoria nos acessos</i>	77
3.3.1.8	<i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i>	77

3.3.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS .....	78
3.3.3 AÇÕES ESTRUTURANTES.....	78
3.3.3.1 <i>Recuperação de nascentes e áreas degradadas</i> .....	79
3.3.3.2 <i>Elaboração de projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água</i> .....	79
3.3.3.3 <i>Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre</i> .....	79
3.3.4 RELACIONAMENTO .....	79
3.3.4.1 <i>Contratação de Assessoria Técnica (AT) para a Terra Indígena Krenak</i> .....	79
4. AÇÕES PLANEJADAS .....	81
4.1 TI COMBOIOS.....	81
4.1.1 AÇÕES EMERGENCIAIS .....	81
4.1.1.1 <i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i> .....	81
4.1.1.2 <i>Distribuição de água mineral</i> .....	81
4.1.1.3 <i>Plano de contingência de cheias</i> .....	81
4.1.1.4 <i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i> .....	81
4.1.1.6 <i>Interfaces para as ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre</i> .....	81
4.1.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS .....	82
4.1.2.1 <i>Projeto Lótus</i> .....	82
4.1.2.2 <i>Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias</i> .....	82
4.1.2.3 <i>Detalhamento do PBAI</i> .....	82
4.1.2.4 <i>Interfaces das ações transitórias planejadas para o próximo trimestre</i> .....	83
4.1.3 AÇÕES ESTRUTURANTES.....	83
4.1.3.1 <i>Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i> .....	83
4.1.3.3 <i>Reparação Integrada</i> .....	83
4.1.3.3 <i>Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre</i> .....	84
4.1.4 RELACIONAMENTO .....	84
4.2 TI TUPINIQUIM/GUARANI .....	85
4.2.1 AÇÕES EMERGENCIAIS .....	85
4.2.1.1 <i>Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)</i> .....	85
4.2.1.2 <i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i> .....	85
4.2.1.4 <i>Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo Trimestre</i> .....	85
4.2.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS .....	85
4.2.2.1 <i>Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias na TI Tupiniquim/Guarani</i> .....	85
4.2.2.2 <i>Detalhamento do PBAI</i> .....	86
4.2.2.3 <i>Projeto Lótus</i> .....	86
4.2.3 AÇÕES ESTRUTURANTES.....	86
4.2.3.1 <i>Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)</i> .....	86
4.1.3.3 <i>Reparação Integrada</i> .....	86
4.2.3.3 <i>Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre</i> .....	87

4.2.4 RELACIONAMENTO .....	87
4.3 TI KRENAK .....	88
4.3.1 AÇÕES EMERGENCIAIS .....	88
4.3.1.1 <i>Auxílio Financeiro Extra Emergencial de Subsistência</i> .....	88
4.3.1.2 <i>Fornecimento de água mineral</i> .....	88
4.3.1.3 <i>Fornecimento de água bruta e potável</i> .....	88
4.3.1.4 <i>Processo concorrencial participativo para contratação dos caminhões-pipas</i> .....	88
4.3.1.5 <i>Fornecimento de suplementação bovina</i> .....	89
4.3.1.6 <i>Manutenção das vias de acesso</i> .....	89
4.3.1.7 <i>Obras estruturantes de melhoria nos acessos</i> .....	89
4.3.1.8 <i>Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)</i> .....	89
4.3.1.9 <i>Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)</i> .....	89
4.3.1.10 <i>Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre</i> .....	89
4.3.2 AÇÕES TRANSITÓRIAS .....	90
4.3.3.1 <i>Recuperação de nascentes e áreas degradadas</i> .....	90
4.3.4 RELACIONAMENTO .....	90
4.3.4.1 <i>Contratação de Assessoria Técnica Independente (ATI) para a Terra Indígena Krenak</i> .....	90
4.3.5 AGENDA .....	90

## 1. INTRODUÇÃO

A Fundação Renova é a organização constituída para conduzir ações para reparação, mitigação e/ou minimização dos danos ocasionados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, orientada pelo Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Dentre os programas que compõem a estrutura da instituição, o Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG 03) tem por objetivo implementar as ações reparatórias e/ou compensatórias para os povos e comunidades indígenas, em conformidade com os impactos socioambientais e socioeconômicos identificados a partir de estudos, conforme as Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Para atender a esse objetivo, o programa estrutura-se em três fases: A) **emergencial**, em que se desenvolvem ações de mitigação de vulnerabilidades e de riscos associados aos povos indígenas atendidos pelo programa; B) **transitória**, em que se articula com órgãos reguladores e comunidades a realização de estudos para identificação de impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais; e C) **estruturante**, em que se elaboram, executam e monitoram os planos de ações permanentes. O processo de implementação das ações prevê a sobreposição das fases, e os projetos estruturantes devem estar assentados em estudos especializados previstos no TTAC. Para o diálogo, a integração e a tomada de decisão com a participação efetiva das comunidades atendidas e, em paralelo às três fases, o **relacionamento** configura-se como uma ação transversal na efetividade da gestão de informação e comunicação entre Fundação Renova e comunidades.

Diante do exposto, a Fundação Renova apresenta este relatório trimestral, referente às comunidades das Terras Indígenas - TIs Comboios, Tupiniquim Guarani (engloba TIs Tupiniquim e Caieiras Velhas II) e Krenak no período de outubro, novembro e dezembro de 2021, no qual apresenta-se uma síntese das ações executadas referentes às três fases supracitadas do Programa.

## 2. STATUS DO PROGRAMA – PG 03

No Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas (PG 03), as ações objetivam a implementação de ações reparatórias e/ou compensatórias nas terras indígenas identificadas no TTAC, restabelecendo suas atividades socioculturais e socioambientais, a partir dos impactos identificados nos estudos pertinentes. A atuação é subdividida nos três eixos: **emergencial**, **transitório** e **estruturante**, a partir dos quais as atividades são alocadas e planejadas com metas estabelecidas para atendimento das comunidades.

Nas terras indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani, localizadas no município de Aracruz (ES), atualmente estão em desenvolvimento ações do eixo emergencial, transitório e estruturante.

Para o desenvolvimento das ações previstas nos projetos do FAIC (Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias), continuidade da elaboração do projeto de SAA (Sistema de Abastecimento de Água), bem como a reparação integrada (PBAI e indenização) e ações administrativas relacionadas aos acordos emergenciais, considerando a permanência do cenário de pandemia e a necessidade de manter o distanciamento social, foram mantidas as estratégias de contato por meio de softwares personalizados, mídias digitais e por meio de atividades possíveis de serem desenvolvidas remotamente.

Em relação a Terra Indígena Krenak, localizada no município de Resplendor (MG), permanecem sendo realizadas as ações emergenciais de abastecimento e controle da qualidade da água, bovinocultura, apoio financeiro mensal às famílias e diálogo com os indígenas, em consonância com a cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Considerando os protocolos de saúde firmados para prevenção ao contágio e disseminação pelo novo Coronavírus, as ações a serem desenvolvidas no território permaneceram adiadas e pendentes de reagendamento, conforme preconizado pelo Plano de Contingência da Saúde Indígena, ativado em 22 de janeiro de 2020 e revalidado em março de 2021.

## **2.1 CRONOGRAMA 2021**

Os cronogramas aqui apresentados têm o intuito de sistematizar as ações previstas e realizadas para os 3 (três) territórios do PG03. Uma apresentação sistêmica das informações possibilitará a compreensão em amplitude temporal referente ao trimestre composto pelos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021.

**2.1.1.A Cronograma previsto/realizado para o período deste relatório trimestral – outubro, novembro e dezembro/2021**

Eixo	Ação prevista	Público-alvo	Interface	Início previsto	Em andamento ou término previsto	Status*	Justificativa**
<b>Emergencial</b>	Fornecimento de água mineral	TI Comboios	-	Fevereiro 2020		1	A ação vem sendo executada conforme cronograma.
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	TI Krenak	Infraestrutura	2016	2022	1	-
	Auxílio Extra Emergencial	TI Krenak	-	2015	2022	1	-
	Auxílio Subsistência Emergencial	TI Comboios		2016	2021	1	Finalizado em novembro/2021 com a antecipação do pagamento referente a dezembro/2021. Acordo homologado em juízo.
	Auxílio Financeiro Emergencial	TI TG	-	2016	2021	1	Finalizado em dezembro/2021. Acordo homologado em juízo.-
	Distribuição de Insumos para animais	TI Krenak	-	2016	2022	1	-
	Obras de melhoria nos acessos (8 pontos críticos)	TI Krenak	Infraestrutura	Janeiro 2019	Abril/2021	4.1	A ação está suspensa desde março/20 devido a pandemia pelo novo coronavírus, a FR solicitou à Funai autorização para retomada. Contrato foi encerrado em abril/21.
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	2.3	A ação vem sendo executada conforme cronograma.
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	TI Comboios e TI TG	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	1	A ação vem sendo executada conforme cronograma.
	Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	TI Krenak	PG 38 - Monitoramento Hídrico	2017	Em andamento	1	A ação vem sendo executada conforme cronograma.

Eixo	Ação prevista	Público-alvo	Interface	Início previsto	Em andamento ou término previsto	Status*	Justificativa**
<b>Transitório</b>	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena	TI Comboios e TI TG		2020	2021	2.3	-
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias (FAIC)	TI Comboios		2020	Em andamento	2.3	Chamamento ao Projeto Publicado em 15.03.2021 - Prorrogação do Período de Inscrições e Submissão das Propostas.
	Projeto Lótus	TI Comboios e TI TG	PG 33 – Programa de Educação Para Revitalização da Bacia do Rio Doce -	2020	2021	1	-
<b>Estruturante</b>	Elaboração de projeto de SAA – Sistema de Abastecimento de Água	TI Comboios	Engenharia	2019	Em andamento	2.3	O avanço da elaboração dos projetos está condicionado à obtenção da licença ambiental. O processo de licenciamento está em andamento.
	Elaboração de projeto de SAA – Sistema de Abastecimento de Água	TI TG	Engenharia	2019	Em andamento	2.3	O avanço da elaboração dos projetos está condicionado à obtenção da licença ambiental. O processo de licenciamento está em andamento.

\*\* Justificativa para as categorias de status relacionadas.

**Quadro 2.1.1.B – Apoio para o Quadro 2.1.1.A**

Nº	Status (legenda) *	Nº	Justificativa **
<b>1 – Em dia</b>			
<b>2 – Iniciada</b>			
2.1	No prazo previsto		
2.2	Antes do prazo previsto		
2.3	Com atraso (atrasou, mas iniciou no trimestre)	2.3	**
<b>3 – Não iniciada</b>			
3.1	Em atraso (atrasou, mas o início tem nova data fora do trimestre vigente)	3.1	**
3.2	Suspensa (sem nova data prevista para início)	3.2	**
3.3	Cancelada (a ação não ocorrerá mais)	3.3	**
<b>4 – Descontinuada</b>			
4.1	Suspensa (será retomada)	4.1	**
4.2	Cancelada (não será mais retomada)	4.2	**
<b>5 – Concluída</b>			
5.1.	No prazo		
5.2	Antes do prazo		
5.3	Com atraso	5.3	**

\*\* Apresentar justificativa para essas situações (2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2 e 5.3).

**Quadro 2.1.1.C – Cronograma 2021 – Ações não previstas que foram realizadas**

Eixo	Ação incluída	Território	Data início	Data término previsto	Justificativa*
-	-	-	-	-	-

\* Justificar a inclusão da nova ação

## 2.2 EQUIPE TÉCNICA DO PG 03

O Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas (PG 03) conta com oito colaboradores que atuam diretamente nas demandas relacionadas a esse PG, além da coordenação, realizada por Gabriela Leite de Almeida Prado, interinamente por Carla de Almeida Moura, e da gerência, por Ricardo Burg.

**Tabela 2.2 - Equipe técnica PG 03 organizada por território**

Nome	Formação	Território	Cargo
Adebal de Andrade*	Antropólogo, Doutor em Antropologia Cultural e Mestre em Ciências Sociais	Krenak, Comboios e Tupiniquim/Guarani	Analista de Programa Socioeconômico
Alessandro Correa	Geógrafo	Tupiniquim/Guarani e Krenak	Especialista de Programa Socioeconômico
Bruna Aarão	Cientista Social e Mestre em Ciência Política	Comboios e Tupiniquim/Guarani	Especialista de Programa Socioeconômico
Caroline Marci Fagundes Coutinho*	Cientista Social e Mestre em Desenvolvimento Social	Comboios,	Analista de Programa Socioeconômico
Carolline Araújo Rocha*	Engenheira Mecânica e Administradora	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Engenheira de Planejamento
Fábio Moreira	Biólogo	Krenak/Comboios	Analista de Programa Socioeconômico
Felipe de Drummond Alves*	Engenheiro Florestal	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Especialista de Programa Socioeconômico
Fernanda Balestro*	Engenheira Ambiental e Mestre em Planejamento Urbano e Regional	Comboios, Tupiniquim/Guarani e Krenak	Analista de Programa Socioeconômico
Sarah Angélica S. de Oliveira Nunes	Advogada, Administradora e Especialista em Direitos Humanos	Krenak	Analista de Programa Socioeconômico

\* **Observação:** Colaboradores que atuam nos dois programas da Gerência de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais.

### 2.2.1 Equipe Técnica – Atividades desempenhadas por território

Na sequência, serão apresentados os responsáveis por cada ação executada no respectivo território, bem como pelas informações contidas neste relatório. Já os dados e os esclarecimentos da gestão do Programa 03 (Item 2 – Status do PG 03) estão sob responsabilidade do coordenador.

#### A) TI Comboios

**Tabela 2.2.1.A – TI Comboios: ações por eixo, respectivos responsáveis.**

Eixo	Atividade	Responsável
<b>Emergencial</b>	Fornecimento de água mineral	Fábio Moreira / Bruna Aarão
	Auxílio de Subsistência Emergencial	Bruna Aarão
	Elaboração do Plano de Contingência de Cheias	Bruna Aarão/ Fernanda Balestro
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Fernanda Balestro
<b>Transitório</b>	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)	Adebal Junior / Bruna Aarão / Gabriela Prado/ Felipe Drummond/ Caroline Marci/ Fernanda Balestro
	Fundo de Apoio às iniciativas comunitárias	Fábio Moreira
	Projeto Lótus	Fábio Moreira
<b>Estruturante</b>	Reparação Integrada	Felipe Drummond/Bruna Aarão/ Gabriela Prado
	Elaboração de projeto de Sistemas de Abastecimento de Água – SAA	Fernanda Balestro
	Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce	Fábio Moreira

B) TI Tupiniquim/Guarani

**Tabela 2.2.1.B – TI Tupiniquim/Guarani: ações por eixo, respectivos responsáveis**

Eixo	Atividade	Responsável
<b>Emergencial</b>	Auxílio de Subsistência Emergencial	Bruna Aarão
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Fernanda Balestro
<b>Transitório</b>	Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)	Adebal Junior / Bruna Aarão / Gabriela Prado/ Felipe Drummond Fabio Moreira/ Fernanda Balestro
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias	Fábio Moreira
	Projeto Lótus	Fábio Moreira
<b>Estruturante</b>	Reparação Integrada	Felipe Drummond/Bruna Aarão/ Gabriela Prado
	Elaboração de projeto de SAA	Fernanda Balestro
	Projeto Rede de Sementes e Mudas do Rio Doce	Fábio Moreira

C) TI Krenak

**Tabela 2.2.1.C–TI Krenak: Ações por eixo, respectivos responsáveis**

Eixo	Atividade	Responsável
<b>Emergencial</b>	Auxílio de subsistência extra emergencial	Sarah Nunes / Alessandro Correa
	Distribuição de água potável, bruta e mineral	Sarah Nunes / Alessandro Correa
	Manutenção das vias de acesso	Sarah Nunes
	Distribuição de insumos para animais	Sarah Nunes / Alessandro Correa
	Obras de melhoria nos acessos (8 pontos críticos)	Sarah Nunes/ Fernanda Balestro
	Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)	Fernanda Balestro
<b>Relacionamento</b>	Processo de contratação assessoria técnica – Krenak	Sarah Nunes

## 2.3 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DO PROGRAMA

Durante o período trimestral de composição deste relatório (meses de **outubro, novembro e dezembro** de 2021), as atividades previstas, executadas e em execução pelo PG03 nos eixos emergencial, transitório e estruturante, foram desenvolvidas, prioritariamente, no contexto da reestruturação e adequação das ações devido às limitações causadas pela pandemia de Covid-19.

Nas comunidades indígenas Tupiniquim e Guarani, foram realizadas agendas virtuais e presenciais no contexto da reparação que possibilitaram o avanço em ações importantes. Dentre estas, destacam-se:

- Acompanhamento da construção da reparação integrada por meio do processo indenizatório e elaboração de cronograma para detalhamento do PBAI para as terras indígenas Comboios, Tupiniquim e Guarani e Caieiras Velhas II;
- Acompanhamento dos acordos emergenciais;
- Disponibilização dos recursos orçamentários para os Projeto FAIC aprovados;
- Aprovação das primeiras 12 prestações de contas do Projeto FAIC;
- Reuniões de alinhamento entre Fundação Renova e lideranças indígenas para a realização do serviço de estudo hidrogeológico na TI Comboios;
- Reuniões para validação do Plano de Trabalho do PBAI Tupiniquim e Guarani para FUNAI e Comunidades Indígenas.
- Oficinas de detalhamentos dos programas do PBAI Tupiniquim Guarani.
- Na Terra Indígena Krenak foram continuadas as ações de fornecimento e entrega de água mineral, bruta e potável, gerenciamento e distribuição de insumos agropecuários e alimentação animal e serviço de manutenção de vias, devido ao tráfego de caminhões pipa.

Considerando a permanência do cenário de Covid-19, as ações desenvolvidas na terra indígena foram adequadas para atender os protocolos sanitários vigentes, em conformidade com o Plano de Contingência da Saúde Indígena. Assim, foram implementados, por meio do plano de engajamento novos fluxos de comunicação, viável em contexto de pandemia, com objetivo de viabilizar o diálogo e aprovação dos fornecedores na TI Krenak.

Vale destacar, contudo, que todos os indígenas (integrantes das 08 aldeias do território Krenak) tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19, contribuindo com o retorno

gradativo de algumas atividades em campo, condicionadas a liberação interna da sala de situação e solicitação da comunidade indígena, sendo, para tanto, observado o protocolo de segurança de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

## **2.4 ANÁLISES DE DESVIOS E CONTRAMEDIDAS**

A Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, classificou como pandemia a contaminação causada pelo novo coronavírus. A partir de então, foram adotadas medidas sanitárias preventivas ao contágio e disseminação do Coronavírus (COVID-19) em nível mundial.

Considerando o avanço no aumento dos casos de contaminação pelo novo Coronavírus, no Brasil, foi ativado o [Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus - COE-nCoV](#), em 22 de janeiro de 2020.

No dia 17 de março de 2020, a Funai emitiu a Portaria nº 419, que estabelece “medidas temporárias de prevenção à infecção e propagação do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Nacional do Índio – FUNAI”. Esse documento versa sobre as medidas de prevenção para evitar o contágio e a disseminação do novo coronavírus, bem como, garantir a proteção das comunidades indígenas.

Em 16 de março de 2020, a Fundação Renova iniciou a restrição das ações nos territórios aos colaboradores diretos e indiretos, as quais deverão permanecer enquanto perdurarem as medidas de distanciamento social, estabelecidas pelas autoridades em saúde. Sendo assim, foram realizadas ações específicas nos territórios após análise da área de saúde e segurança da Fundação Renova, que em caso de pertinência, condiciona a entrada no território também à solicitação e emissão de autorização da Funai através do PG03.

Na data de 05 de março de 2021, foi emitida pela Funai a Portaria 183, a qual estabelece alteração no art. 1º da Portaria nº 419 de 13 de março de 2020, que passa a determinar que a vigência desta Portaria se encontra condicionada ao estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no país.

Com o avanço da vacinação em todo o país, a Fundação Renova começou, de forma gradativa, a retomada de algumas atividades em campo, condicionadas a liberação interna da sala de situação. Para a realização das atividades presenciais, todo um protocolo de segurança é observado de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

## 2.5 INTERFACES

A matriz de interfaces do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas apresenta a sistematização dos programas da Fundação Renova que atuam de forma articulada nas ações desenvolvidas.

O objetivo proposto com a elaboração dessa matriz é assegurar o alcance dos resultados no desenvolvimento destas ações, considerando-se os eixos emergencial, transitório e estruturante.

Para o desenvolvimento das ações previstas no escopo do PG 03 foram consideradas um total de 20 (vinte) interfaces. Desse total, 16 (dezesseis) interfaces encontram-se descritas na definição preliminar do Programa.

Desse modo, a tabela abaixo relaciona todos os Programas da FR que realizaram alguma interface com o PG 03 até o momento.

**Tabela 2.5 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova**

Área	Programas em interface
Socioeconômica	02 – Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados *
	05 – Programa de Proteção Social *
	06 - Programa Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social *
	12 – Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística *
	13 – Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer *
	14 - Programa de Saúde Física e Mental da População impactada *
	15 – Programa Promoção da Inovação *
	16 – Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesquisas *
	18 – Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica *
	19 – Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios
	21 – Programa de Auxílio Financeiro Emergencial *
	23 – Programa de Manejo de Rejeitos *
	26 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPS) e Recargas Hídricas *

<b>Socioambiental</b>	27 – Programa de Recuperação de Nascentes
	28 – Programa de Conservação da Biodiversidade *
	30 – Programa de Fauna e Flora Terrestre
	33 – Programa de Educação para Revitalização da bacia do rio Doce *
	38 – Monitoramento da bacia do rio Doce *
<b>Infraestrutura</b>	32 – Programa Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água *
<b>Funcional</b>	Área de Engenharia

\* Interfaces previstas no documento - Definição Preliminar do Programa (2018)

As interfaces específicas e as ações realizadas em conjunto com os programas citados serão indicadas ao longo deste relatório, nos tópicos sobre as ações executadas no trimestre e planejadas para os próximos meses.

## 2.6 ORÇAMENTO DO PG 03

O orçamento planejado para a execução das ações do PG03 foi apresentado na 36ª reunião da CT-IPTC e encaminhado, em versão revisada, em 30 de março de 2021. Cumpre ressaltar que os valores apresentados em desembolso indicam as medições contratuais executadas no período.

O glossário apresentado na sequência é referente às linhas da tabela nas quais encontram-se dispostos os valores previstos no orçamento 2021 para o PG03.

### Eixo Emergencial

#### • Apoio subsistência emergencial (ASE) – TI Tupiniquim/Guarani Comboios

Contempla o acordo das Terras Indígenas (TIs) Comboios e Tupiniquim/Guarani – Até junho de 2021 foram efetivados o pagamento de Apoio Subsistência Emergencial - ASE para 293 famílias do acordo de Comboios e 1.345 famílias do acordo Tupiniquim/Guarani que atenderam os critérios estabelecidos.

#### • Apoio subsistência extra emergencial – TI Krenak

Contempla a previsão para o pagamento de apoio subsistência extra emergencial para 137 famílias, referente ao acordo emergencial firmado entre a empresa Vale S.A e o Povo Krenak (“Acordo Vale-Krenak”).

- **Distribuição de água potável, bruta e mineral – TI Krenak**

Fornecimento de água potável e bruta por caminhões pipa; serviços de transporte, armazenamento e distribuição de água mineral.

- **Distribuição de água mineral - TI Comboios**

Fornecimento de água mineral.

- **Distribuição de insumos para animais - TI Krenak**

Fornecimento de ração animal para 108 famílias; Fornecimento de silagem de milho, sal mineral para 100 famílias.

- **Manutenção de vias de acessos do caminhão pipa – TI Krenak**

Manutenção realizada nas vias de acesso para viabilizar o tráfego de caminhões pipa.

- **Obras de melhoria nos acessos (08 pontos) – TI Krenak**

Contratação de serviços específico para infraestrutura, terraplenagem, pavimentação em pontos de acesso avaliados como críticos para o deslocamento de caminhões pipa na TI Krenak. O contrato foi encerrado no contexto da pandemia e as melhorias foram concluídas em 5 pontos, restando 3 em aberto.

### Eixo Transitório

- **ECI Plano de Trabalho – TI Krenak**

Valor destinado a pagamento de consultoria para elaboração do plano de trabalho para o Estudo do Componente Indígena (ECI).

- **Estudo de Componente Indígena (ECI) e Detalhamento Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) Krenak**

Valor previsto para pagamento de consultoria para elaboração do ECI e detalhamento do PBAI.

- **Elaboração ECI (Até 2020) + e Detalhamento Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)**

TI Tupiniquim/Guarani e Comboios – ECI e Detalhamento do PBAI.

- **Análises Técnicas - TI Krenak**

Consultorias externas independentes para *Peer Review* de peças técnicas analíticas.

- **Análises Técnicas – TI Tupiniquim/Guarani e Comboios**

Consultorias externas independentes para *Peer Review* de peças técnicas analíticas.

- **GT Indenização Indígena**

Previsão de despesas do grupo de trabalho (GT) indenização, para as TIs Tupiniquim/Guarani, Comboios e Krenak.

- **Depósito Judicial TRF (2016)**

Valor pago ao TRF 12ª Vara em 2016 referente a depósito judicial.

- **Apoio às Iniciativas comunitárias**

Compreende a execução de ações de recuperação e fortalecimento sociocultural, a serem definidas em conjunto com as comunidades no âmbito do etnodesenvolvimento – Projeto Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC.

### Eixo Estruturante

- **Infraestrutura**

Nos primeiros planejamentos orçamentários da Fundação Renova, as ações de qualquer natureza relacionadas às obras e manutenções estruturais eram alocadas como infraestrutura, sem a descrição atualmente utilizada.

- **Sistema de Abastecimento de Água SAA – TI Comboios**

Elaboração de projetos (aldeias Comboios e Córrego do Ouro), levantamento topográfico, estudos de geofísica, serviços de sondagem, serviço de perfuração de poços, coleta de amostras para análise de qualidade de água.

- **Sistema de Abastecimento de Água SAA – TI Tupiniquim-Guarani**

Elaboração de projetos (aldeias Amarelos, Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos D'água, levantamento topográfico, estudos de geofísica, serviços de sondagem, serviço de perfuração de poços, coleta de amostras para análise de qualidade de água.

- **Serviço Topográfico e Sistema de Abastecimento de Água SAA – TI Krenak**

TI Krenak: Serviços de monitoramento de descarga atmosférica, utilizados para segurança dos colaboradores e comunidade indígena, em especial para deslocamento dos

caminhões pipa, manutenção das vias para viabilizar o deslocamento dos caminhões pipa e execução das obras dos 08 pontos críticos.

- **Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI) – Execução TI Tupiniquim-Guarani e Comboios**

TIs Tupiniquim/Guarani e Comboios - Execução do PBAI.

### Relacionamento

- **Planejamentos integradores**

O Planejamento integrador é proposta que visa assegurar a efetividade do programa de reparação. Pretende-se realizar ação para o direcionamento das expectativas, esforços e entendimento das entregas entre TÍ's e Fundação Renova.

### Geral

- **Gerenciamento do programa**

Serviços gerenciamento e fiscalização de obras e serviços a serem realizados pelo programa. Inclui a consultoria de definição do documento diretivo do PG03.

- **Gerenciamento Saúde e Segurança**

Serviços de gerenciamento em Saúde e Segurança para as ações realizadas pelo programa.

- **Monitoramento Social**

Serviços de cadastro e monitoramento socioeconômico e ambiental.

- **Licenciamento ambiental**

Custos com elaboração de projeto para solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação em TI Krenak, na época de elaboração dos projetos dos 08 pontos críticos.

- **Custo de paralisação pandemia – Gerenciamento Saúde e Segurança**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

- **Custo de paralisação pandemia – Manutenção de vias de acesso do caminhão pipa – TI Krenak**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo de paralisação pandemia – Melhorias acessos**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo de paralisação pandemia – SAA TI Comboios**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

• **Custo adicional Covid-19 – Gerenciamento Saúde e Segurança**

Previsão de gasto adicional em virtude de paralizações das ações impactadas pela pandemia de Covid-19.

**Tabela 2.6 – Orçamento 2021 | PG03**

Descrição	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Ações Emergenciais</b>			
Apoio subsistência emergencial - TI Tupiniquim/Guarani e Comboios	4.199.380,00	5.439.725,00	3.075.094,00
Apoio subsistência extra emergencial - TI Krenak	1.356.300,00	1.356.300,00	1.356.300,00
<b>subtotal AFE</b>			
Distribuição de água potável, bruta e mineral - TI Krenak	941.152,00	961.975,00	562.921,00
Distribuição de água mineral - TI Comboios		13.659,00	7.505,00
<b>subtotal Distribuição água</b>			
Distribuição de insumos para animais TI Krenak	760.566,00	820.055,00	835.321,00
<b>subtotal Alimentação Animal</b>			
Manutenção das vias de acesso do caminhão pipa - TI Krenak	77.500,00		
<b>subtotal Manutenção estradas</b>			
Obras de melhoria nos acessos (08 pontos) - TI Krenak	265.322,00	225.463,00	158.949,00
<b>subtotal obras de melhoria nos acessos</b>			
<b>Ações Transitórias</b>			
Elaboração ECI + PBAI TI Tupiniquim/Guarani e Comboios	799.728,00	24.906,00	280.954,00

ECI e PBAI - TI Krenak			
<b>subtotal</b>			
Análise Técnica - TI Krenak			
Análise Técnica - TI Tupiniquim e Comboios			
<b>subtotal Análise Técnica</b>			
GT Indenização Indígena			
<b>subtotal GT indenização</b>			
Apoio a iniciativas comunitárias	3.750,00	118.284,00	21.708,00
<b>subtotal Apoio a iniciativas comunitárias</b>			
<b>Ações Estruturantes</b>			
SAA - TI Comboios	11.202,00	11.389,00	194.518,00
SAA - TI Tupiniquim	12.059,00	22.108,00	134.135,00
SAA - TI Krenak			
<b>subtotal</b>			
Plano Básico Ambiental (PBA) - Execução - TI Tupiniquim/Guarani e Comboios			
<b>subtotal</b>			
<b>Relacionamento</b>			
Planejamentos integradores			
<b>Geral</b>			
Gerenciamento do programa	93.631,00	86.178,00	99.629,00
Gerenciamento Saúde e Segurança			
Monitoramento Social			
Consultoria para revisão do programa			
Licenciamento ambiental			
Custo adicional Covid-19 - Gerenciamento Saúde e Segurança	8.155,00	1.350,00	600,00

## 2.7 GRUPOS DE TRABALHO (GT) COM A CT IPCT

Durante o período de composição deste relatório (outubro a dezembro de 2021), não ocorreram reuniões específicas de Grupos de Trabalho com a CT-IPCT.

## 2.8 GESTÃO DE CLÁUSULAS E DELIBERAÇÕES

### 2.8.1 Principais Conceitos e Considerações

Conceitos:

• **Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova. Exemplo: Caput Cláusula 39.

• **Itens de requisitos:** São itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Caput Cláusula 40.


Considerações:

• Há um total de 13 itens de ação de cláusulas distribuídos para o programa PG03. Não constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos acima.

• As demais cláusulas relacionadas ao programa dependem da elaboração da definição/escopo do programa.

• A distribuição dos itens de ação por status é apresentada no **Gráfico 2.8.1** a seguir.

**Gráfico 2.8.1: Distribuição dos itens de ação por status**

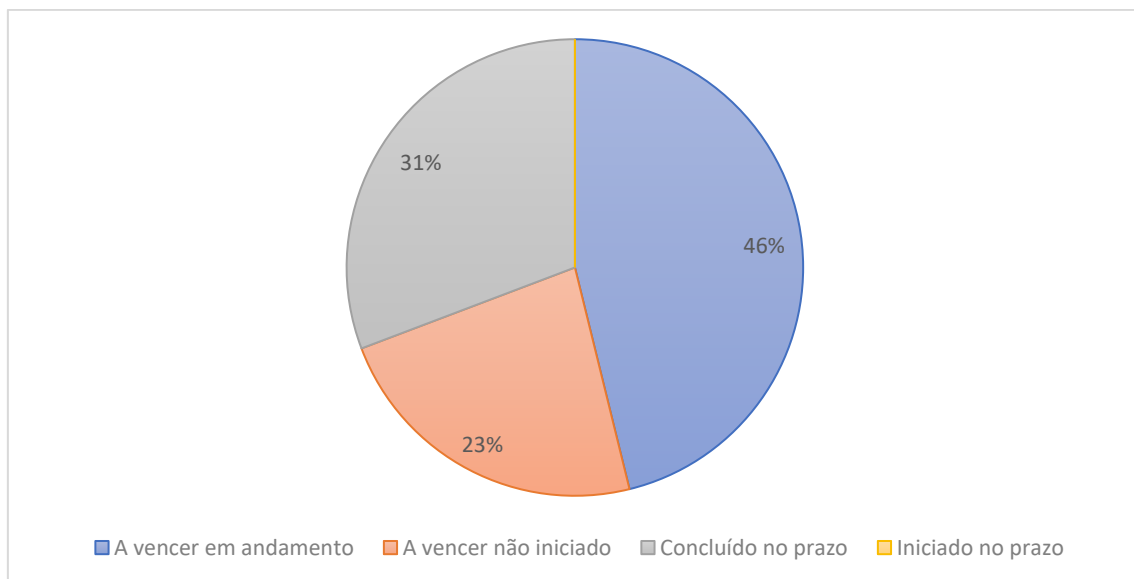

Ressaltamos que os status de conclusão acima representados se referem às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF, as quais ainda serão avaliadas para validar o seu encerramento.

• As evidências de cumprimento encontram-se disponíveis no SharePoint no seguinte link: <https://bit.ly/2EDMxfS>

A seguir, é apresentado o detalhamento dessas cláusulas em conformidade com cada *status*.

### 2.8.1.1 Itens a vencer em andamento

**Quadro 2.8.1.1 – Itens a vencer em andamento**

Cláusula	Prazo TTAC	Observações
39. A FUNDAÇÃO deverá executar um programa para oferecer atendimento especializado aos povos indígenas do território KRENAK e das terras indígenas de COMBOIOS, TUPINQUIM e CAIEIRAS VELHAS II.	Não definido	Programa em execução.
43 (§1º). As medidas previstas nos incisos I e II, caso não tenham sido iniciadas, deverão ter início no prazo de até 10 (dez) dias da assinatura deste Acordo, devendo ser mantidas até a entrada em vigor do Plano de Ação Permanente (Krenak).	Não definido	Ação concluída em 12/03/16. Relatório emitido pelo Jurídico da Renova para a 12ª vara Federal da seção judiciária de MG.
43 (Inc. I). Manutenção das medidas de apoio emergencial previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A. (Krenak)	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações contidas neste.
43 (Inc. II). Monitoramento contínuo das seguintes situações, previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A (Krenak): a) abastecimento de água; b) qualidade da água; c) bovinocultura; d) apoio financeiro mensal às famílias; e) saúde; e f) atualização das necessidades em diálogo com os indígenas KRENAK.	Não definido	Acordo integralmente assumido pela Renova em abril de 2018, e desde então vem cumprindo todas as obrigações.
44 (Inc. II). Execução e monitoramento contínuo das medidas de apoio	Não definido	Desde a criação da Renova esta vem cumprindo os

Cláusula	Prazo TTAC	Observações
emergencial, caso cabíveis nos termos do inciso I (Tupiniquim Guarani).		acordos emergenciais para estes povos, estes vêm sendo renovados, último assinado em dez/20 e válido até dez/21.
44 (Inc. IV). Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III.	Não definido	Trata-se da contratação do detalhamento do PBAI.

### **2.8.1.2 Itens a vencer não iniciados**

**Quadro 2.8.1.2 – Itens a vencer não iniciados**

Cláusula	Prazo TTAC	Observações
43 (Inc. IV). Detalhamento de um Plano de Ação Permanente, com base no estudo previsto no inciso III (Krenak).	Não definido	Não houve permissão por parte dessa comunidade indígena para a execução dos estudos (ECI) até o momento, o qual é necessário para o detalhamento do PBA.
43 (Inc. V). Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente (Krenak).	Não definido	Ação prevista por meio da execução e monitoramento do PBA.
44 (Inc. V). Execução, monitoramento e reavaliação das ações componentes do Plano de Ação Permanente, com base no estudo referido no inciso III.	Não definido	Ação prevista durante a execução e monitoramento do PBA.

### 2.8.1.3 Itens concluídos no prazo

**Quadro 2.8.1.3 – Itens concluídos no prazo**

Cláusula	Prazo TTAC	Observação
43 (Inc III). Contratar consultoria independente a partir do TR a ser apresentado pela Funai para elaboração de estudo dos eventuais impactos do evento sobre os Krenak.	Não definido	Ação concluída em 30/06/16. Estudo foi contratado para os indígenas de Aracruz e Krenak, porém no momento de assinar o Acordo para execução, os Krenak se opuseram, seguindo apenas com os Tupiniquim Guarani.
44 (Inc I - ação 1). Caso seja identificada necessidade por meio de diagnóstico específico realizado pela FUNDAÇÃO ou pela SAMARCO e disponibilizado à Funai e aos povos indígenas em até 20 (vinte) dias da assinatura deste Acordo, serão implementadas medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participação da Funai, observado o previsto nas CLÁUSULAS 40, 41 e 42, sem prejuízo de a Funai elaborar o seu diagnóstico às suas próprias expensas.	22/03/16	Concluída em 22/03/16 com a emissão de um parecer técnico preliminar emitido pela Samarco.
44 (Inc I-ação 2). Caso seja identificada necessidade, implementar medidas de apoio emergencial, mediante acordo com as comunidades, com a participação da Funai.	Não definido	Concluído em 26/02/16 com a assinatura do acordo emergencial.
44 (Inc III e §3º). Contratação de consultoria independente, conforme Termo de Referência a ser apresentado pela FUNAI, para elaboração de estudo circunstanciado dos eventuais impactos socioambientais e socioeconômicos do EVENTO sobre os TUPINIQUIM e os GUARANI.	Não definido	Concluído em 30/06/16 com a contratação da empresa de consultoria independente (Polifônicas)

## 2.8.2 Terra Indígena Krenak

### 2.8.2.1 Principais Conceitos e Considerações

Conceitos:

- **Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova.

Exemplo: Deliberação 299


- **Itens de requisitos:** São itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Não há no momento.

Considerações:

- Há um total de 10 itens de ação nas deliberações dessa comunidade. **Não** constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos acima.

- A distribuição dos itens de ação por status é apresentada no **Gráfico 2.8.2.1** a seguir.

**Gráfico 2.8.2.1: Distribuição dos itens de ação por status**

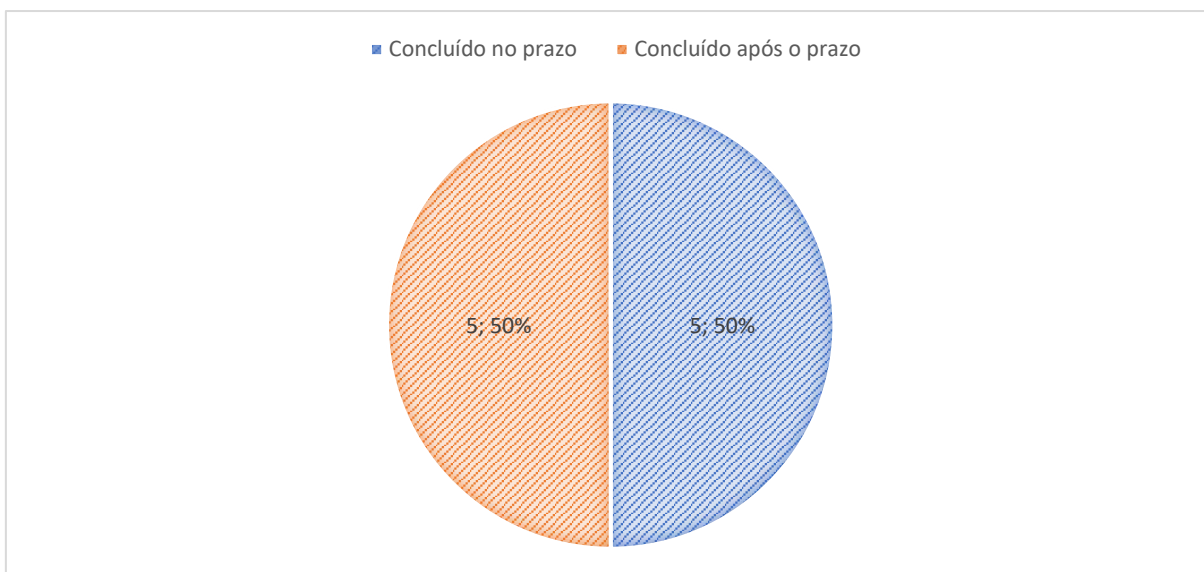

Ressaltamos que os status de conclusão acima representados se referem às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF, as quais ainda precisam ser avaliadas para validar o seu encerramento.

As evidências de cumprimento encontram-se disponíveis no SharePoint no seguinte link: <https://bit.ly/31Nyhtn>

### 2.8.2.2 Itens concluídos no prazo

**Quadro 2.8.2.2 Itens concluídos no prazo.**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 155 (item 2). Aprovar que a participação dos representantes das comunidades tradicionais atingidas seja realizada conforme parâmetros definidos entre Fundação e CTIPCT, respeitando orientação prévia do CIF.	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF. A Fundação Renova deverá apresentar versão reestruturada do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas, considerando as recomendações contidas na NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF, no prazo de 20 dias.	20/08/18	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 187 (item 2) / NT nº. O documento elaborado pela Fundação Renova deverá ser entregue à CT-IPCT para nova avaliação, juntamente com o Plano de Comunicação ao público-alvo.	20/08/18	Encaminhado o documento "Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas" Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 205 (item 3) / NT nº 11/2018/CTIPCT /NT nº 19/2018/CTIPCT. A Fundação Renova deverá apresentar o Plano de Contingência para Cheias referente a todas as terras indígenas atingidas até 15 de outubro de 2018.	15/10/18	Apresentado para TI Comboios na data determinada. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018.4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas. OFI.NII.102018.4315
DEL. 360 (item 1.1) / NT nº 19/2019 / Notif. nº 18/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. À inobservância da determinação constante no "Item 1" da referida Deliberação quanto a inclusão imediata, a partir de julho de 2019, das 7 (sete) famílias Krenak no pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial e nas demais ações previstas no âmbito do Acordo emergencial firmado entre o Povo Indígena Krenak e a Vale S/A, operacionalizado pela Fundação Renova.	Não definido	Enviado em 06/01 o documento OFI.NII.122019.8638 a manifestação ressaltando a necessidade de evidências do repasse da associação às famílias Krenak. Solicitando suspensão de multa (deliberação relacionada às deliberações 299 e 335)

### 2.8.2.3 Itens concluídos após o prazo

Quadro 2.8.2.3 Itens concluídos após prazo.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 169 (item 1) / NT nº 08/2018/CT-IPCT/CIF. Aprovar a inclusão, a partir de julho de 2018, das famílias Krenak referenciadas na Nota Técnica 008/2018/CT-IPCT/CIF, em respeito à Convenção OIT 169, da qual o Brasil é signatário.	31/07/18	Realizado o protocolo em 29/08 conforme documento OFI.NII.082018.3883 confirmando a inclusão das 4 famílias Krenak.
DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT. Determinar a reapresentação do PG03 contemplando o atendimento integral da NT nº 11/2018/CT-IPCT/CIF, com as complementações apontadas na NT nº 19/2018/CT-IPCT/CIF, devidamente acompanhado dos Planos de Ação, Projetos e Processos pertinentes, até 29 de outubro de 2018.	29/10/18	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
DEL. 299 / NT nº 05/2019/CT-IPCT / Notif. nº 19/2019-CIF/GABIN / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. Determinar a inclusão imediata, a partir de julho de 2019, das 7 famílias Krenak, listadas abaixo, no pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial e nas demais ações previstas no âmbito do Acordo emergencial firmado entre o Povo Indígena Krenak e a Vale S/A, operacionalizado pela Fundação Renova.	31/07/19	Encaminhado em 09/06/20 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias.
DEL. 335 (item 2) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. Conferir prazo de cinco dias para que a Fundação Renova busque a documentação de identificação individual das sete famílias.	29/10/19	Encaminhado em 09/06 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 335 (item 3) / NT nº 07/2019 CT IPCT / Notif. nº 23/2019-CIF/GABIN. Efetuar o pagamento devido em 10 dias, conforme Deliberação 299/2019 do CIF.	03/11/19	Encaminhado em 09/06 para o CIF e CTIPCT o documento FR.2020.0767-02 sobre a inclusão das 7 famílias, solicitando a reconsideração da Deliberação CIF nº 335/2019, que notificou a Fundação Renova pelo descumprimento da Deliberação nº 299/2019

### 2.8.3 Terras Indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani

#### 2.8.3.1 Principais Conceitos e Considerações:

Conceitos:

- **Itens de ação:** são itens que demandam entregas a serem realizadas pela Renova.

Exemplo: Deliberação 227 itens 1 e 2.


- **Itens de requisitos:** São itens que especificam as entregas (itens de ação) a serem realizadas. Exemplo: Deliberação 227 item 3.

Considerações:

- Há um total de 15 itens de ação nas deliberações dessa comunidade. **Não** constam os itens classificados como requisitos, uma vez que estes são contemplados dentro dos itens de ação, conforme conceitos acima.

- A distribuição dos itens de ação por status é apresentada no **Gráfico 2.8.3.1** a seguir.

**Gráfico 2.8.3.1: Distribuição dos itens de ação por status**

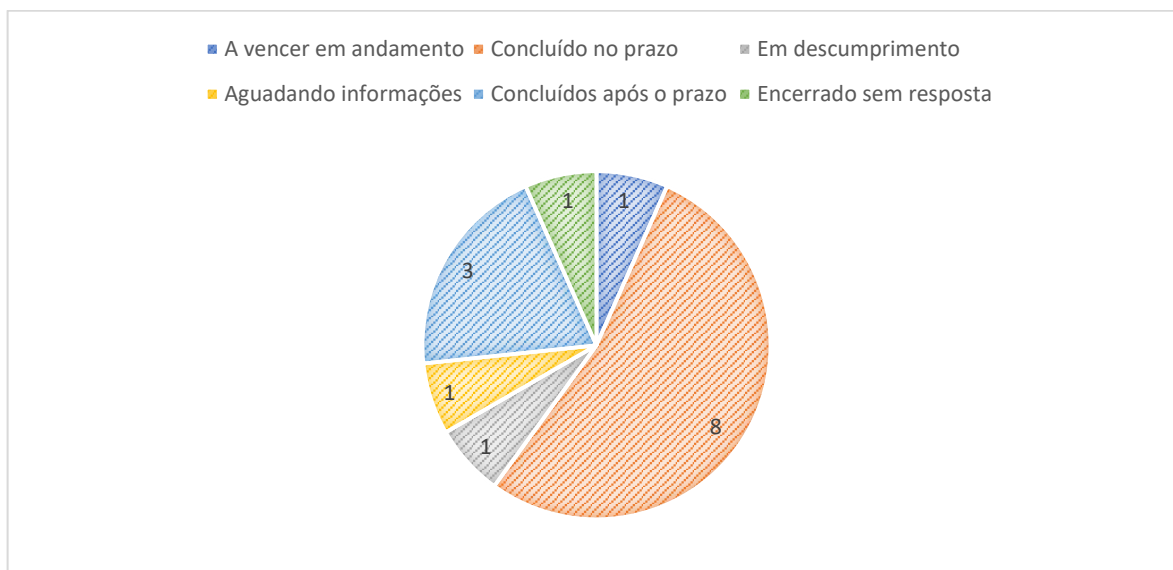

Ressaltamos que os status de conclusão acima representados se referem às entregas de evidências pela Fundação Renova ao CIF, as quais ainda serão avaliadas para validar o seu encerramento.

As evidências de cumprimento encontram-se disponíveis no SharePoint no seguinte link: <https://bit.ly/31Nyhtn>

### 2.8.3.2 Itens a vencer e em andamento

**Quadro 2.8.3.2 Itens a vencer em andamento**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 201 (item 1) / NT nº 14/2018/CTIPCT. Determinar à Renova o fornecimento imediato de água para consumo em até 15 dias para os(as) residentes nas aldeias Comboios, Córrego do Ouro, Amarelos, Pau Brasil, Olhos D'Água e Nova Esperança, das Terras Indígenas Tupiniquim e Guarani de Aracruz/ES, em galões retornáveis de água mineral, de 20 litros, na razão de 15 litros de água/pessoa/dia, até que as medidas estruturantes a serem executadas pela Renova garantam água potável de qualidade para os residentes nestas aldeias e permitam a interrupção deste fornecimento.	Não definido	Conforme ata do da 33ª reunião do CIF de dez/18, a questão de descumprimento foi retirada da pauta uma vez que foi consensado que o foco deveria ser nas soluções definitivas de abastecimento. Projetos estruturantes em andamento.

### 2.8.3.3 Aguardando informações

**Quadro 2.8.3.3 Aguardando informações**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 206 (item 1) / NT nº 20/2018/CT-IPCT/CIF. Determinar à Fundação Renova a apresentação de complementação do delineamento do Plano de Comunicação para Terras Indígenas de acordo com as análises e recomendações da Nota Técnica nº 20/2018/CT-IPCT/CIF, até 19 de outubro de 2018.	19/10/18	Comunidade indígena estava com outras pautas como prioridade. Aguardando término cenário COVID para retomada.

### 2.8.3.4 Itens concluídos no prazo

**Quadro 2.8.3.4 Itens concluídos no prazo**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 155 (item 2). Aprovar que a participação dos representantes das comunidades tradicionais atingidas seja realizada conforme parâmetros definidos entre Fundação e CTIPCT, respeitando orientação prévia do CIF.	Mensalmente	Deliberação concluída a partir da implementação do TAC GOV.
DEL. 187 (item 1) / NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF. A Fundação Renova deverá apresentar versão reestruturada do Programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas, considerando as recomendações contidas na NT nº 011/2018/CT-IPCT/CIF, no prazo de 20 dias.	20/08/18	Encaminhado o documento de Definição do PG03 conforme documento OFI.NII.082018.3863 em OFI.NII.082018.3863 e OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 187 (item 2) / NT nº. O documento elaborado pela Fundação Renova deverá ser entregue à CT - IPCT para nova avaliação, juntamente com o Plano de Comunicação ao público-alvo.	20/08/18	Encaminhado o documento "Construção do Plano de Comunicação em Terras Indígenas" Em OFI.NII.082018.386320/08/18.
DEL. 205 (item 3) / NT nº. A Fundação Renova deverá apresentar o Plano de Contingência	15/10/18	Encaminhado em 15/10/18 o documento OFI.NII.102018.4315

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
para Cheias referente a todas as terras indígenas atingidas até 15 de outubro de 2018.		Com o Plano de Cheias para a TI Comboios. Para as demais terras indígenas foi encaminhado em 20/12/18 o documento OFI.NII.122018.4921 com o documento da Defesa Civil citando a não aplicabilidade do Plano para as demais terras indígenas.
DEL. 227 (item 1) / NT nº. Ressalvadas as especificidades de cada aldeia, deve ser assegurada a isonomia de tratamento aos Tupiniquim e Guarani residentes nas Terras Indígenas de Aracruz/ES, referente as ações emergenciais, estruturantes, indenizatórias de caráter reparatório, considerando o território único e afetado igualmente pelos danos ocasionados pelo rompimento da Barragem de Fundão, garantindo o melhor benefício para toda a comunidade.	Não definido	Em relação aos acordos emergenciais, no dia 26/12 foram assinados os acordos conforme proposta da Fundação Renova.
DEL. 231 (item 1) / NT nº. A Fundação Renova deverá realizar reuniões com as Comunidades em até 30 dias e enviar memória da reunião com a discussão e encaminhamentos sobre o assunto, e cópia da lista de presença, para a CT-IPCT.	29/12/18	Encaminhadas em 20/12/18
DEL. 231 (item 3) / NT nº 23/2018/CTIPCT/ CIF. Determinar que a Fundação Renova insira no Plano Anual de Contingência para o Período Chuvoso 2018/2019 o detalhamento das atividades relacionadas aos povos indígenas e demais comunidades tradicionais atingidas, incluindo as informações contidas no plano conjunto de ações emergenciais Samarco Mineração S/A e Consórcio Aliança (UHE Risoleta Neves - Candonga) e, ainda, a atualização periódica, com frequência mensal, sobre o desenvolvimento das atividades nos territórios acompanhados pela CT-IPCT.	Não definido	Equipe técnica está preparando relatório sobre o tema. Previsão de entrega em setembro/20.

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 231 (item 2) / NT nº 23/2018/CTIPCT/ CIF. Sendo constatado que as áreas podem ser atingidas pelas cheias dos rios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova deverá apresentar Planos de Contingência de Cheias, utilizando a mesma metodologia aplicada a Terra Indígena de Comboios, para as demais comunidades tradicionais acompanhadas por esta CT-IPCT: CRQ Degredo (Linhares/ES) e demais Terras Indígenas.	Não definido	02/10/2020

### 2.8.3.5 Itens concluídos após o prazo

**Quadro 2.8.3.5 Itens concluídos após prazo**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
DEL. 201 (item 2) / NT nº 14/2018/CTIPCT. Determinar à Fundação Renova o início imediato de ações estruturantes nas mesmas aldeias, com vistas a garantir, o mais breve possível, o fornecimento de água de qualidade para o consumo dos residentes, independentemente da finalização do Estudo do Componente Indígena, como parte da mitigação dos efeitos deletérios do rompimento da barragem de Fundão nos Territórios Indígenas de Aracruz/ES.	16/10/18	Enviado o OFI.NII.032019.5775 em 28/03/19, citando que as ações estruturantes em relação ao abastecimento de água já foram iniciadas no workshop de intercâmaras realizado em 15/03/10, e que os encaminhamentos desta estão em andamento.
DEL. 205 (item 2) / NT nº 11/2018/CTIPCT / NT nº 19/2018/CTIPCT. Determinar a reapresentação do PG03 contemplando o atendimento integral da NT nº 11/2018/CT-IPCT/CIF, com as complementações apontadas na NT nº 19/2018/CT-IPCT/CIF, devidamente acompanhado dos Planos de Ação, Projetos e Processos pertinentes, até 29 de outubro de 2018.	29/10/18	Encaminhado o documento de Definição do Programa 03 em 26/11/18, conforme documento OFI.NII.112018.4749.
DEL. 227 (item 2) / NT nº 21/2018. Determinar o início imediato das ações estruturantes de caráter reparatório (sejam transitórias ou definitivas) nas	19/11/18	Enviado o documento OFI.NII.032019.5775 em 28/03/19, citando que as ações

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Data Conclusão
Terras Indígenas Tupiniquim e Guarani, com base nos danos sofridos pelos territórios e no diálogo com os atingidos, tendo em vista que estão denotadas questões emergenciais que precisam de intervenção (como o abastecimento de água para as aldeias citadas na Deliberação CIF nº 201/2018), com apresentação de plano de atividades, devidamente justificado, e cronograma, em até 20 dias.		estruturantes em relação ao abastecimento de água já foram iniciadas no workshop de intercâmaras realizado em 15/03/19, e que os encaminhamentos desta estão em andamento.

### 2.8.3.6 Itens em descumprimento

**Quadro 2.8.3.6 Itens em descumprimento**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 452 (item 5) - Nota Técnica nº 35/2020/CT-IPCT Analisa os pedidos de impugnação feitos pela Fundação Renova em relação às Deliberações CIF 417, 420, 434, 435 e 436 e aplica sanção(...) 5. Em relação à Deliberação 445/2020, rejeitar, na forma das manifestações em ata, a manifestação apresentada pela Fundação Renova, e outorgar prazo de 15 (quinze) dias para que adote as medidas de cumprimento. Para o caso do fornecimento de água previsto no item 1 da referida deliberação, não deverá haver interrupção.	-	Fornecimento de água continuado.

### 2.8.3.7 Itens encerrado sem resposta

**Quadro 2.8.3.7 Itens encerrados sem resposta**

Deliberação / Nota Técnica / Notificação	Prazo	Observações
DEL. 445* (item 2.1)- Nota Técnica nº 35 da CT-IPCT Determinar a continuação do abastecimento de água potável na Terra Indígena Comboios - Item 2.1). Determinar que a Fundação Renova apresente em um prazo de 30 (trinta) dias proposta de integração do conteúdo do monitoramento da qualidade ambiental recomendado na Nota Técnica nº 35 da CT-IPCT relativo às Terras Indígenas do ES (Tupiniquim, Caieiras Velha II e Comboios), aos programas existentes no TTAC para posterior aprovação das comunidades e das Câmaras Técnicas permanentes, de forma a gerar um relatório específico para estes territórios no âmbito de cada um dos programas.	-	Fornecimento de água continuado.

\*NOTA: As deliberações CIF nº 445 itens 2.1 a 2.5 e 452 item 5 foram contestados os cumprimentos junto ao Sistema CIF.

### 3. AÇÕES EXECUTADAS NO TRIMESTRE – OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

#### 3.1 TERRA INDÍGENA COMBOIOS – CONTEXTUALIZAÇÃO

A Terra Indígena (TI) de Comboios foi demarcada e homologada pelo Decreto Presidencial de 05/11/2010, abrangendo uma área de 3.872 (três mil, oitocentos e setenta e dois) hectares, situada entre o rio Comboios e o mar, no município de Aracruz (ES). É constituída por uma população de 534 (quinhentas e trinta e quatro) pessoas (SESAI/SIASI, 2013) pertencentes à etnia tupiniquim, que se dividem em duas aldeias: **aldeia Comboios e aldeia Córrego do Ouro.**

Os Tupiniquim de Comboios vêm sendo atendidos pela Fundação Renova, no âmbito do TTAC. A realização de ações deve se configurar como ferramenta para a promoção da reparação.

##### 3.1.1 Ações emergenciais

As atividades realizadas neste eixo são voltadas às ações de mitigação, vulnerabilidades e aos riscos associados para povos e comunidades tradicionais identificadas no TTAC.

**Tabela 3.1.1 – Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre**

AÇÕES EMERGENCIAIS TI COMBOIOS	
Ações	Auxílio de Subsistência Emergencial
	Fornecimento de água mineral
	Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos - (PMQQS)
	Elaboração do Plano de Contingência de Cheias

##### 3.1.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)

Em dezembro de 2020 foi assinado a renovação do Termo de Acordo para o ano de 2021 (TAC 2021), que previa o atendimento de até 300 famílias para a terra indígena em de Comboios, desde que cumpram os critérios estabelecidos no acordo vigente.

Está previsto o pagamento mensal de dois salários-mínimos e meio (vigente no ano) por titular de cada família atendida, acrescidos a 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo para cada dependente mais uma cesta básica para cada família (DIEESE). No acordo também é previsto o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal repassado à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (AITC) a título de cobertura de gastos administrativos da associação. Os valores são repassados no dia 15 de cada mês para a associação indígena que é responsável por repassar os valores às famílias (**Quadro 3.1.1.1**).

**Quadro 3.1.1.1 Indicador de cumprimento do acordo ASE – Acordo 2021**

Ação	Nº Previsto	Nº Realizado	% Realizado
Pagamento mensal ASE-AITC	300	293	97,6

Os casos de nascimentos são computados como novos dependentes conforme envio de solicitação realizada pela associação e da documentação comprovatória de vínculo com o titular.

**Tabela 3.1.1.1 – Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Comboios**

ASSOCIAÇÃO	TITULARES (ANO)	Outubro		Novembro		Antecipação- novembro	
		Titulares	Dep.	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.
AITC	2021	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.
	300	293	524	293	524	293	524

É importante ressaltar que a associação/lideranças indígenas possuem autonomia para a sua organização administrativa e a integração com seus membros e pode excluí-los ou adicioná-los conforme sua governança, respeitando-se as vagas e as regras estabelecidas do acordo vigente.

Cabe à associação realizar a prestação de contas junto a Fundação Renova por meio da entrega de recibos coletivos (a associação recebe todos os meses um recibo da Fundação Renova constando o quantitativo de famílias, dependentes, cesta básica e o percentual destinado a associação) e individuais (cabe à associação encaminhar mensalmente para a Fundação Renova os recibos os valores repassados às famílias). A ausência da entrega dos recibos pode acarretar suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

### 3.1.1.2 Fornecimento de água mineral

Está previsto o atendimento para 423 indígenas da aldeia de Comboios e 325 na aldeia de Córrego do Ouro na quantidade de 5 litros por dia e por pessoa. Durante o período abrangido por este relatório, o fornecimento de água mineral foi realizado semanalmente na TI Comboios nas aldeias de Comboios e Córrego do Ouro. A reposição dos galões vazios foi realizada de acordo com a demanda. Como registro das entregas realizadas são colhidas as assinaturas nos recibos de entrega. As evidências do desenvolvimento dessa ação são apresentadas no **Anexo 3.1.1.2**.

#### Figuras 3.1.1.2 -1 e 3.1.1.2-2 – Entrega de água para a Aldeia Comboios



Figura 3.1.1.3-1. Entrega de água mineral na aldeia Comboios



Figura.3.1.1.3-2 Entrega de água mineral na aldeia Comboios

**Tabela 3.1.1.2.A – Entrega de água na Aldeia Comboios e na Aldeia Córrego do Ouro entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021.**

Pontos de entrega acordados	Galões de 20 litros		
	Outubro	Novembro	Dezembro
Aldeia Comboios	1141	1152	1389
Aldeia Córrego do Ouro	229	169	199
<b>Total</b>	<b>1370</b>	<b>1321</b>	<b>1588</b>

A entrega de água mineral nas aldeias Córrego do Ouro e Comboios é realizada de acordo com a demanda de consumo de água apresentada pela comunidade mediante a devolução do vasilhame vazio.


**Tabela 3.1.1.2.B – Indicadores de Progresso para o Trimestre**

Ação	Nº previsto Trimestre (pessoas)	% Previsto	Nº Realizado	% Realizado
Fornecimento de água mineral emergencial TI Comboios para 748 pessoas*.	2244	100%	2244	100%

\*A quantidade total demandada pela comunidade é entregue.

Apresentamos na sequência (**Figura 3.1.1.2**) o indicador de progresso dessa ação para o Trimestre em relação ao fornecimento de água mineral para as aldeias Comboios e aldeia Córrego do Ouro da TI Comboios.

**Figura 3.1.1.2 – Indicador de Progresso para o Trimestre**

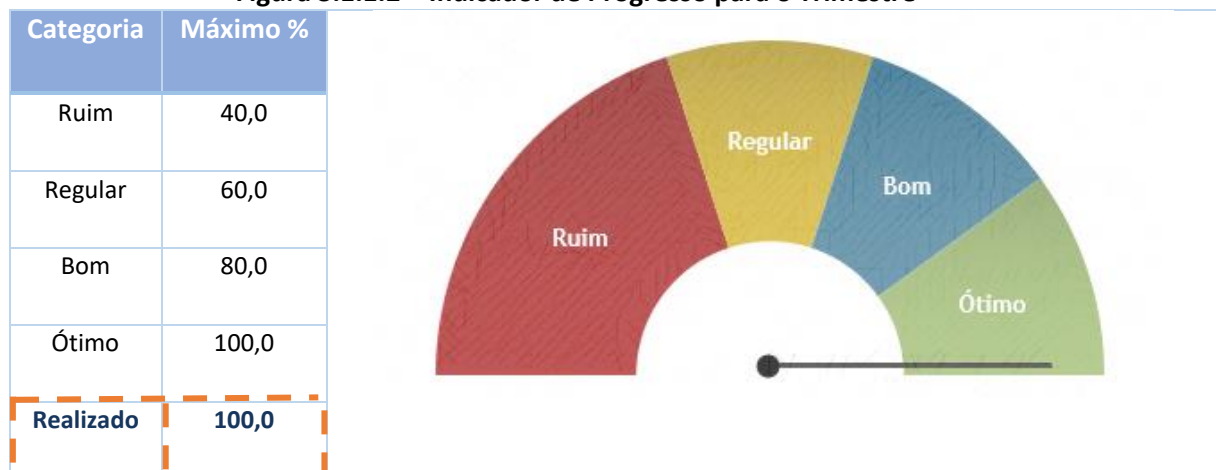

### 3.1.1.3 Plano de contingência de cheias

Realizou-se uma reunião com a Defesa Civil e as lideranças indígenas em 26/11/21. Na ocasião foram solicitadas algumas modificações no documento, que se encontram em elaboração. A ata da reunião encontra-se no **Anexo 3.1.1.3**.

### 3.1.1.4 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

Conforme apresentado em relatório anterior, para a região da TI Comboios, os pontos dos grupos Zona Costeira e Estuarina que estão próximos à mesma são apresentados na tabela abaixo.

Em todos os pontos de monitoramento da zona costeira são coletadas amostras em duas profundidades: superfície (15 cm abaixo da superfície do mar) e fundo (50 cm acima do leito submarino). Já nas regiões estuarinas, se houver diferença significativa de condutividade, entre o medido na superfície e o medido no fundo, significa que a coluna d'água está estratificada. Neste caso são feitas coletas de água na superfície e no fundo. Se não houver estratificação, será coletada água só no fundo. Ou seja, a partir de fevereiro as coletas P15 e P50 não serão mais fixas como anteriormente, vai depender da estratificação da condutividade, inferior a 10.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  coleta de água na profundidade de 50cm (P50). Estas profundidades permitem avaliar a influência da pluma de sedimentos do rio sobre as camadas superficial e de fundo, que podem ser influenciadas de forma diferente por este fator e pela ressuspensão de sedimentos do fundo provocada por processos meteoceanográficos. Os pontos do grupo Zona Costeira indicam apenas a posição em relação à costa e serão deslocados em direção ao mar para coincidirem com a isóbata de 10 m durante a primeira campanha de campo.

**Tabela 3.1.1.4 – Pontos de Amostragem do PMQQS**

Código	Nome do Ponto	Latitude	Longitude
EPA 01R*	Estuário Piraquê-Açú 01R	-19,9502	-40,1561
EPA 02R*	Estuário Piraquê-Açú 02R	-19,92863	-40,17543

\* Os pontos realocados foram renomeados conforme sua disposição no corpo hídrico, de modo que o ponto realocado recebeu a letra R ao seu código. O deslocamento destes pontos ocorreu, pois se encontravam em áreas instáveis, rasas, em bancos de areia ou sob forte influência de corrente de maré.

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referentes ao monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço de armazenamento é: <https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/> no qual estão disponíveis os boletins trimestrais de lagoas, zona costeira e estuários até junho de 2021. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma *online* interativa.

Ressalta-se que os dados referentes aos meses de 2021 que não estão disponíveis online serão adicionados conforme ocorra a sua validação e poderão ser consultados de forma pública a partir de sua publicação, que pode ocorrer antes da elaboração de novo Relatório Trimestral.

### 3.1.1.5 Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre

As interfaces consolidadas no trimestre para a realização das ações emergenciais estão consolidadas no **Quadro 3.1.1.5**.

**Quadro 3.1.1.5 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Financeiro	ASE	3.2.1.1
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	Elaboração do Plano de Cheias	3.1.1.3
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQQS	3.1.1.4

### 3.1.2 Ações transitórias

As ações transitórias previstas no escopo do PG 03 para a Terra Indígena Comboios têm por objetivo promover a articulação com órgãos reguladores a realização dos estudos para identificação dos impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais (**Tabela 3.1.2**).

**Tabela 3.1.2 – Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre**

AÇÕES TRANSITÓRIAS TI COMBOIOS	
Ações	PBAI- Plano Básico Ambiental Indígena
	Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC
	Projeto Lótus

O detalhamento das ações transitórias será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

### **3.1.2.1 Reparação Integrada- Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)**

A consultoria independente para o detalhamento do PBAI voltado às Terras Indígenas Tupiniquim Caieiras Velhas II e Comboios, em Aracruz (ES) foi contratada em maio de 2021. Em outubro após a informação técnica nº105/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI (**Anexo 3.1.2.1.a**) foi realizada a reunião de consulta de validação do Plano de Trabalho para detalhamento dos programas do PBAI. A reunião contou com a participação das lideranças indígenas, FUNAI e Fundação Renova. Nesse encontro, os indígenas da TI Comboios autorizaram o início das oficinas para detalhamento dos projetos (**Anexo 3.1.2.1**).

As oficinas ocorreram nos territórios, conforme demonstrado na planilha abaixo:

Data	Local	Tema da Oficina
07.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Levantamento geral e explicação do PBAI
13.10.2021	AITG	Discussão sobre programas, impactos e medidas
18.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Cultura e Socioeconomia
21.10.2021	Aldeia Córrego do Ouro	Discussão geral sobre impactos e medidas

Data	Local	Tema da Oficina
21.10.2021	AITG	Retomada Econômica e Fundo de Projetos
22.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Caminhada pela aldeia e discussão sobre possíveis projetos nas diferentes eixos
25.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Caminhada na aldeia para avaliação de projetos do eixo de socioeconomia
26.10.2021	Aldeia Comboios	Discussão sobre a relação entre impactos e medidas
08.11.2021	AITG	Gestão do PBAI, Retomada Econômica e Fundo de Projetos
09.11.2021	AITC	Saúde, Proteção Social e Fundo de Projetos
10.11.2021	AITG	Meio Ambiente
11.11.2021	AITG	AGRICULTURA
12.11.2021	AITC	Meio Ambiente
16.11.2021	AITC	Etnoturismo e Artesanato
17.11.2021	AITG	Reestruturação do Pescado
17.11.2021	Três Palmeiras	Associação; Retomada Econômica; Fundo de Projetos; Programas Estruturantes
17.11.2021	Aldeia Pau Brasil	Explicação geral sobre os eixos e discussão sobre a relação entre impactos e medidas
18.11.2021	Aldeia Córrego do Ouro	Agricultura

Data	Local	Tema da Oficina
19.11.2021	Aldeia Irajá	Explicação geral sobre os eixos e discussão sobre a relação entre impactos e medidas
19.11.2021	Aldeia Areal	Explicação geral sobre os eixos e discussão sobre a relação entre impactos e medidas
20.11.2021	Aldeia Boa Esperança	Retomada econômica, Fundo de Projetos, Programas Estruturantes e Reparação Integral
21.11.2021	Aldeia Nova Esperança	Abordagem de todos os eixos
22.11.2021	Aldeia Guarani de Olho D'água	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
22.11.2021	Aldeia Piraquê Açú	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
23.11.2021	AITC	Cultura e Sociabilidade
24.11.2021	AITC	Reestruturação do Pescado
24.11.2021	Aldeia Piraquê Açú	Fundo de Projetos
24.11.2021	Aldeia Nova Esperança	Organização das demandas nos diferentes eixos
26.11.2021	Aldeia Piraquê Açú	Cultura, Sociabilidade e Socioeconomia
27.11.2021	Aldeia Guarani de Olho D'água	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
01.12.2021	Aldeia Guarani de Olho D'água	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
01.12.2021	Aldeia Boa Esperança	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.

Data	Local	Tema da Oficina
07.12.2021	AITG	Educação, Cultura e Sociabilidade
10.12.2021	Aldeia Irajá	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
10.12.2021	AITG	Saúde, Proteção Social e Artesanato
13.12.2021	AITG	Etnoturismo

Cabe destacar que em todas as oficinas na TI Comboios tiveram a presença, além das instituições, de especialistas nas temáticas trabalhadas a convite das lideranças locais. Também as ações foram acompanhadas por uma Assessora Técnica em apoio às lideranças e comunidade.

O plano de trabalho final foi encaminhado, em uma nova versão, para avaliação da FUNAI em dezembro do ano de trabalho por meio do ofício **FR.2021.2013 (Anexo 3.1.2.1 b)**.

### **3.1.2.2 Fundo de Apoio as iniciativas Comunitárias (FAIC)**

O Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC, tem por objetivo, apoiar pequenos projetos comunitários realizados pelos indígenas em seu território, ou que sejam de interesse das comunidades indígenas.

Os projetos propostos pelas comunidades indígenas das aldeias Comboios e Córrego do Ouro focaram nas linhas temáticas: **Cultura, Geração de Renda, Lazer/Educação e Agricultura**, evidenciando a importância desses projetos à essas comunidades. O **Quadro 3.1.2.2** apresenta as informações gerais dos projetos encaminhados.


#### **Quadro 3.1.2.2 Projetos FAIC das Comunidades Indígenas TI Comboios**

Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática
Comboios	Córrego do Ouro	Fortalecimento da Agricultura Familiar na Terra Indígena Comboios	Agricultura
		Fortalecimento da EduComunicação na Terra Indígena Comboios	Educação/Lazer
	Comboios	Fortalecimento do Grupo de Mulheres da Terra Indígena Comboios	Geração de renda
		Fortalecimento da Juventude Indígena da Terra Indígena Comboios	Cultura

Os projetos elaborados pelas comunidades indígenas da TI Comboios podem ser correlacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. As ações propostas nestes projetos apoiam o desenvolvimento de atividades estruturantes, valorizando o protagonismo dos indígenas na elaboração e execução dos projetos.

Os objetivos do Desenvolvimento sustentável e as suas correlações são apresentados no **Gráfico 3.1.2.2**.

Gráfico 3.1.2.2 – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS.



No período referente a este relatório os projetos do FAIC foram iniciados nas duas aldeias da TI Comboios. Conforme previu o edital, foram disponibilizados os

recursos aos proponentes para realização da 1ª etapa das atividades, as quais são apresentadas na sequência.

O projeto de fortalecimento da agricultura familiar na terra indígena Comboios focou em melhorar a fertilidade do solo nas áreas de plantio das duas aldeias: Córrego do Ouro e Comboios. A principal atividade desenvolvida foi a aquisição e distribuição de adubo orgânico, para a recomposição dos solos em áreas agricultáveis. Ação é apresentada nas **Fotografias 3.1.2.2-1 e 3.1.2.2-2**.



Fotografia 3.1.2.2-1 – Fornecimento de Adubo orgânico.



Fotografia 3.1.2.2-2 – Enriquecimento do roçado com adubo orgânico.

O projeto de Educomunicação na TI Comboios tinha por objetivo melhorar o acesso a comunicação, beneficiando a comunidade escolar da aldeia (alunos e professores) por meio da oferta de conexão de internet via fibra óptica. O desenvolvimento do projeto é ilustrado nas **Fotografias 3.1.2.2-3 e 3.1.2.2-4**.



Fotografia 3.1.2.2-3 Instalação Ramal Internet



Fotografia 3.1.2.2-4 Instalação Ramal Internet

O objetivo do projeto de Fortalecimento do Grupo de Mulheres da TI Comboios era contribuir para a valorização e protagonismos da mulher indígena apoiando atividades geradoras de renda. Neste projeto foi adquirido uma máquina overloque que será utilizada pelo coletivo feminino das duas aldeias na confecção de peças a serem

comercializadas posteriormente. O equipamento e a estrutura onde será desenvolvida as atividades é apresentada nas **Fotografias 3.1.2.2-5 e 3.1.2.2-6.**



Fotografia 3.1.2.2-5 Máquina overloque adquirida.



Fotografia 3.1.2.2-6 Galpão que será a sede do grupo de mulheres.

O projeto de Fortalecimento da juventude da terra indígena Comboios, previa a melhoria dos equipamentos e espaços relacionados à cultura, esporte, lazer e educação dos jovens indígenas. Foram realizadas reformas no campo de futebol, aquisição de equipamentos de informática que serão utilizados no desenvolvimento de atividades propostos pela Associação Indígena Tupiniquim de Comboios – AITC. Conforme apresentado na **Fotografia 3.1.2.2-7**



Fotografia 3.1.2.2-8 – Aquisição de 02 notebooks

Os projetos apresentados pela comunidade indígena ainda estão em andamento. No mês de dezembro foram apresentadas as prestações de contas referentes a 1ª parcela disponibilizada. Após avaliação e aprovação das respectivas prestações foi solicitado a descentralização da 2ª parcela para a finalização dos projetos.

### 3.1.2.3 Projeto Lótus

O Projeto Lótus tem por objetivo apoiar a formação de lideranças e o estabelecimento de uma Rede de Jovens atuantes na busca de soluções aos problemas identificados em suas comunidades ou regiões.

Trata-se de Projeto de Educação Socioambiental e Tecnológico que oferece aos jovens a oportunidade de descobrir seu potencial de liderança por meio de ações que desenvolvam o pertencimento ambiental, o olhar jovem para a realidade de sua comunidade e a construção de projetos socioambientais. As oficinas formativas abordam diversos temas ambientais relacionando-os com os desafios encontrados para revitalização da bacia do Rio doce.

Para o período deste relatório as ações foram desenvolvidas de maneira remota, na modalidade de Ensino à Distância – EAD. Atualmente encontram-se matriculados no projeto 12 jovens indígenas nas TI'S de Aracruz, destes 11 são da TI Comboios.

**Tabela 3.1.2.3 – Ações do Projeto Lótus desenvolvidas no trimestre**

<b>Tema do Encontro Virtual</b>	<b>Data</b>
<b>Oficina de Projetos</b>	06/10
<b>Oficina de Projetos</b>	13/10
<b>Oficina de Projetos</b>	20/10
<b>Oficina de Projetos</b>	27/10
<b>Aula de Robótica</b>	04 e 05/10
<b>Aula de Robótica</b>	11/10
<b>Aula de Robótica</b>	18 e 19/10
<b>Aula de Robótica</b>	25 e 26/10
<b>Mentoria junto aos Jovens para escrita dos Projetos</b>	Ao longo de todo mês de Outubro e Novembro
<b>Aula de Robótica</b>	08 e 09/11
<b>Aula de Robótica</b>	16/11
<b>Aula de Robótica</b>	29/11
<b>Mentoria para elaboração da Apresentação dos Projetos para Banca</b>	28/11 a 09/12
<b>Banca de Projetos</b>	01/12
<b>Banca de Projetos</b>	02/12
<b>Banca de Projetos</b>	08/12
<b>Banca de Projetos</b>	09/12

As ações do Projeto Lótus são desenvolvidas no âmbito do PG33 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em interface com o PG03 - Programa de Povos Indígenas.

### 3.1.2.4 Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre

**Quadro 3.1.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre**

Área	Programas FR com interface - PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Área Funcional da FR	Suprimentos	FAIC	3.1.2.3
Socioeconômico	PG-33	Projeto Lótus	3.1.2.4
Monitoramento Hídrico		PBAI	3.1.2.2
Pesca	PG-16	PBAI	3.1.2.2
Educação, cultura e Turismo	PG-12	PBAI	3.1.2.2
Biodiversidade	PG-28	PBAI	3.1.2.2
UST	PG-25	PBAI	3.1.2.2
Proteção Social	PG-05	PBAI	3.1.2.2
Saúde	PG-14	PBAI	3.1.2.2

### 3.1.3 Ações estruturantes

As ações previstas neste eixo são voltadas à elaboração, execução e monitoramento dos planos de ações permanentes, que visam garantir o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades atendidas e em paralelo a todos as fases do processo de reparação.

**Quadro 3.1.3 – Ações do eixo estruturante desenvolvidas no Trimestre**

AÇÕES ESTRUTURANTES TI TUPINIQUIM/GUARANI	
	Reparação Integrada- Indenização

<b>Ações</b>	Elaboração de projetos de SAA
	Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce

O detalhamento das ações estruturantes será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

### **3.1.3.1 Reparação Integrada - Indenização**

Em outubro a minuta de acordo foi assinada entre a Associação Indígena, caciques das aldeias de Comboios e Córrego do Ouro, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE), Defensoria Pública da União (DPU) e Fundação Renova (Anexo 3.1.3.1 a).

Entre os dias 14/10 - 21/10 a Fundação Renova realizou a coleta de assinaturas dos termos de quitação das famílias já aptas<sup>1</sup> para recebimento da indenização. No dia 30/11 a Fundação Renova realizou atividade de campo para coleta de assinatura de termos de quitação pendentes. Até o fechamento do relatório havia pendência de duas famílias para assinatura do termo de quitação individual devido a pendência documental.

O acordo de indenização foi homologado pela 12ª Vara Cível e Agrária da SJMG em 08.11 (Anexo 3.1.3.1 b). A Fundação Renova realizou o pagamento às famílias que assinaram o termo e estavam com a documentação completa no dia 18.11.

### **3.1.3.2 Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)**

A Fundação Renova deu entrada ao processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA para obtenção de licença para perfuração de poços em Córrego do Ouro e Comboios em 03/12/21. A obtenção da licença é imprescindível para agendamento da realização do serviço.

---

<sup>1</sup> O processo de elegibilidade da indenização tem como premissa: 1) famílias beneficiárias do ASE; 2) famílias que apresentaram os documentos pessoais (Documento de identificação e CPF para maiores de 18 anos, e contas bancárias dos titulares; 3) famílias que não possuem ação judicial ou que apresentaram a renúncia da ação judicial.

### 3.1.3.3 Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce

As ações do projeto Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, sob responsabilidade dos programas PG26, estão sendo redesenhadas para atender aos novos critérios de segurança e saúde devido a pandemia do Covid-19.

Buscando esclarecimentos sobre o status do projeto e acompanhamento das ações a serem desenvolvidas, a FUNAI solicitou o agendamento de uma reunião de esclarecimentos junto aos responsáveis pelo projeto. Em concordância, a Fundação Renova ressaltou a importância desse diálogo tendo em vista o necessário alinhamento sobre a interação com a comunidade, inserção de novos integrantes, contextualização e status das atividades desenvolvidas (por meio de interação remota e virtual), dentre outros pontos, tendo o PG03 atuado como interlocutor do projeto na apresentação entre FUNAI e a Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce.

Cabe destacar que, o projeto Rede de Sementes é uma das vias possíveis de projetos no Programa de Retomada Econômica, visando a reparação integrada. Dessa forma, foi realizada reunião com a FUNAI, com o objetivo de esclarecer o projeto de protagonismo dos PGs 26 e 27. A Fundação Renova aguarda a autorização da FUNAI para a retomada das ações presenciais junto aos grupos coletores.

Enquanto não há a sinalização da FUNAI para a retomada das atividades presenciais, são desenvolvidas atividades on-line para capacitação dos agentes multiplicadores, coletores e técnicos das casas de sementes.

### 3.1.3.4 Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre

**Tabela 3.1.3.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre**

Área	Programas FR com interface - PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Socioeconômico	PG02, Jurídico, Compliance	Reparação Integrada	3.1.3.1
Funcional da FR	Engenharia	Elaboração de projeto	3.1.3.2
Socioambiental	PG-26 e PG -27	Projeto Rede de Sementes	3.1.3.3

### 3.1.5 Agendas

#### 3.1.5.1. Agenda realizada no trimestre

**Tabela 3.1.5.1 - Agenda Realizada no Trimestre**

Reunião	Data	Programas/ áreas vinculadas/Instituições	Objetivo da reunião	Evidência	Objetivo alcançado
Reparação integrada (indenização) – TI Comboios	08/out	PG002, 003, Jurídico, Relações Institucionais. DPE ES, DPU, MPF, MPE	Assinatura Minuta Reparação Integrada	Foto	Sim.
Reparação integrada (indenização) – TI Comboios	14/10 ao 21/10	PG002, 003, Jurídico, Lideranças Indígenas e Indígenas	Assinatura dos termos de quitação com as famílias indígenas	Termos Assinados	Sim.
Visita Terra Indígena Comboios	15/out	Lideranças Indígenas, DPE, DPU e Fundação Renova	Roda de conversa com lideranças Indígenas	Fotos	Sim
Inclusão de famílias pendentes no ASE/indenização	15/out	PG03/Caciques e Associação	Inclusão de 10 vagas em abertas no processo de indenização e 07 vagas em aberto no ASE.	Ata	Sim
Documentação pendente indenização	12/nov	PG03/Caciques e Associação	Apresentação de Documentação pendente	Ata	Sim
SAA- etapas do processo	04/nov	PG03/Caciques e Associação	Apresentar as etapas do SAA	Ata	Sim
Reunião CTIPCT	24/nov	Lideranças Indígenas, Fundação Renova, FUNAI e membros da CTIPCT	Pautas diversas	Ata	Sim
Estudo Hidrogeológico	16/dez	PG03/Caciques e Associação	Apresentar etapas do estudo	Ata	Sim
Reparação integrada (indenização) – TI Comboios	30/nov	PG002, 003, Jurídico, Lideranças Indígenas e Indígenas	Assinatura dos termos de quitação pendentes	Termos Assinados	Sim.

### 3.2 TI TUPINIQUIM/GUARANI – CONTEXTUALIZAÇÃO

A Terra Indígena Tupiniquim, situada ao sul da TI Comboios, no município de Aracruz/ES, também foi demarcada e homologada pelo Decreto Presidencial de 05 de novembro de 2010, abrangendo uma área de 14.282 hectares. Se divide em nove

aldeias; quatro delas são compostas pela etnia tupiniquim (Aldeia de Caieiras Velha, Aldeia Pau-Brasil, Aldeia Irajá e Aldeia Areal), e quatro pela etnia guarani (Aldeia Olhos d'Água, Aldeia Boa Esperança, Aldeia Três Palmeiras e Aldeia Nova Esperança). Existe ainda a aldeia mista na TI, composta pelas duas etnias (Aldeia Amarelos).

Já a Terra Indígena Caieiras Velha II, homologada por decreto presidencial em 20/04/2004 tem um território de 57 hectares, que constituída pela Aldeia Piraqueçu, composta pela etnia Guarani.<sup>2</sup>

A Fundação adota a denominação “TI Tupiniquim Guarani” em referência ao conjunto das duas Terras Indígenas.

### 3.2.1 Ações emergenciais

As atividades realizadas neste eixo são voltadas às ações de mitigação, vulnerabilidades e aos riscos associados para povos e comunidades tradicionais identificadas no TTAC, conforme a **Tabela 3.2.1**.

**Tabela 3.2.1– Ações do eixo emergencial desenvolvidas no Trimestre**

AÇÕES ESTRUTURANTES TI TUPINIQUIM/GUARANI	
Ações	Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)
	Programa de Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos - (PMQQS)

#### 3.2.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)

O pagamento de Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) é efetivado às famílias indígenas das terras indígenas Tupiniquim/Guarani como parte do acordo renovado em 2020 entre a Comissão de Caciques, as associações indígenas e a Fundação Renova. Está previsto o atendimento de até 1.350 famílias desde que atendam os critérios estabelecidos no acordo vigente.

Mensalmente, realiza-se o pagamento de 1 (um) salário-mínimo por titular de cada família atendida, acrescido 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo

---

<sup>2</sup> Fonte: ECI – Polifônicas.

por dependente e adicionado o valor de uma cesta básica para cada família. O valor da cesta básica é cotado por estimativa apresentada pelo DIEESE. No acordo, também é previsto o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal, repassado às associações a título de cobertura de seus gastos administrativos. Os valores são repassados no dia 15 (quinze) de cada mês para as 07 associações indígenas atendidas:

- Associação Tupiniquim Guarani da Aldeia de Amarelos (AITUGUAA)
- Associação Indígena Tupiniquim da Aldeia de Pau Brasil (AITUPIAPABRA)
- Associação Indígena Tupiniquim da Aldeia Irajá (AITUPAIRA)
- Associação Indígena Tupiniquim da Aldeia (AITAA)
- Associação Indígena Mboapy Pindó (AIG)
- Associação Indígena Tupiniquim e Guarani (AITG)
- Associação Indígena Tupiniquim de Caieiras Velhas (AITCV)

Mensalmente, realiza-se o pagamento de 1 (um) salário-mínimo por titular de cada família atendida, acrescido 20% (vinte por cento) do valor de um salário-mínimo por dependente e adicionado o valor de uma cesta básica para cada família. O valor da cesta básica é cotado por estimativa apresentada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) conforme o parâmetro para a capital Vitória (ES). No acordo, também é previsto o acréscimo de 5% (cinco por cento) do valor total mensal, repassado às associações a título de cobertura de seus gastos administrativos. Os valores são repassados no dia 15 (quinze) de cada mês.

**Quadro 3.1.1.1 Indicador de atendimento do acordo ASE – Acordo 2021**

Ação	Nº Previsto	Nº Realizado	% Realizado
Pagamento mensal do ASE	1.350	1.349	99,9

O detalhamento do atendimento por associação é apresentado na **Tabela 3.2.1.1.**

**Tabela 3.2.1.1 – Número de titulares e dependentes que receberam ASE no Trimestre – Tupiniquim/Guarani**

Associações	Outubro		Novembro		Dezembro	
	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.	Titulares	Dep.
AITUGUAA	57	84	57	84	57	84
AITUPIAPABRA	278	432	278	435	278	435
AITUPAIRA	164	313	164	314	164	316
AITAA	56	116	56	116	56	116
AIG	56	122	56	122	56	120
AITG	719	1383	719	1378	719	1367
AITCV	19	30	19	30	19	30
<b>TOTAL</b>	<b>1.349</b>	<b>2.480</b>	<b>1349</b>	<b>2.479</b>	<b>1.349</b>	<b>2.468</b>

Ao longo deste ano, os casos de nascimentos são computados como novos dependentes, conforme envio de solicitação, documentação comprovatória de vínculo com o titular.

É importante ressaltar que as associações possuem autonomia para a sua organização administrativa e a integração com seus membros, e podem excluí-los ou adicioná-los conforme sua governança, respeitando-se os critérios de elegibilidade previstas no acordo vigente.

Cabe às associações realizar a prestação de contas junto a Fundação Renova por meio da entrega de recibos coletivos (a associação recebe todos os meses um recibo da Fundação Renova constando o quantitativo de famílias, dependentes, cesta básica e o valor dos 5%) e individuais (cabe às associações encaminhar mensalmente para a Fundação Renova os recibos os valores repassados às famílias). A ausência da entrega

dos recibos pode acarretar suspensão do repasse à associação e, conseqüentemente, às famílias.

### 3.2.1.2 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)

Conforme apresentado em relatório anterior, para a região da TI TG, os pontos dos grupos Zona Costeira e Estuarina que estão próximos à mesma, são apresentados na tabela abaixo. Em todos os pontos de monitoramento da zona costeira são coletadas amostras em duas profundidades: superfície (15 cm abaixo da superfície do mar) e fundo (50 cm acima do leito submarino). Já nas regiões estuarinas, se houver diferença significativa de condutividade, entre o medido na superfície e o medido no fundo, significa que a coluna d'água está estratificada. Neste caso são feitas coletas de água na superfície e no fundo. Se não houver estratificação, será coletada água só no fundo. Ou seja, a partir de fevereiro as coletas P15 e P50 não serão mais fixas como anteriormente, vai depender da estratificação da condutividade, inferior a 10.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$  coleta de água na profundidade de 50cm (P50). Estas profundidades permitem avaliar a influência da pluma de sedimentos do rio sobre as camadas superficial e de fundo, que podem ser influenciadas de forma diferente por este fator e pela ressuspensão de sedimentos do fundo provocada por processos meteoceanográficos. Os pontos do grupo Zona Costeira indicam apenas a posição em relação à costa e serão deslocados em direção ao mar para coincidirem com a isóbata de 10 m durante a primeira campanha de campo.

**Tabela 3.2.1.2 – Pontos de Amostragem do PMQQS**

Código	Nome do Ponto	Latitude	Longitude
EPA 01R *	Estuário Piraquê-Açú 01R	-19,9502	-40,1561
EPA 02R *	Estuário Piraquê-Açú 02R	-19,92863	-40,17543

\* Os pontos realocados foram renomeados conforme sua disposição no corpo hídrico, de modo que o ponto realocado recebeu a letra R ao seu código. O deslocamento destes pontos ocorreu, pois se encontravam em áreas instáveis, rasas, em bancos de areia ou sob forte influência de corrente de maré.

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referente do monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço é <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da>

agua/> no qual estão disponíveis os boletins trimestrais de lagoas, zona costeira e estuários até junho de 2021. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma online interativa.

Ressalta-se que os dados referentes aos meses de 2021 que não estão disponíveis online serão adicionados conforme ocorra a sua validação e poderão ser consultados de forma pública a partir de sua publicação, que pode ocorrer antes da elaboração de novo Relatório Trimestral.

### 3.2.1.3 Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre

**Quadro 3.2.1.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação  
Renova com ações realizadas no Trimestre**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Financeiro	ASE	3.2.1.1
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQQS	3.2.1.2

### 3.2.2 Ações transitórias

As ações transitórias previstas no escopo do PG 03 para a terra indígena Tupiniquim/Guarani têm por objetivo promover a articulação com órgãos reguladores a realização dos estudos de impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais.

**Quadro 3.2.2 – Ações do eixo transitório desenvolvidas no trimestre**

AÇÕES TRANSITÓRIAS	
Ações	Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)
	Fundo de Apoio a Iniciativas Comunitárias (FAIC)
	Projeto Lótus

O detalhamento das ações transitórias será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

### 3.2.2.1 Detalhamento do Plano Básico Ambiental Indígena (PBAI)

A consultoria independente para o detalhamento do PBAI voltado às Terras Indígenas Tupiniquim Caieiras Velhas II e Comboios, em Aracruz (ES) foi contratada em maio de 2021.

Em setembro após a informação técnica nº105/2021/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI foi realizada a reunião de consulta de validação do Plano de Trabalho para detalhamento dos programas do PBAI. A reunião contou com a participação das lideranças indígenas pertencentes a Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani, FUNAI e Fundação Renova.

Em outubro, por solicitação do cacique de Três Palmeiras, foi realizada uma nova reunião de apresentação do Plano de Trabalho. Esse encontro foi realizado com a presença da consultoria independente e lideranças indígenas de Três Palmeiras.

Data	Local	Tema da Oficina
07.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Levantamento geral e explicação do PBAI
13.10.2021	AITG	Discussão sobre programas, impactos e medidas
18.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Cultura e Socioeconomia
21.10.2021	Aldeia Córrego do Ouro	Discussão geral sobre impactos e medidas
21.10.2021	AITG	Retomada Econômica e Fundo de Projetos
22.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Caminhada pela aldeia e discussão sobre possíveis projetos nas diferentes eixos

Data	Local	Tema da Oficina
25.10.2021	Aldeia Três Palmeiras	Caminhada na aldeia para avaliação de projetos do eixo de socioeconomia
26.10.2021	Aldeia Comboios	Discussão sobre a relação entre impactos e medidas
08.11.2021	AITG	Gestão do PBAI, Retomada Econômica e Fundo de Projetos
09.11.2021	AITC	Saúde, Proteção Social e Fundo de Projetos
10.11.2021	AITG	Meio Ambiente
11.11.2021	AITG	AGRICULTURA
12.11.2021	AITC	Meio Ambiente
16.11.2021	AITC	Etnoturismo e Artesanato
17.11.2021	AITG	Reestruturação do Pescado
17.11.2021	Três Palmeiras	Associação; Retomada Econômica; Fundo de Projetos; Programas Estruturantes
17.11.2021	Aldeia Pau Brasil	Explicação geral sobre os eixos e discussão sobre a relação entre impactos e medidas
18.11.2021	Aldeia Córrego do Ouro	Agricultura
19.11.2021	Aldeia Irajá	Explicação geral sobre os eixos e discussão sobre a relação entre impactos e medidas
19.11.2021	Aldeia Areal	Explicação geral sobre os eixos e discussão sobre a relação entre impactos e medidas

Data	Local	Tema da Oficina
20.11.2021	Aldeia Boa Esperança	Retomada econômica, Fundo de Projetos, Programas Estruturantes e Reparação Integral
21.11.2021	Aldeia Nova Esperança	Abordagem de todos os eixos
22.11.2021	Aldeia Guarani de Olho D'água	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
22.11.2021	Aldeia Piraquê Açú	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
23.11.2021	AITC	Cultura e Sociabilidade
24.11.2021	AITC	Reestruturação do Pescado
24.11.2021	Aldeia Piraquê Açú	Fundo de Projetos
24.11.2021	Aldeia Nova Esperança	Organização das demandas nos diferentes eixos
26.11.2021	Aldeia Piraquê Açú	Cultura, Sociabilidade e Socioeconomia
27.11.2021	Aldeia Guarani de Olho D'água	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
01.12.2021	Aldeia Guarani de Olho D'água	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
01.12.2021	Aldeia Boa Esperança	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.
07.12.2021	AITG	Educação, Cultura e Sociabilidade
10.12.2021	Aldeia Irajá	Discussão geral dos eixos. Aprofundamento de demandas.

Data	Local	Tema da Oficina
10.12.2021	AITG	Saúde, Proteção Social e Artesanato
13.12.2021	AITG	Etnoturismo

A partir dessas reuniões, as lideranças indígenas da TI Tupiniquim Guarani autorizaram o início das oficinas para detalhamento dos projetos. As oficinas iniciaram logo após o processo de consulta do Plano de Trabalho, e ocorreram nos meses de novembro e dezembro.

O plano de trabalho final foi encaminhado para a Funai em dezembro de 2021 por meio do ofício FR.2021.2013 (Anexo 3.1.2.1 b).

A consultoria independente está trabalhando no documento de detalhamento dos programas a partir das oficinas realizadas nos territórios indígenas. Será realizada apresentação do trabalho construído com os indígenas para validação antes do protocolo à FUNAI.

### **3.2.2.2 Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC**

O Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias – FAIC, tem por objetivo, apoiar pequenos projetos comunitários são realizados pelos indígenas em seu território, ou que sejam de interesse das comunidades indígenas. Os projetos propostos pelas comunidades indígenas das aldeias Amarelos, Areal, Irajá, Três Palmeiras, Boa Esperança, Piraqueçu, Pau Brasil, Olhos D’água, Nova Esperança, e Caieiras Velhas, focaram nos temas: **Saúde, Proteção Social, Geração de renda, Cultura, Meio ambiente e Educação**. Os temas dos projetos encaminhados são apresentados no **Quadro 3.2.2.2**

**Quadro 3.2.2.2 Projeto TI's Caieiras Velhas II e Tupiniquim e Guarani.**

Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS
Tupiniquim e Guarani	Amarelos	Enriquecimento de quintais	Agricultura	Fome Zero e Agricultura Sustentável
		Reforma de espaço coletivo (cabana)	Cultura	Redução das Desigualdades
	Areal	Aquisição de equipamentos de costura e despoldadora de frutas	Geração de renda	Redução das Desigualdades
		Aquisição de equipamentos para associação	Proteção Social	Redução das Desigualdades
	Irajá	Aquisição de equipamentos para UBSI	Saúde	Saúde e Bem-Estar
		Pintura e Aquisição de equipamentos para UBSI	Saúde	Saúde e Bem-Estar
	Três Palmeiras	Enriquecimento de quintais e criação de aves	Agricultura	Fome Zero e Agricultura Sustentável
		Aquisição de equipamentos para associação	Proteção Social	Redução das Desigualdades
	Boa Esperança	Reforma de espaço coletivo (cabana)	Cultura	Redução das Desigualdades
		Equipamentos UBSI	Saúde	Saúde e Bem-Estar
	Piraqueaçu	Fortalecimento do Turismo na aldeia Piraqueaçu	Cultura	Redução das Desigualdades
		Fortalecimento do Turismo na aldeia Piraqueaçu	Cultura	Redução das Desigualdades
	Pau Brasil	Grafismo Escola e UBSI	Saúde e educação	Saúde e Bem-Estar
		Aquisição de equipamentos UBSI	Saúde	Saúde e Bem-Estar
	Olho D'água	Reforma do Portal da aldeia	Proteção Territorial	Redução das Desigualdades


Terra Indígena	Aldeia	Projeto	Linha temática	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS
		Reforma de espaço coletivo (cabana)	Cultura	Redução das Desigualdades
	Nova Esperança	Reforma da associação e Ponto de apoio à Saúde Indígena	Proteção Social/Saúde	Saúde e Bem-Estar
		Fortalecimento dos coletivos de agricultura, mulheres, jovens e audiovisual da aldeia	Cultura	Redução das Desigualdades
	Caieiras Velhas	Reforma UBSI	Saúde	Saúde e Bem-Estar
		Aquisição de materiais para reforma UBSI	Saúde	Saúde e Bem-Estar

Correlacionando os projetos apresentados pelas comunidades indígenas da TI Caieiras Velhas e Tupiniquim e Guarani, destacam-se os seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

- 1) Saúde e Bem-Estar - 08 projetos;
- 2) Redução das Desigualdades - 10 projetos;
- 3) Fome Zero e Agricultura Sustentável - 02 projetos.

Os temas dos projetos submetidos são apresentados no **Gráfico 3.2.2.2**

**Gráfico 3.2.2.2 – Projetos FAIC e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS**



Até o mês de dezembro 08 projetos finalizaram a 1ª etapa de execução apresentando a documentação de prestação de contas e solicitando a liberação da 2ª parcela. As atividades foram executadas de acordo com o planejamento dos projetos aprovados. O status desses projetos serão apresentados na sequência.

Considerando o eixo agricultura foram iniciados 02 projetos na TI Tupiniquim e Guarani que apoiavam as ações voltadas a produção agrofamiliar (aldeias Amarelos e Três Palmeiras).

O projeto de agricultura elaborado para aldeia Três Palmeiras previa a distribuição de mudas de espécies frutíferas à 03 famílias indígenas e a aquisição de um motor bomba para ser utilizado na irrigação das mudas. As atividades desenvolvidas são ilustradas na **Fotografias 3.2.2.2-1 à 3.2.2.2-4**.



Fotografia 3.2.2.2-1 – Mudas - Projeto Enriquecimento de Quintais.



Fotografia 3.2.2.2-2 – Mudas e motor bomba - Projeto Enriquecimento de Quintais.



Fotografia 3.2.2.2-3 – Mudas projeto enriquecimento de quintais – Aldeia Três Palmeiras.



Fotografia 3.2.2.2-4 – Mudas projeto enriquecimento de quintais – Aldeia Três Palmeiras.

O projeto de Fortalecimento da Agricultura da aldeia Amarelos tinha por objetivo melhorar a qualidade do solo utilizando adubo orgânico, além de adquirir espécies frutíferas para o enriquecimento de quintais. Na 2ª fase do projeto a área de plantio de aroeira será ampliada por meio da aquisição de novas mudas, a adubação e preparo do solo em áreas degradadas previamente escolhidas pela comunidade indígena.

Nesta primeira fase do projeto foram adquiridos o adubo, as mudas de citrus, palmito pupunha e coco. As mudas de aroeira serão adquiridas na próxima etapa do projeto. O desenvolvimento da atividade está ilustrado nas **Fotografias 3.2.2.2-5 a 3.2.2.2-8**



Fotografia 3.2.2.2-5 – Entrega de adubo – Aldeia Amarelos.



Fotografia 3.2.2.2-6 – Entrega de adubo – Aldeia Amarelos.



Fotografia 3.2.2.2-7 – Entrega de adubo – Aldeia Amarelos.



Fotografia 3.2.2.2-8 – Entrega de mudas – Aldeia Amarelos.

Para o mês de dezembro ainda destacam-se os projetos que possuem interface com o objetivo do desenvolvimento Sustentável Redução da desigualdade. São projetos dos eixos temáticos Cultura, Proteção Territorial e Geração de Renda. As ações desenvolvidas no âmbito desses projetos estão ilustradas nas **Fotografias 3.2.2.2-9 a 3.2.2.2-18**.



Fotografia 3.2.2.2-9 – Reforma da Cabana de Cultura – aldeia Amarelos



Fotografia 3.2.2.2-10 – Reforma da Cabana de Cultura – aldeia Amarelos



Fotografia 3.2.2.2-11 –Aquisição de Freezer – Aldeia Areal.



Fotografia 3.2.2.2-12 –Aquisição de despoldadora de frutas - Aldeia Areal



Fotografia 3.2.2.2-13 – Projeto Reforma das Cabanas – Aldeia Pau Brasil.



Fotografia 3.2.2.2-14 – Projeto Reforma das Cabanas – Aldeia Pau Brasil.



Fotografia 3.2.2.2-15 – Instalação do Portal– Aldeia Olho D'Água.



Fotografia 3.2.2.2-16 – Instalação do Portal– Aldeia Olho D'Água.



Fotografia 3.2.2.2-17 – Aquisição de material de informática Associação Indígena Guarani Kaagwy Porã (AIGKP).



Fotografia 3.2.2.2-18 – Aquisição de material de informática Associação Indígena Guarani Kaagwy Porã (AIGKP).

Os projetos apresentados pelas comunidades indígenas da TI Caieiras Velhas/Tupiniquim Guarani ainda estão em andamento. No mês de dezembro foram apresentados as prestações de contas de 08 projetos. Após a análise e aprovação foi solicitada a liberação da 2ª parcela de recurso dos projetos. A equipe do PG 03 vem acompanhando a execução e apoiando a realização das atividades conforme demanda do proponentes.

### 3.2.2.3 Projeto Lótus

O Projeto Lótus tem por objetivo apoiar a formação de lideranças e o estabelecimento de uma Rede de Jovens atuantes na busca de soluções aos problemas identificados em suas comunidades ou regiões.

É um Projeto de Educação Socioambiental e Tecnológico que oferece aos jovens, a oportunidade de descobrir seu potencial de liderança por meio de ações que desenvolvam o pertencimento ambiental, o olhar jovem para a realidade de sua comunidade e a construção de projetos socioambientais. As oficinas formativas abordam diversos temas ambientais relacionando-os com os desafios encontrados para revitalização da bacia do Rio doce

Para o período deste relatório as ações foram desenvolvidas de maneira remota, na modalidade de Ensino à Distância – EAD. Atualmente estão matriculados no projeto 12 jovens indígenas das Tis de Aracruz, destes 01 é da TI Caieiras Velhas II.,

**Tabela 3.2.2.3 – Ações do Projeto Lótus desenvolvidas no trimestre**

<b>Tema do Encontro Virtual</b>	<b>Data</b>
<b>Oficina de Projetos</b>	06/10
<b>Oficina de Projetos</b>	13/10
<b>Oficina de Projetos</b>	20/10
<b>Oficina de Projetos</b>	27/10
<b>Aula de Robótica</b>	04 e 05/10
<b>Aula de Robótica</b>	11/10
<b>Aula de Robótica</b>	18 e 19/10
<b>Aula de Robótica</b>	25 e 26/10
<b>Mentoria junto aos Jovens para escrita dos Projetos</b>	Ao longo de todo mês de Outubro e Novembro
<b>Aula de Robótica</b>	08 e 09/11
<b>Aula de Robótica</b>	16/11
<b>Aula de Robótica</b>	29/11
<b>Mentoria para elaboração da Apresentação dos Projetos para Banca</b>	28/11 a 09/12
<b>Banca de Projetos</b>	01/12
<b>Banca de Projetos</b>	02/12
<b>Banca de Projetos</b>	08/12
<b>Banca de Projetos</b>	09/12

As ações do Projeto Lótus são desenvolvidas no âmbito do PG 33 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em interface com o PG 03 - Programa de Povos Indígenas.

### 3.2.2.4 Interfaces das ações transitórias consolidadas no Trimestre

**Quadro 3.2.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre**

Área	Programas FR com interface - PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional da FR	Saúde e Segurança/ADMCT	PBAI	3.1.2.2
Funcional da FR/Comunicação	Suprimentos	FAIC	3.2.2.3
Socioeconômico	PG-33	Projeto Lótus	3.2.2.4

### 3.2.3 Ações estruturantes

As ações previstas no eixo estruturante são voltadas a elaboração, execução e monitoramento dos planos de ações permanentes; que visam garantir o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades atendidas e em paralelo a todos as fases do processo de reparação.

**Quadro 3.2.3 – Ações do eixo estruturante desenvolvidas no Trimestre**

AÇÕES ESTRUTURANTES TI TUPINIQUIM/GUARANI	
Ações	Reparação integrada
	Elaboração de projeto de SAA
	Projeto Rede de Sementes e mudas do rio Doce

#### 3.2.3.1 Reparação Integrada

Em 22.10.2021 foi assinado o acordo Tupiniquim Guarani entre as Associações Indígenas, Comissão de Caciques Tupiniquim Guarani, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU).

O acordo foi homologado na 12ª Vara Cível e Agraria da SJMG em 15.12.2021. O pagamento da guia judicial ocorreu no dia 23.12.2021. Foi peticionado em conjunto com a guia a informação sobre os termos que estavam aptos<sup>3</sup> para serem resgatados pelas associações indígenas.

É importante ressaltar, conforme acordo assinado, que o preenchimento de termos de quitação familiar é de responsabilidade das associações indígenas. Cabendo a Fundação Renova a conferência de conformidades dos termos preenchidos. Em 12.11.2021 foi assinado o acordo Moaby Pindó entre Associação Indígena Guarany Moaby Pindó, Cacique da aldeia de Três Palmeiras, Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo (DPE) e Defensoria Pública da União (DPU).

Entre os dias 25/11 e 30/11 a Fundação Renova realizou, com o acompanhamento das lideranças indígenas de Três Palmeiras a coleta de assinatura dos termos de quitação familiar. O cacique da Aldeia Três Palmeiras foi o responsável pela tradução do termo de quitação para os titulares não falantes do idioma português. O acordo foi homologado na 12ª Vara Cível e Agraria da SJMG em 15.12.2021. O pagamento da indenização ocorreu no dia 23.12.2021 para as famílias aptas<sup>4</sup> para o pagamento.

É importante esclarecer que foram realizado dois acordos, devido a uma solicitação das lideranças indígenas de Três Palmeiras, que não quiseram aderir ao acordo junto a Comissão e Caciques.

### **3.2.3.2 Elaboração de projeto de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)**

No início de dezembro de 2021 foi iniciado o serviço de levantamento geofísico em campo, na aldeia de Amarelos. Na sequência, o serviço será realizado na aldeia Pau Brasil, Nova Esperança e Olhos d'Água. Os serviços estão sendo acompanhados por um geólogo da SESAI.

---

<sup>3</sup> O processo de elegibilidade da indenização tem como premissa: 1) famílias beneficiárias do ASE; 2) famílias que apresentaram os documentos pessoais (Documento de identificação e CPF para maiores de 18 anos, e contas bancárias dos titulares; 3) famílias que não possuem ação judicial ou que apresentaram a renúncia da ação judicial; 4) preenchimento do termo de quitação corretamente pelas associações indígenas.

<sup>4</sup> O processo de elegibilidade da indenização tem como premissa: 1) famílias beneficiárias do ASE; 2) famílias que apresentaram os documentos pessoais (Documento de identificação e CPF para maiores de 18 anos, e contas bancárias dos titulares; 3) famílias que não possuem ação judicial ou que apresentaram a renúncia da ação judicial.

### 3.2.3.3 Projeto Rede de Sementes e Mudanças do Rio Doce

As ações do projeto Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce, sob responsabilidade dos programas PG26 e PG27, estão sendo redesenhadas para atender aos novos critérios de segurança e saúde devido a pandemia do Covid-19.

Buscando esclarecimentos sobre o status do projeto e acompanhamento das ações a serem desenvolvidas, a FUNAI solicitou o agendamento de uma reunião de esclarecimentos junto aos responsáveis pelo projeto. Em concordância, a Fundação Renova ressaltou a importância desse diálogo tendo em vista o necessário alinhamento sobre a interação com a comunidade, inserção de novos integrantes, contextualização e status das atividades desenvolvidas (por meio de interação remota e virtual), dentre outros pontos, tendo o PG03 atuado apenas como interlocutor do projeto e apoio na apresentação entre FUNAI e a Rede de Sementes e Mudanças da Bacia do Rio Doce. Cabe destacar que, o projeto Rede de Sementes é uma das vias possíveis de projetos no Programa de Retomada Econômica, visando a reparação integrada. Dessa forma, foi realizada reunião com a FUNAI, com o objetivo de esclarecer o projeto de protagonismo dos PGS 26 e 27. A Fundação Renova aguarda a autorização da FUNAI para a retomada das ações presenciais junto aos grupos coletores.

Enquanto não há a sinalização da FUNAI para a retomada das atividades presenciais, são desenvolvidas atividades on-line para capacitação dos agentes multiplicadores, coletores e técnicos das casas de sementes.

### 3.2.3.4 Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre

**Quadro 3.2.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no trimestre**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Socioeconômico	PG-02/ Jurídico	Reparação Integrada	3.2.3.1
Socioambiental	PG-26; PG-27	Projeto Rede de Sementes	3.2.3.3
Funcional da FR	Engenharia	Elaboração de projeto	3.2.3.2

### 3.2.5 Agenda

#### 3.2.5.1 Agenda de ações realizadas no trimestre

**Quadro 3.2.5.1 – Agenda de ações realizadas no trimestre**

Reunião	Data	Programas/ áreas vinculadas	Objetivo da reunião	Evidência	Objetivo alcançado
Reparação Integrada– Indenização TG	05/11	PG003 e AITG	Alinhamento sobre a planilha do ASE/Indenização	Gravação	Sim
40ª Reunião CTIPCT	24/11	PG003, FUNAI, Lideranças Indígenas, e membros da CTIPCT	Apresentar temas relacionados a Reparação dos Povos Indígenas TG	Gravação/ATA	Sim
Termos de quitação AIG	25/11 até 30/11	PG003, PG002, Jurídico, Lideranças Indígenas de Três Palmeiras e famílias beneficiárias do ASE AIG	Assinatura dos termos de quitação por família da AIG	Termos de Quitação Assinados	Sim
Reparação Integrada	21/12	PG003, PG002, Jurídico Renova, Jurídico Indígenas, Comissão de Caciques e Associações	Esclarecimentos sobre o processo indenizatório	Gravação	Sim
Reparação Integrada	22/12	PG003, PG002, Jurídico Renova, Jurídico	Esclarecimentos sobre o processo indenizatório	Gravação	Sim

Reunião	Data	Programas/ áreas vinculadas	Objetivo da reunião	Evidência	Objetivo alcançado
		Indígenas, Comissão de Caciques e Associações			
Reparação Integrada- AITG	27/12	PG003, PG002, Jurídico Renova, Jurídico Indígenas, Comissão de Caciques e Associações	Alinhamento sobre termos em Não Conformidades	Gravação	Sim
Reparação Integrada- Amarelos	27/12	PG003, PG002, Jurídico Renova, Jurídico Indígenas, Comissão de Caciques e Associações	Alinhamento sobre termos em Não Conformidades	Gravação	Sim
Reparação Integrada- Pau Brasil	29/12	PG003, PG002, Jurídico Renova, Jurídico Indígenas, Comissão de Caciques e Associações	Alinhamento sobre termos em Não Conformidades	Gravação	Sim

### 3.3 TI KRENAK – CONTEXTUALIZAÇÃO

A Terra Indígena Krenak foi homologada por meio do Decreto S/N 19/04/2001. Fica localizada no município de Resplendor (MG) e possui uma área total de 4.000 (ha) demarcados. Encontra-se regularizada, tendo sido registrada no Serviço Patrimônio da União (SPU). A organização sociopolítica se estrutura em 8 (oito) grupos: **Atorãñ, Bakan, Borum Ererré, Krenak, Nak Nenuk, Nakrerré, Takruk e Uatú.**

#### 3.3.1 Ações emergenciais

As atividades realizadas no eixo emergencial são voltadas as ações de mitigação às vulnerabilidades e riscos associados para povos indígenas no âmbito do TTAC, conforme o **Quadro 3.3.1.**

**Quadro 3.3.1 – Ações do eixo emergencial desenvolvidas no trimestre**

AÇÕES EMERGENCIAIS TERRITÓRIO	
Ações	3.3.1.1 Auxílio financeiro extra emergencial de Subsistência
	3.3.1.2 Fornecimento de água mineral
	3.3.1.3 Fornecimento de água bruta e potável
	3.3.1.4 Processo concorrencial participativo dos caminhões-pipas
	3.3.1.5 Fornecimento de suplementação bovina
	3.3.1.6 Manutenção das vias de acesso
	3.3.1.7 Obras de melhoria nos acessos (08 pontos críticos)
	3.3.1.8 Programa de Monitoramento da Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS)

O detalhamento das ações emergenciais será apresentado nos itens subsequentes desse relatório.

### 3.3.1.1 Auxílio financeiro extra emergencial de subsistência

O pagamento de **auxílio financeiro extra emergencial de subsistência** é efetivado às famílias indígenas do território Krenak como parte do Acordo realizado entre lideranças das comunidades e Vale S.A em novembro de 2015, o qual foi posteriormente incorporado ao Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (“TTAC”). Os valores firmados no Acordo são pagos às associações indígenas, que têm a responsabilidade de efetuar o repasse às famílias atendidas.

O auxílio financeiro extra emergencial de subsistência é direcionado às 8 (oito) associações indígenas Krenak, cabendo a cada uma delas repassar às famílias do seu grupo. Conforme previsto no acordo Vale-Krenak, cada família recebe mensalmente o equivalente a 9 (nove) vezes o valor do salário-mínimo vigente. Em sua totalidade, o pagamento do auxílio financeiro extra emergencial de subsistência é direcionado à 137 (cento e trinta e sete) famílias.

Na **tabela 3.3.1.1** abaixo é demonstrado o levantamento quantitativo das famílias atendidas e o valor mensal recebido pelas associações para repasse. Devido à não alteração dos valores do salário-mínimo no Brasil (2021), a tabela representa os pagamentos efetivados em julho, agosto e setembro de 2021

**Tabela 3.3.1.1 Pagamento financeiro às associações indígenas Krenak**

Associação	Número de famílias	Salário-Mínimo base	Número de salários-mínimos	Valor total (mensal)	Valor total pago no trimestre (jul, ago, set)
ATORÃN	31	R\$ 1.100,00	9	R\$ 306.900,00	R\$ 920.700,00
BAKAN	10	R\$ 1.100,00	9	R\$ 99.000,00	R\$ 297.000,00
BURUM ERERRE	17	R\$ 1.100,00	9	R\$ 168.300,00	R\$ 504.900,00
KRENAK	18	R\$ 1.100,00	9	R\$ 178.200,00	R\$ 534.600,00
NAKNENUK	12	R\$ 1.100,00	9	R\$ 118.800,00	R\$ 356.400,00
NAKERRE	11	R\$ 1.100,00	9	R\$ 108.900,00	R\$ 326.700,00
TAKRUK	11	R\$ 1.100,00	9	R\$ 108.900,00	R\$ 326.700,00
UATU	27	R\$ 1.100,00	9	R\$ 267.300,00	R\$ 801.900,00
<b>Total</b>	<b>137</b>			<b>R\$ 1.356.300,00</b>	<b>R\$ 4.068.900,00</b>


### 3.3.1.2 Fornecimento de água mineral

O fornecimento de água mineral para o povo Krenak se insere na Cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC). A Fundação Renova disponibiliza 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa por dia. O volume de água mineral distribuído considera o total de 600 (seiscentas) pessoas, conforme o Acordo Vale-Krenak.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, foi adotada a entrega de água mineral a cada 4 (quatro) dias, sem comprometer o volume total previsto de entrega a cada beneficiário. Todo o quantitativo previsto foi executado. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no **Anexo 3.3.1.2**.

A quantidade em litros (L) de água mineral fornecida no trimestre de outubro, novembro e dezembro aos beneficiários da TI Krenak, está representado no **Gráfico 3.3.1.2**.

**Gráfico 3.3.1.2 - Indicador de progresso para o fornecimento de água mineral na T.I. Krenak – Outubro, Novembro e Dezembro.**

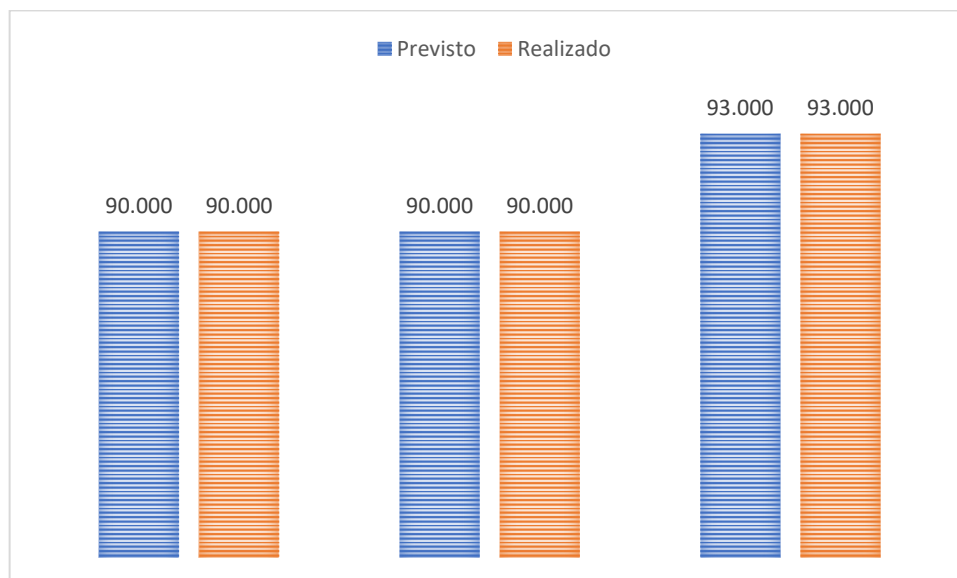

A localização dos pontos de entrega de água na TI Krenak são apresentados no **Mapa 3.3.1.2**.



### 3.3.1.3 Fornecimento de água bruta e potável

A distribuição de água bruta e potável é realizada na TI Krenak pela empresa Linear por meio de caminhões-pipa. O quantitativo de água potável e bruta é, em média, de 1.000 (um mil) litros (cada) ao dia, distribuídos em 174 (cento e setenta e quatro) pontos de abastecimento (potável) e em 103 (cento e três) pontos de abastecimento (bruta). O abastecimento de água ao povo Krenak, vale lembrar, está inserido na Cláusula 43 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

Devido à resistência da comunidade indígena quanto ao registro fotográfico do hidrômetro eletrônico (instalado no caminhão pipa) e do local de abastecimento, o que supriria a necessidade de assinatura de recibos e evitaria o contato próximo entre entregador e beneficiário, houve em maio/2020 uma alteração no formato de comprovação de abastecimento, passando a ser realizado por meio de registro fotográfico do hidrômetro antes e após a entrega de água bruta e potável na terra indígena, não sendo possível determinar com exatidão o quantitativo individual de volume de água entregue.

É importante frisar que o abastecimento de água potável é realizado sob demanda, conforme volume disponível na caixa d'água quando da reposição diária, podendo influenciar em alterações no fornecimento mensal (m<sup>3</sup>) e diferença entre o previsto e o realizado. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no **Anexo 3.3.1.3**.

**Tabela 3.3.1.3: Média do fornecimento de água bruta e potável na T.I. Krenak.**

Tipo/Mês	Outubro	Novembro	Dezembro
Potável (m <sup>3</sup> )	4.284	3.795	3.467
Bruta (m <sup>3</sup> )	1.720	1.375	1.307

### 3.3.1.4 Processo concorrencial participativo dos caminhões-pipas

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração.

### 3.3.1.5 Fornecimento de suplementação bovina

O fornecimento de suplementação bovina também está previsto no TTAC, Cláusula 43, conforme a seguir descrito: a) fornecimento mensal de 21 sacos de ração por família (total de 108 famílias); b) fornecimento mensal de alimentação volumosa, de 2,4 toneladas por família (total de 100 famílias); e c) fornecimento mensal de 3 (três) sacos de sal mineral por família (total de 100 famílias).

As ações de bovinocultura foram executadas em sua totalidade, conforme previsto para o período deste relatório, e continuam sendo realizadas. Os comprovantes de entrega estão disponíveis no **Anexo 3.3.1.5**.

**Tabela 3.3.1.5 - Suplementação bovina por mês e indicadores de progresso.**

Produto	Nº de famílias	Quantidade por família	Total distribuído		
			Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Ração</b>	108	21 sacos*	2.268 sacos	2.268 sacos	2.268 sacos
<b>Sal mineral</b>	100	3 sacos**	300 sacos	300 sacos	300 sacos
<b>Silagem de milho</b>	100	2,4 toneladas	240 toneladas	240 toneladas	240 toneladas

\*Cada saco contém 40 quilos; \*\*Cada saco contém 25 quilos.



### **3.3.1.6 Manutenção das vias de acesso**

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração.

### **3.3.1.7 Obras estruturantes de melhoria nos acessos**

A ação permanece paralisada devido o contexto da pandemia pelo Covid-19.

### **3.3.1.8 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)**

A Fundação Renova criou um link para disponibilizar todas as informações referente do monitoramento, o qual permite a consulta pública dos resultados. O endereço é <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>, no qual estão disponíveis os boletins trimestrais de lagoas, zona costeira e até julho de 2021. A interface de navegação pelos dados dos relatórios é amigável ao usuário e ocorre em uma plataforma online interativa.

Conforme apresentado em relatório anterior, o ponto de monitoramento em Resplendor (MG) próximo a essa Terra Indígena é o Ponto RDO 10, localizado na margem direita do rio Doce, em Resplendor (Coordenadas UTM: 263318,88 leste/ 7861251,39 norte/zona 24 k). Ressalta-se que os dados referentes aos meses de 2021 que não estão disponíveis online serão adicionados conforme ocorra a sua validação e poderão ser consultados de forma pública a partir de sua publicação, que pode ocorrer antes da elaboração de novo Relatório Trimestral.

### 3.3.1.9 Interfaces das ações emergenciais consolidadas no trimestre

**Quadro 3.3.1.9 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
PG03	PG02 – Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)	Pagamento de Auxílio extra emergencial	3.3.1.1
Funcional FR	Infraestrutura	Fornecimento de água mineral, bruta e potável	3.3.1.2 e 3.3.1.3
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Ambiental	PMQQS	3.3.1.7

### 3.3.2 Ações transitórias

As ações transitórias previstas no escopo do PG 03 para a terra indígena Krenak tem por objetivo promover a articulação com órgãos reguladores a realização dos estudos de impactos, bem como o estabelecimento e a efetivação de acordos sociais.

As etapas do Estudo de Impacto do Componente Indígena (ECI) estão paralisadas desde maio de 2017. O plano de trabalho (PT) do ECI elaborado pela empresa Polifônicas foi protocolado na Funai e aprovado pelo órgão indigenista em fevereiro de 2017, Ofício nº 5/2017/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI.

O Povo Krenak, a princípio, sugerira a data da apresentação do PT-ECI para segunda quinzena de maio de 2017 (Ofício nº 7/2017/CORAM/CGGAM/DPDS-FUNAI). No entanto, esse encontro não se consolidou por manifestação do Povo Krenak e, desde então, não houve avanço nas tratativas referentes ao ECI.

### 3.3.3 Ações estruturantes

As ações previstas no eixo estruturante são voltadas a elaboração, execução e monitoramento dos planos de ações permanentes; que visam garantir o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades atendidas e em paralelo a todos as fases do processo de reparação.

### 3.3.3.1 Recuperação de nascentes e áreas degradadas

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração, porque foram paralisadas, devido às medidas de prevenção adotadas contra a Covid-19 – tendo em vista que estas ações não são consideradas essenciais.

### 3.3.3.2 Elaboração de projeto SAA – Sistema de Abastecimento de Água

As Informações enviadas no último relatório permanecem sem alteração.

### 3.3.3.3 Interfaces das ações estruturantes consolidadas no trimestre

**Quadro 3.3.3.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova com ações realizadas no Trimestre**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
-	-	-	-

### 3.3.4 Relacionamento

#### 3.3.4.1 Contratação de Assessoria Técnica (AT) para a Terra Indígena Krenak

Conforme disposto pelo Termo de Ajustamento Preliminar (“TAP”), assinado em 18 de janeiro de 2017, e pelo Termo Aditivo ao TAP, assinado em 16 de novembro de 2017, os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão poderão, se assim desejarem, contar com o apoio de assessorias técnicas independentes para orientá-los e acompanhar os processos de reparação de seus direitos. A Assessoria Técnica Independente (ATI) tem por objetivo geral garantir aos atingidos a sua participação ativa no processo de Reparação Integral, considerando as especificidades de seu território e de sua população, conforme a legislação vigente.

Nesse sentido, o povo indígena Krenak, que é atendido pelo Programa Qualidade de Vida de Povos Indígenas – PG 03, manifestou desejo em contar com o apoio de uma assessoria técnica independente, indicando para esse papel o Instituto de Pesquisas e Ações Sustentáveis (iPAZ). A solicitação de contratação do iPAZ foi definida em reunião realizada na terra indígena Indígena Krenak em 15 de julho de 2019, com a participação de 73 (setenta e três) indígenas, além de representantes do Ministério Público Federal, do Fundo Brasil de Direitos Humanos e da Funai.

O Plano de Trabalho do iPAZ foi submetido ao Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, que autorizou a negociação direta com as empresas (Vale, BHP e Samarco) e Fundação Renova para viabilizar a sua contratação, o que ocorreu em 1º de julho de 2020. Posteriormente, o perito judicial nomeado pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte constatou algumas irregularidades no iPAZ, que inviabilizariam a sua contratação. Diante dessa informação, o juízo da 12ª Vara Federal suspendeu a contratação do iPAZ, e desde então não há assessoria técnica independente específica para o território Krenak.

### **3.3.5 Agendas**

Não houve nenhuma agenda realizada nesse trimestre.

## **4. AÇÕES PLANEJADAS**

### **4.1 TI COMBOIOS**

#### **4.1.1 Ações emergenciais**

##### **4.1.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)**

O Auxílio emergencial foi encerrado. Será realizado ações no território afim de regularização dos recibos pendentes.

##### **4.1.1.2 Distribuição de água mineral**

O fornecimento de água mineral na Aldeia Comboios e na Aldeia Córrego do Ouro continuará ocorrendo no próximo trimestre.

##### **4.1.1.3 Plano de contingência de cheias**

Entrega de novo documento cm as alterações solicitadas.

##### **4.1.1.4 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)**

Previsão de continuidade do monitoramento para o próximo trimestre e consolidação e disponibilização das análises dos meses mais recentes no site <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>.

##### **4.1.1.6 Interfaces para as ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre**

**Quadro 4.1.1.6 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	Plano de Contingência de cheias	4.1.1.3
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQQS	4.1.1.4
Socioambiental	PG 38 – Monitoramento Hídrico	PMQACH	4.1.1.5

#### **4.1.2 Ações transitórias**

##### **4.1.2.1 Projeto Lótus**

Segue prevista a continuidade de realização das próximas etapas do projeto Lótus para a TI Comboios por meio da plataforma EAD.

##### **4.1.2.2 Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias**

Implementação das ações do Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias e gestão das atividades para o próximo trimestre. Acompanhamento técnico e apoio na estruturação das prestações de contas dos Projetos FAIC.

##### **4.1.2.3 Detalhamento do PBAI**

Para o próximo trimestre estão previstas etapas de construção textual pela consultoria e validação do PBAI pela comunidade indígena e FUNAI. Além disso, está previsto a reunião de consulta final para validação do PBAI.

#### 4.1.2.4 Interfaces das ações transitórias planejadas para o próximo trimestre

**Quadro 4.1.2.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Educação	PG 033 Educação	Projeto lotus	4.1.2.1
Funcional FR	Suprimentos/ADMCT/Jurídico	FAIC	4.1.2.2

#### 4.1.3 Ações estruturantes

##### 4.1.3.1 Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

Para o próximo trimestre, está prevista a continuidade do acompanhamento do processo de licenciamento junto ao IBAMA.

##### 4.1.3.2 Projeto Rede de Sementes e mudas do rio Doce

Os programas 26 e 27 da FR deverão alinhar um cronograma de ação em conjunto a Funai para definição sobre a continuidade do projeto.

##### 4.1.3.3 Reparação Integrada

Assinatura de 02 termos de quitação pendente.

#### 4.1.3.3 Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre

**Quadro 4.1.3.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Atividade	Ação (Nº do item)
Funcional FR	Engenharia	Elaboração de projeto de SAA	4.1.3.1
Uso sustentável da terra	PG-26; PG-27	Projeto Rede de Sementes	4.1.3.2
-	Jurídico/Políticas de Indenização	Reparação Integrada	4.1.3.3

#### 4.1.4 Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho de todo o escopo de atuação do PG03.

Nesse sentido, o relacionamento efetuado pelo Programa de Povos Indígenas segue as premissas da OIT 169, legislação vigentes e consulta as lideranças indígenas. Todas as ações a serem executadas em território são previamente solicitadas e se autorizadas pelas lideranças indígenas são executadas.

#### 4.1.5. Agenda

**Quadro 4.1.5.1 – Agendas prevista para trimestral**

Reunião	Data	Programas vinculados	Objetivo da reunião
Reparação Integrada	A definir	Jurídico e Relacionamento Institucional	Assinatura de 02 termos de quitação individual
Validação do Plano de Cheias	a definir-	PG032	Validação do Plano de Cheias
PBAI	A definir	Sem interfaces	Reunião de Consulta do PBAI com FUNAI, Indígenas, Consultoria Independente e FUNAI
PBAI	A definir	Financeiro	Início da reparação estruturante com o início do programa de retomada econômica. <sup>5</sup>

<sup>5</sup> A execução do programa de retomada econômica está previsto depois de 10 dias do protocolo do PBAI a FUNAI.

## **4.2 TI TUPINIQUIM/GUARANI**

### **4.2.1 Ações emergenciais**

#### **4.2.1.1 Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE)**

O Auxílio emergencial foi encerrado. Serão realizadas ações no território afim de regularização dos recibos pendentes.

#### **4.2.1.2 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)**

Existe a previsão de continuidade do monitoramento para o próximo trimestre e consolidação e disponibilização das análises dos meses mais recentes no site <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>.

#### **4.2.1.4 Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo Trimestre**

**Quadro 4.2.1.4 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

<b>Área</b>	<b>Programas da FR que possuem interface com o PG 03</b>	<b>Ação</b>
Funcional da FR	Financeiro	Pagamento de ASE
Socioambiental	PG 38 - PMQQS	4.2.1.2

### **4.2.2 Ações transitórias**

#### **4.2.2.1 Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias na TI Tupiniquim/Guarani**

Implementação das ações do Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias e gestão das atividades para o próximo trimestre. Acompanhamento técnico e apoio na estruturação das prestações de contas dos Projetos FAIC.

#### **4.2.2.2 Detalhamento do PBAI**

Para o próximo trimestre estão previstas etapas de construção textual pela consultoria e validação do PBAI pela comunidade indígena e FUNAI. Além disso, está previsto a reunião de consulta final para validação do PBAI.

#### **4.2.2.3 Projeto Lótus**

Segue previsto a continuidade de realização das próximas etapas do projeto Lótus para a TI Comboios por meio da plataforma EAD.

#### *4.2.2.4 Interfaces das ações transitórias planejadas para o próximo trimestre*

**Quadro 4.2.2.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Educação	PG 33	Projeto Lótus

#### **4.2.3 Ações estruturantes**

##### **4.2.3.1 Elaboração de projetos de Sistema de Abastecimento de Água (SAA)**

Para o próximo trimestre, está prevista a continuidade do serviço técnico de estudos de geofísica nas 04 aldeias supracitadas.

##### *4.2.3.2 Projeto Rede de Sementes e Mudas do rio Doce*

Os programas 26 e 27 da FR deverão alinhar um cronograma de ação em conjunto a Funai para definição sobre a continuidade do projeto.

##### **4.1.3.3 Reparação Integrada**

Para o acordo Tupiniquim Guarani serão realizadas agendas com as associações indígenas para regularização dos termos que ainda constar como não conformes. Somente

com a conformidade dos termos é realizado uma petição em juízo para que as associações possam resgatar os valores referente as indenizações.

Para o acordo AIG serão realizados os pagamentos pendentes. Os pagamentos estavam pendentes devido a renúncia de ações judiciais.

#### 4.2.3.3 Interfaces das ações estruturantes planejadas para o próximo trimestre

**Quadro 4.2.3.3 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Funcional FR	Engenharia – Projeto de SAA	4.2.3.1

#### 4.2.4 Relacionamento

A Fundação Renova reafirma o seu compromisso com o diálogo, a integração e a tomada de decisão com participação efetiva das comunidades, buscando assegurar a efetividade e o melhor desempenho de todo o escopo de atuação do PG03.

Nesse sentido, o relacionamento efetuado pelo Programa de Povos Indígenas segue as premissas da OIT 169, legislação vigentes e consulta as lideranças indígenas. Todas as ações a serem executadas em território são previamente solicitadas e se autorizadas pelas lideranças indígenas são executadas.

#### 4.2.5. Agenda

**Quadro 4.2.5 – Agendas prevista para trimestral**

Reunião	Data	Programas vinculados	Objetivo da reunião
Reparação Integrada	A definir	Jurídico e Relacionamento Institucional	Coleta de termos não conformes

PBAI	A definir	Sem interfaces	Reunião de Consulta do PBAI com FUNAI, Indígenas, Consultoria Independente e FUNAI
PBAI	A definir	Financeiro	Início da reparação estruturante com o início do programa de retomada econômica. <sup>6</sup>

## 4.3 TI KRENAK

### 4.3.1 Ações emergenciais

#### 4.3.1.1 Auxílio Financeiro Extra Emergencial de Subsistência

O **auxílio financeiro extra emergencial de subsistência** será mantido conforme o acordo vigente para 137 famílias para o próximo trimestre.

#### 4.3.1.2 Fornecimento de água mineral

Segue prevista a continuidade, para o próximo trimestre, do fornecimento de água mineral para o povo Krenak, de 5 (cinco) litros de água mineral por pessoa/por dia, para 600 (seiscentas) pessoas.

#### 4.3.1.3 Fornecimento de água bruta e potável

A distribuição de água bruta e potável será mantida na TI Krenak no próximo trimestre.

#### 4.3.1.4 Processo concorrencial participativo para contratação dos caminhões-pipas

Durante período de composição deste relatório, não houve manifestações ou retorno das lideranças indígenas quanto ao processo concorrencial participativo. Aguardando o posicionamento da comunidade Krenak.

---

<sup>6</sup> A execução do programa de retomada econômica está previsto depois de 10 dias do protocolo do PBAI a FUNAI.

#### **4.3.1.5 Fornecimento de suplementação bovina**

O fornecimento de suplementação bovina alimentar segue mantido para o próximo trimestre.

#### **4.3.1.6 Manutenção das vias de acesso**

A manutenção das vias de acesso à Terra Indígena Krenak será mantida para o próximo trimestre, tendo em vista a viabilização do tráfego regular dos caminhões-pipa.

#### **4.3.1.7 Obras estruturantes de melhoria nos acessos**

A ação permanece paralisada devido o contexto da pandemia pelo Covid-19.

#### **4.3.1.8 Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS)**

As ações relativas ao monitoramento do PMQQS permanecem para o próximo trimestre e há previsão de consolidação e disponibilização das análises dos meses mais recentes no site <<https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/>>.

#### **4.3.1.9 Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)**

A ação de monitoramento da qualidade da água para consumo humano segue mantida para o próximo trimestre através da manutenção da frequência de coleta e parâmetros analisados.

#### **4.3.1.10 Interfaces das ações emergenciais planejadas para o próximo trimestre**

**Quadro 4.3.1.10 – Relação de interface entre o PG 03 e demais programas da Fundação Renova planejadas para as ações futuras**

Área	Programas da FR que possuem interface com o PG 03	Ação
Socioambiental	PG 38 – PMQQS	4.3.1.8
Socioambiental	PG 38 – PMQACH	4.3.1.9

#### **4.3.2 Ações transitórias**

As etapas do Estudo de Impacto do Componente Indígena (ECI) estão paralisadas desde maio de 2017.

#### **4.3.3 Ações estruturantes**

##### **4.3.3.1 Recuperação de nascentes e áreas degradadas**

Para os próximos meses, a paralisação da recuperação está mantida, até que haja um posicionamento oficial da Funai para a retomada das ações que não são consideradas essenciais.

#### **4.3.4 Relacionamento**

##### **4.3.4.1 Contratação de Assessoria Técnica Independente (ATI) para a Terra Indígena Krenak**

Aguardando decisão do juízo.

#### **4.3.5 Agenda**

Para o próximo trimestre está programada a retomada das ações da rede de recuperação de nascentes, com interface do PG027, sendo observado protocolo de segurança de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

## 5. AVANÇO FÍSICO DO PG 03

As ações desenvolvidas no âmbito do PG 03 para o trimestre **outubro a dezembro 2021** contribuíram para o avanço do cronograma planejado. Com o avanço da vacinação em todo o país, a Fundação Renova começou, de forma gradativa, a retomada de algumas atividades em campo, condicionadas a liberação interna da sala de situação. Para a realização das atividades presenciais, todo um protocolo de segurança é observado de forma a garantir a integridade dos colaboradores e, também dos indígenas atendidos.

Dentre as ações realizadas no trimestre, destacam-se: ações relacionadas ao detalhamento do PBA no território tupiniquim guarani, acompanhamento do processo de reparação integrada com pagamento de indenização aos indígenas atendidos pelo programa no ES, finalização dos acordos emergenciais no ES, acompanhamento das ações no território Krenak, desenvolvimento dos projetos socioambientais do FAIC e início do processo de escutas e detalhamento do PBAI Tupiniquim-Guarani e Comboios.


Dentre as cláusulas e deliberações acerca das ações atribuídas ao PG03, em resumo, 31% das ações foram “concluídas no prazo” e 41%, até dezembro de 2021, apresentam o status de “a vencer – em andamento” e 23% “a vencer – não iniciada”,

Quanto a Terra Indígena Krenak, em itens e deliberações específicas para essa comunidade, 50% das ações foram “concluídas no prazo” e 50% “concluídas após o prazo”, o que se justifica pelo contexto por Covid-19, que influencia o cumprimento parcial ou integral de algumas entregas ou ações do PG03.

Das cláusulas e deliberações sobre as Terras Indígenas Comboios e Tupiniquim Guarani, 53% das ações foram “concluídas no prazo”, 20% “concluídas após o prazo”, 7% estão “aguardando informações”, 7% “encerrado por não ter resposta”, 7% “em descumprimento” e 7% “a vencer – em andamento”.

Os índices e resultados são a seguir apresentadas por meio do gráfico em curva S, com avanço real x avanço previsto das ações realizadas no presente trimestre.

**Gráfico 5. Avanço real x avanço previsto% das ações realizadas**

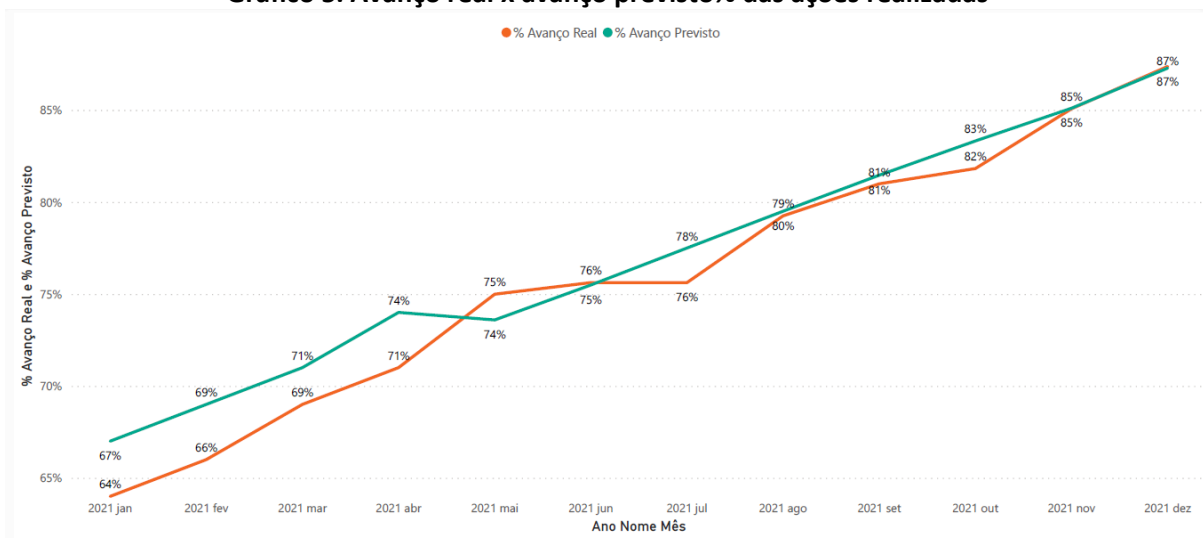

Para além das ações desenvolvidas, foram também continuados, por meio do plano de ação para engajamento com os indígenas, os novos fluxos de comunicação, em contexto de pandemia, o qual vem apresentando resultados positivos junto à comunidade indígena Krenak.

No contexto de retomada, foi necessário a atuação conjunta do PG03 com outros Programas de interface da Fundação Renova, tais como as áreas socioeconomia, socioambiental, infraestrutura e funcional, os quais atuam de forma articulada nas ações desenvolvidas, buscando assegurar o alcance dos resultados no desenvolvimento dos eixos emergencial, transitório e estruturante.
