



FUNDAÇÃO
renova


Report referente às ações do Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce realizadas até o mês de março de 2022 e previstas para abril de 2022

14 DE ABRIL DE 2022



REPORT - GT EDUCAÇÃO

PG033 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

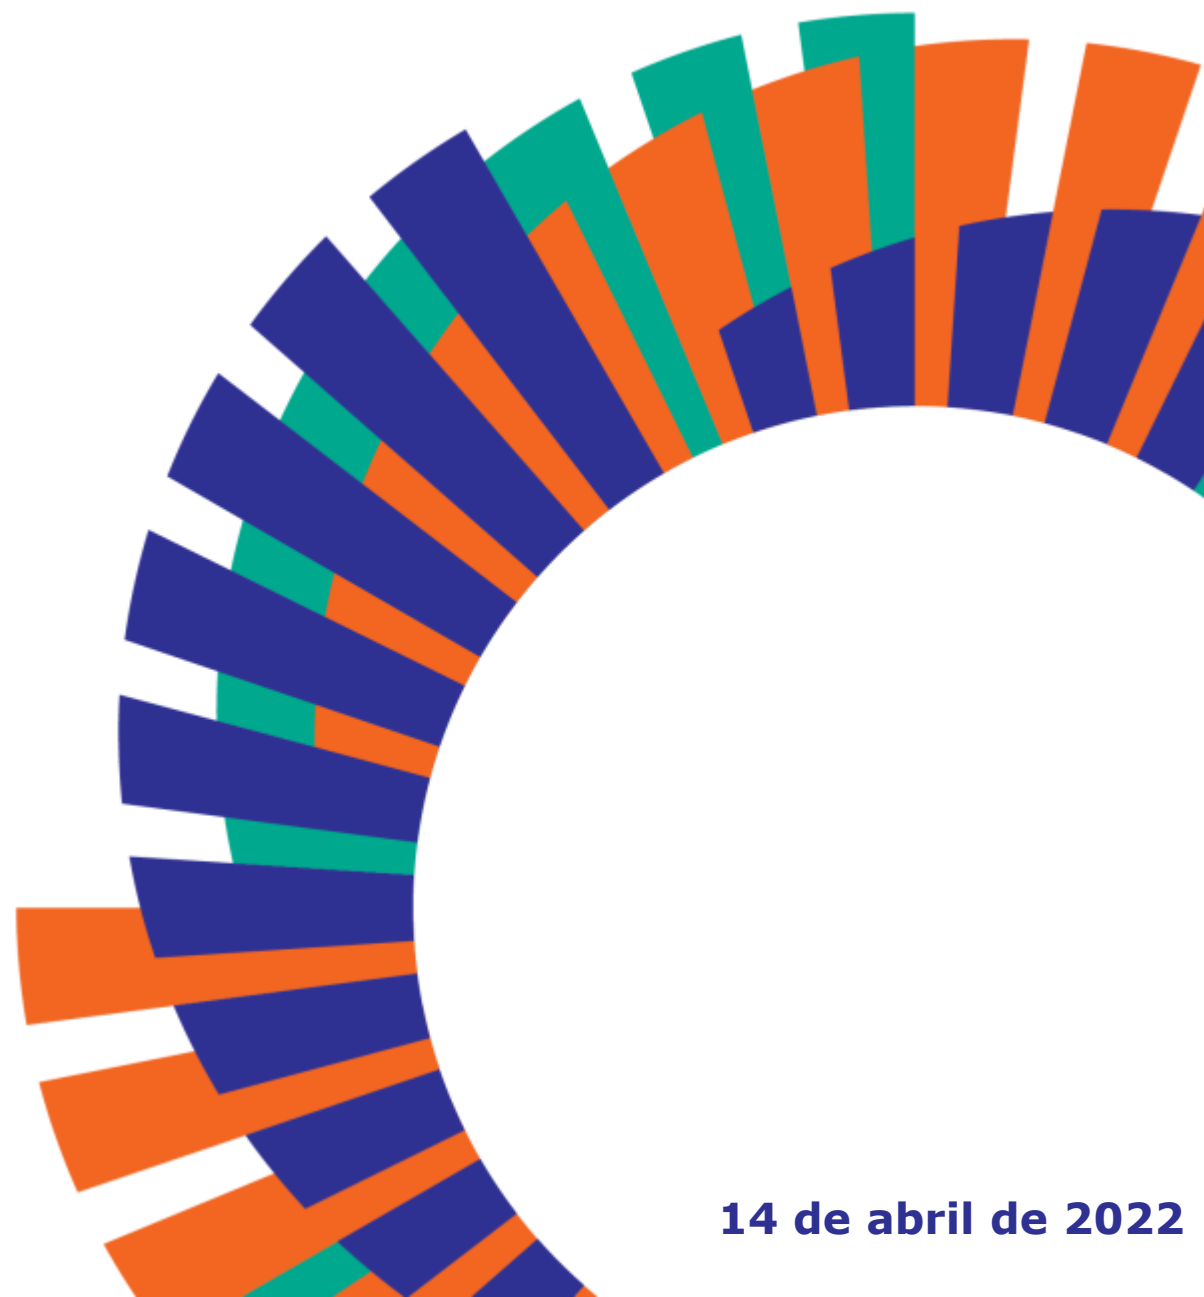



A- REPORT GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

- 1 Objetivo Geral do Programa, TTAC e Deliberações CIF
- 2 Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG033
- 3 Contextualização/memória das ações e orçamento realizado durante a aprovação do PG033
- 4 Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033
- 5 Cronograma Físico do Programa
- 6 Linha do Tempo do Programa
- 7 Cronograma Financeiro Realizado/Previsto Geral do Programa



B- REPORT POR PROJETO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE (*)

8 Projeto Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01

8.1 Cronograma físico previsto- 1º CICLO

8.2 Área de Abrangência - 1º CICLO

8.3 Ações realizadas- JULHO/2019 a MARÇO/2022

8.4 Ações previstas- ABRIL/2022

(*) O report referente ao Projeto Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas será feito quando se iniciarem suas ações em 2022.



9 Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais

9.1 Cronograma físico previsto

9.2 Cronograma financeiro previsto

9.3 Ações realizadas- JULHO/2019 a MARÇO/2022

9.4 Ações previstas- ABRIL/2022



10 Processo Interface Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis

10.1 Cronograma físico previsto

10.2 Ações realizadas- JULHO/2019 a MARÇO/2022

10.3 Ações previstas- ABRIL/2022



- CT-ECLET: Câmara Técnica Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo.
- N/A: Não se aplica
- CIF: Comitê Interfederativo
- TTAC: Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
- PG: Programa
- APP's: Áreas de Preservação Permanentes



REPORT - GT EDUCAÇÃO

A- REPORT GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE- PG33





1 - Objetivo Geral do Programa, TTAC e Deliberações CIF

OBJETIVO: *Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.*

- **CLÁUSULA 172:** A FUNDAÇÃO deverá implantar medidas de educação ambiental, em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na ÁREA AMBIENTAL 1, em conformidade com a Lei Federal nO9.795/1999 e seu decreto regulamentador nO4.281/2002.
 - PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Essas medidas deverão ser iniciadas até 6 (seis) meses a contar da assinatura deste Acordo e serão mantidas pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do seu início.
 - PARÁGRAFO SEGUNDO:** O programa de educação ambiental deverá abranger, além dos demais conteúdos previstos em lei, informações referentes às emergências ambientais.
- **DELIBERAÇÃO 136:** Aprova a Nota Técnica n° 04 da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer e Turismo e encaminha à Fundação Renova as diretrizes a serem cumpridas pelo Programa de Educação Ambiental, previsto na Cláusula 172 do TTAC.
- **DELIBERAÇÃO 178:** Aprova a definição do programa em 29/06/2018.
- **DELIBERAÇÃO 240:** (1) Aprovar o entendimento da Nota Técnica n° 18/2018 da CT-ECLET, referente à concessão de bolsas de estudos para professores participantes do Curso de Formação de Educadores, cujo valor unitário e procedimentos deverá ser definidos pela Fundação Renova e Câmara Técnica, com base em parâmetros usuais do Poder Público Federal ou Estadual, até o dia 31/01/2019.
(2) Não reconhecer a despesa de contratação do Instituto Elos, no valor total de R\$ 1.652.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), no âmbito do Programa de Educação para a Revitalização da Bacia do Rio Doce.



1 - Objetivo Geral do Programa, TTAC e Deliberações CIF

- **DELIBERAÇÃO 288:** Atualização do Programa de Ambiental e apresentação de Relatório detalhado das ações do Programa, com prazos e custos. Item 1) A Renova deverá atualizar o documento de definição do PG033, compilando todas as informações apresentadas pela Fundação em reuniões, como todas as solicitações da CT-ECLET, com a revisão do cronograma físico-financeiro de cada projeto/processo e a exclusão da despesa de contratação não reconhecida por este Comitê, conforme item 2 da Deliberação CIF nº 240/2018, no prazo de 60 dias.
- **DELIBERAÇÃO 343:** Aprovação com ressalvas do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce. Item 1.4) Estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para que a Fundação Renova atenda as recomendações constantes na Nota Técnica Conjunta nº 01/CT-EI/CT-ECLET.
- **DELIBERAÇÃO 549:** Aprova a nova versão do documento de definição do Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce- PG 33- Versão 8, de 2021, em atendimento à cláusula 203 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – TTAC e conforme a Deliberação CIF nº 465, de 04 de dezembro de 2020.

2- Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG033



Tipo da ação	Data da ação	Município	Número de Participantes	Orçamento realizado	Documentos de referência
Período Emergencial: Oficinas/ palestras/ rodas de conversas/ apresentações artísticas/ passeios ecológicos	Agosto a dezembro de 2016	Barra Longa (MG) Mariana (MG)	641	R\$169.982,35(*) (* Includidos gastos com materiais e simulações de trânsito de Cheia – nov/16 a jul/17	N/A
Projeto Douradinho: Distribuição de livros, com contação de história, capacitação de professores, apresentações teatrais e gincanas com alunos.	Março a dezembro de 2017	Governador Valadares (MG)	1.468	R\$185.022,37	N/A
		Ipatinga (MG)	1.786		
		Mariana (MG)	541		
		Rio Doce (MG)	83		
		Santa Cruz do Escalvado (MG)	76		
		Barra Longa (MG)	227		
		Colatina (ES)	795		

2- Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG033



Tipo da ação	Data da ação	Município	Número de Participantes	Orçamento realizado	Documentos gerados
Projeto Plantando pelo Planeta: Formação de Jovens Embaixadores da Justiça Climática	Outubro a novembro de 2017	Mariana (MG)	100	R\$347.511,17(*)	N/A
Projeto Plantando pelo Planeta: Plantio de 100 mudas					

(*) Foi acrescentado o valor de R\$260.381,17, referente ao transporte dos participantes e divulgação da etapa de plantio de mudas, não informado nos meses anteriores.

3- Contextualização/memória das ações e orçamento realizado durante a elaboração do PG033 – (Definição Participativa do PG)



Tipo de ação	Data da ação	Município	Número de Participantes	Orçamento realizado	Documentos gerados
Realização de 01 encontro de Prosa e Saberes - Etapa 01 Definição do Programa	26 e 27/09/2017	Marliéria (MG)	70	R\$490.330,00 (*Foi acrescentado	Livro- Encontro Prosa e Saberes – Fundação Renova Data: 25/06/2018
Realização de 01 Oficina Diálogos com a Gestão Pública - Etapa 02 Definição do Programa	05 e 06/12/2017	Governador Valadares (MG)	102	R\$1.400,00 referente ao serviços de fotografia da oficina Diálogos com a Gestão Pública	Nome do documento: Educação_Revitalização - Etapa 3 - Rev25_06_18 Ofício: OFI.NII.052018.2985
Realização de 01 Fórum de Educação para Revitalização da bacia do rio Doce, etapa Colatina e Ipatinga - Devolutiva do Programa elaborado	17 e 18/10/2018	Colatina (ES)	104		Data: 26/02/2019 Nome do documento: Relatos_Facilitação_Poética_Fórum_
	24 e 25/10/2018	Ipatinga (MG)	144	R\$814.020,00 (*foi acrescentado 46.310,00 referente à revisão e impressão do livro Encontro de Prosa e Saberes, distribuído no fórum	Educação_PG33 Enviado por e-mail: 26/02/2019 Data: 03/01/2019 Nome documento: Relatório_Analítico_Contribuições Fórum_Educação Ofício: OF.NII.012019.4968

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data de solicitação	Tipo de solicitação	Resumo	Entrega pelo PG
29/06/18	Deliberação CIF nº178	Aprova a definição do programa em 29/06/18.	Data: 25/06/2018 Nome do documento: Educação_Revitalização - Etapa 3 - Rev25_06_18 Ofício: OFI.NII.052018.2985
20/03/18	Nota Técnica CT-ECLET nº 7	Realizar um prognóstico do Programa juntamente com a definição de ações que incentivem a continuidade do Programa após os 10 anos.	Data: 18/07/2018 Nome do documento: Prognóstico_final_18_07_2018 Ofício: OFI.NII.072018.3577
18/06/18	Nota Técnica CT-ECLET nº 11		
18/06/18	Nota Técnica CT-ECLET nº11	Apresentar os projetos executivos de cada projeto/programa do “Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce”, incluindo a revisão dos indicadores para cada projeto de forma que suas metas possam ser aferidas também em números absolutos, para cada ano do programa, e o cronograma detalhado dos projetos, com o número de entidades e indivíduos que se pretende atingir, por tipologia, apresentando dados mais concretos do público que estará envolvido nas ações.	Data: 31/08/2018 Nome do documento: Projeto_Executivo_31_08_2018 Ofício: OFI.NII.082018.3971

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
N/A	Produção Livro- Encontro Prosa e Saberes – Fundação Renova	Livros entregues durante a realização do 1º Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce.	Data: 17 e 18/10/2018 (Colatina) e 24 e 25/10/2018 (Ipatinga)
17/09/18	Ata Reunião ordinária CT-ECLET	Revisão do documento Projeto_Executivo_31_08_2018 conforme ata da 16ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo - CT ECLET.	Data: 05/11/2018 Nome do documento: P Projeto_Executivo_Rev_CT_05_11_18 Enviado por e-mail: 05/11/2018
03/01/19	Relatório - Fundação Renova	Relatório elaborado para apresentação dos resultados do 1º Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce.	Data: 03/01/2019 Nome documento: Relatório_Analítico_Contribuições Fórum_Educação Ofício: OF.NII.012019.4968
18/06/18	Nota Técnica CT- ECLET nº 11	item 4: Formação de Grupo de Trabalho, que terá como objetivo a proposição de indicadores de efetividade, que verifiquem o engajamento e a capacidade de transformação operada pelo público atendido pelo programa	Data: 15/02/2019 Nome do documento: Proposta_GT_Indicadores Ofício: OFI.NII.022019.5442

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
N/A	Relatório – Fundação Renova	Relatos a partir da Facilitação Poética realizada durante o 1º Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Colatina/Ipatinga)	Data: 26/02/2019 Nome do documento: Relatos_Facilitação_Poética_Fórum_Educação_PG33 Enviado por e-mail: 26/02/2019
05/04/2019	Reunião Extraordinária- GT Educação ECLET e Fundação Renova	Revisão do documento Proposta_GT_Indicadores conforme Reunião Extraordinária realizada entre a Fundação Renova e CT-ECLET no dia 05/004/2019	Data: 25/04/2019 Nome do documento: Proposta_GT_Indicadores Ofício: OFI.NII.042019.6183
30/11/18	Deliberação CIF nº 240	Contratação de estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsas para professores da rede municipal e estadual dos 45 municípios atendidos.	Data: 30/04/2019 Nome do documento: Relatório_Estudo_de_Viabilidade_PG_33_30_04_2019 Ofício: OFI.NII.012019.5122-02

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
02/05/19	Reunião extraordinária – GT Educação ECLET e Fundação Renova	Considerações finais para lançamento do Edital Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01.	<p>Data: 08/05/2019</p> <p>Nome do documento: Edital Formação de Lideranças Jovens</p> <p>Página do edital: https://www.fundacaorenova.org/paineis/formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/</p> <p>Notícia divulgação: https://www.fundacaorenova.org/noticia/aberto-edital-de-formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/</p>
02/05/19	Reunião extraordinária – GT Educação ECLET e Fundação Renova	Considerações finais para o chamamento público do credenciamento de profissionais para composição da comissão avaliadora das propostas técnicas do Edital Formação Liderança Jovens – Ciclo 01.	<p>Data: 28/05/2019</p> <p>Nome do documento: Chamamento Público</p> <p>Aprovação do texto: E-mail CT-ECLET em 27/05/2019</p> <p>Notícia chamamento: https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundacao-renova-esta-credenciando-profissionais-para-avaliar-propostas-tecnicas-do-edital-formacao-de-liderancas-jovens-ciclo-01/</p> <p>Notícia Resultado Chamamento: https://www.fundacaorenova.org/noticia/resultado-do-chamamento-publico-edital-formacao-de-liderancas-jovens/</p> <p>LINKEDIN: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6551451614241136640/</p>

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
06/05/19	Nota Técnica CT- ECLET nº 24	Revisão do documento Projeto_Executivo_CT_05_11_2018 em função da Nota Técnica nº 24; Deliberação nº 288 e ata da Reunião Extraordinária realizada entre a Fundação Renova e CT-ECLET.	Data: 26/07/2019 Nome do documento: Projetos_ExecutivosV02_26_07_2019 Ofício: OFI.NII.072019.7435
28/05/209	Deliberação CIF nº 288		
27/06/19	Ata reunião extraordinária - GT Educação ECLET e Fundação Renova		
28/05/2019	Deliberação CIF nº288	A Fundação Renova deverá apresentar o relatório detalhado de todas as ações do Programa supracitado, com descrição das ações executadas e respectivos gastos, assim como da previsão de execução das ações não iniciadas, no prazo de 60 (sessenta) dias.	Data da entrega 1º Report: 07/08/2019 Nome do documento: Proposta_Report_GT_Educação Ofício: OFI.NII.072019.7450-01
27/06/19	Ata reunião extraordinária - GT Educação ECLET e Fundação Renova	Para entendimento ao cumprimento da referida Deliberação, foi realizada uma reunião do Grupo de trabalho de Educação (GT Educação) no dia no dia 27 de junho de 2019, onde ficou acordado que tais informações serão disponibilizadas por meio de um relatório mensal – denominado “report” – até o décimo dia útil do mês, sendo que o primeiro Report será entregue em 07 de agosto de 2019, para apreciação e validação do modelo pela CT ECLET.	

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
20/09/2019	Reunião ordinária CT-ECLET	Apresentação proposta de indicadores pela ANPPEA.	Data: 20/09/2019 Nome do documento: Proposta_ANPPEA_PG_33 Ofício: OFI.NII.092019.7897
05/11/2019	Plano de Trabalho e orçamento UFMG/UFOP	Plano de trabalho e orçamento para execução do Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais-Parceria UFMG/UFOP– Minas Gerais	Data: 05/11/2019 Nome do documento: Plano de Trabalho – Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais do Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce e Cumprimento das Deliberações 136 e 240. Ofício: OFI.NII.012019.5122-1
26/08/2020	Plano de Trabalho e orçamento UFMG/UFOP	Revisão do Plano de Trabalho e orçamento para execução do Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais-Parceria UFMG/UFOP– Minas Gerais	Data: 26/08/2020 Nome do documento: Plano de Trabalho: PROGRAMA DE EXTENSÃO - Formação continuada de educadores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais - Escola da Bacia do Rio Doce PEBRID. Documento enviado por e-mail.

4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
26/08/2020	Ata reunião extraordinária - GT Educação ECLET e Fundação Renova	Discussão e validação da revisão do Plano de Trabalho e orçamento para execução do Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais-Parceria UFMG/UFOP- Minas Gerais.	N/A
07/01/2021	Ata reunião extraordinária - GT Educação ECLET e Fundação Renova	Discussão sobre o Projeto de Formação de Lideranças Jovens	N/A



PG033 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

Cronograma

	Projeto / Processo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entregas Realizadas Antes da Aprovação do Programa	Ações Período Emergencial	■											
	Projeto Douradinho		■										
	Projeto Plantando pelo Planeta		■										
	Definição Participativa do Programa			■									
Execução do Projeto	Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais												
	Projeto Fortalecimento de Redes e políticas públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce												
	Projeto Formação de Lideranças Jovens												
	Processo Interfaces Educação para Planejamento de Território Sustentáveis												

HOJE (MAR/22)

O período da execução de cada projeto refere-se ao início dos processos de contratação de cada um respectivamente



Previsto




Realizado



6- Linha do Tempo do Programa


Entregas Concluídas (2017 – 2019)

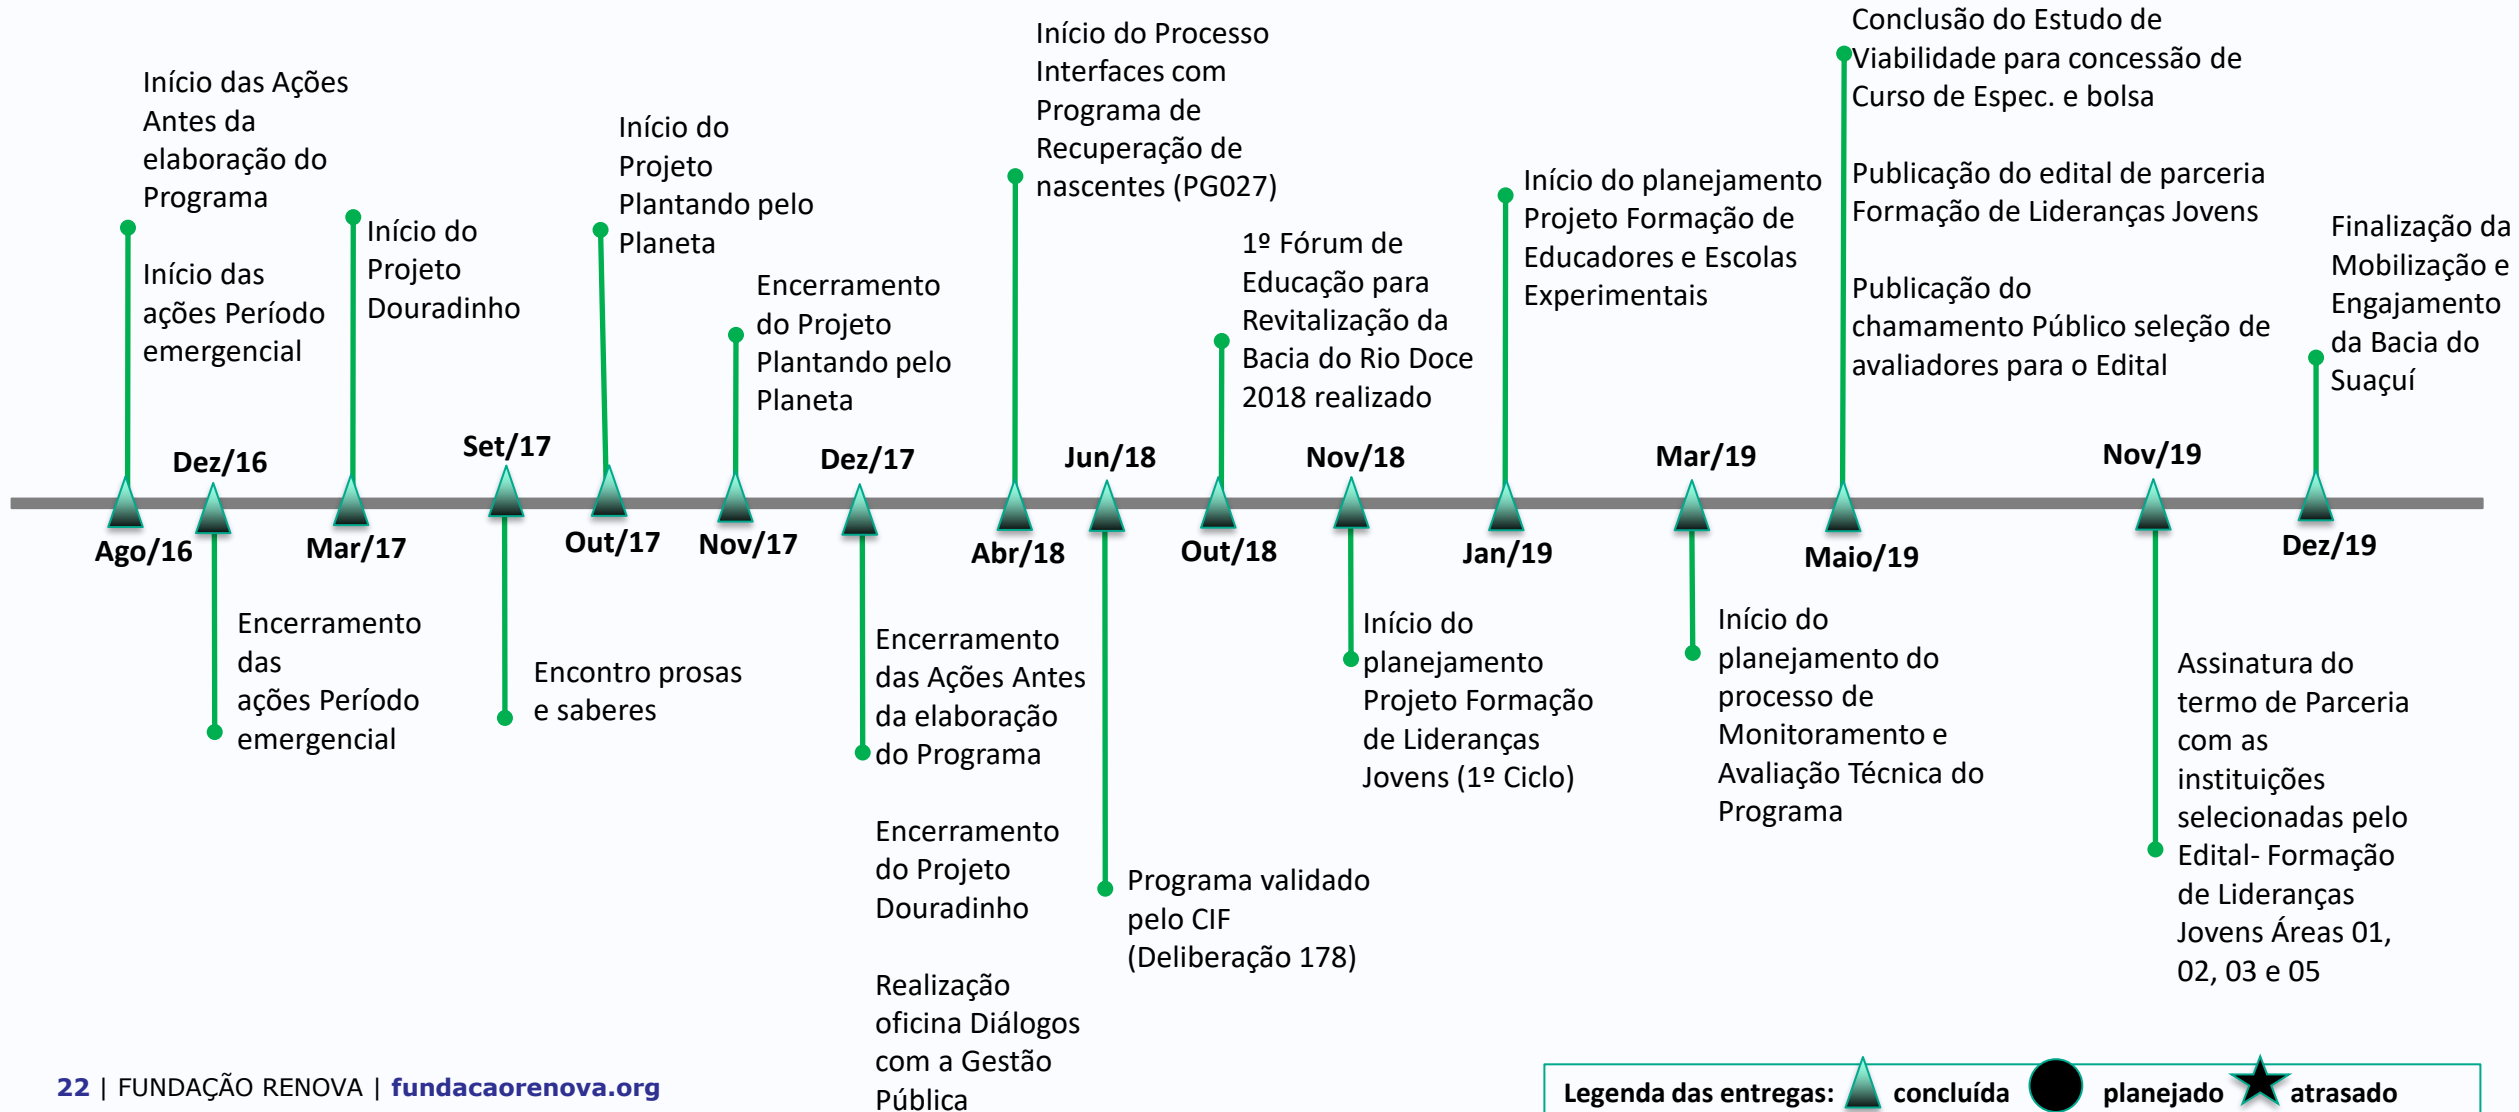




6- Linha do Tempo do Programa

Entregas Concluídas 2020

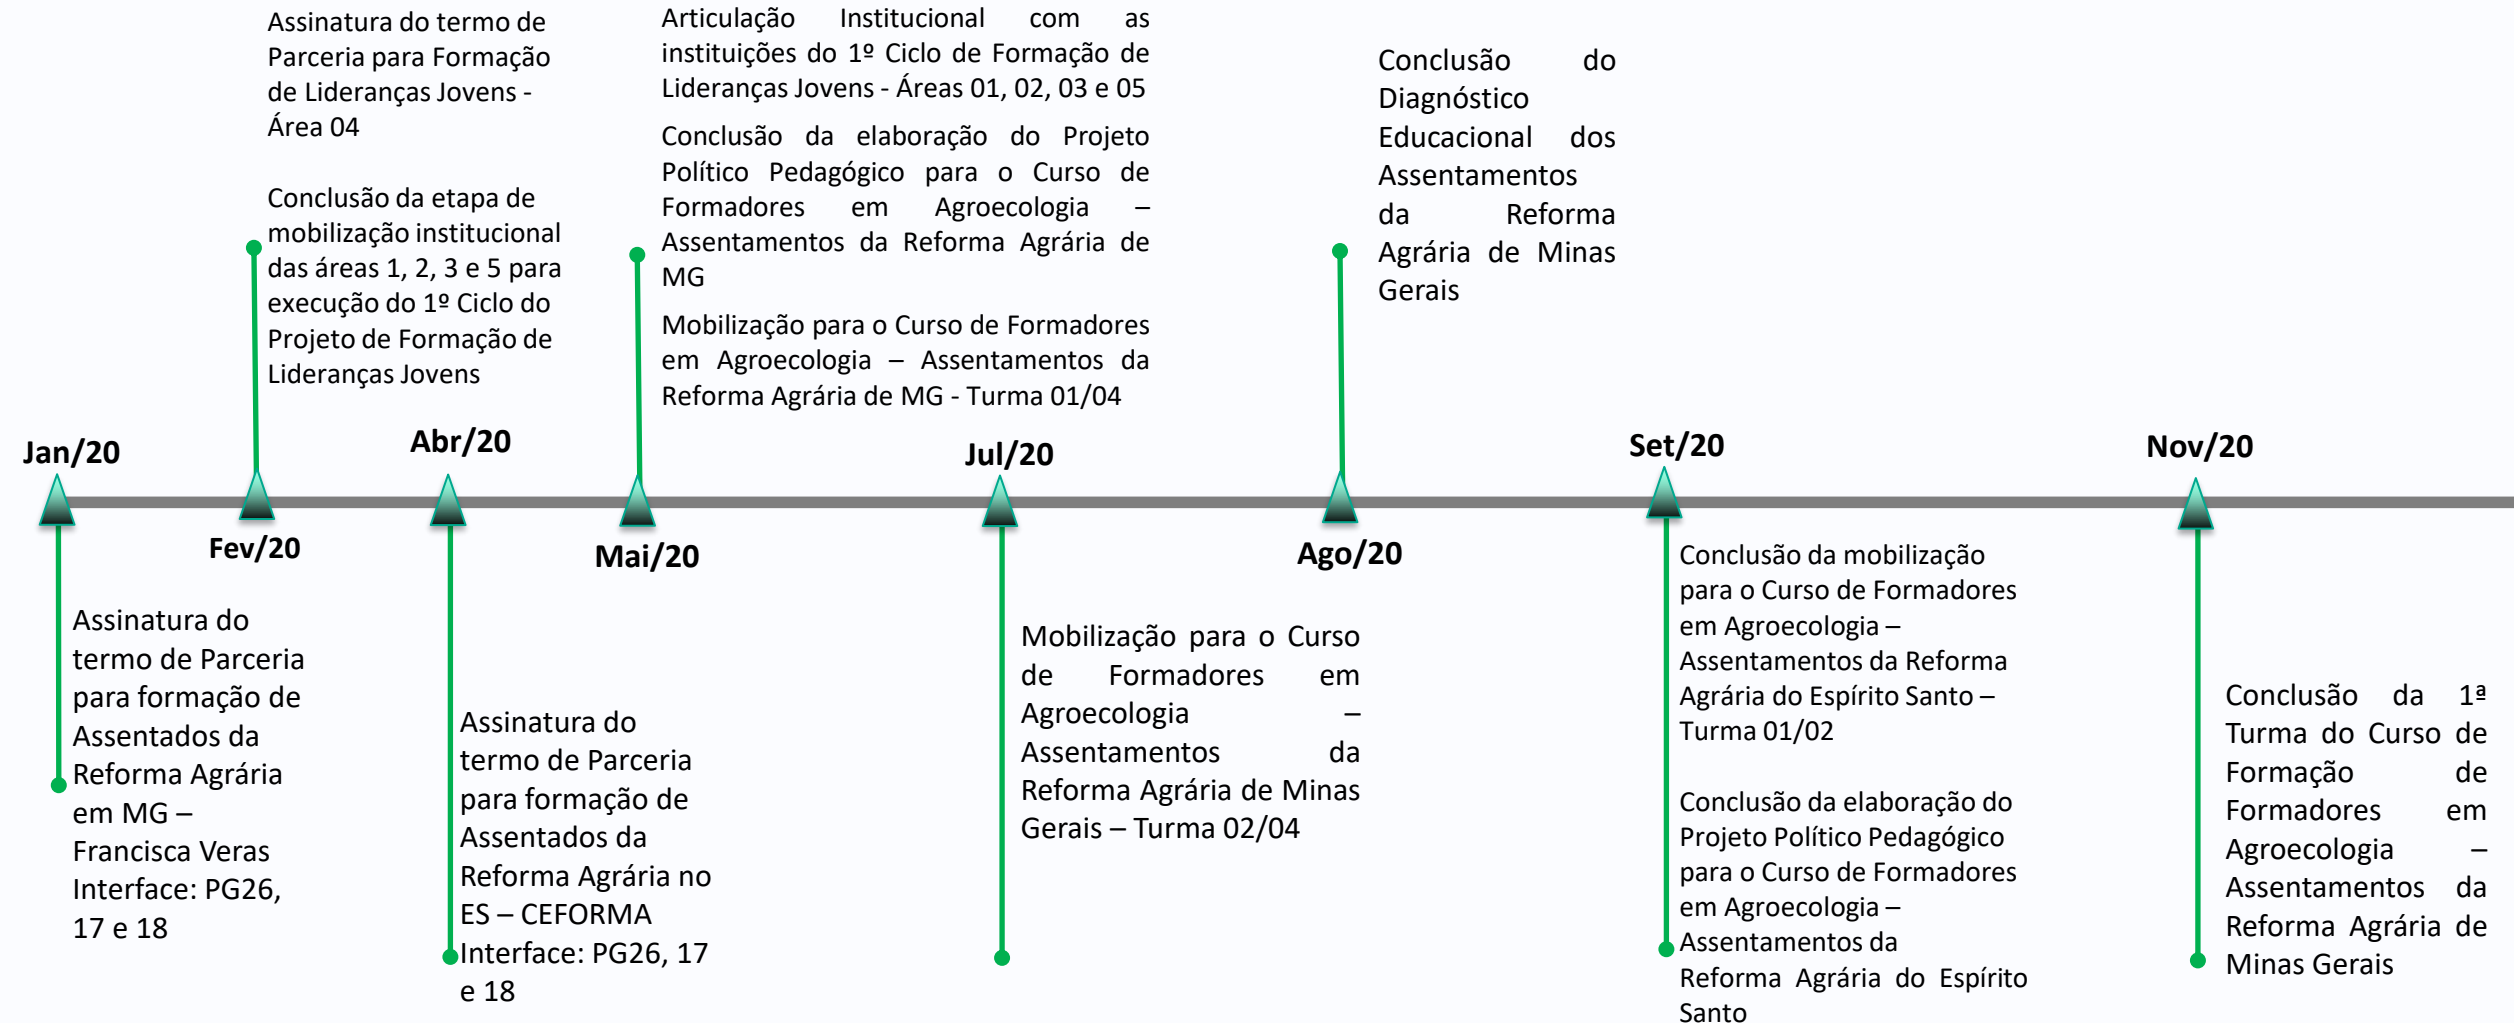



Entregas Concluídas 2021

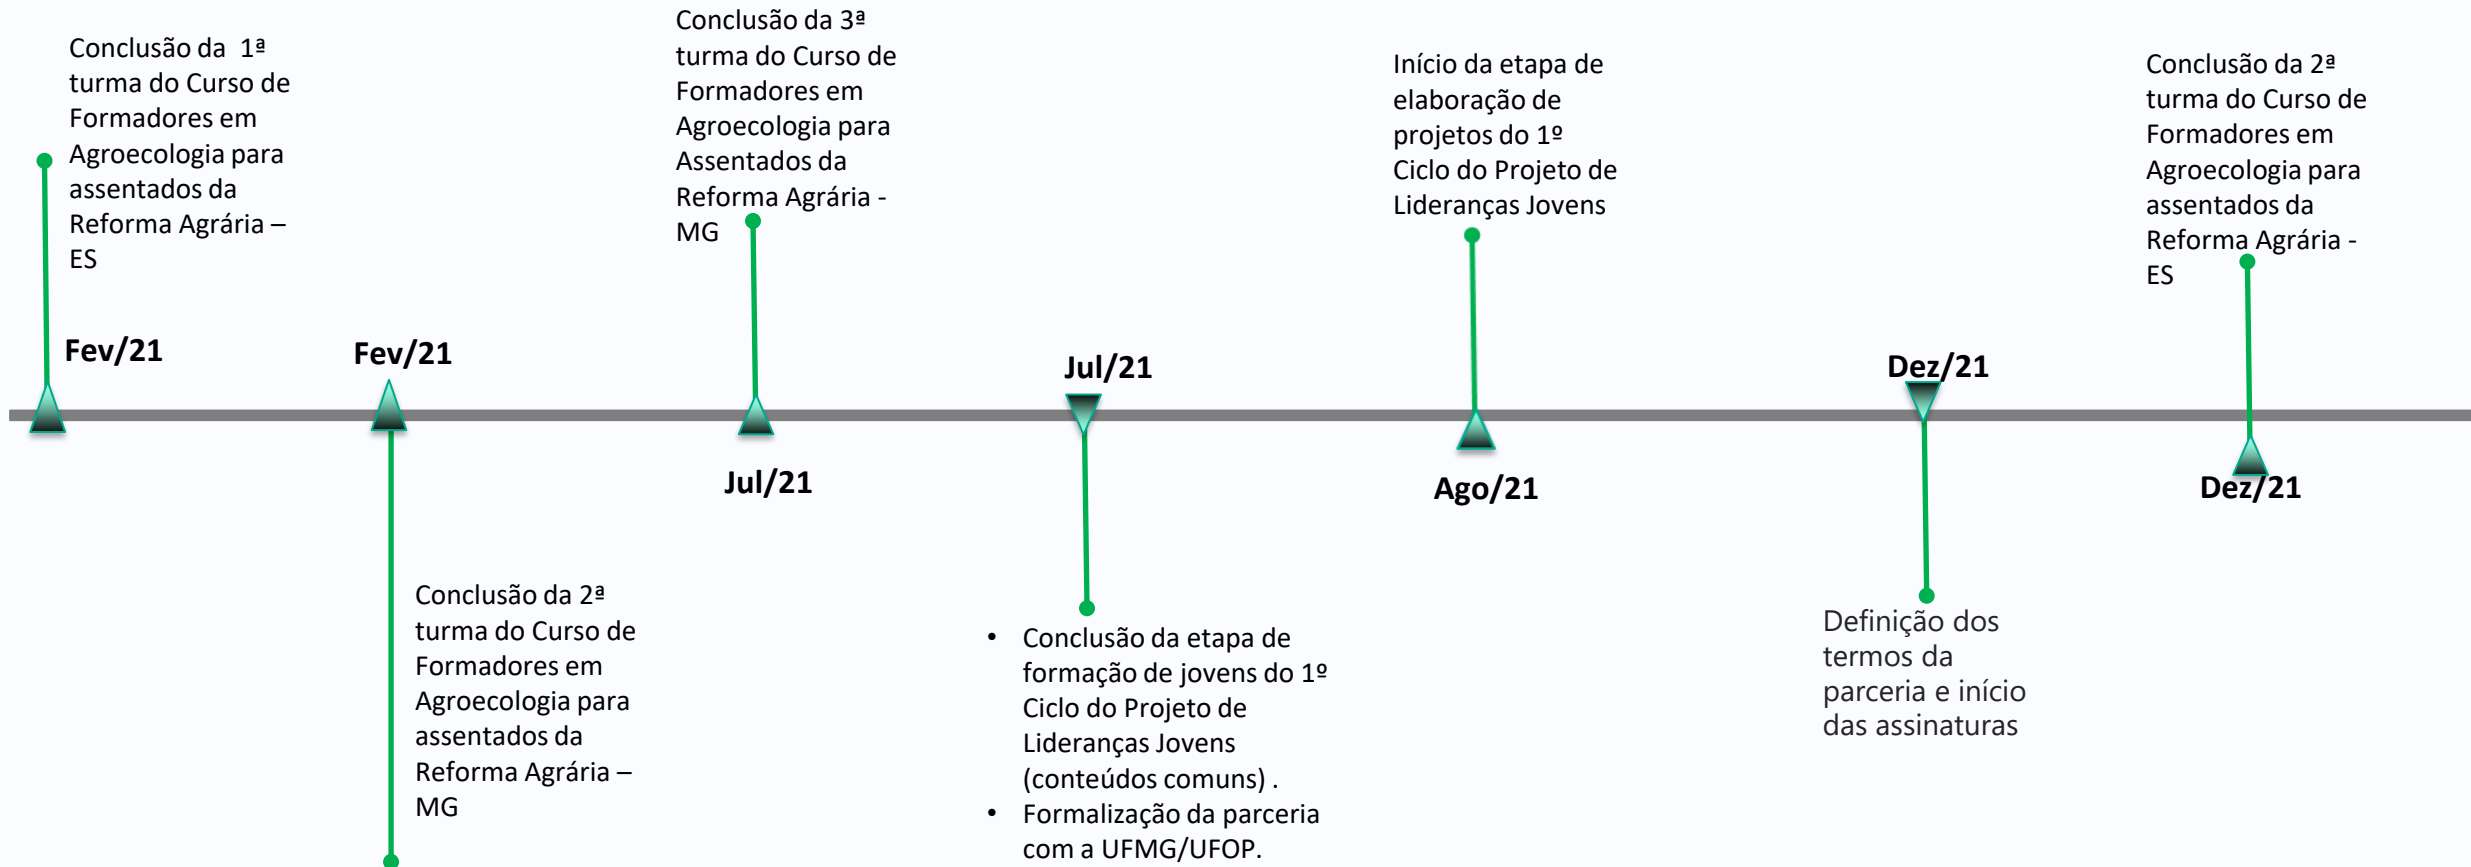


Legenda das entregas: ▲ concluída ● planejado ★ atrasado

6- Linha do Tempo do Programa



Entregas Concluídas 2022*

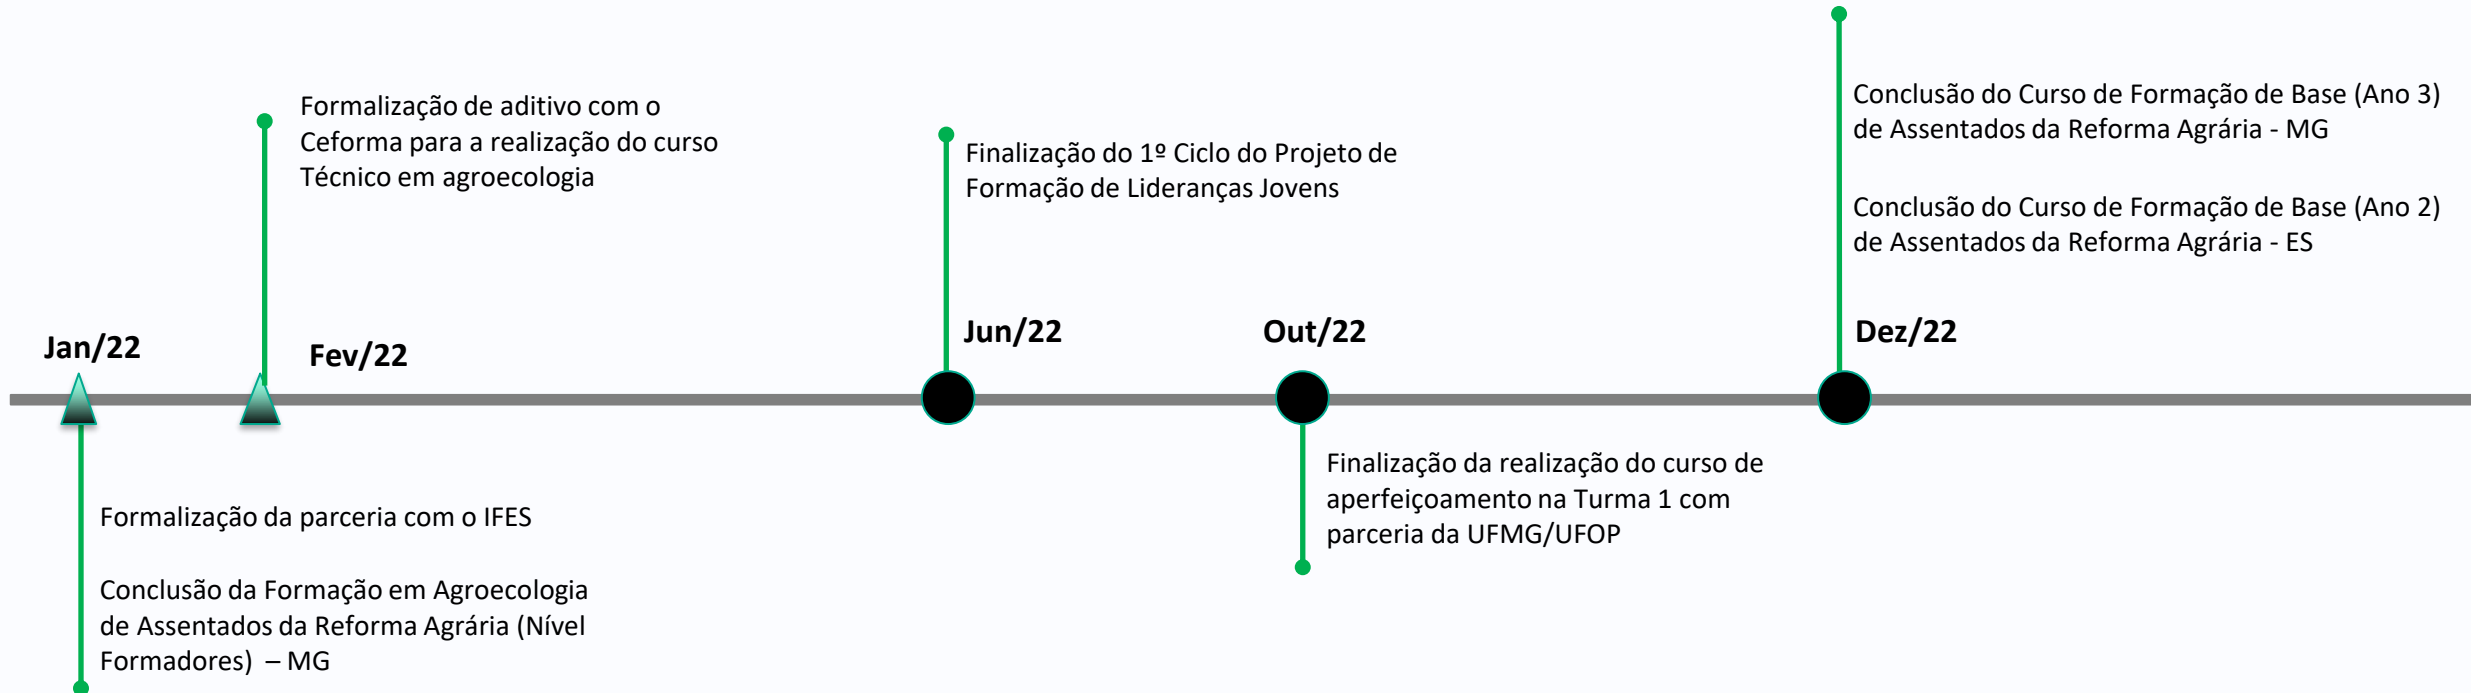

Legenda das entregas: ▲ concluída ● planejado ★ atrasado



7- Cronograma Financeiro Realizado/Previsto Geral do Programa

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Realizado Acumulado (2016-2021)	Orçamento Plurianual
AVANÇO FINANCEIRO	168.171,99	753.777,07	1.846.972,21	4.146.269,94	1.758.909,01		10.527.131,28	141.783.759,17
Ações do Período Emergencial (**)	153.522,22	16.430,13	-	-	-	-	169.982,35	169.982,35
Projeto Douradinho	-	185.022,37	-	-	-	-	185.022,37	185.022,37
Projeto Plantando pelo Planeta	-	347.511,17	-	-	-	-	347.511,17	347.511,17
Definição Participativa do Programa	-	380.621,00	109.709,00	-	-	-	490.330,00	490.330,00
PROJETOS DO PROGRAMA								
Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais (**)	-	-	-	28.799,76	-	-	28.799,76	50.156.622,99
Projeto Fortalecimento de Redes e políticas públicas para Revitalização/ Fórum	-	-	814.019,74	28.207,00	26.400,00	-	868.626,94	37.401.509,74
Projeto Formação de Lideranças Jovens	-	-	765.783,73	1.530.634,61	-120.974,55(*)	2.092.207,34	4.267.651,13	36.825.073,55
Processo Interfaces Educação para Planejamento de Território Sustentáveis	-	-	208.599,48	2.586.835,57	440.959,51	812.147,11	4.048.541,67	13.759.772,94
Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa	-	-	-	-	-	-	-	2.327.268,17
Outras Despesas (Custo Paralisação Covid/Proj. Reforma Escola Povoação**)	-	-	61.892,80	34.933,40	23.839,69	-	120.665,89	120.665,89


(**) valores revisados em ago/21

Fonte/base: Financeiro Fundação Renova – Mai/21



REPORT - GT EDUCAÇÃO

B- REPORT POR PROJETO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

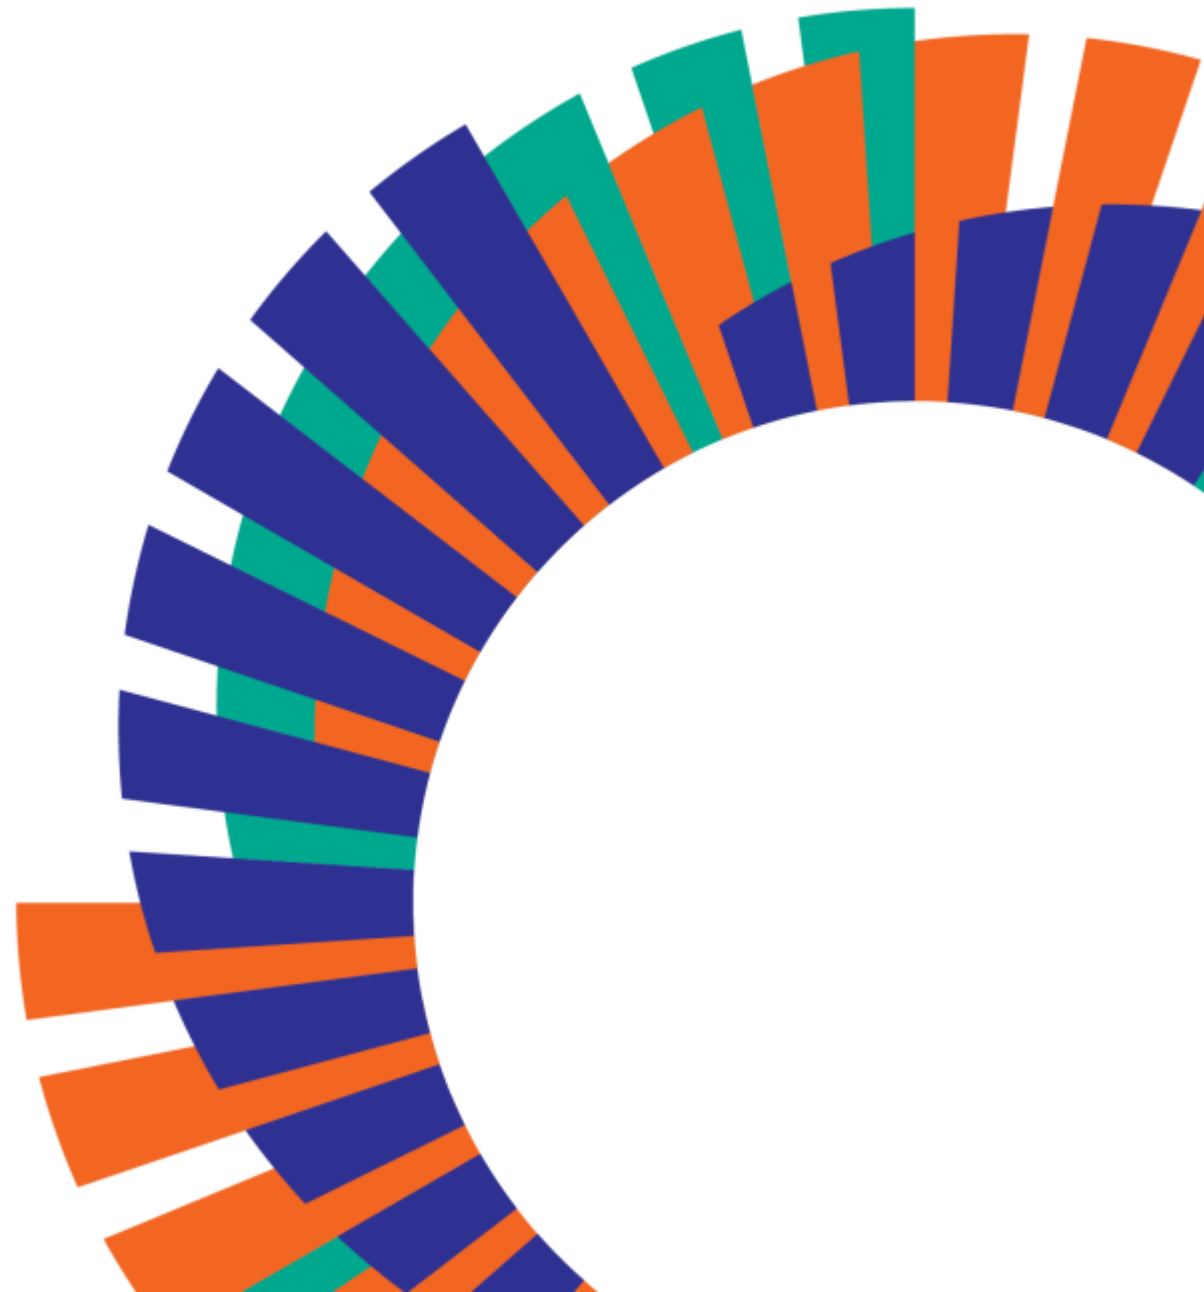

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.2 ÁREA DE ABRENGÊNCIA- 1º CICLO

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA	MUNICÍPIOS
Área de abrangência 1	Mariana; Barra Longa; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Ponte Nova
Área de abrangência 2	Sem-Peixe; Rio Casca; São Pedro dos Ferros; São Domingos da Prata; São José do Goiabal; Raul Soares; Dionísio; Córrego Novo; Pingo D'água; Marliéria; Bom Jesus do Galho; Timóteo; Caratinga; Ipatinga; Santana do Paraíso; Ipaba; Bugre; Iapu; Sobrália; e Fernandes Tourinho
Área de abrangência 3	Belo Oriente; Naque; Periquito; Alpercata; Governador Valadares; Tumiritinga; Galiléia; e Conselheiro Pena
Área de abrangência 4	Resplendor; Itueta; Aimorés; Baixo Guandu; Colatina; e Marilândia
Área de abrangência 5	Linhares e Aracruz
TOTAL	41 municípios

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
01/07/2019	Divulgação do resultado do Chamamento Público para cadastramento de avaliadores das propostas Técnicas do Edital Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01.	Link do resultado: https://www.fundacaorenova.org/noticia/resultado-do-chamamento-publico-edital-formacao-de-liderancas-jovens/	E-mail enviado para CT-ECLET em 02 de julho de 2019	N/A
02/07/2019 a 08/07/2019	Seleção e Contratação dos avaliadores das Propostas Técnicas do Edital de Formação de lideranças Jovens- CICLO 01.	Abertura de Requisição de Compras (documento interno FR)	N/A	N/A
09/07/2019	Envio das propostas técnicas para os avaliadores selecionados	E-mail enviado para cada avaliador	N/A	N/A
21/07/2019 a 26/07/2019	Apreciação das avaliações recebidas	Matriz de critérios de avaliação recebidas	N/A	N/A
29/07/2019	Solicitação de revisão e qualificação das avaliações realizadas	E-mail enviado para cada avaliador	E-mail enviado para CT-ECLET em 29 de julho de 2019	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO A DEZEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
16/08/2019	Finalização da revisão e qualificação das avaliações realizadas das propostas Técnicas do Edital Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01.	Matriz critérios de avaliação	N/A
17/08/2019 a 29/09/2019	Acompanhamento dos processo internos: suprimentos, compliance e jurídico	Documentos internos de cada área	N/A
02 e 08/10/2019	Divulgação das instituições selecionadas pelo Edital de Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01	Nome do documento: Selecionadas Instituições Selecionadas pelo edital Formação de Lideranças Jovens. Página do resultado: https://www.facebook.com/fundacaorenova/photos/rpp.1792999650944739/2410832112494820/ Notícia divulgação: https://www.facebook.com/fundacaorenova/photos/rpp.1792999650944739/2410832112494820/ OFÍCIO: OFI.NII.102019.8020_Resultado_edital_juventudes	N/A
10/10/2019 a 27/11/2019	Acompanhamento dos processo internos: suprimentos, compliance e jurídico.	Documentos internos de cada área	N/A
28/11/2019	Assinatura do termo de parceria e reunião Kickoff com os parceiros das áreas 01, 02, 03 e 05 fundacaorenova.org	Termo de Parceria assinado: ÁREA 01: 27/11/2019 (CPCD); ÁREA 02: : 28/11/2019 (FGPA); ÁREA 03: 27/11/2019 (CIEDS); e ÁREA 05: 27/11/2010 (LUMIAR)	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
06/01/2020 a 31/01/2020	Acompanhamento das instituições (CPCD; FGPA; CIEDS e LUMIAR) na elaboração do plano de trabalho detalhado- PRODUTO 1	PRODUTO 01: Report Mobilização e Planejamento	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
18/02/2020	Assinatura do termo de parceria com o parceiro da área 04- AMEFA	Termo de Parceria assinado	N/A
03/02/2020 a 28/02/2020	Início da etapa: Articulação Institucional- CPCD; FGPA; CIEDS e LUMIAR	Realização das reuniões com as prefeituras e secretarias municipais- Atas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
04/03/2020	Reunião Kickoff com a instituição parceira da área 04- AMEFA	Ata	
02 a 31/03/2020	Acompanhamento do Planejamento e Mobilização da equipe da AMEFA	Termo de Parceria assinado- 18/02/2020	N/A
	Continuação da etapa: Articulação Institucional- CPCD; FGPA; CIEDS e LUMIAR	Realização das reuniões com as prefeituras e secretarias municipais- Atas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – ABRIL E MAIO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
02/04/2020 a 29/05/2020	Acompanhamento do Planejamento e Mobilização da equipe da AMEFA	Termo de Parceria assinado- 18/02/2020	N/A
	Continuação da etapa Articulação Institucional: Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 - Lumiar	Realização das reuniões com as prefeituras e secretarias municipais- Atas	Diante do cenário COVID19, estamos tentando dar continuidade as ações através de ferramentas virtuais e ligações telefônicas
	Continuidade da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero (dados secundários)- CPCD; FGPA; CIEDS; AMEFA e LUMIAR – Áreas 01 a 05	N/A	Diante do cenário COVID19, estamos tentando dar continuidade as ações através de ferramentas virtuais e ligações telefônicas

IMPORTANTE: Diante do cenário da COVID-19, estamos tentando dar continuidade ao cumprimento do cronograma acordado, com realização das ações através de ferramentas virtuais e ligações telefônicas

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JUNHO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/06/2020 a 30/06/2020	Continuação etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: Levantamento de Dados Secundários- Área 01- CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 04-AMEFA/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
	Continuação etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionário de pesquisa- estamos em processo de finalização do questionário para iniciar a aplicação em julho para as áreas -Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
	Continuação da etapa: Articulação Institucional- Área 04- AMEFA	Realização das reuniões com as prefeituras e secretarias municipais- Atas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/07/2020 a 31/07/2020	Continuação etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: Levantamento de Dados Secundários- Área 01- CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 04-AMEFA/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
01/07/2020 a 31/07/2020	Continuação etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionário de pesquisa para as áreas -Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
11/07/2020	Realização do encontro CONECTUDES para apresentar as propostas do PG33 para 77 jovens que iam participar do projeto Futuro do Rio Doce Somos Nós- Ciclo 01.	Ata e gravação	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03/08/2020 a 31/08/2020	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: Levantamento de Dados Secundários- Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 04 – AMEFA/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
	Continuação etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionário de pesquisa para as áreas -Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
	Continuação da etapa: Articulação Institucional- Área 04- AMEFA	Realização de reuniões com o setor de relações institucionais da Fundação Renova	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/09/2020 a 30/09/2020	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionários- Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 - Lumiar	N/A	N/A
	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionários- Área 04 - AMEFA	N/A	N/A
	Mobilização de jovens e início do processo de inscrições para os projetos: Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 - Lumiar	Fichas de inscrição preenchidas pelos jovens nos territórios	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/10/2020 a 31/10/2020	Finalização da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionários- Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 – Lumiar Continuação Área 4 - AMEFA	Fichas de inscrição preenchidas pelos jovens nos territórios	N/A
	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionários- Área 4 - AMEFA	Fichas de inscrição preenchidas pelos jovens nos territórios	N/A
	Preparação de conteúdo digital para a plataforma de formação à distância do Projeto de Formação de Lideranças Jovens - Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 05 – Lumiar Continuação Área 4 - AMEFA	N/A	N/A
	Início do processo de mobilização e inscrição dos Jovens (Áreas 1, 2, 3 e 5) Conclusão da primeira rodada de inscrição dos jovens (Área 5)	Relatório de prestação de contas	Nº de inscrições previstas – Área 5: 200 Número de inscrições realizadas – Área 5: 184

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03/11/20 a 30/11/20	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionários- Área 4 - AMEFA	Fichas de inscrição preenchidas pelos jovens nos territórios	N/A
	Preparação de conteúdo digital para a plataforma de formação à distância do Projeto de Formação de Lideranças Jovens - Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 4- AMEFA/ Área 05 – Lumiar	N/A	N/A
	Continuação do processo de mobilização e inscrição dos Jovens (Áreas 1, 2, 3 e 5)	Relatório de prestação de contas	<p>Nº de Jovens Previstos – Alto Rio Doce (Área 1): 100 Nº de Jovens Inscritos - – Alto Rio Doce (Área 1): 88 Nº de Jovens Previstos – Calha Rio Doce (Área 2): 400 Nº de Jovens Inscritos - Calha Rio Doce (Área 2): 243 Nº de Jovens Previstos – Médio Rio Doce (Área 3): 200 Nº de Jovens Inscritos - Médio Rio Doce (Área 3): 273 Nº de Jovens Previstos – Foz Rio Doce (Área 5): 200 Nº de Jovens Inscritos - Foz Rio Doce (Área 5): 204</p>

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/12/20 a 23/12/20	Continuação do processo de mobilização e inscrição dos Jovens (Áreas 1, 2, 3 e 5)	Relatório de prestação de contas	<p>Alto Rio Doce (Área 1): Nº de Jovens Previstos: 100 Nº de Jovens Inscritos: 90</p> <p>Calha Rio Doce (Área 2): Nº de Jovens Previstos: 400 Nº de Jovens Inscritos: 404</p> <p>Médio Rio Doce (Área 3): Nº de Jovens Previstos: 200 Nº de Jovens Inscritos: 164</p> <p>Foz Rio Doce (Área 5): Nº de Jovens Previstos: 200 Nº de Jovens Inscritos: 223</p>

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
09/12/20	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto – Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
10/12/20	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
12/12/20	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto – Foz Rio Doce (Área 5)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
15/12/20	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto – Alto Rio Doce (Área 1)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
01/12/20 a 23/12/20	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: aplicação de questionários- Área 4 - AMEFA	Relatório de Prestação de Contas	N/A
	Preparação de conteúdo digital para a plataforma de formação à distância do Projeto de Formação de Lideranças Jovens - Área 01-CPCD/ Área 02- FGPA/ Área 03- CIEDS/ Área 04 - AMEFA/ Área 05 – Lumiar	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
11/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Belo Oriente, Naque, Periquito - Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
12/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Belo oriente, Naque, Galileia, Tumiritinga e Conselheiro Pena. Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
12/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Governador Valadares e Alpercata – Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
13/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Galiléia, Tumiritinga e Conselheiro Pena - Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
12/01/21 a 29/01/21	Etapa de acolhimento e integração do jovens inscritos no projeto – contatos individuais por telefone e WhatsApp – mobilização e tutoria individual – Alto Rio Doce (Área 1)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto – formação de times – Alto Rio Doce (Área 1) – Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
13/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Bugre, Marliéria, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Goiabal e Timóteo – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
14/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Bom Jesus do Galho, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipatinga, Pingo D'Água, Raul Soares e São Pedro dos Ferros – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
15/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Caratinga, Córrego Novo, Dionísio, Ipaba, Rio Casca, Sem-peixe e Sobrália – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
19/01/2021	Oficina de cartografia afetiva: Belo Oriente, Naque e Perequito – Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
20/01/2021	Oficina de cartografia afetiva: Governador Valadares e Alpercata e Naque, Galileia, Tumiritinga e Conselheiro Pena – Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
21/01/2021	Oficina de cartografia afetiva: Galiléia, Tumiritinga e Conselheiro Pena – Médio Rio Doce (Área 3)	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
25/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Bugre, Marliéria, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Goiabal e Timóteo – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
26/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Bom Jesus do Galho, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipatinga, Pingo D'Água, Raul Soares e São Pedro dos Ferros – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
27/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Caratinga, Córrego Novo, Dionísio, Ipaba, Rio Casca, Sem-peixe e Sobrália – Calha Rio Doce (Área 2)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
27/01/2021	Encontro de acolhimento e integração dos jovens inscritos no projeto: Aracruz e Linhares – Foz do Rio Doce (Área 5)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
20/01/2021	Continuação da etapa Mapeamento, Diagnóstico e Marco Zero: construção de relatório- Área 4 - AMEFA	Relatório de Prestação de Contas	N/A
11/01/2021 a 11/02/21	Inscrições de jovens para participação no projeto no Baixo Rio Doce (Área 4)	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 28/02/2021	Continuação das etapas de Articulação Institucional e Mapeamento/Diagnóstico/Marco Zero (Área 4)	Relatório de Prestação de Contas	N/A
	Finalização da produção de conteúdo formativo comum pelo Grupo de Trabalho (formado pelas 5 instituições do Projeto de Formação de Lideranças Jovens) para inserção na plataforma EAD.	Lançamento da Plataforma	Plataforma
11/02/2021	Finalização da mobilização de jovens do Baixo Rio Doce (Área 04)	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
08 a 12/03/2021	Lançamento da Plataforma EAD para implantação da Etapa de Formação de Lideranças Jovens	Lançamento da Plataforma	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
15 a 31/03/2021	Início da Etapa de Formação de Lideranças Jovens – Módulo I (Cadastramento/ambientação dos Jovens na plataforma e liberação da Unidade 01)	Plataforma e relatórios de prestações de contas	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
01 a 31/03/2021	Continuação das etapas de Articulação Institucional e Mapeamento/Diagnóstico/Marco Zero (Área 4)	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – ABRIL 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/04/2021	Continuação da Etapa de Formação de Lideranças Jovens – Módulo I (Unidades 2 a 6)	Plataforma e relatórios de prestações de contas	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
	Continuação das etapas de Articulação Institucional e Mapeamento/Diagnóstico/Marco Zero (Área 4)	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – MAIO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/05/2021	Conclusão da Etapa de Formação de Lideranças Jovens – Módulo I (Unidades 2 a 6)	Plataforma e relatórios de prestações de contas	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
	Conclusão das etapas de Articulação Institucional e Mapeamento/Diagnóstico/Marco Zero (Área 4)	Relatório de Prestação de Contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JUNHO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/06/2021	Início da Etapa de Formação de Lideranças Jovens (módulo II) – conteúdos específicos	Plataforma e relatórios de prestações de contas	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
	Início da Etapa de Elaboração de Projetos	Relatório de prestação de contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/07/2021	Continuação da Etapa de Formação de Lideranças Jovens (módulo II) – conteúdos específicos	Plataforma e relatórios de prestações de contas	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
	Continuação da Etapa de Elaboração de Projetos	Relatório de prestação de contas	N/A

Obs: A etapa de elaboração de projetos ocorre de maneira concomitante com a formação de conteúdos específicos elaborado por cada instituição nas 5 áreas de atuação do Projeto de Formação de Lideranças Jovens

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/08/2021	Continuação da Etapa de Formação de Lideranças Jovens (módulo II) – conteúdos específicos	Plataforma e relatórios de prestações de contas	https://projetojuventudes.ciedseduca.org.br/
	Continuação da Etapa de Elaboração de Projetos – início de elaboração das chamadas internas de seleção dos projetos elaborados	Relatório de prestação de contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a	Continuação da Etapa de Elaboração de Projetos – início de elaboração das chamadas internas de seleção dos projetos elaborados	Relatório de prestação de contas	N/A
30/09/2021	Finalização da elaboração das chamadas internas de seleção dos projetos elaborados	Relatório de prestação de contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.4 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/10/2021	Finalização da Etapa de Elaboração de Projetos	Relatório de prestação de contas	N/A
	Início do processo de seleção dos dos projetos elaborados	Relatório de prestação de contas	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 30/11/21	Período de seleção dos projetos elaborados pelos jovens nos territórios.	Relatório de selecionados	Relatório de selecionados

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
16/12/21	Finalização da seleção dos projetos elaborados pelos jovens nos territórios.	Relatório de selecionados	Relatório de selecionados
17 a 30/12/21	Certificação dos jovens concluintes e participantes da etapa de conteúdos específicos	Certificados expedidos	Certificados expedidos

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
10/01/22 a 14/01/22	Reuniões de alinhamento com as instituições parceiras	N/A	N/A
03/01/22 a 31/01/22	Planejamento para implementação dos projetos selecionados	N/A	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 25/02/22	Reuniões de alinhamento com as instituições parceiras	N/A	N/A
01 a 25/02/22	Planejamento para implementação dos projetos selecionados	N/A	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.3 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 31/03/22	Reuniões de alinhamento com as instituições parceiras	N/A	N/A
03 a 31/03/22	Planejamento para implementação dos projetos selecionados	N/A	N/A

8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



8.4 AÇÕES PREVISTAS – ABRIL 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 29/04/22	Reuniões de alinhamento com as instituições parceiras	N/A	N/A
01 a 29/04/22	Implementação, pelos jovens, dos projetos selecionados	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.1 CRONOGRAMA FÍSICO- ES

FORMAÇÃO DE EDUCADORES E ESCOLAS EXPERIMENTAIS	Término Previsto	Término Realizado	2021	2022												2023	2024	2025	2026
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo [IFES]	ago/26																		
Contratação IFES	dez/21	dez/21																	
Execução	jun/26																		
Aperfeiçoamento	mar/25																		
Especialização	mar/25																		
Projeto de Extensão Mestrandos	mar/26																		
Projeto de Extensão Doutorandos	jun/26																		
Encerramento	ago/26																		

HOJE
(MAR22)

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
02/07/2019	Articulação com representantes do IFES para envio dos documentos e do esboço da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos no Espírito Santo (para elaboração do Termo de Abertura da Parceria – TAP).	N/A	Segundo e-mail enviado pelo IFES no dia 03/07 a equipe responsável por essa elaboração só poderia enviar as documentações solicitadas dia 30/08.
03/07/2019	Reunião entre Fundação Renova, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e Universidades (UFMG/UFOP) para planejamento da elaboração do plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais.	Link do registro de reunião: https://bit.ly/3GOTUuX	N/A
03/07 a 30/07/2019	Elaboração do Plano de Trabalho e orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais.	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
15/08/2019	Finalizar plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais	N/A	N/A
16 a 29/08/2019	Trâmites internos de análises e aprovações (Suprimentos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, compliance)	N/A	N/A
30/08/2019	Receber e analisar documentos e esboço da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos no Espírito Santo para elaboração do Termo de Abertura da Parceria – TAP.	N/A	Até o momento o IFES não encaminhou nenhuma documentação, apesar da cobrança constante da equipe de Educação. Será necessário validar com a CT-ECLT se a estratégia com o IFES será mantida.

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
06/09/2019	Protocolado junto ao CIF o Plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais	N/A	OFI. NII.092019.7785
09 a 27/09/2019	Elaboração da APRO, submissão e recolhimento dos Pareceres das Áreas: Suprimentos, Jurídico, Compliance e Financeiro.	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
10/10/2019	Reunião com a Diretoria para análise e aprovação da APRO referente ao Plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais.	N/A	N/A
15 e 16/10/2019	Reunião com o Conselho Curador para análise e aprovação da APRO referente ao Plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais.	N/A	N/A
22/10/2019	Reunião UFMG/UFOP – planejamento de ações a partir da aprovação do Plano de Trabalho pelo Conselho Curador	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
17 a 30/10/2019	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho .	N/A	N/A
	Ajustes necessários ao Plano de Trabalho, de acordo com as orientações das Universidades (UFMG/UFOP) e Conselho Curador	N/A	N/A
30/10/2019	Reunião com o novo grupo de trabalho do IFES para apresentação da proposta de formação de educadores e escolas experimentais (no Espírito Santo) e verificação da continuidade das tratativas para realização da parceria.	ATA em anexo	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
05/11/2019	Encaminhar revisão do Plano de Trabalho da parceria com a UFMG/UFOP	N/A	N/A
01 a 30/11/2019	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho .	N/A	N/A
	Acompanhamento da negociação da Minuta Contratual (Suprimentos Fundação Renova e Universidades)	N/A	N/A
01 a 29/11/2019	Apoio na elaboração da proposta prévia e do Termo de Abertura de Parceria do IFES	N/A	N/A
30/11/2019	Recebimento do Termo de Abertura de Parceria do IFES e encaminhamento às áreas responsáveis (Jurídico, Tributário e Compliance) para emissão dos pareceres sobre a viabilidade da parceria.	N/A	O IFES solicitou dilação de prazo para 10/12/19.

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 20/12/2019	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho .	N/A	N/A
	Acompanhamento da negociação da Minuta Contratual (Suprimentos Fundação Renova e Universidades)	N/A	N/A
10/12/2019	Recebimento do Termo de Abertura de Parceria do IFES e encaminhamento às áreas responsáveis (Jurídico, Tributário e Compliance) para emissão dos pareceres sobre a viabilidade da parceria.	N/A	O IFES não encaminhou a documentação. CT sugeriu iniciar tratativas com outras instituições.

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
06 a 31/01/2020	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho .	N/A	N/A
	Acompanhamento da negociação da Minuta Contratual (Suprimentos Fundação Renova e Universidades)	N/A	Recebimento dos pareceres da Procuradoria Geral da UFMG e Pró-Reitoria de Extensão da UFOP.
06 a 31/01/2020	Articulação com a CT-ECLET (Ana Tritão) para definição da continuidade das tratativas com o IFES ou articulação com novos parceiros.	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03/02/2020	Reunião com representantes da Fundação Renova, UFMG, UFOP e CT-ECLET para discussão dos pareceres da Procuradoria Geral da UFMG e da Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e definição dos próximos passos.	N/A	Solicitação de revisão do plano de trabalho e orçamento (sem alteração do valor final aprovado pela CT-ECLET e Conselho Curador da Fundação Renova)
03 a 28/02/2020	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho .	N/A	*Discussão com a CT e suprimentos da Fundação Renova sobre a necessidade de revisão do Plano *Elaboração de resposta ao parecer da Procuradoria Geral da UFMG
13 a 28/02/2020	Definição de estratégia para continuidade das tratativas com o IFES ou articulação com novos parceiros.	N/A	CT-ECLET informou na última reunião ordinária que solicitaria apoio do IEMA, por meio da representante da CT-ECLET, Ana Tristão, para definição da estratégia juntamente com a Fundação Renova.

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
02 a 31/03/2020	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho.	N/A	*Elaboração de resposta ao Parecer da Procuradoria Geral da *Elaboração de resposta ao parecer da Procuradoria Geral da UFMG e da Pró-Reitoria de Extensão da UFOP
	Definição de estratégia para continuidade das tratativas com o IFES ou articulação com novos parceiros.	N/A	*Aguardando articulação da CT – ECLET com o IFES para continuidade das tratativas

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – ABRIL 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
02 a 30/04/2020	Acompanhamento da resposta ao Parecer da Procuradoria Geral da UFOP, junto ao Jurídico da Fundação Renova.	N/A	*A submissão do Plano de Trabalho nas instâncias de validação da UFMG foi adiada para maio/2020, em função do COVID-19.

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – MAIO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
02 a 30/05/2020	Acompanhamento dos trâmites internos das Universidades (UFMG/UFOP) para aprovação do Plano de Trabalho.	N/A	*18/05 Aprovado no Departamento de Administração Escolar (DAE) *25/05 Aprovado no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JUNHO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
09/06/2020	Aprovação do Plano de Trabalho pela Congregação - UFMG	N/A	N/A
02 a 30/06/2020	Revisão do Plano de Trabalho em função dos pareceres jurídicos e manifestações dos Departamentos/Congregações da UFMG e da UFOP	N/A	N/A
20/06/2020	Realização de reunião extraordinária do GT Educação CT-ECLET e Fundação Renova para discussão das seguintes pautas: 1. Projeto de Formação de Lideranças Jovens; 2. Projetos Executivos; 3. Interface Educação Patrimonial; 4. Atividades em tempo de COVID-19; 5. Relatório Interface MST; 6. Oficina de revisão dos programas.	ATA	Ata pendente de assinatura dos membros da CT-ECLET
22/06/2020	Realização de reunião entre a Fundação Renova, membros da CT-ECLET e representantes do Instituto Federal de Educação (IFES). Pauta: Discussão da paralização das tratativas relacionadas à parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores dos municípios atingidos pelo rompimento no Espírito Santo. Na ocasião o IFES se comprometeu de enviar a documentação necessária para dar início à parceria até dia 20/07.	ATA	Aguardando assinatura dos presente. Será enviado assim que todos assinarem.

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
14/07/2020	Realização de reunião com o GT Educação, representantes da UFMG e UFOP para apresentação do status de aprovação do Plano de Trabalho pelas duas universidades e discussão das estratégias de implementação do Projeto de Formação de Educadores/MG diante do cenário COVID e Eleições Municipais.	N/A	N/A
20 a 31/07/2020	Análise do Termo de Abertura de Parceria e documentação do IFES e encaminhamento ao Núcleo de Parceria da Fundação Renova para dar entrada ao processo de parceria.	N/A	N/A
01 a 31/07/2020	Revisão do Plano de Trabalho em função dos pareceres jurídicos e manifestações dos Departamentos/Congregações da UFMG e da UFOP	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
20 a 31/08/2020	Acompanhamento das análises internas (Compliance, Suprimentos e Jurídico) para dar continuidade ao processo de parceria entre a Fundação Renova e o IFES.	N/A	N/A
01 a 21/08/2020	Finalizar a revisão do Plano de Trabalho e encaminhamento à CT-ECLET.	Plano de Trabalho	Plano de trabalho enviado para o e-mail da CT-ECLET em 21/08/2020.
26/08/2020	Realização de reunião extraordinária - GT Educação ECLET, Fundação Renova, UFMG e UFOP para discussão e validação do plano de trabalho para formação de educadores em Minas Gerais.		N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/09/2020	Realização de reunião extraordinária do GT Educação CT-ECLET e Fundação Renova para discussão das seguintes pautas: 1. Plano de Trabalho IFES; 2. Deliberação 240; 3. Prognóstico PG33; 4. Deliberação 288.	ATA	Na ocasião a Fundação Renova informou à CT-ECLET, que conforme procedimento para estabelecimento da parceria, a área de Suprimentos faz a consulta no Serasa, e que o IFES apresentou algumas certidões negativas, impossibilitando o prosseguimento da parceria. A equipe sugeriu que fosse aberto um edital como segunda opção, mas a Coordenação da CT-ECLET e os representantes da Secretaria de Educação do ES, sugeriram realizar mais uma conversa com o IFES com objetivo de verificar se era possível regularizar tal situação.
11/09/2020	Reunião representantes IFES, CT—ECLET, Fundação Renova para discussão da parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores - ES	N/A	Na ocasião a Fundação Renova informou ao IFES, que conforme procedimento para estabelecimento da parceria, a área de Suprimentos faz a consulta no Serasa, e que o Instituto apresentou algumas certidões negativas. O IFES se comprometeu em regularizar a situação para dar prosseguimento à parceria.
01 a 30/09/20	Acompanhar os trâmites internos (UFMG/UFOP/Fundação Renova) aprovação das alterações no Plano de Trabalho e Minuta do Termo de Cooperação Técnico Financeiro para execução do Projeto de Formação de Educadores - MG	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/10/20	Acompanhar os trâmites internos (UFMG/UFOP/Fundação Renova) aprovação das alterações no Plano de Trabalho e Minuta do Termo de Cooperação Técnico Financeiro para execução do Projeto de Formação de Educadores - MG	N/A	N/A
	Elaborar Plano de Trabalho e orçamento – parceria IFES para execução do Projeto de Formação de Educadores – ES	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 30/11/20	Acompanhamento dos trâmites internos (UFMG/UFOP/Fundação Renova) aprovação das alterações no Plano de Trabalho e Minuta do Termo de Cooperação Técnico Financeiro para execução do Projeto de Formação de Educadores - MG	N/A	09/11/20 – Submissão final da Minuta à Procuradoria Geral UFMG para aprovação.
	Elaboração do Plano de Trabalho e orçamento – parceria IFES para execução do Projeto de Formação de Educadores – ES	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 23/12/20	Acompanhamento dos trâmites internos (UFMG) para aprovação da Minuta e formalização da parceria para execução do Projeto de Formação de Educadores - MG	N/A	Minuta Assinada
14 a 23/12/20	Recebimento e análise da 1ª versão do plano de trabalho e orçamento enviado pelo IFES para execução do Projeto de Formação de Educadores – ES e abertura do processo de parceria.	N/A	Plano de trabalho

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
07/01/21	Realizar reunião com a equipe técnica do IFES para discussão do Plano de trabalho e orçamento	Ata	N/A
13/01/21	Realizar reunião entre as Procuradorias Jurídicas da UFMG e UFOP com o Jurídico da Fundação Renova para discussão da minuta contratual	Ata	N/A
18/01/21	Enviar versão atualizada da minuta do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP após reunião de alinhamentos jurídicos	Minuta	N/A
29/01/21	Realizar reunião com equipe técnica do IFES: apresentação da nova coordenadora do projeto e discussões sobre o Plano de Trabalho e orçamento	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/02/21	Realizar reunião com equipes da UFMG, UFOP e Fundep para esclarecimentos sobre composição de valores de despesas administrativas.	N/A	E-mail da Fundep esclarecendo a memória de cálculo
08/02/21	Realizar reunião entre times da Fundação Renova para alinhamentos quanto à tramitação interna da documentação referente a parceria com as universidades de Minas Gerais e de Ouro Preto.	N/A	N/A
10/02/21	Incluir documentação no SAP ARIBA	N/A	N/A
12/02/21	Realizar reunião com equipes do IFES e Secretaria de Estado da Educação do ES para discussões sobre plano de trabalho	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03/03/21	Reunião entre a equipe técnica da Fundação Renova, coordenação do projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais – ES, equipe SEDU/ES e coordenação da CT ECLET	minuta	Documento síntese da reunião
05/03/21	Realização de Reunião Inicial de Alinhamento (RIA) para discussão da metodologia de aplicação de taxas administrativas proposta pela Fundep/UFMG/UFOP.	N/A	N/A
01 a 31/03/21	Acompanhamento de trâmites internos e elaboração de documentação para aprovação da proposta de aplicação das taxas administrativas pela Fundep/UFMG/UFOP e formalização da parceria.	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – ABRIL 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/04/21	Acompanhamento e suporte na elaboração do plano de trabalho e orçamento pelo IFES.	minuta	Documento síntese da reunião
	Acompanhamento de trâmites internos para formalização da parceria com Fundep/UFMG/UFOP.	N/A	N/A

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – MAIO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
07/05	Reunião Fundação Renova – IFES: definições de prazos futuros e alinhamento de informações	N/A	Gravação de reunião – Microsoft Teams
14/05	Encaminhamento de Plano de Trabalho , planilha orçamentária e demais documentações do IFES	N/A	Anexo 01: Plano de trabalho, planilha orçamentária e demais documentos
17/05	Submissão de documentação às áreas da Fundação Renova	N/A	N/A
01 à 31/05/21	Acompanhamento de trâmites internos para formalização da parceria com Fundep/UFGM/UFOP.	N/A	Anexo 02: Plano de trabalho Revisado



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JUNHO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
10/06/2021	Retorno da minuta de Termo de Parceria com o IFES do setor jurídico da Fundação Renova	Minuta	Minuta
10/06/21	Encaminhamento da Minuta para análise e parecer da Procuradoria Federal/IFES	Minuta	Minuta
18/06/2021	Realização de Reunião Interna de Alinhamento – RIA – pela equipe da Fundação Renova	Ata	Ata
23/06/2021	Reunião de alinhamentos pós RIA com equipe do IFES	Gravação de reunião – Microsoft Teams	Gravação de reunião – Microsoft Teams
01 à 25/06/21	Encaminhamento e acompanhamento dos trâmites para assinatura do Termo de Parceria entre a Fundação Renova e Fundep/UFMG/UFOP.	N/A	<ul style="list-style-type: none"> - Encaminhamento da Minuta Chancelada pelo Jurídico da Fundação Renova para Universidades e Fundep; - Cadastro de toda documentação no SEI UFMG



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/07/2021	Reunião de negociações IFES-FACTO-Fundação Renova	Gravação de reunião – Microsoft Teams	Gravação de reunião – Microsoft Teams
12/07/21	Envio de APRO para áreas da Fundação Renova para emissão de pareceres	N/A	N/A
30/07/21	Apreciação de APRO pela diretoria da Fundação Renova	N/A	N/A
30/07/21	Assinatura do Termo de Parceria entre a Fundação Renova e Fundep/UFMG/UFOP.	N/A	Anexo 01: Termo de Cooperação Técnico Financeiro e Anexo 02 - Plano de Trabalho

9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



9.3 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/08/21	Realização de reuniões de trabalho para execução do Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais para Revitalização da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais		Reuniões de trabalho com os gestores do projetos (ajustes no planejamento, necessidade de remanejamento de linhas do orçamento e esclarecimentos sobre prestações de contas)
01 a 31/08/21	Tramitação da APRO do IFES para aprovação do Conselho Curador (apresentação para Diretoria e Comitê Socioeconômico) - Projeto de Formação de Educadores e Escolas Experimentais para Revitalização da Bacia do Rio Doce – Espírito Santo		Validação da proposta pela diretoria da FR e apresentação para o Comitê Socioeconômico



9.3 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/09/21	Realização de reuniões técnicas entre as equipes da UFMG, UFOP, Fundep e Fundação Renova para discussões sobre necessidades de readequação de planilha orçamentária.	Gravações – Microsoft Teams	N/A
01 a 30/09/21	Realização de reuniões gerenciais – Parceria Fundação Renova/IFES	N/A	N/A



9.3 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/10/21	Reuniões técnicas para revisão e adequações da planilha orçamentária: equipes UFMG, UFOP, Fundep e Fundação Renova;	N/A	N/A
01 a 31/10/21	Realização de reuniões gerenciais – parceria Fundação Renova - IFES	N/A	N/A



9.3 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 30/11/21	Realização de reuniões técnicas para planejamento de atividades – articulação institucional. Equipes: UFMG,UFOP, Fundação Renova	N/A	N/A
03 a 30/11/21	Realização de reuniões gerenciais – Parceria Fundação Renova/IFES	N/A	N/A



9.3 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/12/21	Realização de reuniões técnicas para planejamento de atividades – articulação institucional. Equipes: UFMG,UFOP, Fundação Renova	N/A	N/A
06/07 e 08/12	Realização de seminários de apresentação do projeto de Formação de Educadores para gestores públicos - MG	N/A	N/A
01 a 30/12/21	Realização de reuniões gerenciais – Parceria Fundação Renova/IFES	N/A	N/A
20/12/21	Definição da minuta final do Termo de Parceria com o IFES	N/A	Início das assinaturas pela Fundação Renova em 20/12/2021



9.3 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03/01/22	Formalização do Termo de Parceria com o IFES.	N/A	Última assinatura necessária (Reitor IFES) realizada em 03/01/22.
03 a 31/01/22	Realização de reuniões técnicas para planejamento de atividades – articulação institucional. Equipes: UFMG,UFOP, Fundação Renova	N/A	N/A
03 a 31/01/22	Realização de reuniões gerenciais – Parceria Fundação Renova/IFES	N/A	N/A



9.3 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 25/02/22	Realização de reuniões técnicas para planejamento de atividades – articulação institucional. Equipes: UFMG,UFOP, Fundação Renova.	N/A	N/A
01 a 25/02/22	Realização de <i>kick off</i> – atividades financeiras e prestação de contas – Parceria Fundação Renova/IFES.	N/A	N/A



9.3 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 31/03/22	Realização de reuniões técnicas para planejamento de atividades – articulação institucional. Equipes: UFMG, UFOP, Fundação Renova e membros da CT-ECLET.	N/A	N/A
03 a 31/03/22	Início do processo de mobilização e inscrição de educadores das redes públicas de ensino dos territórios da bacia do Rio Doce no estado de Minas Gerais.	N/A	N/A




9.4 AÇÕES PREVISTAS – ABRIL 2022


Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/04	Finalização do processo de seleção de educadores cursistas para a primeira turma do curso de aperfeiçoamento.	N/A	N/A
01 a 30/04	Início e finalização do processo de seleção de tutores para a primeira turma do curso de aperfeiçoamento.	N/A	N/A




ETAPAS DA MOBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO

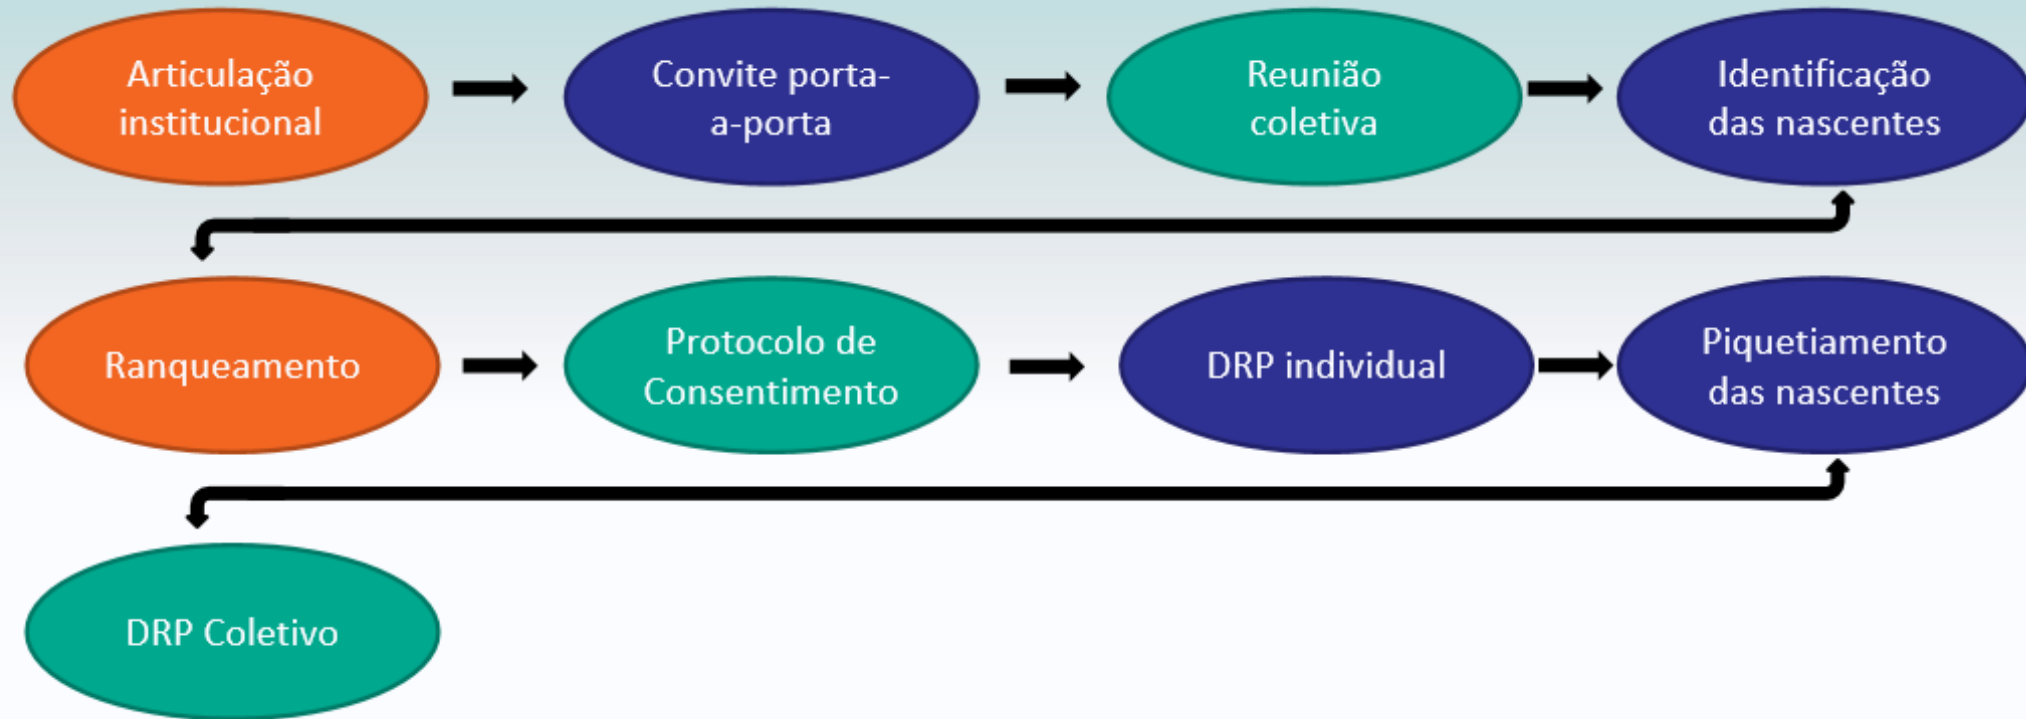

 Etapas internas

 Etapas individuais nas propriedades

 Etapas coletivas com a comunidade

10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



10.1 CRONOGRAMA FÍSICO – INTERFACE PG27 (*)

Atividade	Início	Término
Bacia do Suaçuí	Ter 08/01/19	Sex 20/12/19
Arranjo Institucional Local para mobilização e engajamento da Bacia do Suaçuí	Ter 08/01/19	Sex 01/02/19
Mobilização, Credenciamento e Capacitação de Técnicos e Associações da Bacia do Suaçuí	Ter 08/01/19	Seg 28/01/19
Chamamento Local para Mobilização da Bacia do Suaçuí	Ter 08/01/19	Sex 15/02/19
Apresentação Coletiva do Programa para mobilização e engajamento da Bacia do Suaçuí	Seg 04/02/19	Sex 08/03/19
Ranqueamento e Seleção dos Proprietários Cadastrados da Bacia do Suaçuí	Seg 04/02/19	Qua 31/07/19
Protocolo de Consentimento/Contrato para mobilização e engajamento da Bacia do Suaçuí	Seg 22/04/19	Sex 09/08/19
Assinatura dos Termos de Adesão ao Programa para mobilização e engajamento da Bacia do Suaçuí	Sex 26/04/19	Sex 23/08/19
Etapas de DRP nas propriedades (individual / coletivo TI Krenak)	Qui 28/03/19	Seg 16/09/19
Etapas de DRP na Comunidade (Coletivo)	Ter 15/10/19	Sex 22/11/19
Encerramento das atividades de mobilização e engajamento da Bacia do Suaçuí	Seg 25/11/19	Sex 20/12/19

(*) Essa interface foi concluída com a finalização dos DRPs coletivos e a inclusão da metodologia de mobilização e engajamento dos produtores rurais na definição do Programa de Recuperação de Nascentes – PG27.

10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



10.1 CRONOGRAMA FÍSICO – INTERFACE PG27 (*)

Atividade	Início	Término
Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Ter 12/03/19	Sex 05/06/20
Arranjo Institucional Local para mobilização e engajamento da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Ter 12/03/19	Sex 05/04/19
Mobilização, Credenciamento e Capacitação de Técnicos e Associações da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Ter 12/03/19	Seg 01/04/19
Chamamento Local para Mobilização da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Seg 08/04/19	Sex 07/06/19
Apresentação Coletiva do Programa para mobilização e engajamento da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Seg 22/04/19	Sex 21/06/19
Ranqueamento e Seleção dos Proprietários Cadastrados da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Seg 13/05/19	Sex 16/08/19
Protocolo de Consentimento/Contrato para mobilização e engajamento da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Sex 23/08/19	Seg 23/09/19
Etapas de DRP nas propriedades (individual)	Sex 30/08/19	Seg 23/12/19
Etapas de DRP na Comunidade (Coletivo)	Seg 14/10/19	Sex 07/02/20
Assinatura dos Termos de Adesão ao Programa para mobilização e engajamento da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Seg 30/09/19	Qui 30/04/20
Encerramento das atividades de mobilização e engajamento da Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Piranga	Seg 03/08/20*	Sex 04/09/20*

(*) Essa interface foi concluída com a adesão dos proprietários da Bacia de Pontões e a inclusão da metodologia de mobilização e engajamento dos produtores rurais na definição do Programa de Recuperação de Nascentes – PG27.

10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JULHO/2019 A SET/2020- INTERFACE PG27

As ações realizadas e prevista durante o período deste relatório foram reportadas no cronograma físico



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
11/07/2019	Apresentação da proposta geral da interface com o PG18 e o PG26 (Programa Integrado dos Assentamentos), com intuito de mobilizar, formar e engajar famílias, dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, para transição agroecológica.	ATA Reunião 11/07/2019	Apresentação em PPT enviada pelo e-mail da governança
01 a 30/07/2019	Articulação com as instituições que executarão a proposta de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, para envio da documentação; elaboração do Termo de Abertura de Parceria (TAP).	N/A	Centro de Formação Francisca Veras – (CFFV) e Fundação Helena Antipoff – para parceria em Minas Gerais e Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA) e Instituto Federal de Santa Teresa (IFES) – para parceria no Espírito Santo
06/07 a 30/07/2019	Elaboração do Plano de Trabalho e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais.	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
15/08/2019	Finalização do Plano de Trabalho e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais	N/A	N/A
16/08/2019	Reunião com o Centro de Formação Maria Olinda e Instituto Federal/Santa Maria para articulação e definição da parceria	ATA de Reunião	N/A
16 a 29/08/2019	Trâmites internos de análises e aprovações (Suprimentos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Compliance) referente proposta da interface com o PG18 e o PG26 para os assentamentos de Minas Gerais.	N/A	N/A
23/08/2019	Reunião intercâmaras (CTEI, CT Flor e CT ECLET) para apresentação do Projeto Integrado dos Assentamentos.	ATA de Reunião	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
19/09/2019	Finalização do Plano de Trabalho e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão no Espírito Santo (parceria IFES e Centro de Formação Maria Olinda).	N/A	N/A
20/09/2019	Protocolado junto ao CIF o Projeto Integrado de Desenvolvimento dos Assentamentos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Trabalho das parcerias previstas.	N/A	OFI. NII.072019.7370-01
09 a 27/09/2019	Elaboração da APRO, referente ao e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais – parceria com Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Helena Antipoff, para submissão e recolhimento dos Pareceres das Áreas: Suprimentos, Jurídico, Compliance e Financeiro.	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
10/10/2019	Reunião com a Diretoria para análise e aprovação da APRO referente ao Plano de trabalho/orçamento da proposta mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento em Minas Gerais.	N/A	N/A
15 e 16/10/2019	Reunião com o Conselho Curador para análise e aprovação da APRO referente ao Plano de trabalho/orçamento da proposta mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento em Minas Gerais.	N/A	N/A
17 a 30/10/2019	Ajustes necessários ao Plano de trabalho/orçamento da proposta mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento em Minas Gerais, de acordo com as orientações do Conselho Curador	N/A	N/A
17 a 30/10/2019	Elaboração da APRO, referente Plano de Trabalho e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão no Espírito Santo (parceria IFES e Centro de Formação Maria Olinda), para submissão e recolhimento dos Pareceres das Áreas: Suprimentos, Jurídico, Compliance e Financeiro..	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01/11/2019	Realizar reunião com a nova presidência da Fundação Helena Antipoff para discussão do Plano de Trabalho relacionado à parceria para formação técnica em agroecologia nos assentamentos da Reforma Agrária em Minas Gerais.	N/A	N/A
01 a 30/11/2019	Realizar ajustes necessários no Plano de Trabalho, relacionado à parceria com a Fundação Helena Antipoff – FHA e Centro de Formação Francisca Veras - CFFV, conforme encaminhamentos da reunião do FHA e da CT-ECLET.	N/A	N/A
	Acompanhar a negociação da Minuta Contratual (Suprimentos Fundação Renova, FHA e CFFV)	N/A	N/A
01 a 30/11/2019	Elaborar APRO, relativa à parceria com a CEFORMA e IFES, para formação das famílias assentadas em assentamentos da Reforma Agrária no Espírito Santo, e encaminhar para as áreas responsáveis pelos pareceres (Suprimentos, Compliance, Financeiro)	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 A 20/12/2019	Acompanhar a negociação da Minuta Contratual (Suprimentos Fundação Renova, FHA e CFFV)	N/A	No dia 20/12, a Fundação Helena Antipoff, comunicou sua desistência da parceria, em reunião, realizada entre as equipes técnicas e Jurídicas da Fundação Renova, Fundação Helena Antipoff e Centro de Formação Francisca Veras. Como estratégia, a Fundação Renova e o Centro de Formação Francisca Veras acordaram de revisar o plano de trabalho/orçamento, retirando o Curso Técnico em Agroecologia e a Fundação Helena Antipoff da parceria e dar continuidade aos cursos não formais, enquanto se busca um novo parceiro para execução do curso formal.
12/12/2019	Reunião Conselho Curador para análise e aprovação da APRO, relativa à parceria com a CEFORMA e IFES, para formação das famílias assentadas em assentamentos da Reforma Agrária no Espírito Santo	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
06 a 31/01/2020	Acompanhamento das negociações das Minuta Contratuais (Suprimentos Fundação Renova, CEFORMA/IFES)	N/A	N/A
	Revisão do Plano de trabalho/Orçamento da parceria com o Centro de Formação Francisca Veras	Plano de Trabalho e orçamento	Em função da desistência da Fundação Helena Antipoff na parceria
30/01/2020	Assinatura do contrato e formalização da parceria entre Fundação Renova e Centro de Formação Francisca Veras para execução de cursos não formais de Formação de Formadores e Formação de Base em Agroecologia.	Minuta assinada	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
10/02/2020	Reunião com representantes do CEFORMA e IFES Santa Teresa para discussão da Minuta	N/A	Em função da não aprovação do Curso Técnico em Agroecologia pelo IFES, os representantes do CEFORMA e do IFES solicitaram o desmembramento do plano de trabalho para dar continuidade ao cursos não formais, enquanto se espera os trâmites de aprovação do mesmo
11 a 28/02/2020	Revisão do Plano de trabalho/Orçamento da parceria com o Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA)	Plano de Trabalho e orçamento	Em função da não aprovação do Curso Técnico em Agroecologia e da necessidade do desmembramento do plano de trabalho.



10.2 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
02 a 31/03/2020	Acompanhamento das negociações das Minuta Contratuais (Suprimentos Fundação Renova, CEFORMA)	N/A	N/A
19/03/2020	Realização do 1º Seminário da Educação na Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia dos Assentamentos da Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce (MG).	N/A	O seminário foi adiado em função do COVID-19



10.2 AÇÕES REALIZADAS – ABRIL 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
14/04/2020	Assinatura do contrato e formalização da parceria entre Fundação Renova e Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA) para execução de cursos não formais de Formação de Formadores e Formação de Base em Agroecologia.	Minuta assinada	N/A
01 a 30/04/2020	Elaboração do Projeto Político Pedagógico; da proposta de Diagnóstico Educacional; do Plano de Comunicação – Período de isolamento social (COVID-19).	Relatório 1ª prestação de contas	N/A
	Realização de reuniões virtuais para replanejamento das atividades de campo no período de isolamento social (COVID-19)	Atas	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – MAIO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
18/05/2020	Realização da reunião de Kick off (partida) com o Centro de Formação Maria Olinda (CEFORMA) para início da execução do plano de trabalho.	ATA	N/A
01 a 30/05/2020	Análise e validação da 1ª prestação de Contas do Centro de Formação Francisca Veras.	Relatório 1ª prestação de contas	N/A
	Realização de reuniões virtuais para replanejamento das atividades de campo no período de isolamento social (CEFORMA)	ATA	N/A
	Conclusão da mobilização da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia (Etapa I) - MG	Peças de divulgação, lista de inscritos	Número de cursistas previstos: 30 Número de cursistas inscritos: 40
29/05 a 25/06/2020(*)	Realização da Etapa I da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório de execução do Curso - Relatório 1ª prestação de contas.	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 01 Número de participantes: 40



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JUNHO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/06/2020	Continuidade da realização de diagnóstico educacional e agroecológico nos assentamentos em Minas Gerais	Relatório 2ª prestação de contas	N/A
	Realização da proposta de diagnóstico educacional e agroecológico nos assentamentos no Espírito Santo	Relatório 1ª prestação de contas	N/A
	Elaboração do Projeto Político Pedagógicos do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para assentamentos no Espírito Santo	Relatório 1ª prestação de contas	N/A
28/06 a 24/07/2020(*)	Realização da Etapa II da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 2ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 02 Número de participantes: 40



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/07/2020	Conclusão do diagnóstico educacional e agroecológico nos assentamentos em Minas Gerais	Relatório 2ª prestação de contas	N/A
	Início da realização de diagnóstico educacional e agroecológico nos assentamentos do Espírito Santo	N/A	Por solicitação dos assentamentos essa atividade só ocorrerá quando o período de isolamento pela COVID – 19 for encerrado
	Início da mobilização da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para assentamentos no Espírito Santo	Relatório 1ª prestação de contas	N/A
25/07 a 27/08/2020(*)	Realização da Etapa III da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório de execução do Curso ou Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 03 Número de participantes: 40



10.2 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/08/2020	Conclusão da mobilização da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para assentamentos no Espírito Santo	Relatório 1ª prestação de contas	Número de cursistas previstos: 50 Número de cursistas inscritos: 51
27/08 a 29/09/2020(*)	Realização da Etapa I da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório de execução do Curso	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 01 Número de participantes: 87
27/08 a 24/09/2020(*)	Realização da Etapa IV da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 04 Número de participantes: 40



10.2 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
11 e 12/09 e 18 e 19/09/2020	Realização da Etapa I da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo	Relatório 2ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 01 Número de participantes: 48
24/09 a 22/10/2020(*)	Realização da Etapa V da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 05 Número de participantes: 40
30/09 a 30/10/2020(*)	Realização da Etapa II da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 02 Número de participantes: 87



10.2 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
09 e 10/10 e 16 e 17/10/2020	Realização da Etapa II da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo	Relatório 2ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 02 Número de participantes: 43
30/10 a 30/11/2020(*)	Realização da Etapa III da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 03 Número de participantes: 87
12/10/2020 (**)	Eventos Formação de Base: Realização da Assembleia dos Sem Terrinhas (MG)	Relatório 3ª prestação de contas	Número de participantes: 28

(**) Informação inserida no Relatório de Agosto/21



10.2 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
06 e 13/11/2020	Realização da Etapa III da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo	Relatório 2ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 03 Número de participantes: 42
29/10 a 31/11/2020(*)	Realização da Etapa VI e conclusão da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 06 Número de participantes: 40 Anexo 08: Certificados de Conclusão de Curso



10.2 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2020

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/12/2020(*)	Realização da Etapa IV da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório 4ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 04 Número de participantes: 87
04 e 11/12/2020	Realização da Etapa IV da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo	Relatório 3ª prestação de contas	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 04 Número de participantes: (44)
19/12/2020	Eventos Formação de Base: Oficina Introdução às Mídias Digitais (MG)	Relatório 3ª prestação de contas	Número de participantes: 25

(**) Informação inserida no Relatório de Agosto/21



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
15 a 17/01/2021	Realização da Etapa V da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo	N/A	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 05 Número de participantes: 44
02 a 31/01/2021(*)	Realização da Etapa V da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	N/A	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 05 Número de participantes: 87



10.2 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
12 e 19/02/2021	Realização da Etapa VI da 1ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo (Conclusão Turma 01)	Relatório de Prestação de Contas – 3º Trimestre e Certificado de Conclusão de Curso	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 06 Número de participantes: 36
01 a 26/01/2021(*)	Realização da Etapa VI da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (Conclusão Turma 02) (*) Incluindo tempo escola e tempo comunidade	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre(*)	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 05 Número de participantes: 87
26/02/21	Início da Etapa I da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre(*)	Etapas previstas: 06 Número de participantes: 64



10.2 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 31/03/2021(*)	Conclusão da Etapa I da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre(*)	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 01 Número de participantes: 57
26/03/21	Início da Etapa II da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre(*)	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 01 Número de participantes: 57
30/03/21	Eventos Formação de Base: O Papel do Setor de Educação e a Agroecologia (MG)	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre(*)	Número de participantes: 40

(*) Conforme cronograma de prestação de contas este relatório será apresentado em abril/21



10.2 AÇÕES REALIZADAS – ABRIL 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 e 02/04/2021	Realização do IIº Seminário da Educação na Integração dos Eixos do Programa de Agroecologia dos Assentamentos da Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce (ES).	Relatório de Prestação de Contas – 4º Trimestre	Anexo 01: IV RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Período: 23/02/2021 a 28/05/2021
20/04/2021	Conclusão da etapa de mobilização/inscrição da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório de Prestação de Contas – 4º Trimestre	Número de inscritos: 52(*) (Anexo 01)
01 a 22/04/21	Conclusão da Etapa II da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 02 Número de participantes: 57
23/04/21	Início da Etapa III da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 02 Número de participantes: 57



10.2 AÇÕES REALIZADAS – MAIO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 22/05/21	Conclusão da Etapa III da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	N/a
22/05/21	Início da Etapa IV da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	N/a
29/05/21	Eventos Formação de Base: Realização da Oficina Ervas Medicinais e Agroecologia: Uma forma de Cultivar o Saber Popular (MG)	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	Número de participantes: 26



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JUNHO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 22/06/21	Conclusão da Etapa IV da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório Prestação de Contas – 6º Trimestre	N/A
25/06/21	Início da Etapa V da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório Prestação de Contas – 6º Trimestre	N/A
04 e 18/06/2021	Conclusão da I Etapa da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório Prestação de Contas – 5º Trimestre	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 01 Número de participantes: 56



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/07/21	Conclusão da 3ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	55 Formandos - Anexo 03: VI Relatório Trimestral de Prestação de Contas – Centro de Formação Francisca Veras(*). OBS: Os certificados serão emitidos e enviados no próximo mês
	Mobilização dos cursista para participação na 4ª e última turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	Anexo 03: VI Relatório Trimestral de Prestação de Contas – Centro de Formação Francisca Veras. Nº de Inscritos: 27
22/07/21	Eventos Formação de Base: Realização da Oficina de Boas Práticas para Manter a Saúde Mental em Dia (MG)	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	Anexo 03: VI Relatório Trimestral de Prestação de Contas – Centro de Formação Francisca Veras. Anexo 04: Certificados Nº de Participante: 13
09 e 16/07/2021	Realização da II Etapa da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre	Etapas previstas: 06 Etapas realizadas: 02 Número de participantes: 52



10.2 AÇÕES REALIZADAS – AGOSTO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
06 e 13/08/2021	Realização da III Etapa da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre	N/A
20/08/21	Início 4ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais (Etapa I).	Relatório de Prestação de Contas – 7º Trimestre	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – SETEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 10/09/21	Realização da IV Etapa da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório de Prestação de Contas – 5º Trimestre	N/A
21/09/21	Finalização da Etapa I da 4ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 7º Trimestre	N/A
22/09/21	Início da Etapa II da 4ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 7º Trimestre	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – OUTUBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
08/10/21	Início da V Etapa da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	N/A
15/10/21	Finalização da V Etapa da 2ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos do Espírito Santo.	Relatório de Prestação de Contas – 6º Trimestre	N/A
17/10/21	Início da Etapa III da 4ª Turma do Curso de Formação de Formadores em Agroecologia para os assentamentos de Minas Gerais.	Relatório de Prestação de Contas – 7º Trimestre	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – NOVEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 30/11/21	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Renova.	N/A	N/A
13/11/21	Finalização da 3ª Etapa da 4ª turma de formação de formadores em assentamentos da reforma agrária em MG	N/A	N/A
14/11/21	Início da 4ª Etapa da 4ª turma de formação de formadores em assentamentos da reforma agrária em MG	N/A	N/A
03 a 30/11/21	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Maria Olinda (ES) e Fundação Renova.	N/A	N/A
03 a 30/11/21	Início da 6ª etapa da 2ª turma de formação de formadores em assentamentos da reforma agrária no ES	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – DEZEMBRO 2021

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 30/12/21	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Renova.	N/A	N/A
16/12/21	Finalização da 4ª Etapa da 4ª turma de formação de formadores em assentamentos da reforma agrária em MG	N/A	N/A
01 a 30/12/21	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Maria Olinda (ES) e Fundação Renova.	N/A	N/A
01 a 30/12/21	Finalização da 2ª turma de formação de formadores em assentamentos da reforma agrária no ES	N/A	N/A
01 a 30/12/21	Início da execução da formação de base em Agroecologia no ES	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – JANEIRO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 31/01/22	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Renova.	N/A	N/A
07/01/22	Reunião entre a Fundação renova/Centro de Formação Francisca Veras e GT – 33.	N/A	N/A
03 a 31/01/22	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Maria Olinda (ES) e Fundação Renova.	N/A	N/A
03 a 31/01/22	Execução – Formação de base agroecológica - ES	N/A	N/A
03 a 31/01/22	Finalização da 4ª turma de formação de formadores - MG	N/A	N/A
01 a 31/01/22	Execução – Formação de base agroecológica - MG	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – FEVEREIRO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 25/02/22	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Renova.	N/A	N/A
01 a 25/02/22	Realização de seminários de integração dos eixos do programa de agroecologia nos assentamentos da reforma agrária na bacia do rio Doce - MG	N/A	Relação de participantes, de conteúdos abordados, etc
25/02/22	Envio do relatório executivo referente ao ano de 2021	N/A	Relatório técnico
01 a 25/02/22	Mobilização – Formação de base agroecológica - MG	N/A	N/A
01 a 25/02/22	Execução – Formação de base agroecológica - ES	N/A	N/A



10.2 AÇÕES REALIZADAS – MARÇO 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
03 a 31/03/22	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Renova.	N/A	N/A
15/03/22	Envio do relatório executivo referente ao ano de 2021 - MG	N/A	Relatório técnico
03 a 31/03/22	Realização – Formação de base agroecológica - MG	N/A	N/A
03 a 31/03/22	Execução – Formação de base agroecológica - ES	N/A	N/A
07/03/2022	Realização da aula inaugural do curso técnico em agroecologia - ES	N/A	N/A



10.3 AÇÕES PREVISTAS – ABRIL 2022

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Observações e Documentações Referentes a ação
01 a 29/04/22	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Francisca Veras e Fundação Renova.	N/A	N/A
01 a 29/04/22	Execução – Formação de base agroecológica - MG	N/A	N/A
01 a 29/04/22	Realização de reuniões técnicas entre as equipes do Centro de Formação Maria Olinda e Fundação Renova.		N/A
01 a 31/03/22	Execução – Formação de base agroecológica – ES	N/A	N/A
01 a 29/04/22	Execução - do curso técnico em agroecologia – ES	N/A	N/A



FUNDAÇÃO
renova
