



FUNDAÇÃO  
**renova**


AGOSTO/2019



# REPORT - GT EDUCAÇÃO

## PG033 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

Proposta preliminar para apreciação dos membros do GT Educação, conforme encaminhamentos da reunião extraordinária realizada em 27/06/2019. Após próxima reunião prevista para dia 06/09/2019, serão realizados os ajustes e o envio do report será mensal para os membros do GT-Educação.





### A- REPORT GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

1

Objetivo Geral do Programa, TTAC e Deliberações CIF

2

Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG-033 – Período Emergencial

3

Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG-033 – Durante a Elaboração do Programa

4

Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG-033

5

Cronograma Físico do Programa

6

Linha do Tempo do Programa

7

Cronograma Financeiro Realizado/Previsto Geral do Programa



### B- REPORT POR PROJETO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

8

#### Projeto Formação de Lideranças Jovens

8.1 Cronograma físico previsto- 1º CICLO

8.2 Cronograma financeiro previsto- 1º CICLO

8.3 Ações realizadas- JULHO 2019

8.4 Ações previstas- AGOSTO 2019



### 9 Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais

9.1 Cronograma físico previsto

9.2 Cronograma financeiro previsto

9.3 Ações realizadas- JULHO 2019

9.4 Ações previstas- AGOSTO 2019



### 10 Processo Interface Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis

10.1 Cronograma físico previsto

10.2 Cronograma financeiro previsto

10.3 Ações realizadas- JULHO 2019


10.4 Ações previstas- AGOSTO 2019

\*O report referente ao Projeto Fortalecimento de Redes e Políticas Públicas será feito quando se iniciarem suas ações em 2021.



# REPORT - GT EDUCAÇÃO

## A- REPORT GERAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE- PG33

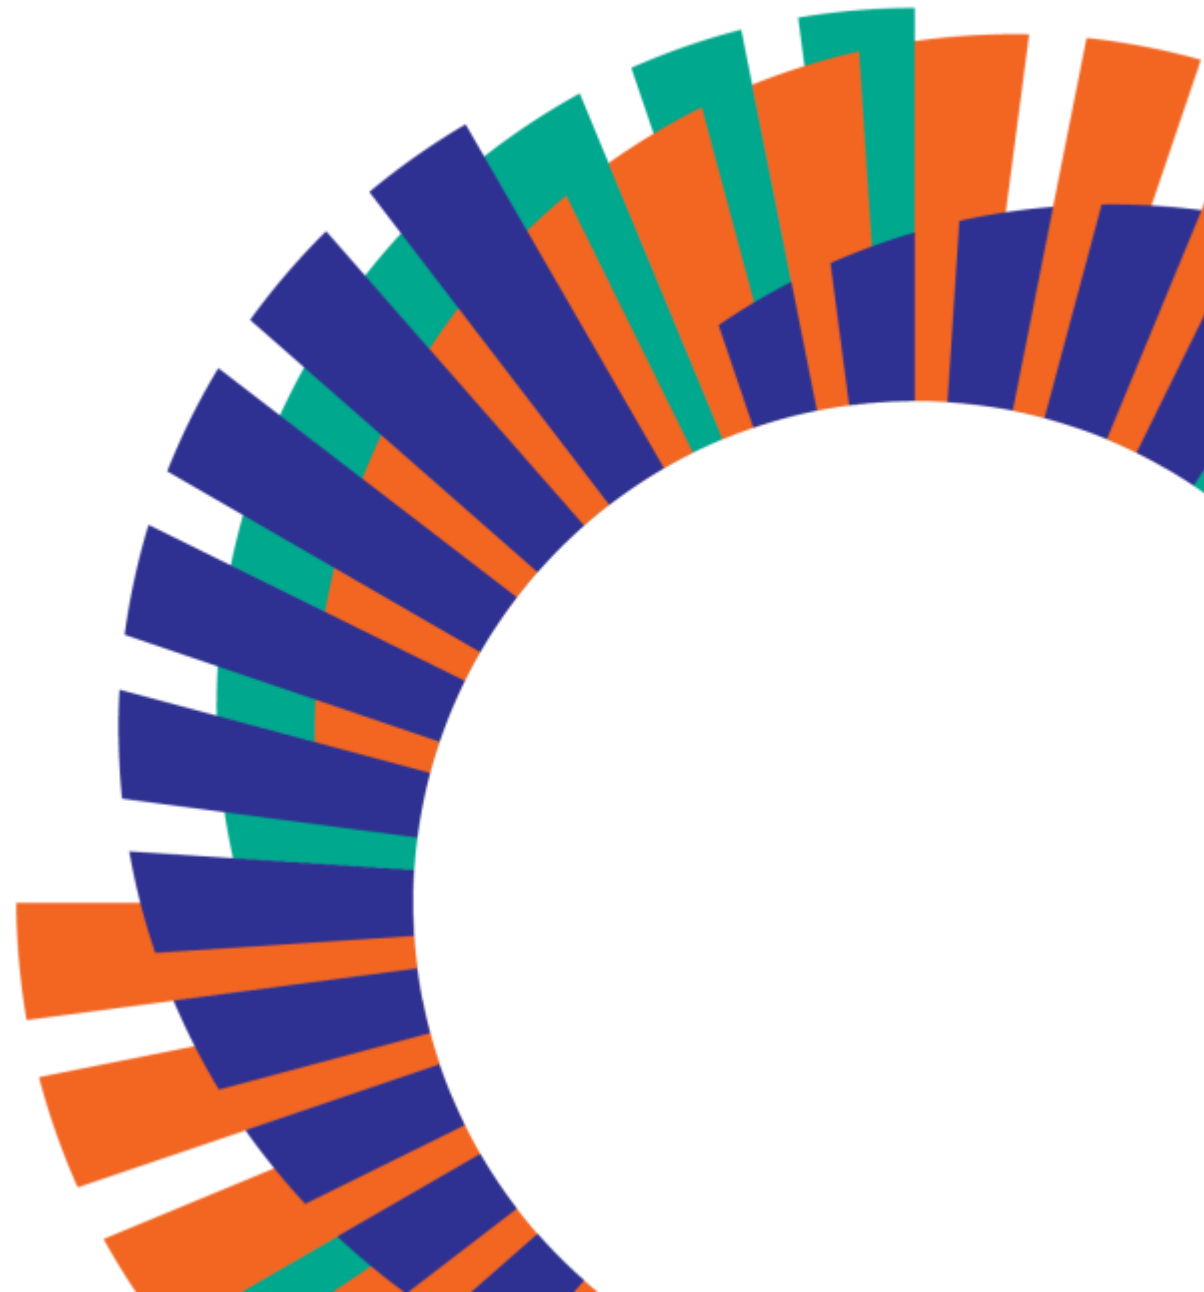



# 1 - Objetivo Geral do Programa, TTAC e Deliberações CIF

**OBJETIVO:** *Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.*

- **CLÁUSULA 172:** A FUNDAÇÃO deverá implantar medidas de educação ambiental, em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na ÁREA AMBIENTAL 1, em conformidade com a Lei Federal nº 9.795/1999 e seu decreto regulamentador nº 4.281/2002.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Essas medidas deverão ser iniciadas até 6 (seis) meses a contar da assinatura deste Acordo e serão mantidas pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do seu início.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O programa de educação ambiental deverá abranger, além dos demais conteúdos previstos em lei, informações referentes às emergências ambientais.

- **DELIBERAÇÃO 136:** Aprova a Nota Técnica nº 04 da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer e Turismo e encaminha à Fundação Renova as diretrizes a serem cumpridas pelo Programa de Educação Ambiental, previsto na Cláusula 172 do TTAC.
- **DELIBERAÇÃO 178:** Aprova a definição do programa em 29/06/2018.
- **DELIBERAÇÃO 240:** Contratação de estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsas para professores da rede municipal e estadual dos 45 municípios atendidos.
- **DELIBERAÇÃO 288:** Atualização do Programa de Ambiental e apresentação de Relatório detalhado das ações do Programa, com prazos e custos. Item 1) A Renova deverá atualizar o documento de definição do PG033, compilando todas as informações apresentadas pela Fundação em reuniões, como todas as solicitações da CT-ECLET, com a revisão do cronograma físico-financeiro de cada projeto/processo e a exclusão da despesa de contratação não reconhecida por este Comitê, conforme item 2 da Deliberação CIF nº 240/2018, no prazo de 60 dias.

## 2- Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG-033 – Período Emergencial



Data	Tipo	Município	Número de Participantes	Orçamento realizado
Agosto a dezembro de 2017	Ações Período Emergencial: Oficinas/ palestras/ rodas de conversas/ apresentações artísticas/ passeios ecológicos	Barra Longa Mariana	641	R\$406.479,00
Março a dezembro de 2017	Execução do Projeto Douradinho: Distribuição de livros, com contação de história, capacitação de professores, apresentações teatrais e gincanas com alunos.	Governador Valadares	1.468	R\$276.066,00
		Ipatinga	1.786	
		Mariana	541	
		Rio Doce	83	
		Santa Cruz do Escalvado	76	
		Barra Longa	227	
		Colatina	795	

## 2- Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG-033 – Período Emergencial



<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Município</b>	<b>Número de Participantes</b>	<b>Orçamento realizado</b>
Outubro a novembro de 2017	Projeto Plantando pelo Planeta: Formação de Jovens Embaixadores da Justiça Climática	Mariana	100	R\$87.130,00
	Projeto Plantando pelo Planeta: Plantio de 100 mudas			

### 3- Contextualização/memória das ações e orçamento realizado antes da aprovação do PG-033 – Durante a Elaboração do Programa (Definição Participativa do PG)



<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Município</b>	<b>Número de Participantes</b>	<b>Orçamento realizado</b>
26 e 27/09/2017	Realização de 01 encontro de Prosa e Saberes - Etapa 01 Elaboração do Programa	Marilândia	70	R\$488.930,00
05 e 06/12/2017	Realização de 01 Oficina Diálogos com a Gestão Pública - Etapa 02 Elaboração do Programa	Governador Valadares	102	
17 e 18/10/2018	Realização de 01 Fórum de Educação para Revitalização da bacia do rio Doce, etapa Colatina e Ipatinga - Devolutiva do Programa elaborado	Colatina	104	
24 e 25/10/2018		Ipatinga	144	

## 4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG-033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
29/06/18	Deliberação nº178	Aprova a definição do programa em 29/06/18.	Data: 25/06/2018 Nome do documento: Educação_Revitalização - Etapa 3 - Rev25_06_18 Ofício: OFI.NII.052018.2985
20/03/18	Nota Técnica nº 7	Realizar um prognóstico do Programa juntamente com a definição de ações que incentivem a continuidade do Programa após os 10 anos.	Data: 18/07/2018 Nome do documento:
18/06/18	Nota Técnica nº 11		Prognóstico_final_18_07_2018 Ofício: OFI.NII.072018.3577
18/06/18	Nota Técnica nº11	Apresentar os projetos executivos de cada projeto/programa do “Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce”, incluindo a revisão dos indicadores para cada projeto de forma que suas metas possam ser aferidas também em números absolutos, para cada ano do programa, e o cronograma detalhado dos projetos, com o número de entidades e indivíduos que se pretende atingir, por tipologia, apresentando dados mais concretos do público que estará envolvido nas ações.	Data: 31/08/2018 Nome do documento: Projeto_Executivo_31_08_2018 Ofício: OFI.NII.082018.3971

## 4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG-033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
N/A	Produção Livro- Encontro Prosa e Saberes	Livros entregues durante a realização do 1º Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce.	Data: 17 e 18/10/2018 (Colatina) e 24 e 25/10/2018 (Ipatinga)
17/09/18	Ata Reunião ordinária CT-ECLET	Revisão do documento Projeto_Executivo_31_08_2018 conforme ata da 16ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo - CT ECLET.	Data: 05/11/2018 Nome do documento: P Projeto_Executivo_Rev_ CT_05_11_18 Enviado por e-mail: 05/11/2018
03/01/19	Relatório	Relatório elaborado para apresentação dos resultados do 1º Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce.	Data: 03/01/2019 Nome documento: Relatório_Analítico_Contribuições Fórum_Educação Ofício: OF.NII.012019.4968
18/06/18	Nota Técnica nº 11	item 4: Formação de Grupo de Trabalho, que terá como objetivo a proposição de indicadores de efetividade, que verifiquem o engajamento e a capacidade de transformação operada pelo público atendido pelo programa	Data: 15/02/2019 Nome do documento: Proposta_GT_Indicadores Ofício: OFI.NII.022019.5442

## 4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG-033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
N/A	Relatório	Relatos a partir da Facilitação Poética realizada durante o 1º Fórum de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (Colatina/Ipatinga)	Data: 26/02/2019 Nome do documento? Relatos_Facilitação_Poética_Fórum_Educação_PG33 Enviado por e-mail: 26/02/2019
05/04/2019	Reunião Extraordinária	Revisão do documento Proposta_GT_Indicadores conforme Reunião Extraordinária realizada entre a Fundação Renova e CT-ECLET no dia 05/004/2019	Data: 25/04/2019 Nome do documento: Proposta_GT_Indicadores Ofício: OFI.NII.042019.6183
30/11/18	Deliberação nº 240	Contratação de estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsas para professores da rede municipal e estadual dos 45 municípios atendidos.	Data: 30/04/2019 Nome do documento: Relatório_Estudo_de_Viabilidade_PG_33_30_04_2019 Ofício: OFI.NII.012019.5122-02

## 4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG-033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
02/05/19	Reunião extraordinária	Considerações finais para lançamento do Edital Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01.	<p>Data: 08/05/2019  Nome do documento: Edital Formação de Lideranças Jovens</p> <p>Página do edital: <a href="https://www.fundacaorenova.org/paineis/formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/">https://www.fundacaorenova.org/paineis/formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/</a></p> <p>Notícia divulgação:  <a href="https://www.fundacaorenova.org/noticia/aberto-edital-de-formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/">https://www.fundacaorenova.org/noticia/aberto-edital-de-formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/</a></p>
02/05/19	Reunião extraordinária	Considerações finais para o chamamento público do credenciamento de profissionais para composição da comissão avaliadora das propostas técnicas do Edital Formação Liderança Jovens – Ciclo 01.	<p>Data: 28/05/2019  Nome do documento: Chamamento Público  Aprovação do texto: E-mail CT-ECLET em 27/05/2019</p> <p>Notícia chamamento:  <a href="https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundacao-renova-esta-credenciando-profissionais-para-avaliar-propostas-tecnicas-do-edital-formacao-de-liderancas-jovens-ciclo-01/">https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundacao-renova-esta-credenciando-profissionais-para-avaliar-propostas-tecnicas-do-edital-formacao-de-liderancas-jovens-ciclo-01/</a></p> <p>Notícia Resultado Chamamento:  <a href="https://www.fundacaorenova.org/noticia/resultado-do-chamamento-publico-edital-formacao-de-liderancas-jovens/">https://www.fundacaorenova.org/noticia/resultado-do-chamamento-publico-edital-formacao-de-liderancas-jovens/</a></p> <p>LINKEDIN:  <a href="https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6551451614241136640/">https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6551451614241136640/</a></p>


## 4- Contextualização/memória das documentações técnicas produzidas a partir da aprovação do PG-033



Data	Tipo	Resumo	Entrega pelo PG
06/05/19	Nota Técnica nº 24	Revisão do documento Projeto_Executivo_CT_05_11_2018 em função da Nota Técnica nº 24; Deliberação nº 288 e ata da Reunião Extraordinária realizada entre a Fundação Renova e CT-ECLET.	Data: 26/07/2019
28/05/209	Deliberação nº 288		Nome do documento: Projetos_ExecutivosV02_26_07_2019
27/06/19	Ata reunião extraordinária		Ofício: OFI.NII.072019.7435
28/05/2019	Deliberação nº288	A Fundação Renova deverá apresentar o relatório detalhado de todas as ações do Programa supracitado, com descrição das ações executadas e respectivos gastos, assim como da previsão de execução das ações não iniciadas, no prazo de 60 (sessenta) dias.	
27/06/19	Ata reunião extraordinária	Para entendimento ao cumprimento da referida Deliberação, foi realizada uma reunião do Grupo de trabalho de Educação (GT Educação) no dia no dia 27 de junho de 2019, onde ficou acordado que tais informações serão disponibilizadas por meio de um relatório mensal – denominado “report” – até o décimo dia útil do mês, sendo que o primeiro Report será entregue em 07 de agosto de 2019, para apreciação e validação do modelo pela CT ECLET.	Data: 07/08/2019 Nome do documento: Proposta_Report_GT_Educação Ofício: OFI.NII.072019.7450-01



# 5- Cronograma físico do Programa

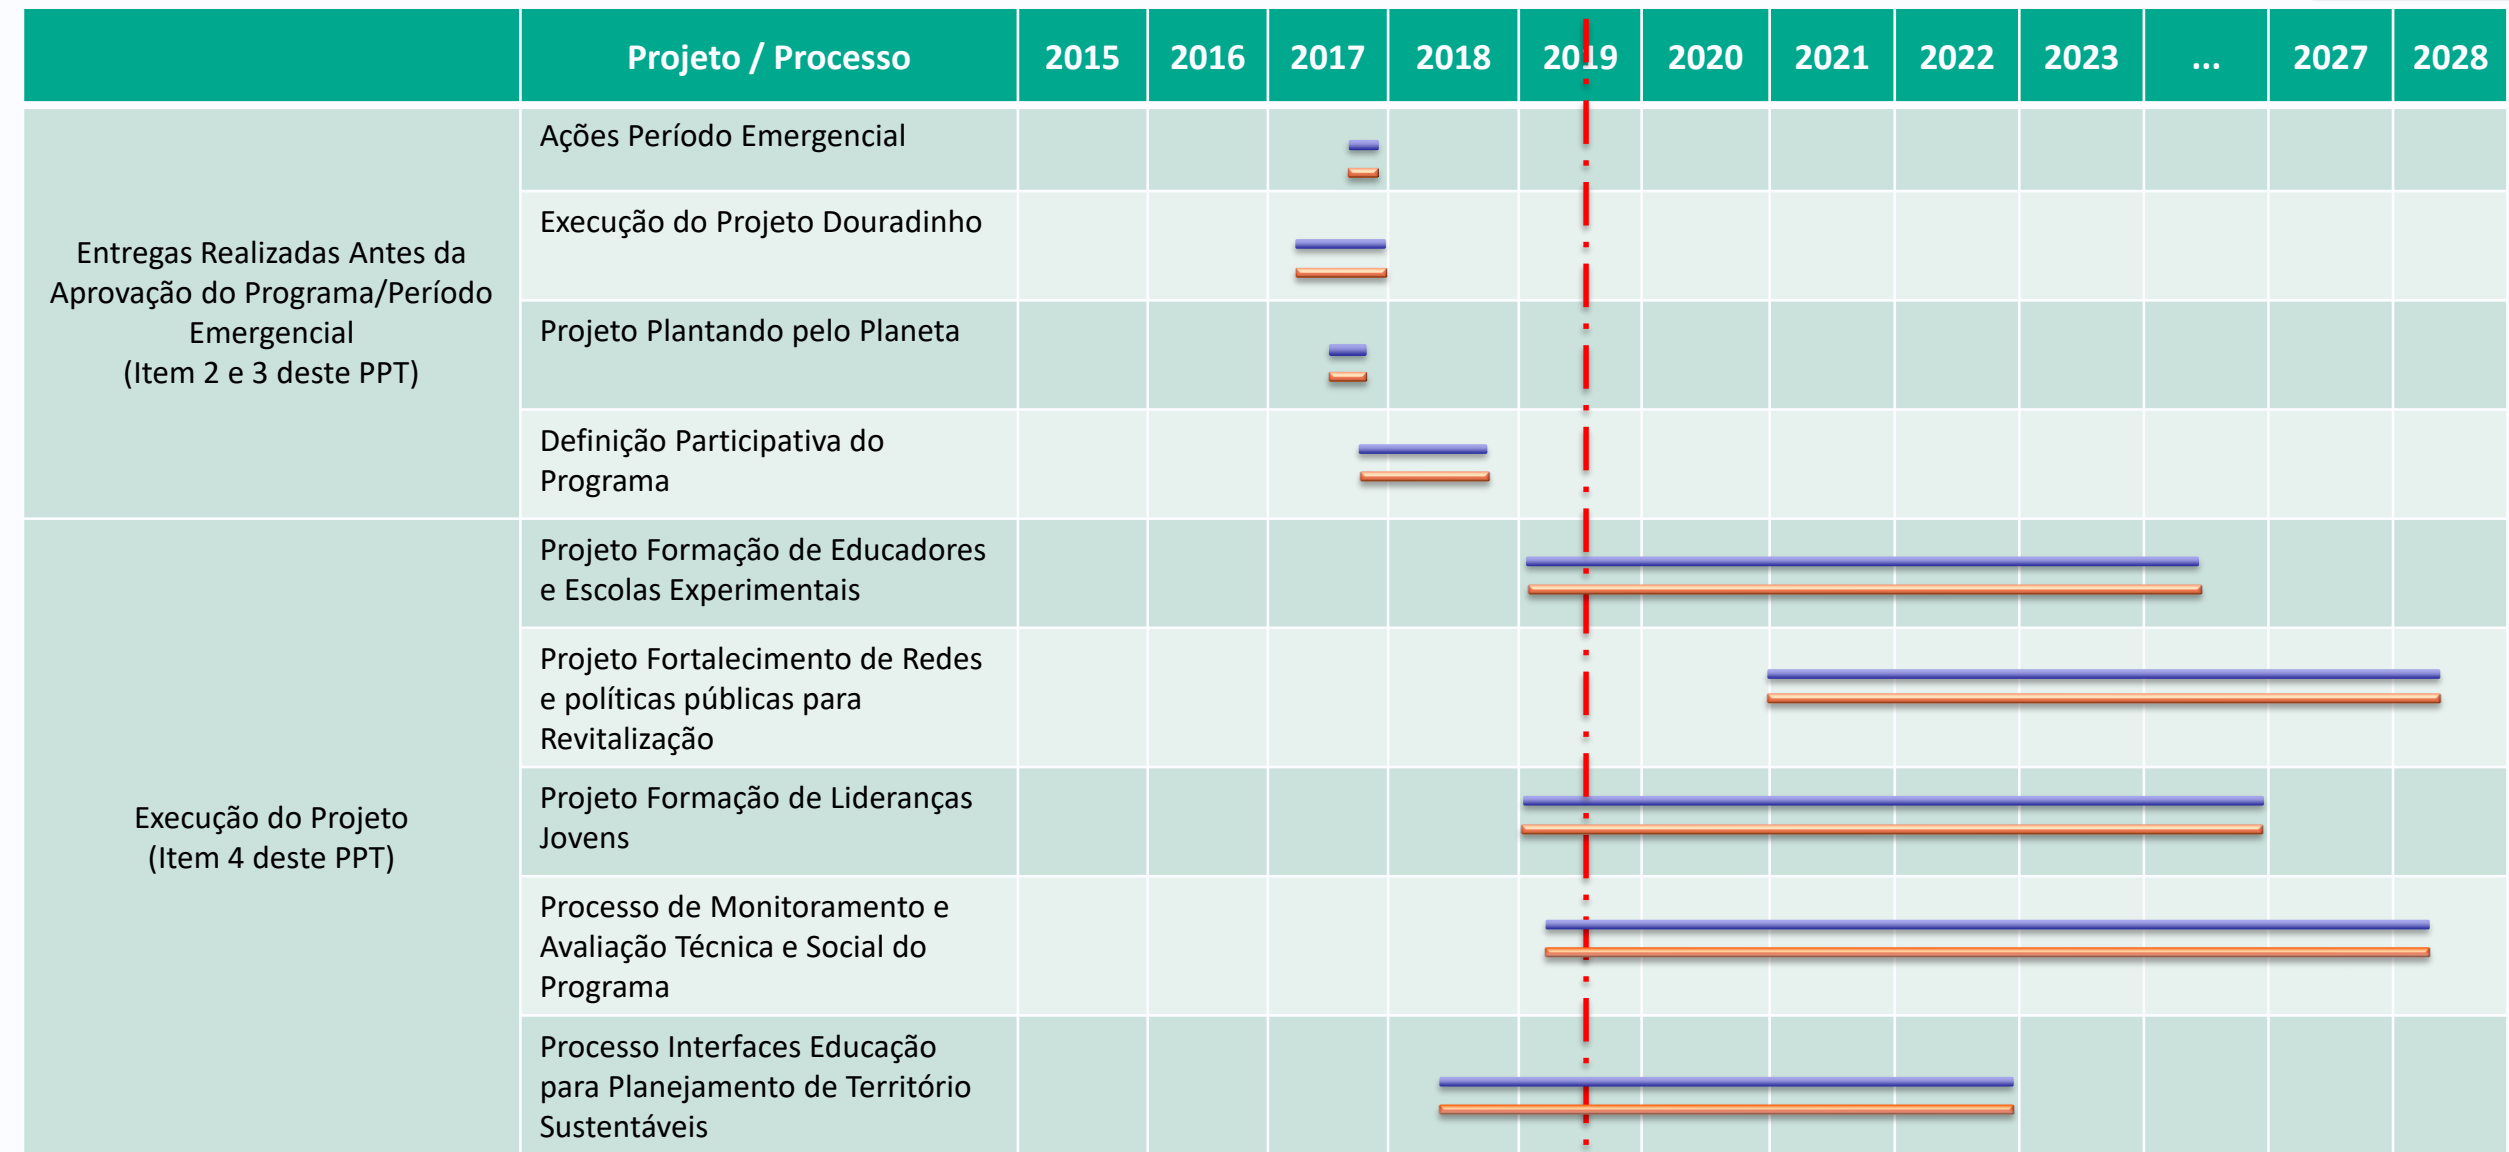




# 6- Linha do Tempo do Programa

Entregas Concluídas (Jan/17 – Mai/19)


Próximas Entregas (Jun - Dez/19)

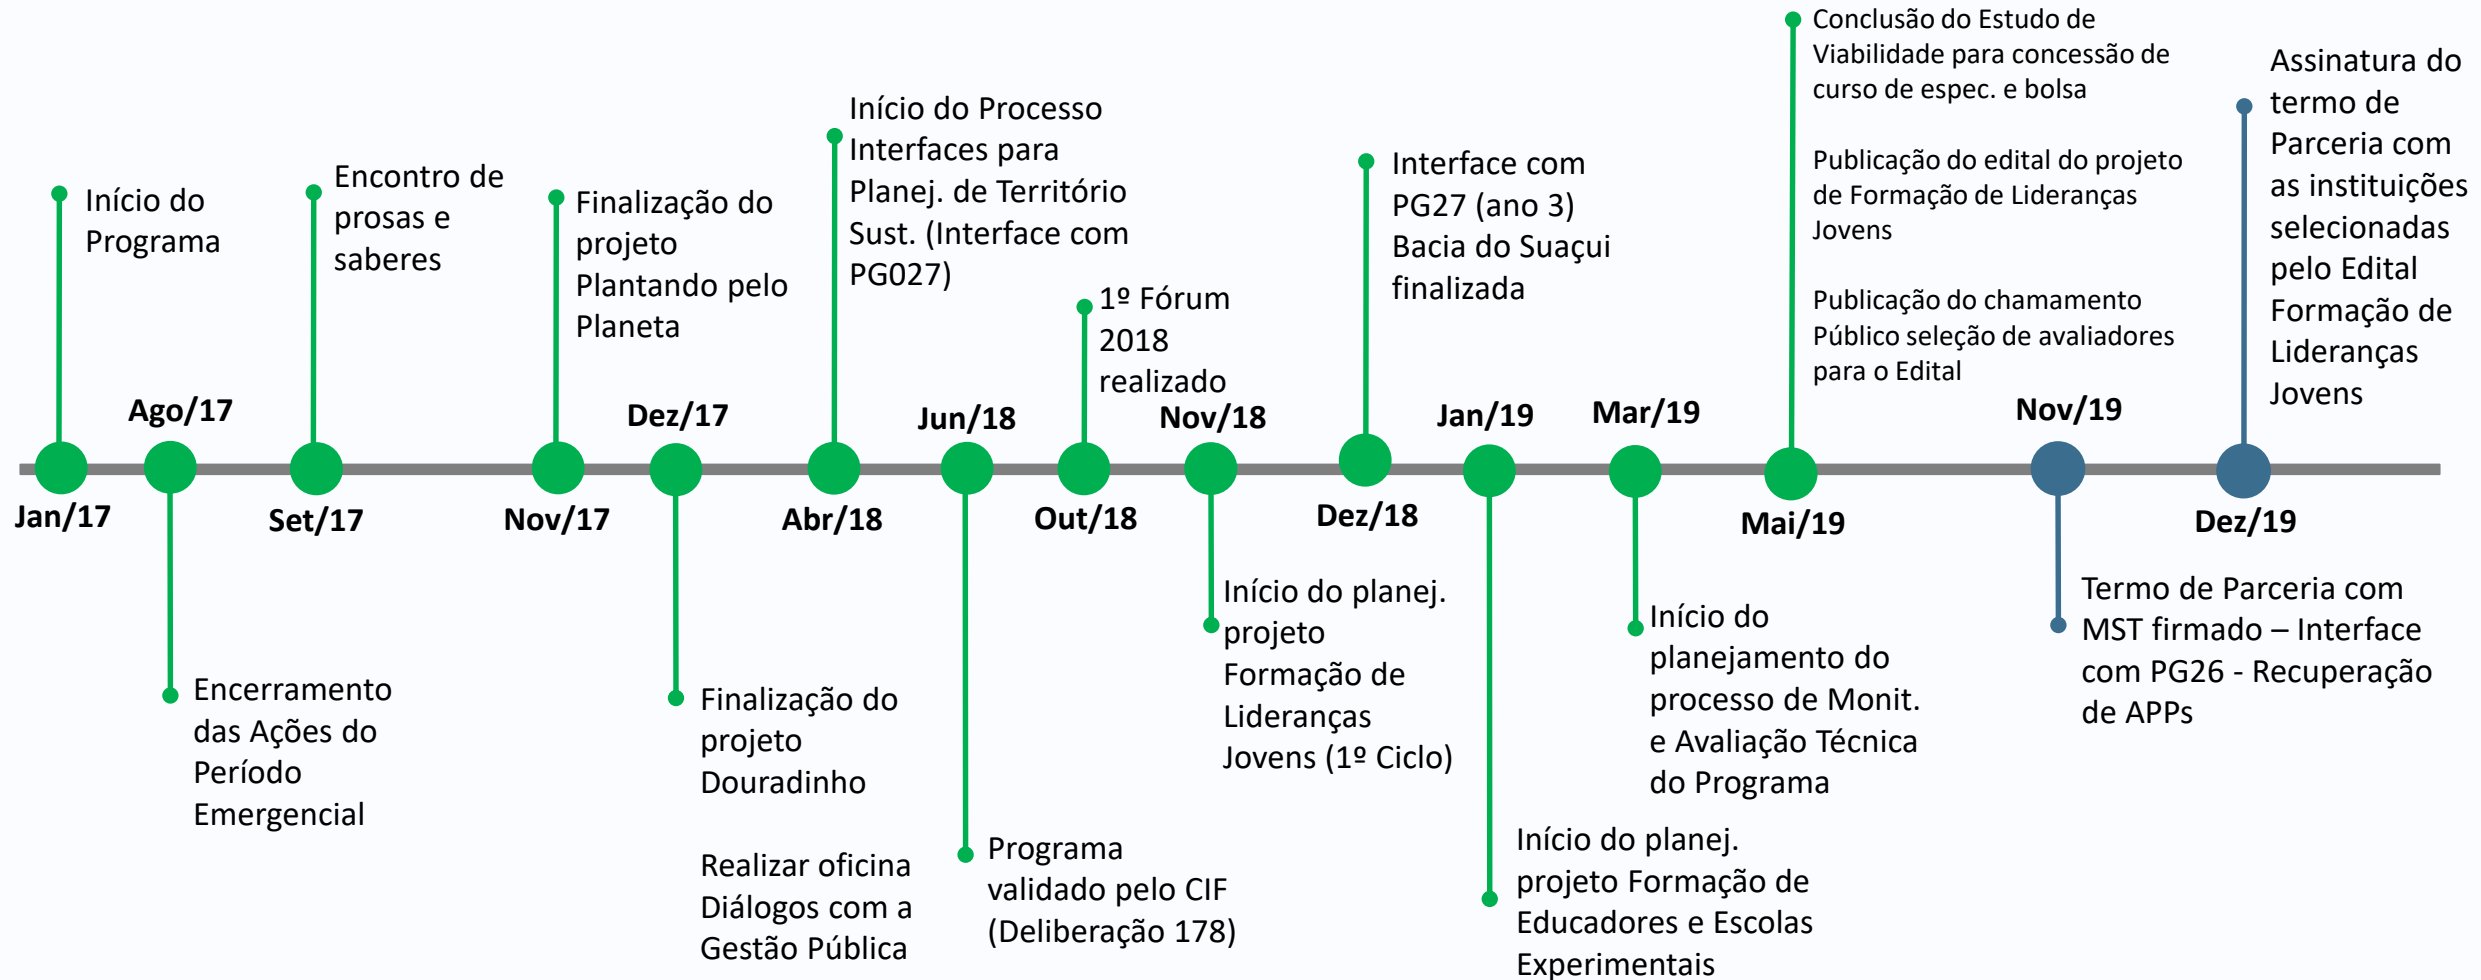

# 6- Linha do Tempo do Programa



## Próximas Entregas (2020 – 2028)

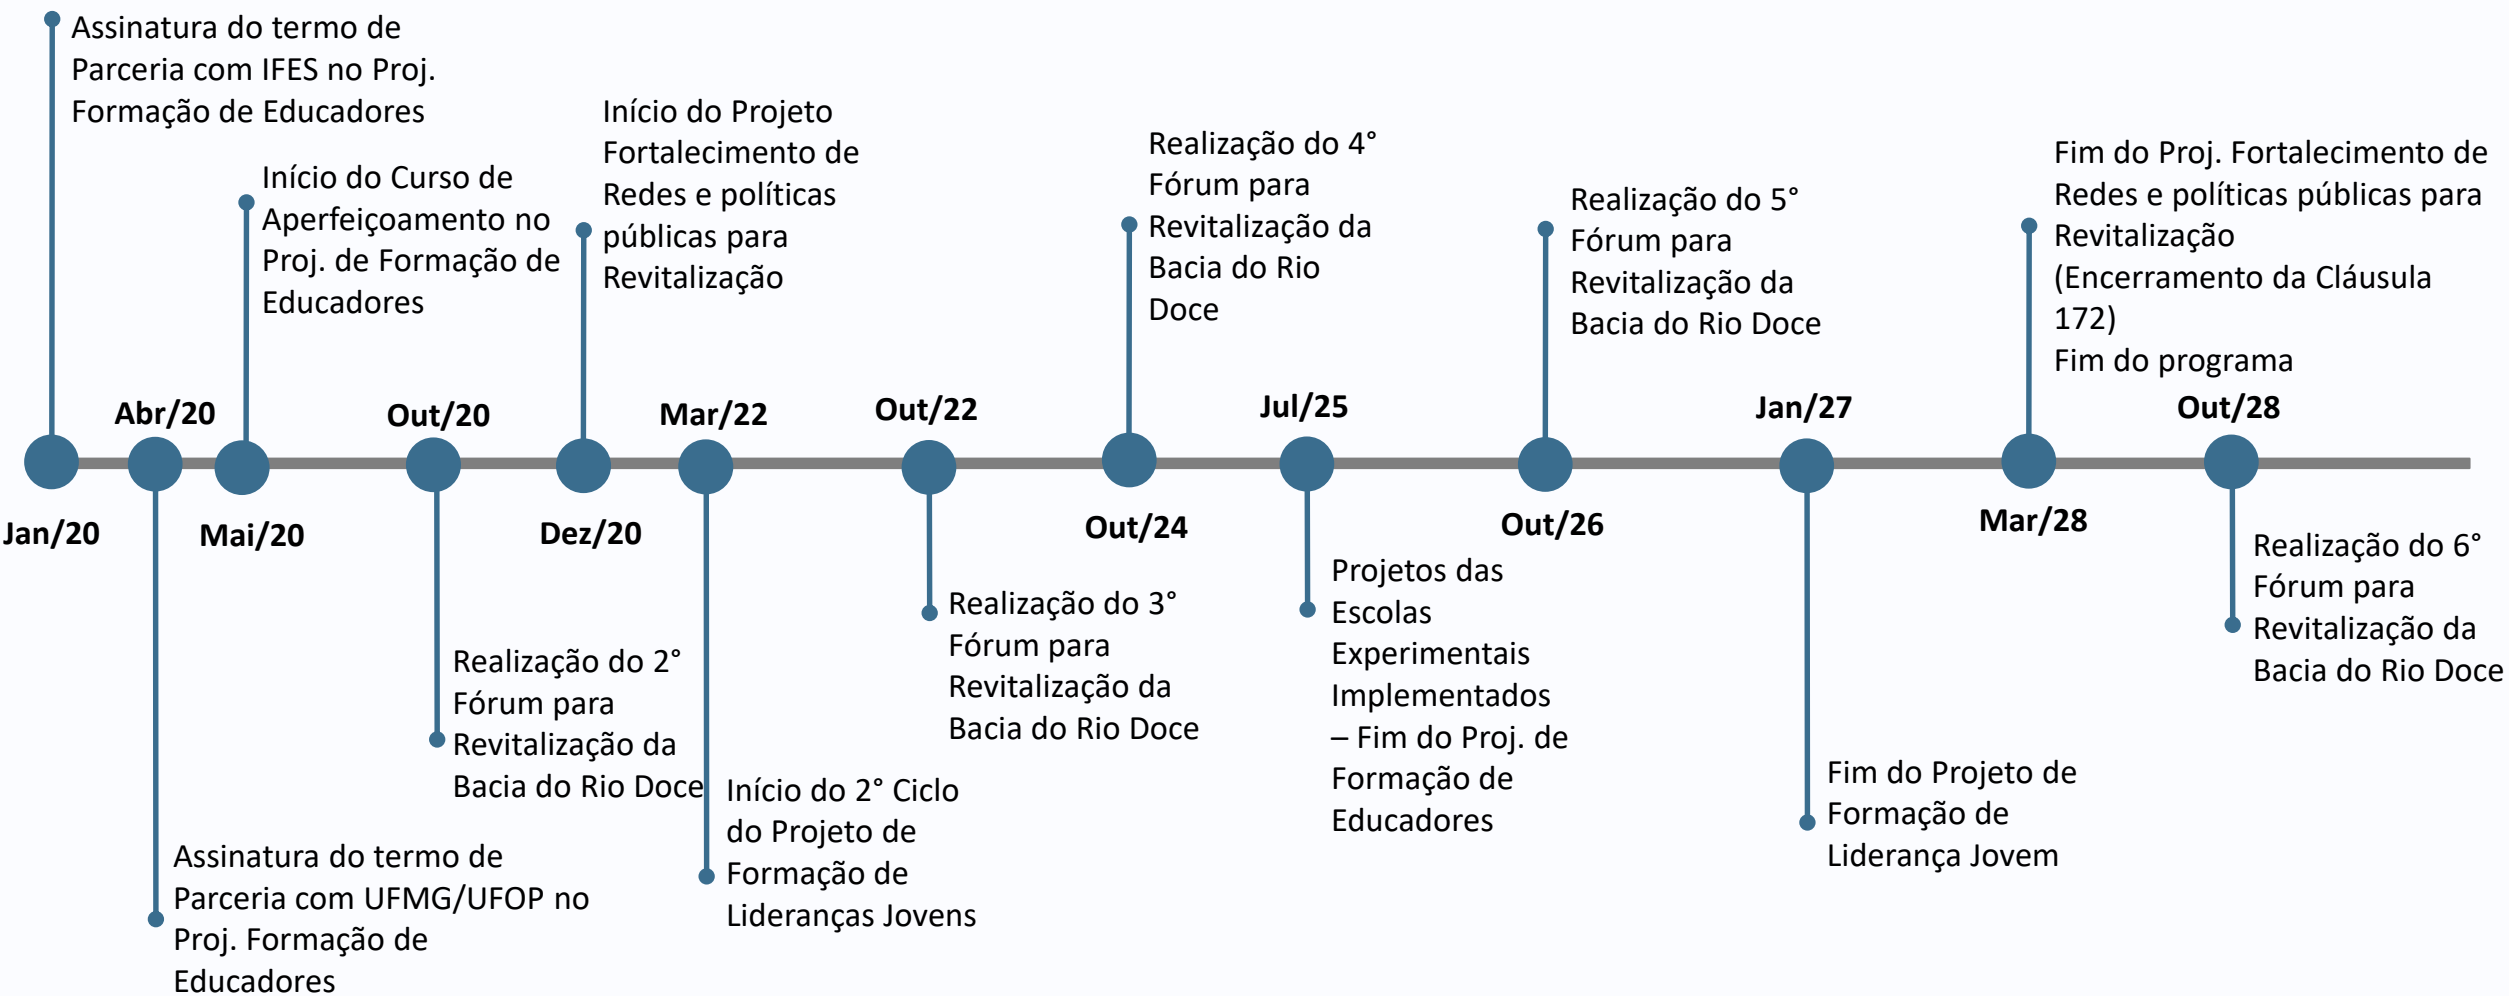

Legenda das entregas:

● Concluída

● Planejada

● Atrasada

# 7- Cronograma Financeiro Realizado/Previsto Geral do Programa



PROJETO/PROCESSO	ETAPA	REALIZADO 2016	REALIZADO 2017	REALIZADO 2018	REALIZADO 2019 (Jan - Mar)	PREVISTO 2019 (Abr - Dez)
<b>ANTES DA APROVAÇÃO DO PROGRAMA</b>	AÇÕES DO PERÍODO EMERGENCIAL	R\$56.638	R\$1.325			
	COMUNICAÇÃO E EVENTOS	R\$0	R\$261.781	R\$51.140		
	PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Ações do PG34)	R\$28.476	R\$7.119			
	PROJETO DOURADINHO	R\$86.533	R\$189.533			
	PROJETO PLANTANDO PELO PLANETA	R\$0	R\$87.130			
	DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 33	R\$0	R\$379.221	R\$109.709		R\$24.220
<b>FORMAÇÃO DE EDUCADORES E ESCOLAS EXPERIMENTAIS</b>	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO					R\$3.503.182
	FORMAÇÃO EDUCAD - COMUNICAÇÃO E EVENTOS					R\$550.000
<b>FORMAÇÃO DE LIDERANÇA JOVENS</b>	FORMAÇÃO LIDERANÇA JOVEM - EVENTOS E COM			R\$0		R\$500.000
	INTEGRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO LIDERANÇA JOV			R\$0		R\$1.033.333
	MAPEAMENTO E MOBILIZ LIDERANÇAS JOVEM			R\$0		R\$784.667
<b>FORTALECIMENTO DE REDES E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REVITALIZAÇÃO</b>	CONSTITUIÇÃO E FORTALECIMENTO REDES			R\$0		R\$152.100
	ELABORAÇÃO PROJ POLÍTICOS PEDAG TERRIT			R\$0		R\$3.333.335
	FORTALECIMENTO REDES COMUNICAÇÃO EVENTOS			R\$0		R\$490.687
<b>INTERFACES EDUCAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS</b>	PG026 AÇÕES COM PRODUTORES RURAIS (APPS)			R\$0		
	PG027 AÇÕES COM PRODUTORES RURAIS (NASC)			R\$203.769	R\$227.671	R\$1.772.506
<b>PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA</b>	FÓRUM DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO			R\$767.710		R\$400.290
	PROJETO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES E ESCOLAS EXPERIMENTAIS				R\$28.207	R\$264.106
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$171.647</b>	<b>R\$926.110</b>	<b>R\$1.132.328</b>	<b>R\$255.878</b>	<b>R\$12.808.427</b>



# REPORT - GT EDUCAÇÃO

## B- REPORT POR PROJETO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE



# 8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



## 8.1 CRONOGRAMA FÍSICO- 1º CICLO

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Duração da Linha de Base (Dias)	Início da Linha de Base	Término da Linha de Base	2019												2020												2021												2022											
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>PROJETO FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS JOVENS-</b>	<b>2049</b>	<b>21/03/2019</b>	<b>26/01/2027</b>																																																
<b>1º Ciclo</b>	<b>780</b>	<b>21/03/2019</b>	<b>16/03/2022</b>																																																
<b>Contratação</b>	<b>190</b>	<b>21/03/2019</b>	<b>20/12/2019</b>																																																
Articulação Institucional	66	07/02/2020	18/05/2020																																																
Mapeamento/Diagnóstico/Marco Zero	88	19/05/2020	21/09/2020																																																
Mobilização e Seleção de Jovens	44	22/09/2020	24/11/2020																																																
Formação e Integração dos Jovens	110	25/11/2020	07/05/2021																																																
Implementação dos Projetos selecionados	170	10/05/2021	10/01/2022																																																
Relatório analítico anual	176	25/11/2020	10/08/2021																																																
Relatório final de atendimento	22	11/01/2022	09/02/2022																																																
<i>1º Ciclo do Projeto de Formação de Liderança Jovem finalizado</i>	<i>0</i>	<i>16/03/2022</i>	<i>16/03/2022</i>																																																

## 8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



### 8.2 CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO- 1º CICLO

ÁREAS DE ABRANGÊNCIA	UNID	VALOR
Área de abrangência 1	VB	R\$1.281.250,00
Área de abrangência 2	VB	R\$5.125.000,00
Área de abrangência 3	VB	R\$2.512.500,00
Área de abrangência 4	VB	R\$1.306.250,00
Área de abrangência 5	VB	R\$4.775.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>VB</b>	<b>R\$15.000.000,00</b>

\*Após efetivação das parcerias e início da execução das ações nos municípios, será apresentado o report do cronograma financeiro executado.

## 8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



### 8.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
01/07/2019	Divulgação do resultado do Chamamento Público para cadastramento de avaliadores das propostas Técnicas do Edital Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01.	Link do resultado: <a href="https://www.fundacaorenova.org/noticia/resultado-do-chamamento-publico-edital-formacao-de-liderancas-jovens/">https://www.fundacaorenova.org/noticia/resultado-do-chamamento-publico-edital-formacao-de-liderancas-jovens/</a>	E-mail enviado para CT-ECLET em 02 de julho de 2019	N/A
02/07/2019 a 08/07/2019	Seleção e Contratação dos avaliadores das Propostas Técnicas do Edital de Formação de lideranças Jovens- CICLO 01.	Abertura de Requisição de Compras (documento interno FR)	N/A	N/A
09/07/2019	Envio das propostas técnicas para os avaliadores selecionados	E-mail enviado para cada avaliador	N/A	N/A
21/07/2019 a 26/07/2019	Apreciação das avaliações recebidas	Matriz de critérios de avaliação recebidas	N/A	N/A
29/07/2019	Solicitação de revisão e qualificação das avaliações realizadas	E-mail enviado para cada avaliador	E-mail enviado para CT-ECLET em 29 de julho de 2019	N/A

## 8. Projeto Formação de Lideranças Jovens



### 8.4 AÇÕES PREVISTAS – AGOSTO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
09/08/2019	Recebimento das avaliações revisadas das Propostas Técnicas do Edital de Formação de Lideranças Jovens- CICLO 01	Matriz de critérios de avaliação recebidas		
19/08/2019 a 23/08/2019	Processos internos para pagamento dos avaliadores das propostas técnicas	Pagamento realizado		
12/08/2019 a 16/08/2019	Apreciação das avaliações recebidas	E-mail		
19/08/2019 a 09/09/2019	Procedimentos internos de análise compliance, comercial e jurídico	Análise das respectivas áreas		

# 9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



## 9.1 CRONOGRAMA FÍSICO

## 9.2 CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO

Os cronogramas físicos e financeiro previsto, serão apresentados após finalização dos Planos de Trabalho com as Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para atuação no estado de Minas Gerias; e com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), para atuação no estado do Espírito Santo.

# 9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais



## 9.3 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
02/07/2019	Articulação com representantes do IFES para envio dos documentos e do esboço da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos no Espírito Santo (para elaboração do Termo de Abertura da Parceria – TAP).	Segundo e-mail enviado pelo IFES no dia 03/07 a equipe responsável por essa elaboração só poderia enviar as documentações solicitadas dia 30/08		
03/07/2019	Reunião entre Fundação Renova, Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e Universidades (UFMG/UFOP) para planejamento da elaboração do plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais.	Link do registro de reunião: <a href="https://fundacaorenova.sharepoint.com/sites/RRP/Lists/ReunioesRealizadas/DispForm.aspx?ID=1163&amp;Source=https%3A%2F%2Ffundacaorenova%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRRP%2FLists%2FReunioesRealizadas%2FTodos%2520Items%2Easpx%23InplviewHashc93cbd00%2Def4d%2D4c96%2D85e9%2De6ffaebcb93d%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FData%253D20190715%25252003%25253a00%25253a00%2Dp%5FID%253D1183%2DSortField%253DData%2DSortDir%253DDesc%2DPageFirstRow%253D31&amp;ContentTypeId=0x0100B0857F4549145E48BF100D93232E7631">https://fundacaorenova.sharepoint.com/sites/RRP/Lists/ReunioesRealizadas/DispForm.aspx?ID=1163&amp;Source=https%3A%2F%2Ffundacaorenova%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRRP%2FLists%2FReunioesRealizadas%2FTodos%2520Items%2Easpx%23InplviewHashc93cbd00%2Def4d%2D4c96%2D85e9%2De6ffaebcb93d%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FData%253D20190715%25252003%25253a00%25253a00%2Dp%5FID%253D1183%2DSortField%253DData%2DSortDir%253DDesc%2DPageFirstRow%253D31&amp;ContentTypeId=0x0100B0857F4549145E48BF100D93232E7631</a>	N/A	N/A
03/07 a 30/07/2019	Elaboração do Plano de Trabalho e orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais.	N/A	N/A	N/A

# 9. Projeto Formação de Educadores e Escolas Experimentais




## 9.4 AÇÕES PREVISTAS – AGOSTO 2019


Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
15/08/2019	Finalizar plano de trabalho/orçamento da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos em Minas Gerais	N/A	N/A	N/A
16 a 29/08/2019	Trâmites internos de análises e aprovações (Suprimentos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, compliance)	N/A	N/A	N/A
30/08	Receber e analisar documentos e esboço da proposta de formação de educadores dos municípios atingidos pelo rompimentos no Espírito Santo para elaboração do Termo de Abertura da Parceria – TAP.	N/A	N/A	N/A




## ETAPAS DA MOBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO

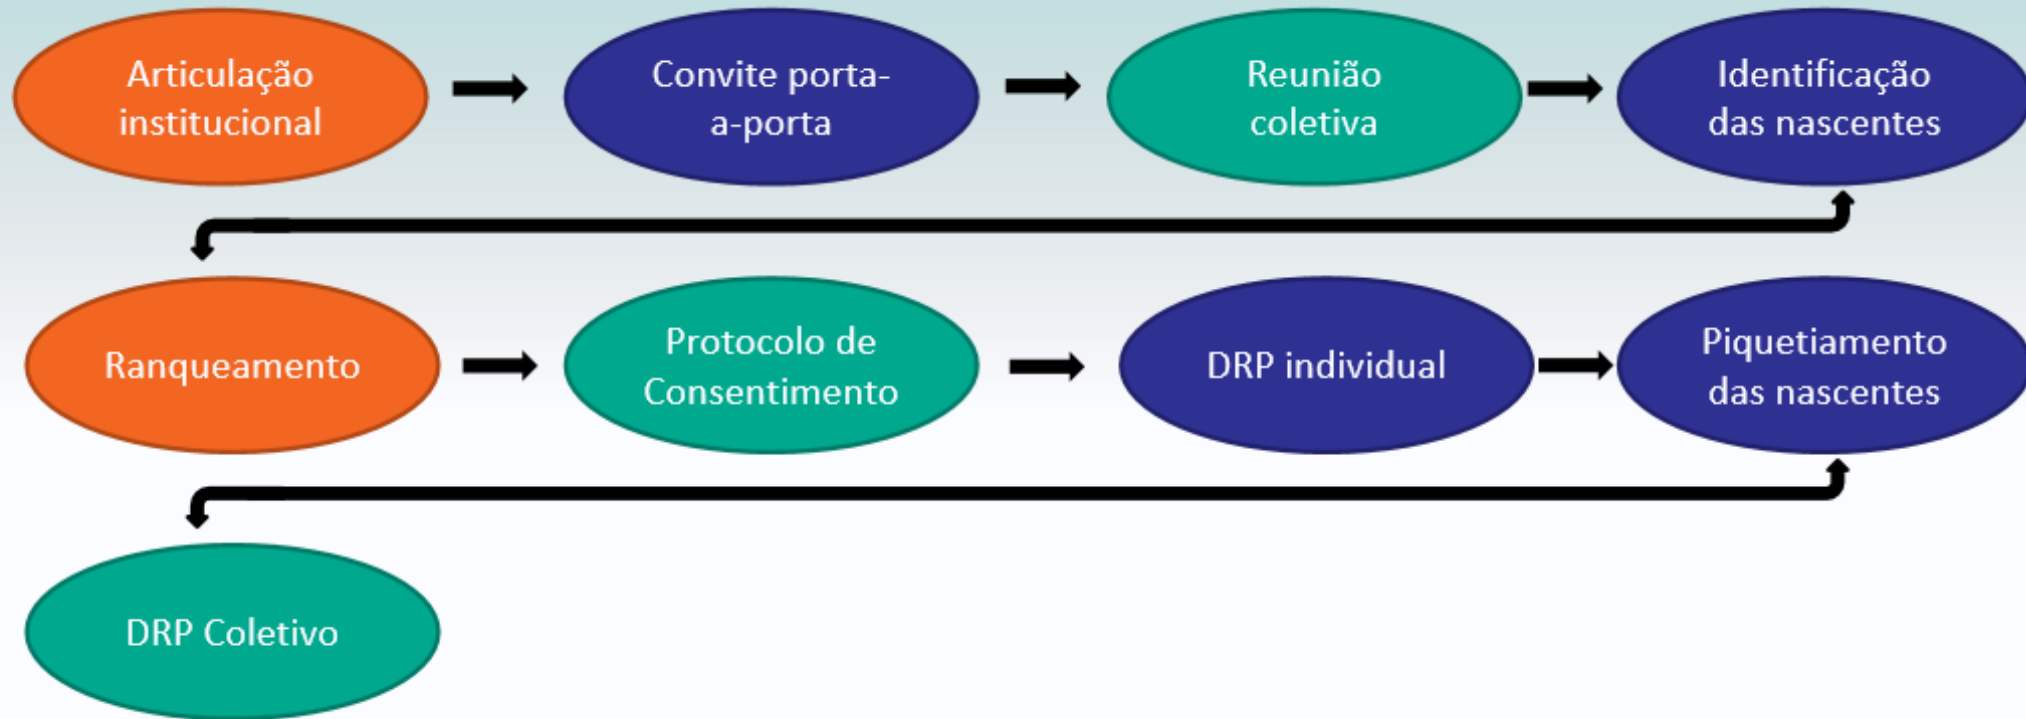

 Etapas internas

 Etapas individuais nas propriedades

 Etapas coletivas com a comunidade

# 10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



## 10.1.1 CRONOGRAMA FÍSICO – INTERFACE PG27

Mobilização e engajamento - Sub-bacia do Suaçuí		08/01/19	19/05/20
Realizar arranjo institucional local		08/01/19	04/02/19
Realizar mobilização, credenciamento e capacitação de técnicos e associações		08/01/19	29/01/19
Realizar chamamento local para mobilização		08/01/19	18/02/19
Realizar apresentação coletiva do programa		05/02/19	11/03/19
Realizar ranqueamento e seleção dos proprietários cadastrados		12/02/19	31/07/19
Elaborar protocolo de consentimento/contrato		22/04/19	05/08/19
Realizar etapas de DRP nas propriedades (individual/ coletivo Krenak)		28/03/19	16/08/19
Realizar etapas de DRP na Comunidade (coletivo)		12/08/19	19/09/19
Elaborar e validar Planos Individuais da Propriedade (PIP)		22/08/19	30/03/20
		06/09/19	07/10/19
Iniciar processo de assinatura dos termos de parceria na Sub-bacia do Suaçuí Ano 03			
Assinaturas dos termos de parceria na Sub-bacia do Suaçuí do Ano 03 obtidas		15/04/20	15/04/20
Encerrar atividades		16/04/20	19/05/20
		19/05/20	19/05/20
Mobilização e engajamento nas propriedades da Sub-bacia do Suaçuí do Ano 03 concluída			

# 10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



## 10.1.1 CRONOGRAMA FÍSICO – INTERFACE PG 27

Mobilização e engajamento Sub-bacia de Pontões e Lagoas		12/03/19	30/06/20
Realizar arranjo institucional local		12/03/19	08/04/19
Realizar mobilização, credenciamento e capacitação de técnicos e associações		12/03/19	02/04/19
Realizar chamamento local para mobilização		09/04/19	07/06/19
Realizar apresentação coletiva do programa		07/06/19	21/06/19
Realizar ranqueamento e seleção dos proprietários cadastrados		13/05/19	14/08/19
Elaborar protocolo de consentimento/contrato		22/08/19	19/09/19
Realizar etapas de DRP nas propriedades (individual)		29/08/19	26/12/19
Realizar etapas de DRP na Comunidade (coletivo)		27/09/19	28/01/20
Elaborar e validar Planos Individuais da Propriedade (PIP)		08/10/19	12/05/20
Iniciar processo de assinatura dos termos de parceria		22/10/19	21/11/19
Assinaturas dos Termos de Parceria na Sub-bacia de Pontões e Lagoas do Ano 03 obtidas		25/05/20	25/05/20
Encerrar atividades		26/05/20	30/06/20
Mobilização e engajamento na Sub-bacia de Pontões e Lagoas do Ano 03 concluída		30/06/20	30/06/20

# 10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



## 10.2.1 CRONOGRAMA FINANCEIRO – INTERFACE PG27

Ano/Mês	2018/11	2019/01	2019/03	2019/04	2019/05	2019/06	2019/07	Total Geral
<b>Programa:</b> 33								
<b>Número do Contrato:</b> 4800015249								
<b>Fornecedor:</b> ASSOCIACAO CENTRO DE INFORMACAO E ASSESSORIA TÉCNICA - CIAAT	126.090,23	102.431,51	202.918,93	140.250,96	454.883,03	472.114,77	115.785,17	1.614.474,60

Atualizado em 06/08/2019

# 10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – PG 27 – Programa de Recuperação de Nascentes



## 10.3.1 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019 - INTERFACE PG27

## 10.4.1 AÇÕES PREVISTAS – AGOSTO 2019 - INTERFACE PG27

As ações realizadas em julho e prevista para agosto já foram reportadas no cronograma físico financeiro



### 10.1.2 CRONOGRAMA FÍSICO – INTERFACES PG26 E PG18

### 10.2.2 CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO – INTERFACES PG26 E PG18

Os cronogramas físicos e financeiro previsto, serão apresentados após finalização dos Planos de Trabalho com as instituições (Centro de Formação Francisca Veras/Fundação Helena Antipoff – MG e Centro de Formação Maria Olinda e Instituto Federal/Santa Maria – ES) responsáveis pela formação das famílias dos assentamentos dos municípios atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais e no Espírito.

# 10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – Programas de Recuperação de APPs (PG26) e Desenvolvimento e Diversificação Econômica (PG18)



## 10.3.2 AÇÕES REALIZADAS – JULHO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
11/07/2019	Apresentação da proposta geral da interface com o PG18 e o PG26 ( <b>Programa Integrado dos Assentamentos</b> ), com intuito de mobilizar, formar e engajar famílias, dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, para transição agroecológica.	ATA Reunião 11/07/2019	Apresentação em PPT enviada pelo e-mail da governança	N/A
01 a 30/07/2019	Articulação com as instituições que executarão a proposta de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, para envio da documentação; elaboração do Termo de Abertura de Parceria (TAP).	N/A	N/A	N/A
06/07 a 30/07/2019	Elaboração do Plano de Trabalho e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais.	N/A	N/A	N/A

# 10. Processo Interfaces Educação para o Planejamento de Territórios Sustentáveis – Programas de Recuperação de APPs (PG26) e Desenvolvimento e Diversificação Econômica (PG18)



## 10.4.2 AÇÕES PREVISTAS – AGOSTO 2019

Data	Ações Realizadas Equipe Técnica	Verificação	Documentação oficial enviada para CT-ECLET	Documentação oficial recebida pela CT-ECLET
15/08/2019	Finalização do Plano de Trabalho e orçamento de mobilização, formação e engajamento das famílias dos assentamentos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão em Minas Gerais	N/A	N/A	N/A
16/08/2019	Reunião com o Centro de Formação Maria Olinda e Instituto Federal/Santa Maria para articulação e definição da parceria	ATA de Reunião	N/A	N/A
16 a 29/08/2019	Trâmites internos de análises e aprovações (Suprimentos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Compliance) referente proposta da interface com o PG18 e o PG26 para os assentamentos de Minas Gerais.	N/A	N/A	N/A
23/08/2010	Reunião intercâmaras (CTEI, CT Flor e CT ECLET) para apresentação do Projeto Integrado dos Assentamentos.	ATA de Reunião	N/A	N/A
