

Plano de Trabalho

**Mobilização e execução de reuniões informativas
iniciais nos estados do Amapá e Pará.**

BLOCO FZA-M-59



Setembro / 2022

PÚBLICA

ÍNDICE GERAL

I - APRESENTAÇÃO.....	5
II - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR.....	6
III - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.....	7
III.1 - EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO - CONTRATADA.....	8
IV - OBJETIVOS.....	9
IV.1 OBJETIVO GERAL.....	9
IV.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.....	9
V - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA.....	9
V.1. REUNIÕES INFORMATIVAS INICIAIS.....	9
VI. METODOLOGIA.....	11
VI.1. MOBILIZAÇÃO DAS REUNIÕES.....	11
VI.2. REUNIÕES INFORMATIVAS INICIAIS.....	12
VII - RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES.....	13
VIII - SISTEMAS DE REGISTRO.....	14
IX - CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO E REUNIÕES.....	15
X - METAS.....	16
XI - RESULTADOS ESPERADOS.....	17
XII - PRODUTOS A SEREM ENVIADOS.....	17

LISTA DE FIGURAS

<i>Figura 1 – Mapa de localização do Bloco FZA-M-59.....</i>	<i>5</i>
<i>Figura 2 – Mapa de localização da área de abrangência.....</i>	<i>10</i>

LISTA DE TABELAS

<i>Quadro 1 – Disposição das rotas a serem executadas para cobrir a área de abrangência.....</i>	<i>9</i>
<i>Quadro 2 – Municípios com portos de desembarque pesqueiro mais significativos.....</i>	<i>12</i>
<i>Quadro 3 – Descrição das atividades do PCS.....</i>	<i>13</i>
<i>Quadro 4 – Sistema de registro de atividades.....</i>	<i>14</i>
<i>Quadro 5 – Calendário de mobilização.....</i>	<i>15</i>
<i>Quadro 6 – Calendário de reuniões presenciais.....</i>	<i>16</i>

I - APRESENTAÇÃO

Neste documento é apresentado o Plano de Trabalho referente à mobilização e à execução de reuniões informativas em municípios dos estados do Amapá e Pará. Trata-se de uma ação que faz parte do Projeto de Comunicação Social (PCS) da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59.

O objetivo deste plano é detalhar a metodologia a ser desenvolvida durante a realização desta ação constante no PCS, descrever as atividades previstas e apresentar o cronograma de execução detalhado.

A distância entre o Bloco FZA-M-59 e o município de Oiapoque/AP é de aproximadamente 160 km, conforme Figura 1. Este plano será aplicado nos municípios que compõem a Área de Influência da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59.

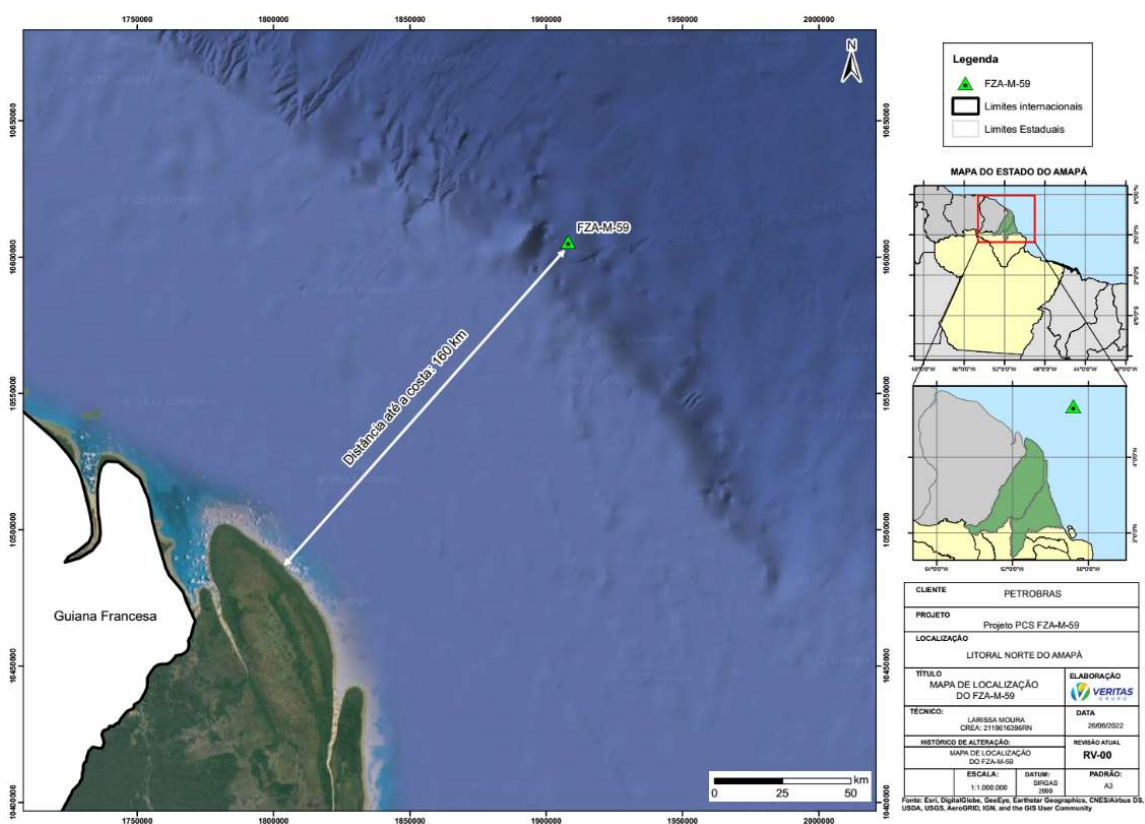


Figura 1 – Mapa de localização do Bloco FZA-M-59.

II - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Razão Social	Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
CNPJ	33.000.167/0036-31
Endereço	Av. Henrique Valadares, 28, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.231-030
Responsável Técnico	Gustavo Limp Nascimento
E-mail	gustavo.limp@petrobras.com.br

III - EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Razão Social: Veritas Serviços de Meio Ambiente LTDA
CNPJ: 10.516.775/0001-78
Endereço: Rua Pedro Fonseca Filho, n.º 8989, Ponta Negra, Natal/RN.
CEP 59.090-080.

Responsável Técnico: Sérgio Iani Godinho
Cargo: Diretor-Sócio
Função: Engenheiro Ambiental especialista em Engenharia Sanitarista.
E-mail: sergio@veritasgrupo.com

Responsável Técnico: Eduardo de Magalhães Pinto Gomes
Cargo: Diretor-Sócio
Função: Engenheiro Ambiental especialista em Tecnologias Ambientais
E-mail: eduardo@veritasgrupo.com

III.1 - EQUIPE TÉCNICA - ELABORAÇÃO - CONTRATADA

PROFISSIONAL	REGISTRO PROFISSIONAL	FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Eduardo Magalhães Pinto Gomes	CONFEA 140.200.220-3	Engenheiro Ambiental Esp. Tecnologias Ambientais
Sérgio Iani Godinho	CONFEA 140.220.762-0	Engenheiro Ambiental Esp. Engenharia Sanitária
Rafael Diaz	-	Oceanógrafo Doutor em Antropologia
Uriens Ravena	-	Comunicador Social Doutor em Antropologia
Larissa Maria Galvão Rodrigues Moura	CONFEA 211961639-6	Engenheira Ambiental Eng. de Segurança do Trabalho Esp. Em Gestão Ambiental

IV - OBJETIVOS

IV.1 OBJETIVO GERAL

Comunicar de forma ampla e eficaz, assim como, esclarecer e dirimir expectativas relacionadas à Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, das partes interessadas correspondentes aos municípios da Área de Influência desta atividade.

IV.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar mobilização e reuniões presenciais informativas iniciais junto às partes interessadas dos municípios da Área de Influência da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, totalizando 18 municípios;

V - IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

V.1. REUNIÕES INFORMATIVAS INICIAIS

A área de abrangência deste plano no que diz respeito às reuniões informativas iniciais compreende os municípios dos estados do Amapá e Pará fazem parte da Área de Influência da Atividade, totalizando 18 municípios.

Com a finalidade de organizar a logística para mobilização e realização das reuniões, os municípios foram agrupados em regiões, de acordo com suas localizações geográficas e relações sociais e culturais, conforme Quadro 1. A Figura 2 contempla a localização da área de abrangência para realização das reuniões.

Quadro 1 – Disposição das rotas a serem executadas para cobrir a área de abrangência.

Municípios/Regiões			
RMB* e Tocantins	Salgado paraense 01	Salgado paraense 02	Salgado paraense 03
Belém	São João de Pirabas	Maracanã	São Caetano de Odivelas
Ananindeua	Salinópolis	Magalhães Barata	Vigia
Abaetetuba	-	Marapanim	Colares
Barcarena	-	Curuçá	Santo Antônio do Tauá
Amapá	Marajó	* RMB – Região Metropolitana de Belém	
Oiapoque	Soure		
-	Salvaterra		
-	Cachoeira do Arari		

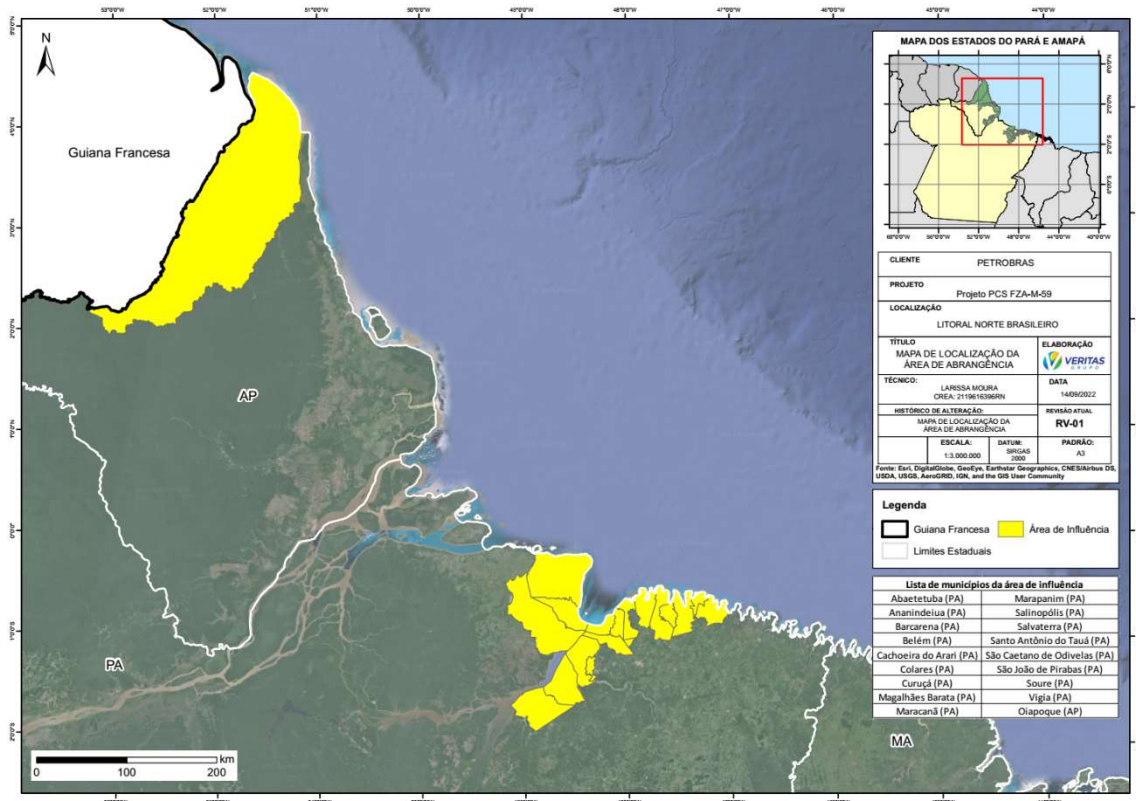


Figura 2 – Mapa de localização da área de abrangência.

VI. METODOLOGIA

VI.1. MOBILIZAÇÃO DAS REUNIÕES

As reuniões serão distribuídas por município, uma por município, devido às questões logísticas que dificultam o transporte intermunicipal. A mobilização das reuniões será feita por contato telefônico, correio eletrônico e através de lideranças locais, uma vez que nem todos os participantes possuem acesso aos meios de comunicação formais. Outros meios de comunicação poderão ser utilizados como forma de mobilização com o objetivo de obter maior alcance das partes interessadas, principalmente nos municípios de Oiapoque – AP e Belém – PA.

A fim de alcançar o maior número de pessoas, todos os municípios serão visitados para realização de mobilização junto a agentes locais (colônias de pesca, sindicatos, associações, entre outros) e fixação de materiais informativos nos principais portos de desembarque pesqueiros dos 18 municípios da área de influência. Durante a mobilização formaliza-se o local onde será realizada a reunião e estratégias para dar capilaridade ao convite para participação na reunião.

A mobilização irá ocorrer em meios de comunicação digitais durante toda a etapa de mobilização até as reuniões, serão enviados convites para e-mails institucionais de secretarias de municípios e estaduais, gestores de unidades de conservação, organizações não governamentais relacionadas a atividades pesqueiras, sindicatos, colônias de pesca, entre outros atores relevantes para a pesca nos municípios onde irão ocorrer as reuniões.

Todos os municípios da região possuem desembarque pesqueiro, onde serão realizados contatos para mobilizar a participação nas reuniões informativas. No Quadro 2 são apresentados os municípios com portos de desembarque mais significativos por região, estes portos possuem relevante importância econômica e recebem pescadores que têm como espécie-alvo a pescada amarela, importante recurso pesqueiro da região.

Quadro 2 – Municípios com portos de desembarque pesqueiro mais significativos.

Municípios com portos de desembarque pesqueiro por região			
RMB e Tocantins	Salgado paraense 01	Salgado paraense 02	Salgado paraense 03
Belém	São João de Pirabas	Curuçá	Vigia
Amapá	Marajó		
Oiapoque	Soure		
-	-		

VI.2. REUNIÕES INFORMATIVAS INICIAIS

Serão realizadas reuniões informativas com os grupos de interesse da área de abrangência descrita no item V do presente documento, a fim de promover a divulgação das informações referentes à atividade. O objetivo destas reuniões é apresentar as informações de forma clara e objetiva para todo o público interessado. Tendo em vista a passagem de operação do bloco FZA-M-59 para a Petrobras, as reuniões informativas iniciais também terão o objetivo de esclarecer as partes interessadas acerca dessa transferência.

As reuniões serão conduzidas a partir de comunicação dialógica, nas quais serão apresentadas informações quanto a descrição da atividade, os aspectos ambientais da área de abrangência, os impactos ambientais efetivos e potenciais, as medidas ambientais aplicáveis a estes impactos, orientações sobre a navegação segura na região da rota das embarcações e do bloco e a legislação relacionada à atividade. A depender do número de participantes, as reuniões poderão ter de uma a três horas de duração.

Ademais, serão disponibilizados os canais de comunicação com a operadora, assim como serão distribuídos materiais informativos impressos.

As reuniões possibilitarão o nivelamento de expectativas em relação à operadora, à atividade de perfuração e ao processo de licenciamento ambiental.

Os locais de realização das reuniões serão acordados previamente com as lideranças locais. Devem ter infraestrutura adequada, tais como: mesas e cadeiras, pontos de energia, entre outros.

Serão realizadas reuniões informativas ampliadas nos municípios de Oiapoque – AP e Belém – PA.

VII - RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Quadro 3 – Descrição das atividades do PCS.

Descrição das atividades					
Etapa	Atividade	Descrição	Sistemas de registos	Tempo de duração	Equipe
1	Realizar a mobilização por meios digitais com a distribuição de cartazes de divulgação das reuniões informativas.	Nesta etapa, serão encaminhados por meios digitais os cartazes de divulgação das reuniões informativas e abertos canais de comunicação com entidades representativas dos governos federal, estadual e municipal, organizações da sociedade civil e populações tradicionais.	Planilha excel (online) para monitoramento das entregas	30 dias	2 colaboradores
2	Realizar mobilização e de forma presencial para participação na reunião informativa junto a pescadores artesanais dos litorais dos estados do Pará e Amapá, totalizando 18 municípios.	Neste momento serão realizadas visitas aos municípios a fim de mobilizar os atores envolvidos na pesca nos municípios, visitando assim comunidades pesqueiras, colônias de pesca, associações de pescadores, entre outros. Neste encontro é pactuado o local onde será realizada a reunião informativa.	Registros fotográficos das localidades visitadas e cartaz fixado com chamada para reunião informativa. Planilha de Excel (online) para acompanhamento do status desta ação	30 dias	4 colaboradores
3	Realizar mobilização com entes representativos dos governos federais, estaduais e municipais, sociedade civil organizada	Realizar convites por meios digitais para gestores locais e organizações da sociedade civil envolvidas nas agendas da pesca nos municípios a participar da reunião informativa. Em caso de não recebimento e não resposta dos convites, as instituições podem ser contactadas presencialmente.	Planilha excel (online) para monitoramento das entregas	30 dias	4 colaboradores
4	Realização da Reunião Informativa	Serão realizadas 18 reuniões, uma em cada município da área de influência. As reuniões terão duração de 1 a 3 horas, com intervalo de 20 minutos. Nestas reuniões serão apresentados a atividade e o processo de licenciamento e distribuídos os materiais informativos da atividade de perfuração no Bloco FZA-M-59 e os canais de comunicação do PCS. Haverá momentos para perguntas e outras questões relevantes para os pescadores locais e o projeto.	Registros fotográficos e listas de presença das reuniões. Planilha de Excel (online) para acompanhamento do status desta ação.	30 dias	4 colaboradores

VIII - SISTEMAS DE REGISTRO

Quadro 4 – Sistema de registro de atividades.

SISTEMAS DE REGISTROS (ACOMPANHAMENTO)		
Etapa	Atividade	Sistemas de registros
1	Realizar a mobilização por meios digitais com a distribuição de cartazes de divulgação das reuniões informativas.	Planilha excel (online) para monitoramento das entregas
2	Realizar mobilização de forma presencial para participação na reunião informativa junto a pescadores artesanais de municípios dos litorais dos estados do Pará e Amapá, totalizando 18 municípios.	Registros fotográficos das localidades visitadas e documentos de recebimento de materiais assinados por atores locais. Planilha de Excel (online) para acompanhamento do status desta ação.
3	Realizar mobilização com entes representativos dos governos federais, estaduais e municipais, sociedade civil organizada	Planilha excel (online) para monitoramento das entregas
4	Realização da reunião informativa	Registros fotográficos e listas de presença das reuniões. Planilha de Excel (online) para acompanhamento do status desta ação.

IX - CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO E REUNIÕES**Quadro 5 – Calendário de mobilização.**

CALENDÁRIO MOBILIZAÇÃO				
Equipe	Campos	Estado	Municípios	Data
1	1ª semana	PA	Abaetetuba	26/09/2022
1	1ª semana	PA	Barcarena	27/09/2022
1	1ª semana	PA	Trajeto	28/09/2022
1	1ª semana	PA	Ananindeua	29/09/2022
1/2	1ª semana	PA	BELÉM	30/09/2022
2	1ª semana	AP	Bel -> Mcp	26/09/2022
2	1ª semana	AP	OIAPOQUE	27/09/2022
2	1ª semana	AP	OIAPOQUE	28/09/2022
2	1ª semana	AP	Mcp -> Bel	29/09/2022
1	2ª semana	PA	Vigia	03/10/2022
1	2ª semana	PA	São Caetano de Odivelas	04/10/2022
1	2ª semana	PA	Colares	05/10/2022
1	2ª semana	PA	Santo Antônio do Tauá	06/10/2022
1	2ª semana	PA	Trajeto	07/10/2022
1	2ª semana	PA	Salinas	11/10/2022
2	2ª semana	PA	Salvaterra	03/10/2022
2	2ª semana	PA	Soure	04/10/2022
2	2ª semana	PA	Cachoeira	05/10/2022
2	2ª semana	PA	Trajeto	06/10/2022
2	3ª semana	PA	Marapanim	07/10/2022
1	3ª semana	PA	São João de Pirabas	10/10/2022
1	3ª semana	PA	Salinas	11/10/2022
2	3ª semana	PA	Curuçá	10/10/2022
2	3ª semana	PA	Magalhães Barata	11/10/2022
1	3ª semana	PA	Maracanã	13/10/2022

Quadro 6 – Calendário de reuniões presenciais.

CALENDÁRIO REUNIÕES				
Equipe	Campos	Estado	Municípios	Data
1	1ª semana	PA	Abaetetuba	24/10/2022
1	1ª semana	PA	Barcarena	25/10/2022
1	1ª semana	PA	Trajeto	26/10/2022
1	1ª semana	PA	Ananindeua	27/10/2022
2	1ª semana	PA	Salvaterra	24/10/2022
2	1ª semana	PA	Soure	25/10/2022
2	1ª semana	PA	Cachoeira do Arari	26/10/2022
2	1ª semana	PA	Trajeto	27/10/2022
1	2ª semana	PA	Vigia	31/10/2022
1	2ª semana	PA	São Caetano de Odivelas	01/11/2022
1	2ª semana	PA	Colares	02/11/2022
1	2ª semana	PA	Santo Antônio do Tauá	03/11/2022
1	2ª semana	PA	Trajeto	04/11/2022
2	2ª semana	AP	Bel -> Mcp	31/10/2022
2	2ª semana	AP	Trajeto Macapá > Oiapoque	01/11/2022
2	2ª semana	AP	OIAPOQUE	03/11/2022
2	2ª semana	PA	Mcp -> Bel	04/11/2022
1/2	2ª semana	PA	BELÉM	07/11/2022
2	3ª semana	PA	Magalhães Barata	08/11/2022
1	3ª semana	PA	São João de Pirabas	08/11/2022
1	3ª semana	PA	Salinas	09/11/2022
2	3ª semana	PA	Curuçá	09/11/2022
2	3ª semana	PA	Marapanim	10/11/2022
1	3ª semana	PA	Maracanã	10/11/2022

X - METAS

- Aprovação do Plano de Trabalho;
- Realização de mobilização ampla junto às partes interessadas;
- Realização das reuniões informativas iniciais.

XI - RESULTADOS ESPERADOS

- Mobilização e participação efetiva de comunidades pesqueiras, sociedade civil, instituições federais, estaduais e municipais nas reuniões informativas;

XII - PRODUTOS A SEREM ENVIADOS

- Relatório final de avaliação qualitativa da participação nas reuniões informativas iniciais.
