

FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO MENSAL PARA CTOS

Julho de 2024 (REF.: junho - 2024)

Sumário

Programa de Proteção Social	3
1) Status do Programa	3
2) Monitoramento dos planos	4
3) Fatos e entregas relevantes do último mês	6
3.1 – Capacitação.....	6
3.2 Acompanhamento de famílias.....	9
3.3. Outros fatos relevantes	10
4) Informações do repasse financeiro aos municípios e estados com planos assinados	11
5) Barramento	13
6) Próximas entregas do Programa	15
7) Desafios	15
8) Organização das ações em Home Office	15
9) Indicadores.....	16
10) Cronograma das macros ações do Programa em 2021	18
11) Orçamento 2024.....	18
ANEXOS	19
ANEXO 1: Painel de elaboração dos Planos de Trabalho e Termos de Parcerias com os municípios de MG e ES	19
ANEXO 2: Síntese de Cenário dos Planos	50
ANEXO 3: número de famílias vulneráveis cadastradas por município.....	51

Programa de Proteção Social

1) Status do Programa

A nova definição do PG05 foi protocolada em 23/08/2021 no CIF. O processo de aprovação se deveu em função do desdobramento do processo de revisão (Cláusula 203 do TTAC e Deliberação CIF nº 465), por meio de reuniões do GT PPS/AFE sobre o escopo do PPS, com a participação dos membros da CTOS e da equipe técnica da Fundação Renova.

A aprovação do escopo ocorreu na 55ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo realizada no dia 16/09/2021 – Deliberação CIF nº 533.

Em 29 de novembro foi enviada correspondência ao CIF, para ajustes no conceito de vulnerável aprovado na Deliberação CIF nº 533.

Na reunião do CIF de 17/12/21 cuja pauta incluiu a discussão sobre o escopo aprovado, ficou clara a divergência no conceito de vulnerável, motivo pelo qual essa questão foi ajuizada em 25/02/2022.

Com relação aos municípios não aderentes ao plano de reparação, a Fundação Renova judicializou o tema. O juiz designou audiência de conciliação para 30/08/2022. Contudo, porque nenhum dos municípios convocados compareceu, a audiência foi remarcada para 18/10/2022. Na ocasião as partes/interessados deverão apresentar, de forma concreta e objetiva, os pontos sensíveis quanto à viabilidade concreta de adesão à proposta alternativa aos Planos Municipais de Reparação do Programa de Proteção Social, aprovada por meio da Deliberação CIF nº 496/2021.

Realizada a audiência de conciliação no dia 18/10, agora com a presença dos 4 municípios. Foi determinada a EXTINÇÃO DO FEITO com relação aos MUNICÍPIOS DE AIMORÉS E BELO ORIENTE, uma vez que ambos já haviam assinado o Termo de Cooperação com a Fundação Renova.

Consoante manifestação das partes, foi determinada a SUSPENSÃO DO PROCESSO, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em relação aos MUNICÍPIOS de GALILÉIA e RESPLENDOR, em virtude do negócio jurídico processual firmado entre as partes.

O município de Resplendor encaminhou sugestões de alterações em algumas cláusulas, e em 25/11 foi realizada uma reunião entre as partes para alinhamentos

sobre consensos e dissensos. Foi acordada a data de 02/12/2022 para resposta oficial do município sobre a adesão ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira. O município de Resplendor aderiu em 02/12/2022 ao Termo de Cooperação e o processo para assinatura foi aberto pela Fundação Renova. Ao receber a minuta do Termo para assinatura, o município fez nova solicitação de alteração, que não foi consensuada com a Fundação Renova. A ação judicial foi retomada através de petição protocolada em 13/06/2023 pelo setor jurídico da Fundação Renova. Em 17/04/2024 o juiz da 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, emitiu a sentença em que declarou o processo extinto sem resolução do mérito, pois não cabe ao juízo determinar a homologação forçada de um acordo. Em 21/05/2024 ocorreu uma reunião proposta pela Fundação Renova com a Secretaria de Assistência Social de Resplendor para a retomada das tratativas sobre a proposta do Plano de Trabalho.

Em 18/06/2024 foi realizada nova reunião entre o município e a Fundação Renova, onde foi apresentada uma proposta por parte do município para o escopo do Plano de Trabalho, que será analisada pela Fundação Renova.

O município de Galileia não manifestou sobre a adesão ao Plano de Trabalho e Termo de Cooperação, mas estão no prazo previsto para contestação e informaram interesse em agendamento de reunião para alinhamentos. Agendada para 09/12/2022. Reunião aconteceu em 14/12/2022 e município apresentou indicativo de aceite ao Plano de Trabalho. Acordado com o município entrega da proposta do Plano de Trabalho até o dia 27/01/2023. Município apresentou proposta do Plano de Trabalho em 02/02/2023, reuniões foram realizadas para os ajustes necessários e o processo de abertura será realizado em março/2023. Abertura do procedimento para assinatura iniciado em 23/03/2023. Assinatura do termo de Cooperação Técnica e Financeira em 18/07/2023.

2) Monitoramento dos planos


Uma das estratégias de reparação em Proteção Social foi a pactuação de Planos de Reparação em Proteção Social, cujas ações são desenvolvidas de forma **articulada com o Poder Público**, essencialmente para o **fortalecimento da**

política pública de assistência social, com a perspectiva de **ampliar a cobertura** destes dois programas nas **comunidades atingidas**.

Os Planos de Reparação foram construídos de acordo com os apontamentos do Mapa de Vulnerabilidade, considerando a base de dados do Cadastro Integrado da FR e os possíveis danos de cada município.

Os modelos de planos são:

- **Ação Civil Pública** – específico para o município de Mariana, com execução das ações previstas no acordo, cujo objetivo é suplementar os serviços municipais de assistência social.
- **Planos municipais com termos de cooperação técnica e financeira** - a reparação é feita via equipamento público, CRAS/CREAS, com repasses de recursos diretamente aos municípios para a execução das ações do Termo de Cooperação Técnica e Financeira Além das capacitações a operadores de proteção social;
- **Planos municipais com acordo de cooperação** - ação de reparação é feita via rede socioassistencial (cujas entidades foram selecionadas no Edital de Proteção Social feito pela Renova), com as ações previstas no Acordo de Cooperação Técnica. Além das capacitações a operadores de proteção social;
- **Planos municipais com acordos de cooperação** - municípios com menos de 50 famílias vulneráveis na base do Cadastro Integrado, com as ações

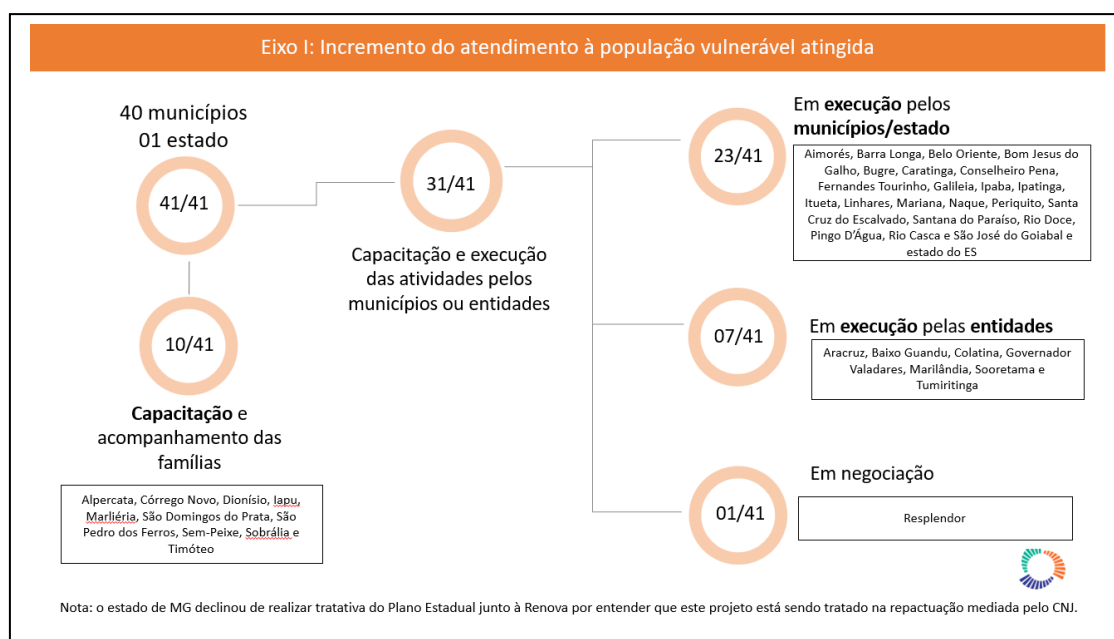

previstas no Acordo de Cooperação Técnica, onde o Programa de Proteção Social da Fundação Renova acompanha o processo de reparação das famílias vulneráveis, realiza capacitação e busca interagir com a Secretaria de Assistência Social, levando informações de todo processo de reparação.

Obs.: para os municípios “em negociação”, caso o plano não seja pactuado oficialmente (termo de parceria assinado por ambas as partes), deverão ter resolução via judicial.

Fonte: PG 05

3) Fatos e entregas relevantes do último mês

3.1 – Capacitação

Conforme previsto nos Planos de Reparação em Proteção Social e acordados com os estados, as capacitações devem ser ofertadas às equipes municipais e estaduais, com operacionalização pela Fundação Renova.

As temáticas ofertadas até o momento para os municípios são: Trabalho Social com Famílias em Situação de Desastre com foco em Gênero; Vigilância Socioassistencial; Técnica para trabalhos em grupos; Capacitação Introdutória à Política Nacional de Assistência Social, ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS e aos Serviços tipificados; Trabalho dos profissionais da Assistência Social em situações de desastres/calamidade - rompimento de barragem, chuvas, pandemia e outros; Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF/ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – e suas transversalidades; Família acolhedora e UAI criança e adolescente - construção de caso a partir da perspectiva da rede; Os diversos serviços, papéis e desafios da atenção especializada da Assistência Social – intervenção com múltiplos públicos: pessoas em situação de rua, migração ou imigração; Saúde Mental em Tempos de Pandemia; Comunicação Não Violenta; Violência sexual e seus desdobramentos na saúde da mulher; Envelhecimento e políticas alternativas ao asilamento.

Município	Ano da realização da oferta
Mariana	2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024
Linhares	2021 e 2024
Aracruz	2021 e 2022
Baixo Guandu	2021, 2022 e 2024
Colatina	2021 e 2023
Marilândia	2021, 2022 e 2023 e 2024
Sooretama	2021, 2023 e 2024

Bom Jesus do Galho	2021, 2022 e 2023
Caratinga	2021 e 2024
Conselheiro Pena	2021, 2022 e 2024
Ipaba	2021
Itueta	2021 e 2022
Naque	2021, 2022 e 2024
Periquito	2021, 2022 e 2024
Santana do Paraíso	2021 e 2022
Dionísio	2022
Iapu	2022, 2023 e 2024
Ipatinga	2022, 2023 e 2024
Marliéria	2022, 2023 e 2024
São Domingos do Prata	2022
Sem-Peixe	2022, 2023 e 2024
Sobralia	2022 e 2023
Timóteo	2022 e 2024
Estado do Espírito Santo	2022
Aimorés	2022, 2023 e 2024
Alpercata	2022, 2023 e 2024
Barra Longa	2022 e 2023
Belo Oriente	2022, 2023 e 2024
Bugre	2023
Córrego Novo	2022, 2023 e 2024
Fernandes Tourinho	2022, 2023 e 2024
Governador Valadares	2022
Pingo D'Água	2022 e 2023
Resplendor	-
Rio Casca	2022, 2023 e 2024
Rio Doce	2022
Santa Cruz do Escalvado	2022 e 2024
São José do Goiabal	2022, 2023 e 2024
São Pedro dos Ferros	2022, 2023 e 2024
Tumiritinga	2022, 2023 e 2024
Galileia	2024

Capacitações

- Março: Envio dos convites com a oferta de vagas aos municípios da primeira turma de 2023: Aimorés, Alpercata, Belo Oriente, Bugre, Córrego Novo, Fernandes Tourinho, Marliéria, Sobralia, Tumiritinga, Pingo D'água. Início da capacitação ocorreu em 11 de abril de 2023.
- Abril: Envio dos convites com a oferta de vagas aos municípios da segunda turma de 2023: Galileia, Córrego Novo, Marliéria, Sobralia, Iapu, São Pedro dos Ferros, Rio Casca, São José do Goiabal, Alpercata, Tumiritinga, Colatina, Marilândia e Sooretama. Início da capacitação ocorreu em 09 de maio de 2023.

- Maio: Envio dos convites com a oferta de vagas aos municípios da terceira turma de 2023: Bugre, Galileia, Resplendor, Alpercata, Iapu, Marliéria, São José do Goiabal, Sem Peixe, Sobrália, Tumiritinga, Ipatinga, São Pedro dos Ferros, Colatina, Marilândia e Sooretama. A capacitação prevista para 13 de junho de 2023, ocorreu conforme o planejado com as ofertas de vagas para os municípios acima elencados.
- Junho: Processo de inscrição para a 1ª Capacitação 2023 de Mariana, prevista para julho/2023.
- Julho: Realização da 1ª Capacitação 2023 de Mariana em 11 e 12/07/2023.
- Agosto: Realização da Capacitação de Barra Longa em 03/08/2023.
- Setembro: Realização de Capacitação de Mariana em 21 e 20/09/2023.
- Novembro: Realização da Capacitação de Barra Longa em 01/11/2023.
Realização de Capacitação de Mariana em 27 e 28/11/2023.
- Fevereiro de 2024: Envio dos convites com a oferta de vagas aos municípios da primeira turma deste ano, prevista para Março de 2024: Linhares, Baixo Guandu, Marilândia, Sooretama, Caratinga, Conselheiro Pena, Naque Periquito, Iapu, Ipatinga, Marliéria, Sem-peixe, Timóteo, Aimorés, Alpercata, Belo Oriente, Córrego Novo, Fernandes Tourinho, Rio Casca, Santa Cruz, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Tumiritinga, Galileia.
- Março de 2024: Envio dos convites com a oferta de vagas da segunda turma deste ano, prevista para abril de 2024: Mariana, Caratinga, Sobrália; Pingo D'água; Ipaba; Linhares; Timóteo; São Pedro dos Ferros; Tumiritinga; Sooretama; Sem Peixe; Marliéria; Marilândia; Iapu; Córrego Novo; Baixo Guandu; Alpercata; Galileia; São José do Goiabal; Santa Cruz do Escalvado; Rio Casca; Periquito; Naque; Ipatinga; Fernandes Tourinho; Conselheiro Pena; Bom Jesus do Galho; Aimorés; Belo Oriente.
- Abril de 2024: Conclusão do Curso de Trabalho Social com Famílias.
- Realização da capacitação Tema 1 e 2 em Mariana – dias 02 e 03/04/2024.

- Maio de 2024: Conclusão do Curso Vigilância Socioassistencial – dias 14/05/2024;
- Realização da capacitação Tema 3 em Mariana – dias 08 e 09/05/2024.

3.2 Acompanhamento de famílias

ENCAMINHAMENTOS DE FAMÍLIAS QUE PROCURARAM A FR PARA BUSCA DE INFORMAÇÕES DOS DEMAIS PROGRAMAS- MUNICÍPIOS DO ES

Municípios	Quantidade de encaminhamentos	Datas dos encaminhamentos
Linhares	03	19/06/2024
Cariacica	01	18/06/2024
São Mateus	01	11/06/2024

ENCAMINHAMENTOS DE FAMÍLIAS QUE PROCURARAM A FR PARA O PODER PÚBLICO - MUNICÍPIOS DO ES

-	-	-
-	-	-
-	-	-

REUNIÕES OU CONTATO POR TELEFONE COM EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIOS DE MG e ES

Município	Quantidade de Reuniões/contatos	Data das Reuniões/contatos
Baixo Gandu/ES	01	06/06/2024
Resplendor	01	18/06/2024
Mariana	-	-
Rio Doce	01	05/06/2024
Santa Cruz do Escalvado	05	04/06/2024
		12/06/2024
		13/06/2024
		20/06/2024
Barra Longa	01	24/06/2024

ENCAMINHAMENTOS PARA OS DEMAIS PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO RENOVA - MUNICÍPIOS DE MG

Municípios	Quantidade de encaminhamentos	Datas dos encaminhamentos
------------	-------------------------------	---------------------------

Mariana	15	06/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 18/06/2024
Barra Longa	01	24/06/2024

**ENCAMINHAMENTOS DE FAMÍLIAS QUE PROCURARAM A FR PARA
O PODER PÚBLICO - MUNICÍPIOS DO MG**

Município	Quantidade de encaminhamentos	Data das Reuniões/contatos
Aimorés	01	18/06/2024
Mariana	-	
Barra Longa	01	24/06/2024


**VISITAS DOMICILIARES OU CONTATO POR TELEFONE REALIZADAS -
MUNICÍPIOS DE MG e ES**

Município	Quantidade de Visitas/contato	Data da realização das visitas/contato
-	-	-

3.3. Outros fatos relevantes

- Assinatura do Termo de Encerramento do Acordo de Cooperação com o município de Baixo Gandu, em 06/06/2024.
- Assinatura do Termo de Encerramento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira com o município de Timóteo, em 10/06/2024.
- Assinatura do Termo de Encerramento do Acordo de Cooperação com o município de Fernandes Tourinho, em 24/06/2024.
- 2ª Reunião do Comapps de Galileia, em 25/06/2024.

4) Informações do repasse financeiro aos municípios e estados com planos assinados

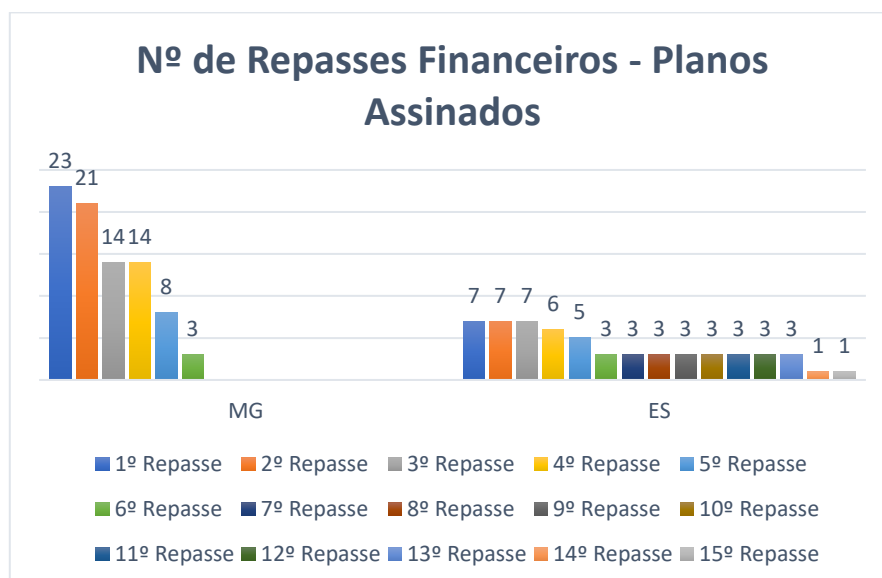

Fonte: PG 05 - até 30/06/2024



Fonte: PG 05 – até 30/06/2024

¹ Quantidade de repasses atualizada a partir da alteração da modalidade repasse semestral para medição mensal das entidades dos municípios de Colatina, Marilândia e Sooretama e inclusão do repasse previsto para Galileia.

Valor total previsto para repasse	Valor repassado até março/2024
R\$ 30.675.126,15¹	R\$ 28.708.044,43

¹ Valor atualizado incluindo repasses para Mariana e pleito de Naque e retirado valor previsto para Resplendor, pois ainda está em negociação. Corrigido valor total previsto.

Valor repassado por município e estado

Município	Total repassado
Aimorés	R\$1.863.084,01
Aracruz	R\$ 1.798.766,90
Baixo Guandu	R\$ 1.002.576,07
Barra Longa	R\$ 1.009.376,29
Belo Oriente	R\$ 740.544,26
Bom Jesus do Galho	R\$ 339.489,66
Bugre	R\$ 426.326,00
Caratinga	R\$ 168.321,83
Colatina	R\$ 396.829,60
Conselheiro Pena	R\$ 635.983,68
Fernandes Tourinho	R\$ 554.430,00
Galileia	R\$ 436.917,36
Governador Valadares	R\$ 1.157.046,68
Ipaba	R\$ 268.656,95
Ipatinga	R\$ 370.000,00
Itueta	R\$ 318.340,88
Linhares	R\$ 2.371.622,36
Mariana	R\$ 7.543.500,00
Marilândia	R\$ 433.632,00
Naque	R\$ 374.072,01
Periquito	R\$ 229.450,03
Pingo D'Água	R\$ 318.614,00
Rio Doce	1.107.008,25
Rio Casca	R\$ 317.595,04
Santa Cruz do Escalvado	R\$ 769.115,29
Santana do Paraíso	R\$ 312.295,40
São José do Goiabal	R\$ 739.613,27
Sooretama	R\$ 272.800,80
Tumiritinga	R\$ 738.012,31
Estado ES	R\$ 1.694.023,50
Total	R\$ 28.708.044,43

Fonte: PG 05 - até 31/05/2024

Status repasse financeiro – Deliberação CIF 533

Os municípios de Aimorés, Aracruz, Bom Jesus do Galho, Linhares, Naque, Pingo D'Água, Rio Casca, São José do Goiabal e Santa Cruz do Escalvado já foram finalizados os aditivos, conforme atualização da deliberação CIF 533.

Os municípios de Bugre, Fernandes Tourinho e Belo Oriente já assinaram e os recursos foram integralmente repassados.

Os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Sooretama tiveram as entidades contratadas, com a execução já finalizada.

Os municípios de Governador Valadares, Tumiritinga e Aracruz tiveram o valor referente ao impacto da deliberação CIF 533 diluído nas parcelas, de acordo com solicitação das entidades, com execução já finalizada.

5) Barramento

Atendimento pelo Programa de Proteção Social às famílias impactadas pelo alagamento da Lagoa Juparanã em Linhares e Sooretama/ES

Para as famílias removidas, além da execução de ações emergenciais, foram oferecidas duas modalidades de atendimento para a alocação em moradia provisória:

- a) **Compensação Financeira:** foi ofertado o pagamento de um valor para cobrir despesas de aluguel, condomínio, taxas e transporte, durante o período de deslocamento das famílias. A compensação financeira se operacionaliza por meio de um TERMO e é paga em razão da alocação do NÚCLEO FAMILIAR ATINGIDO, exclusivamente por opção deste, manifestada em reuniões de esclarecimento. Nesta modalidade, a própria família aluga o imóvel de sua escolha.
- b) **Aluguel de imóvel:** nesta modalidade a Fundação Renova aluga a casa, conforme escolha da família. O contrato de locação é em nome da Fundação Renova, assinando o proprietário do imóvel e o responsável do núcleo familiar.


Neste processo de concessão ficou a cargo do Programa de Proteção Social, a primeira escuta com o núcleo familiar, sendo realizada entrevista para coleta de informações de composição familiar, dados pessoais e aspectos de possível vulnerabilidade.

Aproximadamente 2 anos após a instalação do Barramento no rio Pequeno em novembro de 2015, o nível da lagoa Juparanã elevou, afetando 66 edificações em Patrimônio da Lagoa, Sooretama. Em decorrência do alagamento, em março de 2018, 11 famílias precisaram ser realocadas em moradia provisória com atendimento pela Fundação Renova. A partir desse momento, a Fundação Renova iniciou estudos para entender os danos causados nas edificações pelo prolongado

alagamento na localidade. Durante esse período de estudos, 4 famílias retornaram por conta própria às suas moradias e 1 se mudou para outra localidade, permanecendo famílias em moradia provisória. Após a conclusão dos laudos periciais em 15 de julho de 2019, mais 13 edificações foram interditadas pela Defesa Civil de Sooretama, contudo 3 famílias se recusaram a deixar suas casas com apoio da FR, permanecendo 5 famílias em situação de risco.

O impacto desse alagamento em Sooretama foi na comunidade de Patrimônio da Lagoa, afetando não só moradias, mas também equipamentos públicos, como a creche.

Total de famílias em deslocamento físico de Linhares/ES e Sooretama/ES

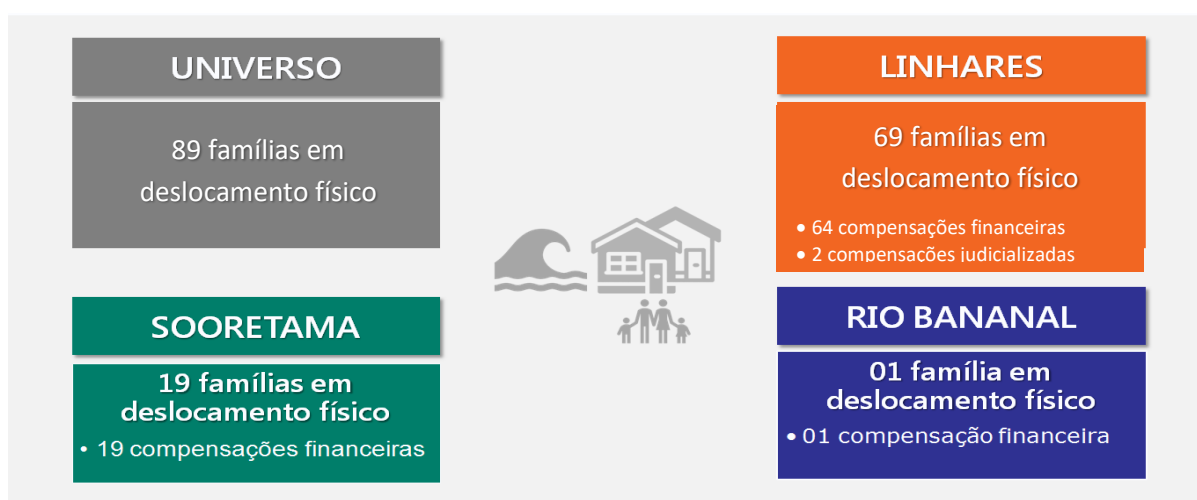

Observação: 02 famílias foram a óbito e 01 não foi localizada em 2023. 03 famílias assinaram o acordo no final de 2023, e no mês de junho de 2024 tiveram os termos de compensação encerrados, após manutenção de pagamento da Compensação Financeira por 180 dias, após a assinatura do acordo.

ENCAMINHAMENTOS PARA O PODER PÚBLICO – CONTEXTO DO BARRAMENTO

Município	Quantidade de encaminhamentos	Data do encaminhamento
Sooretama	-	-
Linhares	-	-

ENCAMINHAMENTOS PARA OS DEMAIS PROGRAMAS DA FR – CONTEXTO DO BARRAMENTO

Município	Quantidade/Contato	Data da realização
Linhares	03	19/06/2024

Obs.: por se tratar de encaminhamento a mesma família pode ter mais de um encaminhamento

6) Próximas entregas do Programa

- Continuidade da execução e monitoramento das ações previstas nos planos municipais e estadual de reparação em proteção social;
- Finalização dos termos de encerramento dos municípios: São Pedro dos Ferros, Sobrália e Colatina.

7) Desafios

- Monitoramento e acompanhamento das ações de reparação previstas nos planos com os municípios/estado;
- Garantir a presença dos membros do COMAPPS nas reuniões, dificuldades de acesso internet;
- Encerramento dos planos de reparação com os municípios do MG e ES envolvidos na reparação;
- Encerramento dos acordos de reparação com os municípios do MG e ES envolvidos na reparação.

8) Organização das ações em Home Office

A equipe do programa de Proteção Social, para a organização das ações em *home office*, elencou categorias de atuação norteadoras das atividades diárias.

- Reuniões entre membros da equipe e com os municípios por vídeo conferência, telefone e e-mail;
- Monitoramento dos Planos de Trabalho com os municípios por vídeo conferência, telefone e e-mail;
- Reuniões com os outros programas e áreas da Fundação Renova por vídeo conferência, telefone e e-mail (para tratativas de casos de atingidos ou outros encaminhamentos);
- Tratativas de casos com equipamentos públicos por vídeo conferência, telefone e e-mail;
- Assinatura eletrônica nos documentos para agilidade dos processos;

- Comunicação com atingidos por telefone e pílulas elaboradas pela comunicação.

9) Indicadores

Os indicadores, para monitoramento do Programa, foram aprovados no documento da 7ª versão do escopo do Programa de Proteção Social.

INDICADORES DE RESULTADO (atrelados aos critérios de encerramento)		UNIDADE	MEDIÇÃO	CÁLCULO (considerando as datas de medições conforme escopo)
I-1.1	% de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social.	Percentual (%)	100%	39 municípios e estado aderentes com recursos disponibilizados para implementação do plano de reparação em proteção social/39 municípios e estado aderentes
I-1.2	% Município de Mariana com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do Plano de reparação em proteção social. ¹		0%	0 município com recurso disponibilizado para implementação do plano de reparação em proteção social/01 município aderente
I-2	Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos. (Premissa: técnicos serem	Percentual (%)	100% ²	13 vagas ofertadas/06 vagas previstas

¹Em atendimento à auditoria externa, o município de Mariana será medido separadamente porque responde uma ACP (não segue o documento de definição do PG5), e suas entregas estão vinculadas à entrega do reassentamento. O Plano de Mariana está em andamento com recursos financeiros repassados parcialmente, conforme previsto na ACP. Vale ressaltar que, além dos recursos financeiros previstos exclusivamente para contratação de recursos humanos, estão previstas também outras ações (em andamento): disponibilização de veículos e cartão combustível; locação de imóvel para atendimento do CREAS; insumos para as oficinas e capacitações. As ações que já foram concluídas são: disponibilização de mobiliário para CREAS; estruturação de 5 brinquedotecas, disponibilização de mobiliário para o SCFV; disponibilização de mobiliário para Unidade Institucional de Acolhimento da Mulher.

²O método de apresentação deste indicador foi alterado a partir de recomendação da auditoria externa, considerando os perfis previstos na ficha do indicador. Os resultados estão apresentados com os dados do semestre, ou seja, não mais de maneira cumulativa. Vale ressaltar que as ofertas de vagas previstas a todos os municípios foi realizada, e por liberalidade a Fundação Renova ofertou vagas adicionais (vide relatório no anexo 4).

	contratados pelos municípios/estados com plano de reparação pactuado, confirmarem presença no curso e serem encaminhados pelos municípios/estados para participação na capacitação.).			(Vagas ofertadas no segundo semestre de 2023)
I-3	Ofertar vagas pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos. (Premissa: técnicos confirmarem presença no curso e serem encaminhados pelos municípios/estados para participação na capacitação.).	Percentual (%)	100% ³	14 vagas ofertadas/04 vagas previstas (Vagas ofertadas no segundo semestre de 2023)
I-4	Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos. (Premissa: técnicos confirmarem presença no curso e serem encaminhados pelos municípios/estados para participação na capacitação.).	Percentual (%)	100% ³	06 vagas ofertadas/02 vagas previstas (Vagas ofertadas no segundo semestre de 2023)
I-5	% de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito (monitoramento por programa). ³	Percentual (%)	100%	21.667 famílias vulneráveis com a rota de reparação concluída/21.667 elegíveis.
I-6	% de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova. ⁴ (Vulnerável elegível atendido pela política à qual ele é elegível no programa que tem direito. Uma vez constatada a elegibilidade e	Percentual (%)	100%	21.667 famílias vulneráveis com a rota de reparação concluída/21.667 elegíveis.

³ Medição realizada em dezembro/2023.

	o atendimento/oferta junto à política a qual o atingido vulnerável for elegível, a rota de reparação será considerada concluída pelo PG05).			
I-7	% de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares). ⁴	Percentual (%)	100%	134 famílias anuentes/134 famílias com acompanhamento (acompanhamento no primeiro semestre 2024).

10) Cronograma das macros ações do Programa em 2024

Fase do Programa	Cronograma	
	Início	Término
Definição do Programa	04/04/16	30/11/21
Execução do Programa	04/04/16	29/11/24*
Tema 1 – Incremento do atendimento à população vulnerável impactada	04/04/16	29/11/24
Tema 2 - Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da FR	16/08/18	29/11/24
Encerramento do Programa	30/05/25	30/05/25

*Relativo às ações de responsabilidade da Renova.

11) Orçamento 2022

Projetos/ Processos	Até 2021	2022	2023	A partir de 2024	TOTAL
Fortalecimento da política pública de Assistência Social	17,6 MM	12,8 MM	17,3 MM	23,61 MM	71,3 MM
Integração de ações entre programas da Fundação Renova					

⁴O método de apresentação deste indicador foi alterado a partir de recomendação da auditoria externa. Os resultados estão apresentados com os dados do semestre, ou seja, não mais de maneira. Alteração reportada no RMM de janeiro/2024.

ANEXOS

ANEXO 1: Painel de elaboração dos Planos de Trabalho e Termos de Parcerias com os municípios de MG e ES

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
ESTADO ESPÍRITO SANTO	ES	Plano em execução	<p>Aguardando análise de novo parecer da PGE, prazo acordado até 10/03/2020; Não enviou a resposta. Em 27/04/2020, Severino/Subsecretario Estadual enviou mensagem dizendo que a resposta da PGE retornou, em breve nos enviaria um posicionamento. Reunião dia 26/06 com equipe da SETADES para apresentação da FR, dos itens de dissenso do Plano e no Termo, aguardando retorno da SETADES Aguardando resposta da SETADES sobre o material enviado no dia 26/07; Ainda em agosto, aguardando devolutiva do Estado do termo. Em 30/09/2020 reunião de negociação do termo, sucesso na negociação, pequenos ajustes no termo e chegamos na pactuação do documento. Termo está em tramitação no sistema Ariba, próximo passo assinatura. Termo novamente na PGE – novembro/2020 Sem resposta até o mês de dezembro Reunião agendada para o dia 11/02 para ajustarmos o termo Cancelada a reunião do dia 11, FR aguardando nova agenda com a SETADES. Em março continuamos aguardando resposta da SETADES Pactuado o termo de cooperação técnica na reunião do dia 23/04/2021- Tramites internos para coleta de assinatura. Maio: trâmites internos para coleta de assinatura. No dia 25/06/2021 o Governado do ES, assinou o termo de cooperação técnico e financeiro, Em 26/07/2021 repasse da 1ª parcela do Acordo assinado -- envio de correspondência para o CEAS em 27/07/2021. Reunião de gestão com a equipe da SETADES em 19/08/21 e no dia 30 de agosto. Reunião de gestão com equipe da SETADES em 28/09/2021. Entrega do 1º relatório quadrimestral SETADES outubro/21. Reunião no dia 30/11/2021 monitoramento das ações do acordo firmado com a SETADES Reunião em 27/01/2022 de gestão com a Equipe da SETADES. Reunião de gestão foi reprogramada para março a pedido da SETADES. Reunião de gestão dia 31/03/2022- Capacitação para equipe contratada para fazer supervisão nos municípios dia 07/04/2022 Aguardando ajuste do termo 1º aditivo - jurídico da fundação em 30/08/22 1ª reunião do COMAPPS em 31/08 Reunião de gestão no dia 17/10/2022 informe e alinhamento do processo de reparação nos municípios de ES Reunião em 2ª reunião do COMAPPS em 28/03/2023 Reunião dia 15/03/2023 para apresentação da nova equipe da SETADES. Reunião em 04/04/23 de prestação de contas e dia 28/04/23 reunião com subsecretário para o alinhamento do 3º aditivo. Reunião de alinhamento para a realização do COMAPPS em 16/06/23. Reunião do 3º COMAPPS Estadual em 27/06/2023. Postagem da última prestação de contas para a baixa contábil em 10/07/2023; Realização da baixa contábil em 27/07/2023; Reunião mensal de gestão em 14/08/2023. Reunião mensal de gestão em 23/10/2023. Reunião – 4º COMAPPS Estadual em 23/10/2023.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Reunião mensal de gestão em 22/03/2024.</p> <p>Reunião – 5ª COMAPPS Estadual em 26/03/2024.</p> <p>Reunião – 6ª COMAPPS Estadual em 29/05/2024.</p>
Aracruz	ES	Plano encerrado	<p>Aguardando análise da PGM.</p> <p>Reunião para esclarecimentos do termo em 04/03/2020. Não enviou a resposta.</p> <p>Em 31/03/2020 FR enviou ofício cobrando resposta.</p> <p>Em 22/04/2020 FR enviou e-mail cobrando novamente resposta.</p> <p>Sem informação neste período.</p> <p>Continuamos sem informação em 30/07/2020.</p> <p>Em 10/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação.</p> <p>Em 01/09/2020 o município enviou nova proposta do termo de cooperação, vamos chamá-los para nova mesa de negociação. Agora em setembro</p> <p>Reunião em 23/09/2020, nova rodada de negociação, o município ficou de nos enviar resposta se aceita ou não o Plano até dia 30/09/2020, mas não enviou na data combinada, nenhuma resposta.</p> <p>Em novembro sem mudança na informação</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro</p> <p>Reunião agendada para dia 08/02/ apresentação para nova gestão</p> <p>Município aguarda a FR a enviar o Plano para assinatura, e informações sobre o edital</p> <p>Enviamos um novo plano e termo de reparação no dia 19 de março.</p> <p>Enviado o termo para coleta de assinatura 26/04/2021.</p> <p>Encaminhado no dia 27 /05 parecer do Jurídico da FR, esclarecendo o não envio de uma lista de documento solicitado pelo município,</p> <p>Estamos aguardando o retorno da PGM, em 28/05.</p> <p>Em 25/06/2021, enviamos os documentos solicitados pelo município e a FR aguarda retorno.</p> <p>Em 21/07/2021 assinado o Acordo com o município.</p> <p>Em 21/09/2021 reunião com gestores e liderança de comunidade de alinhamento sobre o processo de reparação em Proteção social.</p> <p>Assinatura e repasse da 1ª parcela para as 4 entidades selecionadas no edital agora no mês de outubro/21.</p> <p>Reunião com o Município dia 23/11/ criação do COMAPPS</p> <p>Publicação da portaria do COMAPPS AGORA NO MÊS DE JANEIRO</p> <p>Dia 24/02/2021 1ª reunião do COMAPPS</p> <p>Postagem de prestação de contas das 4 entidades, que executam as ações de reparação. Reunião com a nova secretária de Aracruz em 25/03/2022</p> <p>Pagamento da 2ª parcela das 4 Entidades que estão fazendo a reparação no município</p> <p>Supervisão das 4 entidades – visita in loco nos dias 23 e 24/08 – visitar os projetos e orientação de PC</p> <p>Contato com a nova Subsecretaria de Aracruz, em 21/10/22, ponto focal para discussões com a Renova</p> <p>Reunião com a Secretaria dia 08/11/22 para alinhamento sobre as entidades</p> <p>Reunião COMAPPS dia 30/03/2023</p> <p>Reunião com a nova subsecretaria dia 22/05/23 para alinhamento sobre as entidades</p> <p>Reunião com a secretaria de assistência social dia 25/09/23</p> <p>Reunião do 4º COMAPPS dia 25/09/23</p> <p>Assinatura do Termo de Encerramento do município de Aracruz dia 30/10/2023</p> <p>Desmobilização do COMAPPS- Portaria em 08/01/2024</p> <p>Reunião – 5ª COMAPPS Estadual em 26/03/2024.</p>
Baixo Guandu	ES	Plano encerrado	<p>Aguardando análise do Prefeito, prazo até dia 05/03/2020. Não enviou a resposta.</p> <p>Em 31/03/2020 FR enviou ofício cobrando resposta.</p> <p>Em 22/04/2020 FR enviou e-mail cobrando novamente resposta.</p> <p>Sem resposta em junho.</p> <p>Município encaminhou contraproposta no dia 31/07/2020.</p> <p>Em 10/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação.</p> <p>Em 19/08/2020 reunião de negociação, 90% dos itens apresentados pela prefeitura diverge da proposta de reparação. Em 21/08/ a FR enviou nova proposta, aguardamos retorno do município.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Envio de e-mail para município em 14/09/2020, solicitando resposta do município, não obtivemos nenhuma resposta. Aguardando retorno do município e da intervenção novamente feita pela SETADES</p> <p>Em novembro sem mudança na informação.</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro.</p> <p>Reunião com o município dia 26/01/21 apresentação para nova gestão e informação sobre a nova estratégia de reparação.</p> <p>Município aguarda a FR a enviar o Plano para assinatura, e informações sobre o edital</p> <p>Enviamos um novo plano e termo de reparação no dia 19 de março.</p> <p>Enviado ofício dia 23/04/2021 para o município solicitando devolutiva do de acordo do termo.</p> <p>Termo revisado pela FR será enviado. Em 01/06/2021 para o município.</p> <p>Em 25/06/2021 reenviamos os documentos solicitado pelo município, a FR aguarda retorno do município.</p> <p>Em 27 /07/2021 enviamos e-mail aguardando devolutiva do município</p> <p>Contato com município no mês de agosto, buscando devolutiva sobre o acordo.</p> <p>Assinado o termo de cooperação técnica com o município de BG em 23/09/2021</p> <p>Assinatura e repasse da 1ª parcela para a entidades selecionadas no edital agora no mês de outubro/21</p> <p>Reunião com o Município dia 17/11/ criação do COMAPPS</p> <p>Dia 25/02/202 1ª reunião do COMAPPS</p> <p>Reunião com a secretária de Assistência Social em 31/03/2022 e reunião com a entidade – INSTITUTO ELOS – que vai iniciar as ações de reparação</p> <p>Contratação da entidade que vai fazer a reparação no município. Solicitação da 1ª parcela em 27/04/2022</p> <p>Reunião em 17/10/22 com Entidade para acompanhamento da execução do projeto</p> <p>Reunião dia 10/11/22 vista aos projetos de Baixo Guandu, e reunião com a secretaria</p> <p>Dia 29/03/23 3ª reunião do COMAPPS</p> <p>Reunião com a comissão de atingido em 19/04/23;</p> <p>Reunião com a secretaria de assistência social dia 29/09/23</p> <p>Reunião do 4º COMAPPS dia 29/09/23</p> <p>Reunião com o Jurídico do Município sobre o Termo de Encerramento em 20/12/2023</p> <p>Desmobilização do COMAPPS de Baixo Guandu 09/01/2024.</p> <p>Reunião – 5ª COMAPPS Estadual em 26/03/2024.</p> <p>Reunião – 6ª COMAPPS Estadual em 29/05/2024.</p>
Colatina	ES	Plano encerrado	<p>Secretaria informou que está analisando a demanda. Reunião em 04/03/2020 para esclarecimentos do termo. Não enviou a resposta.</p> <p>Em 31/03/2020 FR enviou ofício cobrando resposta.</p> <p>Em 22/04/2020 FR enviou e-mail cobrando novamente resposta.</p> <p>Sem resposta em junho.</p> <p>Sem resposta em julho.</p> <p>Em 10/08/2020 a FR envia novo e-mail chamando para renegociar o termo. Até presente data o município não manifestou.</p> <p>Sem retorno no mês de setembro</p> <p>Em novembro sem mudança na informação</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro</p> <p>Reunião com o município dia 28/01/ apresentação para nova gestão e informação sobre a nova estratégia de reparação</p> <p>Município aguarda a FR a enviar o Plano para assinatura, e informações sobre o edital</p> <p>ENVIAMOS UM NOVO PLANO E TERMO DE REPARAÇÃO NO DIA 19 DE MARÇO</p> <p>O Município enviou no dia 27/04/21 o parecer da PGM - Plano e termo em ajuste na FR, conforme parecer da PGM do município.</p> <p>Aguardando assinatura do termo que foi enviado no dia 24/05/21 para o município.</p> <p>Em 28/05/2021 assinado o termo de Colatina – envio de correspondência para o CMAS em 27/07/2021</p> <p>Em 15/09/2021 reunião com gestores e liderança de comunidade para alinhamento sobre o processo de reparação em Proteção social.</p> <p>Assinatura e repasse da 1ª parcela para a entidades selecionadas no edital agora no mês de outubro/21.</p> <p>Reunião com o Município dia 18/11/ criação do COMAPPS</p> <p>Publicação da portaria do COMAPPS AGORA NO MÊS DE JANEIRO</p> <p>Dia 18/02/202 1ª reunião do COMAPPS</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Início de concorrência para nova entidade fazer as ações de reparação</p> <p>Reunião com a Secretaria de Assistência social em 01/04/2022 para informe do processo concorrencial para seleção de Entidade</p> <p>Visita a comunidade de Maria Ortiz, junto com a representante da secretaria, tentativa de reunião do COMAPPS, EM 13/10/22</p> <p>Reunião dia 10/11/22 conhecer o secretário novo de assistência</p> <p>Dia 27/03/23 3ª reunião do COMAPPS</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Reunião com a secretaria de assistência social dia 28/09/23.</p> <p>Reunião do 4º COMAPPS dia 28/09/23.</p>
Conceição da Barra	ES		
Fundão	ES		
Linhares	ES	Plano encerrado	<p>Em análise da PGM e do Gabinete do Prefeito.</p> <p>Reunião com Prefeito em 10/03.</p> <p>Prefeitura enviou ofício para Fundação em 13/03 com questionamentos jurídicos pela PGM. Fundação respondeu ofício em 23/04/2020.</p> <p>Em 01/06/2020 reunião com o município ajustando os itens dos termos em divergência. Em 05/06 enviado o termo para município novamente, para que ele faça seus ajustes.</p> <p>Em tramitação dentro da FR, para colher assinatura já no início do mês de julho.</p> <p>Assinado o termo em 24/07/2020 em tramite na FR para repasse da 1ª parcela. Em 07/08/pagamento da primeira parcela</p> <p>Em 31/08/2020 o município envia ofício pedindo prorrogação para contratação de FR.</p> <p>Reunião em 22/09/2021 para orientações de prestação de contas.</p> <p>Em novembro assinatura de termo aditivo - contratação de RH em janeiro de 2021</p> <p>Em dezembro nada para atualizar.</p> <p>Reunião agendada para dia 08/02/ alinhamento sobre a execução do plano.</p> <p>FR aguarda resposta das contratações e compra de equipamento no município.</p> <p>Reunião com município no dia 11 de março – informações sobre execução das ações previstas no plano de reparação.</p> <p>Envio de ofício e minuta de portaria para publicação do COMAPPS – em 26/04/21.</p> <p>Envio de e-mail no dia 28/05/2021 cobrando documentos para montar a prestação de conta do mês de maio/21.</p> <p>30/06 fechamos a primeira prestação de contas mensal, período de abril a maio, do termo assinado com o município.</p> <p>Em 23/07/2021 reunião com a Secretaria de Assistência social – gestão do termo</p> <p>Contato telefônico para ajuste na prestação de contas referente ao mês de julho.</p> <p>2ª reunião do COMAPPS no município de Linhares.</p> <p>1ª prestação de contas do município mês de novembro.</p> <p>2º REPASSE PARA O MUNICÍPIO EM DEZEMBRO</p> <p>Reunião de gestão em 04/02/2022</p> <p>Reunião com a Secretaria de assistência social dia 30/03/2022 – no mesmo dia reunião com a equipe técnica contratada para fazer as ações de proteção social – postagem da 2ª prestação de contas do município</p> <p>Pagamento da 3ª parcela para o município mês de abril</p> <p>Início do processo de remanejamento de rubrica dentro do Termo – mês de agosto/22</p> <p>Reunião com a secretaria em 19/10/22 alinhamento com a equipe da secretaria</p> <p>Reunião com a secretaria Luciene dia 07/11/22 alinhamento sobre o termo e PC</p> <p>Dia 20/03/23 6ª reunião do COMAPPS</p> <p>Reunião em 20/04/23 alinhamento do termo de parceria</p> <p>Reunião com a secretaria em 12/05/23 alinhamento dos RESULTA</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Reuniões Resulta – reuniões com as comunidades para apresentação dos resultados do PPS nos dias 22/05, 23/05, 24/05 e 25/05/2023</p> <p>Reunião em 14/06/23 de orientação sobre a desmobilização de veículos e equipe técnica tendo em vista o encerramento do termo de cooperação técnica e financeira.</p> <p>Desmobilização dos veículos previsto no termo de cooperação no município de Linhares-ES, em 29/06/2023.</p> <p>Encerramento do termo de cooperação técnica e financeira do município de Linhares, Jul/23.</p> <p>Reunião com a Secretaria de assistência social sobre população idosa vulnerável da comunidade de Degredo, em 03/08/2023.</p> <p>Reunião com o CRAS sobre população idosa vulnerável da comunidade de Degredo, em 25/08/2023.</p> <p>Reunião com a Secretaria de Assistência Social dia 08/11/2023.</p> <p>Reunião com a Secretaria de Assistência Social dia 16/11/2023.</p> <p>7ª Reunião do COMAPPS de Linhares dia 27/11/2023.</p>
Marilândia	ES	Plano encerrado	<p>Município aguarda a FR a enviar o Plano para assinatura, e informações sobre o processo de reparação no município</p> <p>Enviado o Plano e o acordo para o Município no dia 29/04/2021 para ser assinado</p> <p>Termo assinado em 07/05/2021.</p> <p>Em 27/07/2021, envio de correspondência para o CMAS.</p> <p>Em 14/09/2021 reunião com gestores e liderança de comunidade para alinhamento sobre o processo de reparação em Proteção social.</p> <p>Ainda no mês de janeiro o município não deu devolutiva sobre o Plano enviado em dezembro (município impactado com a deliberação 533</p> <p>Abertura de concorrência, no mês de fevereiro/22, para fazer a reparação com entidade, uma vez que o município não aceitou a fazer direto o termo.</p> <p>Envio do termo aditivo para anuência do município em abril</p> <p>Visita ao projeto na comunidade dia 02/08/22</p> <p>Reunião em 18/10/22 com a secretária para alinhamento de informações</p> <p>Reunião com a equipe do CRAS em 03/11/22 apresentação da Entidade Mandu</p> <p>Realização da primeira reunião do COMAPPS em 15/12/22</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 06 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio.</p> <p>Reuniões Resulta – reuniões com as comunidades para apresentação dos resultados do PPS e 2ª reunião do COMAPPS no dia 26/05/2023</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 6 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Reunião com a secretaria de assistência social dia 27/09/23</p> <p>Reunião do 3º COMAPPS dia 27/09/23</p> <p>Reunião com o Jurídico do município de Marilândia dia 28/11/2023, para entendimento das cláusulas de quitação do plano.</p>
São Mateus	ES		
Serra	ES		
Sooretama	ES	Plano encerrado	<p>Município enviou ofício com aceite do Termo em 19/02. Em 26/03/2020 Fundação solicitou ao município nº da conta do FMAS. A prefeitura enviou o nº da conta em 24/04/2020. Atualmente em trâmite interno da FR, para posterior assinatura da PM no documento.</p> <p>Em 04/06/2020 prefeito retrocedeu e não houve pactuação do termo. 31/07/2020.</p> <p>Em 10/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação, até final de agosto não obtivemos resposta.</p> <p>Sem resposta mês de setembro.</p> <p>Em novembro sem mudança na informação</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro</p> <p>Reunião agendada para dia 08/02/2021 apresentação para nova gestão.</p> <p>Reunião agendada para dia 10/02/ apresentação da nova estratégia de reparação no município.</p> <p>Município aguarda a FR a enviar o Plano para assinatura, e informações sobre o edital</p> <p>ENVIAMOS UM NOVO PLANO E TERMO DE REPARAÇÃO NO DIA 19 DE MARÇO</p> <p>Envio do termo e Plano para assinatura do Sr. Prefeito dia 26/04/21.</p> <p>Termo assinado em 11/05/2021.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Em 27/07/2021, envio de correspondência para o CMAS.</p> <p>Em 16/09/2021 reunião com gestores e liderança de comunidade para alinhamento sobre o processo de reparação em Proteção social.</p> <p>Assinatura e repasse da 1ª parcela para a entidades selecionada no edital agora</p> <p>No mês de outubro/21</p> <p>Reunião com o Município dia 16/11/ criação do COMAPPS</p> <p>Publicação da portaria do COMAPPS AGORA NO MÊS DE JANEIRO</p> <p>Dia 24/02/2022 1ª reunião do COMAPS;</p> <p>Abertura de concorrência, no mês de março/22, para fazer a reparação com entidade, uma vez que o município não aceitou a fazer direto o termo</p> <p>Reunião realizada com o SESI na data 09/06/2022 e dia 20/06/2022 com o SESI e a Secretaria Municipal de Assistência Social.</p> <p>Reunião com a nova secretaria de Sooretama – dia 02/08/22</p> <p>Reunião com a Entidade para acompanhar a execução do projeto</p> <p>Dia 28/03/23 3ª reunião do COMAPPS</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 5 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Reunião presencial com a secretaria de assistência social do município de Sooretama, em 11/07/23.</p> <p>Reunião com a Secretaria de assistência social dia 27/09/23</p> <p>Reunião do 4º COMAPPS dia 26/09/23</p> <p>Assinatura do Termo de Encerramento do município de Sooretama dia 26/10/2023</p> <p>Desmobilização do COMAPPS - Portaria em 13/12/2023</p> <p>Reunião – 5ª COMAPPS Estadual em 26/03/2024.</p>
ESTADO MINAS GERAIS		Estado de MG não aderiu à proposta do Plano	
Aimorés	MG	Plano encerrado	<p>Em 10/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação, até final de agosto não tivemos resposta.</p> <p>Em 30/10/2020, a FR enviou e-mail novamente chamando para renegociação, até o momento não houve retorno.</p> <p>Sem resposta até o mês de novembro.</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro.</p> <p>Sem resposta até o mês de janeiro/21.</p> <p>Reunião agendada para dia 04/03/2021 com a nova gestão para apresentação do Programa.</p> <p>Realizada reunião em 04/03/2021.</p> <p>Em 19/03/2021, foram enviados o novo plano e o termo de reparação.</p> <p>Enviado e-mail em 12/04/2021, solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 27/04/2021, foi realizada reunião com o Gestor da Assistência Social para esclarecimentos sobre o Plano e Termo.</p> <p>Em 28/04/2021, foi enviado ofício solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 27/05/2021, realizada reunião com a Sedese e o município.</p> <p>Em 23/06/2021, realizada reunião com jurídico e Assistência Social do município para esclarecimentos sobre o Acordo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Em 28/06/2021, enviado ao município a versão do Acordo e Plano ajustados conforme acordado em reunião de 23/06. E a FR aguarda retorno do município.</p> <p>Em 27/07/2021, município envia ofício informando a não adesão ao Acordo de Cooperação Técnica.</p> <p>Em 24/08/2021 envio do Acordo de Cooperação para o município.</p> <p>Sem resposta até setembro de 2021.</p> <p>Em 20/10/2021, envio do ofício reforçando a não adesão ao Acordo de Cooperação Técnica.</p> <p>Novembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>09/12/2021: reunião com o município sobre alteração no número de famílias vulneráveis e alinhamentos sobre o Plano.</p> <p>24/01/2022: realizada reunião com o município para a retomada da negociação do Plano, uma vez que informou interesse em pactuar o Plano por meio do repasse de recursos financeiros direto ao poder público.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>10/02/2022: Reunião com o município para informar sobre o acionamento, por parte da Fundação Renova, da 12ª Vara para solicitar autorização na execução das ações do PPS via entidades.</p> <p>10/02/2022: Município envia o Plano para o PPS.</p> <p>14/02/2022: PPS envia o Plano revisado para o município.</p> <p>Março/2022: Período de ajustes no Plano e Minuta do Termo em conjunto com o município.</p> <p>Abril/2022: Período de ajustes no Plano e Minuta do Termo em conjunto com o município.</p> <p>Maio/2022: município formaliza adesão à proposta. Iniciado os trâmites internos para assinatura.</p> <p>Junho/2022: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Julho/2022: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Agosto/2022: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira (29/08/2022).</p> <p>09/09/2022: Reunião inicial do Termo de Cooperação</p> <p>27/09/2022: 1º Repasse financeiro</p> <p>27/09/2022: Reunião presencial para apresentação do Termo de Cooperação para prefeito e secretário.</p> <p>Outubro: Oferta e adesão de profissionais para a capacitação "Trabalho Social com Famílias".</p> <p>26/10/2022: Reunião de apresentação do Termos de Cooperação Técnica e Financeira para os atingidos com a presença do município (definidos os representantes do COMAPPS).</p> <p>Dez/2022: Abertura de aditivo para baixa contábil.</p> <p>27/12/2023: Entrega dos veículos ao município para atendimento ao Plano de Trabalho do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Janeiro/2023: Gestão do Termo / Plano de Trabalho junto ao município.</p> <p>03/02/2023: Reunião de COMAPPS em formato online com participação de todas as partes.</p> <p>Março de 2023: Reunião com o município para acompanhamento do Plano de Trabalho em 13/03 e COMAPPS formato presencial em 15/03/2023, reunião para tratar do monitoramento dos veículos em 27/03/2023 (formato online).</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril/2023: Acompanhamento do Plano. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Maio/2023: Reunião de acompanhamento do plano de trabalho em 19/05/2023</p> <p>Junho/2023:Reunião de acompanhamento do plano de trabalho e alinhamento sobre desmobilização de veículos em 22/06/2023.</p> <p>julho/2023:Reunião de acompanhamento Plano de Reparação em Proteção Social com o município de Aimorés na comunidade Santo Antônio do Rio Doce em 31/07/2023;</p> <p>Agosto/23: Reunião de acompanhamento do Plano de Reparação em Proteção Social com o município de Aimorés – 07/08/2023 e 29/08/2023</p> <p>Participação no Resulta e realização do COMAPPS ampliado em Aimorés – 31/08/2023</p> <p>Outubro/23: Reunião de acompanhamento Plano de Reparação em Proteção Social em 19/10/2023.</p> <p>Dezembro: Reunião de acompanhamento e orientações sobre o encerramento do Plano de Reparação em Proteção Social em 13/12/2023</p> <p>22/01/2024 – Reunião Preparatória COMAPPS;</p> <p>23/01/2024 – Reunião do COMAPPS.</p>
Alpercata	MG	Plano encerrado	<p>Agendada reunião com o Gestor da Assistência Social para dia 07/05/2021 para tratar sobre o Plano e Termo.</p> <p>Em 25/05/2021, realizada reunião com o Gestor da Assistência Social para tratar sobre o Plano de Termo.</p> <p>Em 08/06/2021, Acordo de Cooperação Técnica assinado pelo município.</p> <p>Em setembro/21, mobilização do município e das comunidades para alinhamento sobre o processo de reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro/21, mobilização do município e lideranças das comunidades para apresentação do processo de reparação em Proteção Social.</p> <p>Novembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Dezembro/21: informativo enviado às lideranças e à Secretaria Municipal de Assistência Social sobre as ações do Programa de Proteção Social no município.</p> <p>Janeiro/22: sem atualização.</p> <p>Fevereiro/22: sem atualização.</p> <p>Março/22: sem atualização.</p> <p>Abril/22: sem atualização.</p> <p>Maio/22: sem atualização.</p> <p>Junho/22: sem atualização.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: município informou que não teria disponibilidade em participar das capacitações ofertadas.</p> <p>Setembro/22: sem atualização.</p> <p>Novembro/22: município informou que não teria disponibilidade em participar das capacitações ofertadas.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, porém sem adesão e participação deste.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 13 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 13 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 13 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Outubro/2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Novembro/2023: Assinatura do Termo de Encerramento do município em 07/11/2023.</p>
Barra Longa	MG	Plano encerrado	<p>Envio de ofício com Plano e Termo para análise do município, em 30/03/2020;</p> <p>Retorno do município com pré-aprovação do Plano e Termo. Documento em avaliação jurídica pela FR, em 16/04/2020;</p> <p>Envio de Termo e Plano para aprovação do município, em 10/06/2020;</p> <p>Retorno do município com a aprovação do Plano e Termo informando que o município está impedido de criar cargos ou funções públicas nos 180 dias que antecedem o término do mandato, em 29/06/2020;</p> <p>Documento em avaliação jurídica pela FR.</p> <p>20/07/2020 Envio de ofício para o município com a proposta do Plano e Termo, em 20/07/2020;</p> <p>27/07/2020 Resposta de aprovação do Plano e Termo pelo município, em 27/07/2020;</p> <p>Trâmites internos para assinatura.</p> <p>Termo assinado 28/08/2020;</p> <p>Reunião inicial para execução do Termo/Plano, em 02/09/2020; Reunião de planejamento das ações. Em 08/09/2020.</p> <p>Em processo de aditivo.</p> <p>Novembro: Assinatura do aditivo do Termo de Cooperação Técnica e Financeira de Barra Longa.</p> <p>Em 21/12/20 repasse da 1ª parcela para contratação de RH.</p> <p>Prestação de contas prevista para agosto 2021.</p> <p>15/01/2021 e 29/01/2021 - Reunião para alinhamento do Plano e Termo.</p> <p>Em 19/02/21 - Reunião de alinhamento sobre prestação de contas e implantação do comitê de avaliação;</p> <p>Em março foi realizado o processo seletivo e contratação dos profissionais pelo município.</p> <p>26/04/21- Entrega de mais um veículo para o município.</p> <p>Agosto - município finaliza entrega de documentação para a 1ª PC e realizada a inserção no sistema Fiori.</p> <p>03/09/2021 - Realização do repasse da 2ª parcela ao município de Barra Longa, conforme Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Outubro 2021: gestão do termo junto ao município.</p> <p>18/11/2021 - Segundo aditivo assinado. ro termo aditivo.</p> <p>Dezembro 2021- Gestão do termo junto ao município.</p> <p>Janeiro 2022- Gestão do termo junto ao município e avaliação da prestação de contas.</p> <p>16/02/2022- Repasse da 3ª parcela</p> <p>Março 2022- Gestão do termo junto ao município.</p> <p>Abril 2022- Gestão do termo junto ao município.</p> <p>Maio 2022- Gestão do termo junto ao município.</p> <p>Junho 2022- Gestão do termo junto ao município.</p> <p>Julho 2022- Gestão do termo junto ao município, prestação de contas.</p> <p>Agosto 2022- Gestão do Termo junto ao município, realização do repasse da 4ª parcela em 03/08/2022 e início do curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Setembro 2022 - Gestão do termo junto ao município, conclusão do curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Reunião de acompanhamento e avaliação do Plano de Reparação em Proteção Social realizada em 30/09/2022.</p> <p>Outubro 2022 - Recebimento de ofício sobre revisão do Plano de Reparação, em 11/10/2022 em avaliação da FR, mais realizado a troca de veículo solicitada pelo município.</p> <p>Novembro 2022 - Reunião de acompanhamento e início do processo de aditivo de alteração do Plano.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Dezembro 2022 – Reunião de acompanhamento e início do processo de aditivo de alteração do Plano e abertura de aditivo para baixa contábil.</p> <p>Janeiro 2023 - Reunião de acompanhamento e alinhamento sobre o processo de aditivo com alteração do Plano e abertura de aditivo para baixa contábil.</p> <p>Aceite pelo município, em processo para finalização do Termo para envio e assinatura.</p> <p>Fevereiro 2023 - Acompanhamento do Plano e Assinatura aditivo para repasse financeiro em 15/02/2023.</p> <p>Março 2023 - Acompanhamento do Plano, prestação de contas e repasse de 5ª parcela.</p> <p>Abril 2023 -Acompanhamento do Plano.</p> <p>Maio/ 2023 -Acompanhamento do Plano.</p> <p>Junho/ 2023 -Acompanhamento do Plano com Planejamento de Capacitação da equipe.</p> <p>Julho/ 2023 -Acompanhamento do Plano com Planejamento de Capacitação da equipe e planejamento de aquisição de insumos.</p> <p>Agosto/2023 - Acompanhamento do Plano, realização de capacitação e planejamento de aquisição de insumos.</p> <p>Setembro/2023 – Acompanhamento do Plano e planejamento de aquisição de insumos.</p> <p>Outubro/2023 - Acompanhamento do Plano, entregas de insumos e organização da capacitação.</p> <p>Novembro/2023 - Acompanhamento do Plano, entregas de insumos e realização da capacitação.</p> <p>Dezembro/2023 - Acompanhamento do Plano, entregas de insumos, alinhamento de informações para encerramento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Janeiro/2024 – Acompanhamento do Plano, desmobilização dos veículos em 05/01/2024; encerramento da execução do plano.</p> <p>Fevereiro/2024 - Acompanhamento do Plano – encerramento do plano em 28/02/2024.</p>
Belo Oriente	MG	Plano encerrado	<p>Em 13/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação.</p> <p>Em 26/08/2020, o município manifestou interesse.</p> <p>Em 26/08/2020 a FR solicita agenda para reunião na semana seguinte, mas sem retorno do município até final de agosto.</p> <p>Em 25/09/2020, foi realizada reunião de renegociação com o município onde ficou pactuado o retorno até dia 07/10/2020.</p> <p>Em 13/10/2020, foi realizada reunião para renegociação do Plano, sendo acordo com o município a devolutiva em 15 dias. Até o momento não houve retorno.</p> <p>Em 24/11/2020, recebemos retorno do município com proposta do Plano para análise do Programa.</p> <p>Em 04/12/2020, após análise da proposta do município, enviamos contrapropostas para as ações do Plano e até o momento não houve retorno.</p> <p>Sem resposta até o mês de janeiro/21.</p> <p>Reunião agendada para dia 04/03/2021 com a gestão para apresentação da nova estratégia de reparação.</p> <p>Realizada reunião em 04/03/2021.</p> <p>Em 26/03/2021, foram enviados o novo plano e o termo de reparação.</p> <p>Enviado e-mail em 12/04/2021, solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 28/04/2021, foi enviado ofício solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 20/05/2021, realizada reunião com a Sedese e o município.</p> <p>Em 28/05/2021, realizada reunião com o município com nova negociação sobre o Plano e Termo, onde município sinaliza a não adesão à proposta.</p> <p>Junho/21: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/21: sem mudança na informação.</p> <p>Agosto/21: sem mudança na informação.</p> <p>Setembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Outubro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Novembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Dezembro/21: tentativa de agenda com o município para falar sobre o aumento no número de famílias vulneráveis e possíveis ajustes no Plano. Município não tinha agenda para o mês.</p> <p>Janeiro/2022: em 26/01/2022, realizada reunião com o município para nova tentativa de negociação do Plano.</p> <p>Fevereiro/2022: em 10/02/2022, reunião com o município para informar sobre o acionamento, por parte da Fundação Renova, da 12ª Vara para solicitar autorização na execução das ações do PPS via entidades.</p> <p>Março/2022: em 22/03/2022, houve reunião presencial para apoiar na elaboração do Plano do município.</p> <p>Abril/2022: Período de ajustes no Plano pelo município.</p> <p>Maio/2022: Período de ajustes no Plano pelo município.</p> <p>Junho/2022: Município envia plano com ajustes. Reunião agendada para o próximo mês para finalizar os ajustes.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Julho/2022: Reunião com Belo Oriente para ajustes finais no Plano de Trabalho, em 06/07/2022.</p> <p>Agosto/2022: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Setembro/2022: Em trâmite para assinatura.</p> <p>07/10/2022: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>24/10/2022: Reunião inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Outubro/2022: 07/10/2022: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira. Em 24/10/2022: Reunião inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Oferta e adesão de profissionais para a capacitação "Trabalho Social com Famílias".</p> <p>Dezembro/22: Abertura do aditivo de baixa contábil.</p> <p>Fevereiro/2023: 14/02/2023 reunião online de acompanhamento do Plano de Trabalho.</p> <p>Março/2023: Reunião para apoio em prestação de contas em 15 e 23/03, e COMAPPS formato presencial em 21/03/2023.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 15 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril de 2023: Acompanhamento do Plano. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Junho/2023: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 05/06/2023.</p> <p>Agosto/2023: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 24/08/2023.</p> <p>Setembro/2023: Reunião Comapps em 13/09/2023.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 13/12/2023.</p> <p>Fevereiro/2024: Encerramento do Plano e Termo de Cooperação em 22/02/2024 e reunião de encerramento de COMAPPS em 28/02/2024.</p>
Bom Jesus do Galho	MG	Plano encerrado	<p>Termo Assinado, 29/01/2020.</p> <p>Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro em 18/03/2020.</p> <p>Município em período de prestação de contas – set/2020.</p> <p>Município não finalizou a prestação de contas set. 2020 até o mês de novembro.</p> <p>Encaminhada notificação em 23/12/2020 para regularização de prestação de contas ao município de na pessoa do prefeito municipal que foi quem assinou o Termo.</p> <p>Reunião com novo prefeito do município, em 20/01/21.</p> <p>Reunião com nova gestão da assistência social, em 26/01/21 para apresentação do PPS, esclarecimentos sobre o Plano de reparação e sobre a PC, que se encontra atrasada.</p> <p>Em 24/02/21, município informou que localizou diversos e-mails da FR informando sobre somente duas pendências na PC e que para todas as outras que foram solicitadas precisaria de um prazo para a contabilidade analisar os documentos solicitados.</p> <p>Março 2021, município inicia envio de documentação pendentes solicitadas, mas informou que não foram localizadas as GPS, formalizando através de ofício.</p> <p>25/03/21 – PPS solicitou orientação do jurídico sobre como a Fundação Renova deverá atuar para sanar essa situação do município declarar que não tem como entregar toda documentação necessária para a finalização da primeira prestação de contas.</p> <p>Em 22/04/21 – Reunião com Prefeito para negociação de prazo para a entrega da documentação pendente para a finalização da 1ª PC. Prazo solicitado pelo município para entrega: 30/05/21.</p> <p>Em 27/05/21, realizada reunião de negociação para entrega da documentação pendente para a finalização da 1ª PC;</p> <p>Em 28/05/21, município entrega documentação pendentes para a finalização da 1ª PC. PPS submete a documentação para avaliação da ADMCT.</p> <p>Em junho, finalização da 1ª prestação de contas.</p> <p>Em 29/06/21 realizado o segundo repasse.</p> <p>Em 30/06/21, publicação da portaria do COMAPPS.</p> <p>Em julho/21, início do processo da 2ª prestação de contas. Município justificou por ofícios a ausência de alguns documentos para a 2ª PC.</p> <p>Em agosto/21, município finaliza entrega de documentação para a 2ª PC e realizada a inserção no sistema Fiori;</p> <p>Realizada a primeira reunião do COMAPPS de BJG, em 26/08/21</p> <p>Em setembro/21, finalização da 2ª prestação de contas, aprovada.</p> <p>Em outubro/21 – Realizado 3º repasse e acordo com o município sobre aditivo de prazo para execução do Plano de trabalho.</p> <p>Em novembro/21 – Reunião para informação sobre aditivo de valor em função da alteração do conceito de vulnerabilidade.</p> <p>Em dezembro/21 – Gestão do Termo e Plano de Trabalho junto ao município.</p> <p>Em janeiro/22 – Alinhamento para a realização da 3ª prestação de contas, prevista para março/22.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Em fevereiro/22 – Município em período da 3ª prestação de contas. Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”.</p> <p>Março/22: Período de prestação de contas.</p> <p>Abril/22: 3ª prestação de contas finalizada e 4º repasse realizado.</p> <p>Maio/22: realizado repasse adicional ao município, referente ao impacto da deliberação CIF 533.</p> <p>Junho/22: monitoramento do Plano junto ao município.</p> <p>Julho/22: Reunião sobre orientação para a 4ª prestação de contas e desmobilização do RH, em 14/07/2022.</p> <p>Agosto/22: monitoramento do Plano junto ao município.</p> <p>Setembro/22: período da 4ª prestação de contas.</p> <p>Outubro/22: período da 4ª prestação de contas.</p> <p>Novembro/22: período da 4ª prestação de contas.</p> <p>Março/23: Termo de encerramento da parceria assinado pelas partes, em 08/03/2023.</p> <p>Abril/2023: Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p>
Bugre	MG	Plano encerrado	<p>Em maio, reunião de negociação para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social, e assinatura do Plano.</p> <p>Em 26/05/2021, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021: Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em novembro 2021: Reunião com gestores municipais para proposta de um Termo de Parceria com repasse financeiro para execução do Plano de Reparação em Proteção Social, devido alteração do conceito de vulnerabilidade da FR.</p> <p>Em dezembro de 2021 – Apoio e orientação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro de 2022 – Apoio, orientação e negociação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em fevereiro de 2022 - Orientação para ajustes na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social e seus documentos complementares.</p> <p>Março/22: Ajustes no Plano de Trabalho do município.</p> <p>Abril/22: Ajustes no Plano de Trabalho pelo município.</p> <p>Maio/22: Anuência do município à Minuta do Termo. Iniciado os trâmites internos para assinatura.</p> <p>Junho/22: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Julho/22: Reunião para alinhamento sobre o Plano de Trabalho, em 14/07/2022.</p> <p>Agosto/22: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>28/09/2022: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>06/10/2022: Reunião presencial de assinatura simbólica do Termo de Cooperação firmado entre o município de Bugre e a Fundação Renova.</p> <p>10/10/2022: Reunião inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>25/10/2022: Repasse financeiro (parcela única) ao município.</p> <p>24/01/2023: Reunião para organizar a Instituição do COMAPPS – prevista para 09/02/2023</p> <p>08/02/2023: Reunião de instituição do COMAPPS.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril de 2023: Reunião de Comapps em 17/04/2023. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Maio/2023: Reunião presencial para acompanhamento da execução do Plano de Trabalho em 16/05/2023.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Junho/2023: Tratativas via telefone sobre relatório quadrimestral e inauguração de equipamento previsto no Plano de Trabalho, em 16/06 e 28/06/2023.</p> <p>Julho/2023: Reunião de COMAPPS em 05/07/2023 e inauguração do Centro de Convivência (melhorias com recursos previstos no Plano de Trabalho) em 07/07/2023.</p> <p>Outubro/23: Reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho com o município em 26/10/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho com o município em 09/02/2024.</p> <p>Fevereiro/2024: Reunião de encerramento de COMAPPS em 29/02/2024.</p> <p>Março/2024: Assinatura do Termo de encerramento em 26/03/2024.</p>
Caratinga	MG	Plano encerrado	<p>Termo Assinado, 19/02/2020.</p> <p>Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro em 23/03/2020.</p> <p>Em 31/08/2020, o município envia ofício informando que a aquisição de equipamentos está em fase de processo de compra.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Em novembro 2020, município em período de prestação de contas semestral.</p> <p>Em dezembro foi informado ao município pendências na prestação de contas.</p> <p>Em janeiro 2021, município apresenta documentação pendente, mas ainda inconsistente para a finalização da PC.</p> <p>Em fevereiro 2021, município envia documentações pendentes.</p> <p>Em 02/03/21, PPS submete a documentação pendente da 1ª PC para ADMCT;</p> <p>Em 16/03/21, reunião de apresentação do Plano de Reparação em Proteção Social à nova secretária de Assistência Social.</p> <p>Em 25/03/21, ADMCT aprova documentação apresentada.</p> <p>Em abril, município em período de prestação de contas semestral.</p> <p>Em maio, município enviou documentações para a realização da 2ª prestação de contas. Realizou a inserção da documentação no SAPFIORE, em 27/05/21.</p> <p>Em 25/05/21 o Programa de Proteção Social recebeu um e-mail do município de Caratinga, em nome do Prefeito municipal Wellington Moreira de Oliveira, com a solicitação de rescisão do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Em junho, ADMCT identificou inconsistência da documentação. Solicitado ao município a pendência identificada.</p> <p>Em junho, realizada reunião com prefeito para esclarecimentos. Município ainda não respondeu sobre a continuidade ou não da parceria e solicitou mais tempo.</p> <p>Em julho município envia as pendências para a 2ª PC e continua a negociação sobre a manutenção do Plano.</p> <p>Em 28/07/21, ADMCT aprova a Medição da 2ª PC.</p> <p>Em agosto 2021: Realizado o terceiro repasse do Termo de Cooperação Técnica e financeira; Município envia a memória de cálculo corrigida; Município e FR continua a negociação sobre manutenção do Plano de Trabalho.</p> <p>Em setembro 2021 – município informa à FR que reconhece que não houve suplementação de RH em relação à funcionária deslocada para atuar no Plano de Reparação em Proteção Social, desta forma, a negociação para manutenção do Plano continua.</p> <p>Em outubro 2021 – Reunião para negociação para a manutenção do Termo de Parceria. Município irá continuar com a execução do Termo de Parceria. E, período da 3ª prestação de contas.</p> <p>Em novembro 2021 – município posta documentação referente a 3ª prestação de contas no sistema FIORE para avaliação da FR.</p> <p>Em dezembro 2021 – A 3ª prestação de contas é aprovada pela FR. Município recusa anuência do aditivo de valor referente a diferença salarial do RH (lei de ajuste de salário). Ainda em dezembro, município encaminha ofício confirmando a solicitação do distrato do Termo e não realiza entrega da Nota de Débito relativo ao boletim de medição (BM) do terceiro repasse realizado para o desenvolvimento do Plano de Reparação em Proteção Social</p> <p>Em janeiro de 2022 – realizado o 4º repasse do Termo de Parceria. Ocorre a retomada de diálogo e o município entrega a Nota de Débito relativo ao boletim de medição (BM) do terceiro repasse.</p> <p>Em fevereiro 2022 – O PPS realiza as tratativas necessárias para a desmobilização e encerramento do Termo de Parceria. Veículo, aparelho de monitoramento e cartão combustível foram desmobilizados. Acompanhamento da entrega da documentação para a última prestação de contas.</p> <p>Março/22: período de prestação de contas final.</p> <p>Abril/22: período de prestação de contas final.</p> <p>Maio/22: período de prestação de contas final.</p> <p>Junho/22: Realizada reunião presencial com o município para sanar as pendências da 4ª prestação de contas.</p> <p>Julho/22: Realizada a postagem da última prestação de contas, em 29/07/2022.</p> <p>Agosto/22: Nova postagem da última prestação de contas.</p> <p>Setembro/22: última prestação de contas aprovada.</p> <p>Outubro/22: em análise de pleito.</p> <p>Novembro/22: em análise de pleito.</p> <p>Janeiro/23: Reunião com município para esclarecimento de dúvidas e deliberações sobre o pleito.</p> <p>Abril de 2023: Acompanhamento das tratativas do pleito. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Maio/2023: Acompanhamento das tratativas do pleito, contato com o município para alinhamentos.</p> <p>Junho/2023: Reunião para devolutiva do pleito em 15/06 e assinatura da carta de pleito em 20/06/2023. Reunião com comunidade da Ilha do Rio Doce sobre o Plano de Trabalho em 29/06/2023.</p> <p>Agosto/2023: Reunião para tratativas sobre o pleito em 10/08/2023.</p> <p>Novembro/2023: Pagamento do pleito e baixa contábil.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 01/12/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Assinatura do termo de encerramento do município em 10/01/2024.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
Conselheiro Pena	MG	Plano encerrado	<p>Termo Assinado, 31/01/2020.</p> <p>Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro em 31/03/2020.</p> <p>Em 02/09/2020, o município envia ofício informando que a aquisição de equipamentos está em fase de licitação.</p> <p>Out-nov2020: Município em período de prestação de contas.</p> <p>Dezembro: município finalizou o envio da documentação de prestação de contas, que se encontra em análise pela Renova.</p> <p>Janeiro 2021: análise realizada e município foi informado da necessidade de envio de documentos ainda pendentes. Aguardando devolutiva do município.</p> <p>Fevereiro 2021: município iniciou envio de documentações pendentes.</p> <p>Março 2021: 1ª prestação de contas finalizada e 2º repasse realizado. E treinamento em sistema (SAPFIORI) sobre a inserção de documentos para a 2ª PC.</p> <p>Abril 2021: período de prestação de contas.</p> <p>Maio 2021: 2ª prestação de contas finalizada e 3º repasse realizado.</p> <p>Junho 2021: publicação da portaria do COMAPPS.</p> <p>Julho 2021: Reunião do COMAPPS.</p> <p>Agosto 2021: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Setembro 2021: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Outubro 2021: período de prestação de contas.</p> <p>Novembro/21: 3ª prestação de contas finalizada e 4º repasse financeiro realizado.</p> <p>Dezembro/21: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Janeiro/22: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Fevereiro/22: gestão do termo junto ao município e inscrição dos profissionais para o 2º curso de capacitação previsto no Plano de Trabalho.</p> <p>Março/22: início da desmobilização das atividades no município.</p> <p>Abril/22: desmobilização realizada e período de prestação de contas final.</p> <p>Maio/22: em período de prestação de contas final.</p> <p>Junho/22: em período de prestação de contas final.</p> <p>Julho/22: em período de prestação de contas final.</p> <p>Agosto/22: em período de prestação de contas final.</p> <p>Setembro/22: Postagem da última prestação de contas a troca de veículo solicitada pelo município.</p> <p>Outubro/22: Acompanhamento de encerramento das ações.</p> <p>Novembro/22: Último COMAPPS e fórum de apresentação dos Resultados do PG05 às comunidades com a participação da Secretaria de Assistência Social.</p> <p>Dezembro/22: Assinatura do Termo de Encerramento em 20/12/2022.</p> <p>Abril/2023: Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p>
Córrego Novo	MG	Plano encerrado	<p>Em 13/05/21 – reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em 29/06/21 – assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS.</p> <p>Fevereiro/22: sem alteração da informação.</p> <p>Março/22: sem alteração da informação.</p> <p>Abril/22: sem alteração da informação.</p> <p>Maio/22: sem alteração da informação.</p> <p>Junho/22: sem alteração da informação.</p> <p>Julho/22: sem alteração da informação.</p> <p>Agosto/22: Mobilização para participação no curso de Capacitação para os profissionais do SUAS, conforme Acordo assinado. Capacitação iniciada.</p> <p>Setembro/22: sem atualização.</p> <p>Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, porém sem adesão e participação deste.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 08 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 08 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Maio.</p> <p>Outubro/2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Novembro/2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Dezembro/2023: Assinatura do Termo de Encerramento do município em 28/12/23.</p>
Dionísio	MG	Plano encerrado	<p>Em maio, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social, e assinatura do Plano.</p> <p>Em 01/06/21, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021: Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para a Capacitação SUAS.</p> <p>Fevereiro/22: sem alteração da informação.</p> <p>Março/22: sem alteração da informação.</p> <p>Abril/22: sem alteração da informação.</p> <p>Maio/22: sem alteração da informação.</p> <p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: Capacitação iniciada.</p> <p>Setembro/22: sem atualização.</p> <p>Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, com adesão e participação deste.</p> <p>Outubro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Novembro: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Dezembro/2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Fevereiro/2024: Encerramento do Acordo de Cooperação Técnica em 07/02/2024.</p>
Fernandes Tourinho	MG	Plano encerrado	<p>Em 10/05/21, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em 29/06/21, Reunião de negociação de assinatura do Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social, com participação da equipe SUBAS</p> <p>Em julho/21: Assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021 – Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em novembro 2021 – Reunião com gestores municipais para proposta de um Termo de Parceria com repasse financeiro para execução do Plano de Reparação em Proteção Social, devido alteração do conceito de vulnerabilidade da FR.</p> <p>Em dezembro de 2021 – Apoio e orientação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em Janeiro/22 – Apoio, orientação e negociação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em fevereiro/22 - Orientação para ajustes na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social e seus documentos complementares.</p> <p>Março/22: Ajustes no Plano de Trabalho do município.</p> <p>Abril/22: Ajustes no Plano de Trabalho pelo município.</p> <p>Maio/22: Anuência do município à Minuta do Termo. Iniciado os procedimentos internos para assinatura.</p> <p>Junho/2022: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Julho/2022: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Agosto/2022: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>01/09/2022: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira</p> <p>08/09/2022: Reunião inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira</p> <p>13/09/2022: Reunião para apresentação do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>22/09/2022: Reunião para apresentação dos resultados do Plano de Trabalho em Proteção Social no distrito de Senhora da Penha, junto com a equipe de Diálogo (resulta).</p> <p>05/10/2022: Repasse financeiro da 1ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Outubro/22: Oferta e adesão de profissionais para a capacitação “Trabalho Social com Famílias”.</p> <p>Dezembro/22: Abertura do aditivo de baixa contábil.</p> <p>Janeiro/23: Gestão do Plano de Trabalho junto ao município.</p> <p>Fevereiro/2023: Em 07/02/2023 Reunião presencial para instituição de COMAPPS.</p> <p>Março/2023: Reunião para apoio na prestação de contas em 06 e 16/03/2023.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Abril/2023: Acompanhamento do Plano. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Junho/2023: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 06/06/2023.</p> <p>Julho/2023: Reunião de COMAPPS em 04/07/2023.</p> <p>Outubro/23: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 25/10/2023.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 14/12/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Contato telefônico para tratativas do termo de encerramento em 24/01/2024.</p> <p>Fevereiro/2024: Encerramento de COMAPPS em 26/02/2024.</p> <p>Março/2024: Tratativas por telefone sobre o termo de encerramento.</p> <p>Junho/2024: Assinatura do termo de encerramento em 24/06/2024.</p>
Galileia	MG	Plano em execução	<p>22/05/2020, foi enviado o Termo para assinatura eletrônica do município e não obtivemos retorno. Fizemos diversas tentativas de contato para apoiar no processo de assinatura, mas o município não retornou com o Termo.</p> <p>Em 13/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação, mas sem retorno do município até final de agosto.</p> <p>Sem retorno do município até final de setembro.</p> <p>Em 30/10/2020, a FR enviou novamente e-mail chamando para renegociação, até o momento não houve retorno.</p> <p>Em novembro, sem mudança na informação.</p> <p>Em dezembro, sem mudança na informação.</p> <p>Sem resposta até o mês de janeiro/21.</p> <p>Reunião agendada para dia 02/03/2021 com a gestão para apresentação da nova estratégia de reparação.</p> <p>Realizada reunião em 02/03/2021.</p> <p>Em 19/03/2021, foram enviados o novo plano e o termo de reparação.</p> <p>Enviado e-mail em 12/04/2021, solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 28/04/2021, foi enviado ofício solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 21/05/2021, realizada reunião com a Sedese e o município.</p> <p>Em 29/06/2021, enviado Acordo de Cooperação Técnica ajustado. E sem retorno do município, até o momento.</p> <p>Julho/21: sem mudança na informação.</p> <p>Agosto/21: sem mudança na informação.</p> <p>Setembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Outubro/21: nova tentativa de negociação.</p> <p>Novembro/21: aguardando devolutiva do município.</p> <p>Dezembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Janeiro/22: sem mudança na informação.</p> <p>15/02/2022: Reunião com o município para informar sobre o acionamento, por parte da Fundação Renova, da 12ª Vara para solicitar autorização na execução das ações do PPS via entidades. Na ocasião, o município manifestou, na reunião, o interesse em seguir com a negociação na modalidade de repasse de recurso financeiro ao poder público.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Agosto/22: sem mudança na informação.</p> <p>Setembro/22: sem mudança na informação.</p> <p>Outubro/22: Em 18/10/2022 foi realizada a audiência de conciliação dos municípios não aderentes com a participação do procurador do município de Galileia.</p> <p>Novembro/22: Jurídico da Fundação Renova realizou alguns contatos para tentativa de obter retorno sobre o Plano de Trabalho, ainda sem resposta.</p> <p>Dezembro/22 – 14/12/2022: Reunião para negociação sobre o Plano de Trabalho, com indicativo de aceite por parte do município.</p> <p>Janeiro/2023 – Contato com município, prazo estipulado para retorno da proposta do Plano até o final de janeiro, sem retorno.</p> <p>Fevereiro/2023: Conclusão da proposta do Plano de Trabalho, em reunião realizada em 17/02/2023.</p> <p>Março/2023: Reunião dia 22/03/2023 em formato presencial para finalização das negociações de Plano do Trabalho.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Abril/2023: Abertura do processo de assinatura.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Maio.</p> <p>Maio/2023: Em trâmite interno para assinatura, contatos com o município para acessos aos sistemas.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Junho/2023: Tratativas sobre a minuta do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>Julho/2023: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira em 18/07/2023 e reunião inicial do Termo em 31/07/2023.</p> <p>Agosto/2023: Repasse financeiro integral do Plano de Trabalho em 17/08/2023, reunião para acompanhamento do Plano em 24/08/2023.</p> <p>Setembro/2023: Reunião de Comapps 14/09/2023 e acompanhamento do Plano publicação do extrato do Termo e Portaria do Comapps no diário oficial em 27/09/2023.</p> <p>Fevereiro/2024: Reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho, em 05/02/2024.</p> <p>Junho/2024: Reunião de COMAPPS em 25/06/2024.</p>
Governador Valadares	MG	Plano encerrado	<p>Em 13/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação, mas sem retorno do município até final de agosto.</p> <p>Sem retorno do município até final de setembro.</p> <p>Em 30/10/2020, a FR enviou novamente e-mail chamando para renegociação, até o momento não houve retorno.</p> <p>Em novembro, sem mudança na informação.</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro.</p> <p>Sem resposta até o mês de janeiro/21.</p> <p>Reunião agendada para dia 04/03/2021 com a nova gestão para apresentação do Programa.</p> <p>Realizada reunião em 04/03/2021.</p> <p>Em 19/03/2021, foram enviados o novo plano e o termo de reparação.</p> <p>Enviado e-mail em 12/04/2021, solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 28/04/2021, foi enviado ofício solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 24/05/2021, realizada reunião com a Sedese e o município.</p> <p>Em 29/06/2021, enviado Acordo de Cooperação Técnica ajustado. Encontra-se em análise pelo município.</p> <p>Em 01/07/2021, realizada reunião com o Prefeito e foi pactuado retorno quanto à análise do município até 07/07/2021. Porém, ainda sem retorno.</p> <p>Em 27/08/2021, município envia Acordo com solicitação de ajustes.</p> <p>Em 15/09/2021, PPS envia ao município o Acordo e Plano ajustados, conforme solicitado.</p> <p>Em 20/09/2021, município envia e-mail anuindo o Acordo.</p> <p>Em 23/09/2021, PPS envia o Acordo para assinatura eletrônica do município.</p> <p>Em 25/10/2021, Acordo assinado.</p> <p>Novembro/21: mobilização das 02 instituições aprovadas no Edital de Proteção Social.</p> <p>Dezembro/21: Repasse da 1ª parcela para as 02 instituições aprovadas no Edital de Proteção Social.</p> <p>Janeiro: reunião com as entidades aprovadas no Edital de Proteção Social.</p> <p>18/02/2022: Reunião com o município para apresentar as entidades aprovadas no Edital de Proteção Social e seus projetos, bem como alinhar fluxo de trabalho.</p> <p>25/03/2022: reunião presencial para alinhamentos sobre a execução do Plano de Trabalho do município.</p> <p>Abril/2022: monitoramento das ações do Plano.</p> <p>Maio/2022: monitoramento das ações do Plano.</p> <p>Junho/2022: entidade realiza a 1ª prestação de contas realizada. Aprovada 1ª prestação de contas da entidade.</p> <p>Julho/2022: as entidades receberam a 2ª parcela do repasse de recursos financeiros.</p> <p>Agosto/22: Mobilização para participação no curso de Capacitação para os profissionais do SUAS, conforme Acordo assinado. Capacitação iniciada.</p> <p>21/09/2022: Reunião para apresentação dos resultados do Plano de Trabalho em Proteção Social no distrito de Baguari, junto com a equipe de Diálogo (resulta).</p> <p>Setembro: abertura do takeoff/remanejamento a pedido da entidade IBIS.</p> <p>Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial; Aditivo do IBIS finalizado.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, com adesão e participação deste.</p> <p>Dezembro/22: Finalização da prestação de contas, com baixa contábil da instituição IBIS – Instituto Brasil Igualdade Social.</p> <p>Dezembro/22: Finalização da prestação de contas, com baixa contábil da instituição INLAR – Instituto Nosso Lar.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Janeiro/23: Repasses financeiros da 3ª parcela para as entidades IBIS e Nosso Lar em 09/01/2023.</p> <p>Fevereiro/2023: Visita presencial na sede da entidade Nosso Lar em 09/02/2023, reunião de acompanhamento de projeto.</p> <p>Março/2023: Reunião com secretaria de assistência dia 22/03/2023. Reunião com entidades dia 17/03/2023 em conjunto com entidade de Tumiritinga sobre Comapps, encaminhamentos do workshop de entidades (aproximação com poder público).</p> <p>Abril de 2023: Reunião de Comapps em 13/04/2023, com a presença das entidades.</p> <p>Maio/2023: Reunião de Comapps (continuidade do Comapps de Abril com a presença dos atingidos) em 03/05/2023; reunião com as entidades (separadamente) em 31/05/2023 sobre acompanhamento dos projetos.</p> <p>Junho/2023: Reunião para acompanhamento dos projetos nas entidades: Nosso Lar em 16/06/2023 e IBIS em 27/06/2023.</p> <p>Julho/2023: Repasses (últimos) realizados para as entidades IBIS e INLAR em 12/07/2023.</p> <p>Agosto/2023: Reuniões para acompanhamento dos Planos de Trabalho, com os dias entidades IBIS e Nosso Lar, em 01/08/2023 e individualmente com a entidade Nosso Lar em 22/08/2023, e IBIS em 24/08/2023.</p> <p>Dezembro/2023: Encerramento da execução dos projetos das entidades IBIS e Nosso Lar em 24/12/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Prestação de contas final das duas entidades IBIS e Nosso Lar.</p> <p>Março/2024: Assinatura dos termos de encerramento das entidades IBIS e Nosso Lar, em 25/03/2024.</p> <p>Abril/2024: Reunião de encerramento do COMAPPS, em 23/04/2024.</p>
Iapu	MG	Plano encerrado	<p>Em 11/05/21 – reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em 02/06/21 – assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021 – Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para a Capacitação SUAS.</p> <p>Fevereiro/22: sem mudança na informação.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: Capacitação iniciada</p> <p>Setembro/22: sem atualização.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 06 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 06 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Outubro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo</p> <p>Novembro/23: Assinatura do Termo de Encerramento do município em 21/11/23.</p>
Ipaba	MG	Plano encerrado	<p>Termo Assinado, 29/01/2020.</p> <p>Repasses da 1ª parcela do recurso financeiro em 06/03/2020.</p> <p>Em 26/08/2020, o município envia ofício informando que a aquisição de equipamentos está em fase de licitação.</p> <p>Em novembro 2020, município em período de contas.</p> <p>Em dezembro 2020, município concluiu o envio de toda documentação para prestação de contas.</p> <p>Em janeiro 2021, reunião com novo prefeito e nova gestão da assistência social para esclarecimentos do Plano de Trabalho.</p> <p>Em 19/03/21, município envia nova memória de cálculo.</p> <p>Em 25/03/21, município inicia envio da documentação a ser submetida na 2ªPC para análise prévia do PPS.</p> <p>Em abril, município em período de contas semestral.</p> <p>Em 23/04/21, envio de ofício da FR/PPS informando sobre o atraso da entrega de documentação para a realização da 2ª PC.</p> <p>Em maio, município enviou documentações para a realização da 2ª prestação de contas. Realizou a inserção da documentação no SAPFIORI, em 27/05/21.</p> <p>Em junho 2021, finalização da 2ª PC e terceiro repasse realizado.</p> <p>Em julho 2021, publicação da portaria do COMAPPS.</p> <p>Em agosto 2021 – Município inicia envio da documentação para a 3ª prestação de contas;</p> <p>Realizada primeira reunião do COMAPPS de Ipaba em 30/08/21.</p> <p>Em setembro 2021 – município em período da 3ª prestação de contas.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Em outubro 2021 – município em período da 3ª prestação de contas (com dificuldades de cumprir com o prazo para a entrega da documentação. Em novembro 2021 – município posta documentação referente a 3ª prestação de contas no sistema FIORI para avaliação da FR. ADMCT reprova medição. Município realiza as correções indicadas e posta novamente no FIORI.</p> <p>Em dezembro 2021 – Realizado o 4º repasse do Termo de Parceria.</p> <p>Em janeiro 2022 – Gestão do Termo e Plano de Trabalho junto ao município.</p> <p>Em fevereiro de 2022 – Município em período da última prestação de contas. Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”.</p> <p>Março/22: realizada a desmobilização das atividades do Plano de Trabalho e período de prestação de contas.</p> <p>Abril/22: período de prestação de contas.</p> <p>Maio/22: período de prestação de contas.</p> <p>Junho/22: período de prestação de contas.</p> <p>Julho/22: Reunião presencial sobre as pendências da 4ª prestação de contas, em 18/07/2022.</p> <p>Agosto/22: Postagem da última prestação de contas.</p> <p>15/09/2022: Reunião para apresentação dos resultados do Plano de Trabalho em Proteção Social, junto com a equipe de Diálogo (resulta).</p> <p>Setembro/22: última prestação de contas aprovada.</p> <p>Outubro/22: em período de encerramento da parceria.</p> <p>Novembro/22: Realizada reunião em 16/11/2022 com o município para alinhamentos sobre o encerramento da parceria.</p> <p>Dezembro/22: Assinatura do Termo de encerramento da parceria em 26/12/22. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Julho/2023: Reunião de encerramento de COMAPPS em 21/07/2023.</p>
Ipatinga	MG	Plano encerrado	<p>Em 13/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação.</p> <p>Em 31/08/2020, o município manifestou interesse.</p> <p>Em 31/08/2020 a FR solicita agenda para reunião na semana seguinte, mas sem retorno do município.</p> <p>Em 09/09/2020, ocorre a reunião para renegociação do Plano com Ipatinga.</p> <p>Em 23/09/2020, ocorre uma nova reunião para alinhamentos sobre a renegociação.</p> <p>Em 30/09/2020, o município aprova as ações do Plano. E foi iniciado os trâmites internos na Fundação Renova.</p> <p>Em outubro, o Plano passa por ajustes.</p> <p>Em 04/12/20 município enviou contraproposta com requisitos para a aprovação do termo de cooperação técnica e financeira. No mesmo dia informamos que dois itens não eram possíveis atender. Foi dado um prazo até 10/12/2020 para o município responder, porém, não obtivemos retorno.</p> <p>Em janeiro, reunião com nova gestão da assistência social para apresentação do PPS, histórico de negociações do Termo e Nova Estratégia.</p> <p>Em fevereiro município solicita renegociação para executarem o Plano. Em 25/02/21, município enviou cotação de insumos para análise da FR.</p> <p>Em março 2021, PPS aguarda o resultado do balizamento de valores da cotação pela cadeia de suprimentos.</p> <p>Em 08/04/21 - suprimentos finaliza balizamento de valores com resultado de “aprovação para contratação”.</p> <p>Em 30/04/21, PPS envia Termo de Cooperação Técnica e Financeira e Plano de Trabalho para avaliação e “de acordo” do município.</p> <p>Em 24/05/21, município envia o “de acordo” ao Termo de Cooperação Técnica e Financeiro e Plano de Trabalho.</p> <p>Em junho 2021, documentação do Termo de Parceria transita internamente para as devidas chancelas. Realizada a RIA.</p> <p>Em julho 2021 - Reunião de Handover Parceria;</p> <p>Em agosto 2021 – Reunião de Kick-off. Realizado o primeiro repasse do Termo de Parceria, em 25/08/21</p> <p>Em setembro 2021- fluxo de acompanhamento.</p> <p>Em outubro 2021 – Avaliação do PPS das propostas técnicas para compra dos equipamentos.</p> <p>Em novembro 2021 – Após análise técnica e comercial, resultado do processo de concorrência para o fornecedor dos equipamentos (07 notebooks)</p> <p>Em dezembro de 2021 – Realização da entrega dos equipamentos pela FR (07 notebooks)</p> <p>Em janeiro 2022 – Gestão do Termo e Plano de Trabalho junto ao município.</p> <p>Em fevereiro 2022 – Gestão do Termo e Plano de Trabalho junto ao município. Orientações para a 1ª prestação de contas.</p> <p>Março/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Abril/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Maio/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Junho/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Julho/22: gestão do termo com o município e mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Agosto/22: gestão do termo com o município e mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Setembro/22: Em 21/09/2022 foi realizado acompanhamento presencial da execução do Plano de Trabalho, capacitação que o município contratou para as equipes técnicas do município.</p> <p>Outubro/22 Em 25/10/2022 foi finalizada a 2ª prestação de contas do município de Ipatinga.</p> <p>Novembro/22: Em 09/11/2022 – 2º repasse ao município.</p> <p>Dezembro/22: Abertura de aditivo prestação de contas aos órgãos competentes.</p> <p>Fevereiro/2023: Em 16/02/2023 realizada reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho.</p> <p>Março/2023: Reunião de apoio na prestação de contas e COMAPPS Formato online em 29/03/2023.</p> <p>Abril de 2023: Reunião de acompanhamento do Plano de Reparação em Proteção Social em 19/04/2023. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Agosto/2023: Reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho em 17/08/2023.</p> <p>Outubro/2023: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 24/10/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Reunião para desmobilização do Plano de Trabalho em 12/01/2024.</p> <p>Março/2024: Reunião de encerramento do COMAPPS em 20/03/2024.</p> <p>Abril/2024: Assinatura do Termo de encerramento em 24/04/2024.</p>
Itueta	MG	Plano encerrado	<p>Termo assinado, repasse da 1ª parcela em 02/07/2020</p> <p>Em 26/08/2020 o município envia ofício solicitando prorrogação na compra dos equipamentos, FR responde em 31/08 concedendo o prazo solicitado por ofício.</p> <p>Novembro: município enviou a prestação de contas dos equipamentos.</p> <p>Próxima prestação de contas com informações de RH prevista para janeiro 2021.</p> <p>Janeiro/21: em período de prestação de contas.</p> <p>Fevereiro/21: ajustes na prestação de contas com o município.</p> <p>Março/21: análise da prestação de contas do município.</p> <p>Abril/21: finalização e aprovação da 1ª prestação de contas e 2º repasse realizado.</p> <p>Maio/21: acompanhamento das ações do Plano.</p> <p>Junho/21: em período de prestação de contas com o município.</p> <p>Julho/21: em período de prestação de contas com o município.</p> <p>Agosto/21: Aprovação da prestação de contas e repasse da 3ª parcela ao município.</p> <p>Setembro/21: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Outubro/21: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Novembro/21: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Dezembro/21: gestão do termo junto ao município.</p> <p>Janeiro/22: em período de prestação de contas.</p> <p>Fevereiro/22: em período de prestação de contas e inscrição dos profissionais para o 2º curso de capacitação previsto no Plano de Trabalho.</p> <p>Março/22: postagem da 3ª prestação de contas e realização do 4º repasse de recursos financeiros.</p> <p>Abril/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Maio/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Junho/22: gestão do termo com o município.</p> <p>Julho/22: encerramento da execução das atividades do Plano de Trabalho e início do período da última prestação de contas.</p> <p>Agosto/22: período da última prestação de contas.</p> <p>28/09/2022: Reunião para apresentação dos resultados do Plano de Trabalho em Proteção Social, junto com a equipe de Diálogo (resulta).</p> <p>Setembro/2022: postagem da última prestação de contas.</p> <p>26/10/2022: Reunião de encerramento do Comapps (participação de todos os representantes do comitê).</p> <p>Novembro/22: Em 11/11/2022 realizada reunião com município sobre nota de débito e devolução de recursos à FR para encerramento da parceria.</p> <p>Em 23/11/2022 o município encaminhou ofício à FR com solicitação de doação dos recursos que deveriam ser devolvidos.</p> <p>Abril/2023: Fundação Renova deferiu o pedido de doação, formalizou via termo de doação. Medição efetuada do sistema e baixa contábil realizada. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			Maio/2023: Alinhamentos com o município sobre prestação de contas referente ao termo de doação e sobre assinatura do termo de encerramento.
Mariana	MG	Plano em execução	<p>1ª parcela do recurso disponibilizado ao município. 2ª parcela do recurso disponibilizado ao município. 3ª parcela do recurso disponibilizado ao município. Realização de Reunião de avaliação do Plano de Reparação em Proteção Social, em 08/08/2022; Agendamento de segunda reunião do Plano de Reparação em Proteção Social, para 07/10/2022. Outubro 2022: Realização de reunião de avaliação do Plano de Reparação em Proteção Social e avaliação de prestação de contas (judicial) Janeiro 2023: Repasse da 5ª parcela via depósito judicial; Fevereiro 2023: Acompanhamento Plano e troca da frota veicular do município, organizada para acontecer até o dia 07 de março de 2023. Março 2023 - Acompanhamento do Plano. Abril 2023 -Acompanhamento do Plano. Maio 2023 -Acompanhamento do Plano. Junho/ 2023 -Acompanhamento do Plano com Planejamento de Capacitação da equipe e planejamento de aquisição de insumos para os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Julho/ 2023 -Acompanhamento do Plano, realização de capacitação da equipe e planejamento de aquisição de insumos para os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Agosto/2023 - Acompanhamento do Plano, avaliação capacitação, replanejamento de aquisição de insumos e prestação de contas. Setembro/2023 - Acompanhamento do Plano, replanejamento de aquisição de insumos e prestação de contas. Outubro/2023 - Acompanhamento do Plano, reunião de avaliação e planejamento de capacitação. Novembro/2023 - Acompanhamento do Plano, organização para entrega de insumos e realização da capacitação. Dezembro/2023 - Acompanhamento do Plano, entregas de insumos, reunião de avaliação da 3ª Capacitação. Janeiro/2024 – Acompanhamento do Plano, reunião avaliação, planejamento 2024 e prestação de contas. Abril/2024- Acompanhamento do Plano, realização de capacitações. Maio/2024 – Acompanhamento do Plano, realização da capacitação 3</p>
Marliéria	MG	Plano encerrado	<p>Em 06/05/21 – reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social. Em 18/06/21 – assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social. Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS. Fevereiro/22: sem mudança na informação. Março/22: sem mudança na informação. Abril/22: sem mudança na informação. Maio/22: sem mudança na informação. Junho/22: sem mudança na informação. Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Agosto/22: sem mudança na informação. Setembro/22: sem mudança na informação. Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, porém sem adesão e participação deste. Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril. Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio. Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho Novembro de 2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo. Janeiro/2024: Assinatura do termo de encerramento 31/01/2024.</p>
Naque	MG	Plano encerrado	<p>Termo assinado em 16/04/2020. Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro em 22/06/2020. Dezembro/20: em período de prestação de contas. Janeiro/21: município ainda está providenciando documentos para a prestação de contas. Aguardando devolutiva do município.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Fevereiro/21: ajustes na prestação de contas com o município. Março/21: análise da prestação de contas do município. Abril/21: finalização e aprovação da 1ª prestação de contas e 2º repasse realizado. Maio/21: acompanhamento das ações do Plano. Junho/21: em período de prestação de contas com o município. Julho/21: finalização e aprovação da 2ª prestação de contas e 3º repasse realizado. Agosto/21: gestão do termo junto ao município. Setembro/21: gestão do termo junto ao município. Outubro/21: gestão do termo junto ao município. Novembro/21: Reunião para informação sobre aditivo de valor em função da alteração do conceito de vulnerabilidade. Dezembro/21: em período de prestação de contas com o município. Janeiro/22: em período de prestação de contas. Fevereiro/22: realizado o último (4º) repasse financeiro ao município e inscrição dos profissionais para o 2º curso de capacitação previsto no Plano de Trabalho. Março/22: gestão do termo junto ao município. Abril/22: gestão do termo junto ao município Maio/22: realizado repasse adicional ao município, referente ao impacto da deliberação CIF 533. Junho/22: gestão do termo com o município. Julho/22: assinatura do aditivo de vigência com o município. Agosto/22: gestão do termo com o município. Setembro/22: período da última prestação de contas. Outubro/22: período da última prestação de contas. Novembro/22: Último COMAPPS e fórum de apresentação dos Resultados do PG05 às comunidades com a participação da Secretária de Assistência Social. Em período da 4ª prestação de contas. Fevereiro/2023: Termo de encerramento assinado em 16/02/2023. Abril/2023: Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p>
Periquito	MG	Plano encerrado	<p>Termo assinado em 11/02/2020. Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro em 17/03/2020. Dezembro/20: Prestação de contas prevista para fevereiro de 2021. Janeiro/21: realizada reunião com nova gestão do município para apresentação do Programa de Proteção Social. Fevereiro/21: em período de ajustes na prestação de contas. E treinamento em sistema (SAPFIORI) sobre a inserção de documentos para prestação de contas. Março/21: ajustes na 1ª prestação de contas. Abril/21: ajustes na 1ª prestação de contas. Maio/21: ajustes na 1ª prestação de contas. Junho/21: em período da 2ª prestação de contas com o município. Julho/21: em período da 2ª prestação de contas com o município. Agosto/21: em período da 2ª prestação de contas com o município. Setembro/21: 2ª prestação de contas finalizada e aprovada. Outubro/21: realizado o 3º repasse ao município. Novembro/21: gestão do termo junto ao município. Dezembro/21: em período da 3ª prestação de contas com o município. Janeiro/22: em período de prestação de contas. 25/01, houve reunião para tratar sobre as pendências documentais da prestação de contas. Fevereiro/22: em período de prestação de contas e inscrição dos profissionais para o 2º curso de capacitação previsto no Plano de Trabalho. Março/22: reunião do comitê (09/03). Período da 3ª prestação de contas. Abril/22: 3ª prestação de contas finalizada e 4º repasse realizado. Desmobilização realizada e período da 4ª prestação de contas. Maio/22: em período da 4ª prestação de contas. Reunião presencial em 12/05. Junho/22: em período da 4ª prestação de contas. Agendada reunião presencial para o próximo mês.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Julho/22: Reuniões sobre as pendências da 4ª prestação de contas, em 13/07/2022 e 25/07/2022;</p> <p>Agosto/22: postagem da última prestação de contas e aprovação desta prestação de contas pela Fundação Renova.</p> <p>Setembro/22: trâmites internos para formalização do encerramento da parceria.</p> <p>Outubro/22: Reunião para o encerramento da parceria.</p> <p>06/10/2022: Apresentação do Programa e do Plano de Trabalho no Resulta para as comunidades atingidas.</p> <p>Novembro/22: Assinatura do Termo de Encerramento da Parceria em 04/11/2022.</p> <p>Abril/2023: Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Junho/2023: Reunião de encerramento de COMAPPS, em 29/06/2023.</p>
Pingo D'Água	MG	Plano encerrado	<p>Em 06/05/21, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em, 01/06/21, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021: Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em novembro 2021: Reunião com gestores municipais para proposta de um Termo de Parceria com repasse financeiro para execução do Plano de Reparação em Proteção Social, devido alteração do conceito de vulnerabilidade da FR.</p> <p>Em dezembro de 2021: Apoio e orientação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro de 2022 – Apoio, orientação e negociação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em fevereiro de 2022 - Orientação para ajustes na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social e seus documentos complementares.</p> <p>Março/22: ajustes no Plano de Trabalho do município e validação do mesmo por parte do município.</p> <p>Abril/22: iniciado trâmites internos para assinatura do Termo.</p> <p>Maio/22: em trâmite para assinatura.</p> <p>Junho/22: em trâmite para assinatura</p> <p>Julho/22: Assinado em 07/07/2022, reunião inicial realizada presencialmente em 19/07/2022.</p> <p>Agosto/22: 1ª parcela de repasse realizado em 11/08/2022.</p> <p>Outubro: reuniões para gestão do Termo junto ao município.</p> <p>Outubro: Oferta e adesão de profissionais para a capacitação “Trabalho Social com Famílias”.</p> <p>Novembro: Tratativas com o município para abertura de aditivo/takeoff remanejamento, solicitado pelo município.</p> <p>Dezembro: Abertura de aditivo para remanejamento e baixa contábil.</p> <p>01/12/2022: Reunião de instituição do Comapps e acompanhamento do Plano de Trabalho.</p> <p>Janeiro/2023: Encerramento do aditivo para baixa contábil e prestação de contas aos órgãos competentes.</p> <p>Fevereiro/2023: Encerramento do aditivo e repasse financeiro da última parcela em 13/02/2023. Reunião com o município em 16/02/2023 para fluxo de processos de baixa contábil.</p> <p>Março/2023: Reuniões para apoio de prestação de contas em 03 e 17/03/2023. Reunião de COMAPPS formato presencial dia 01/03/2023.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Abril.</p> <p>Abril/2023: Acompanhamento do Plano. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Junho/2023: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 06/06/2023.</p> <p>Julho/2023: Tratativas sobre o acompanhamento do Plano de Trabalho via telefone.</p> <p>Agosto/2023: Reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho, em 18/08/2023.</p> <p>Setembro/2023: Reunião de Comapps em 12/09/2023.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 05/12/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Assinatura do Termo de encerramento em 12/01/2024.</p> <p>Março/2024: Reunião de encerramento do COMAPPS em 19/03/2024.</p>
Raul Soares	MG	Não há famílias vulneráveis cadastradas na base do Cadastro Integrado	----

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
Resplendor	MG	Município não aderiu à proposta	<p>Reunião em 14/02/2020 para negociação do plano. Em 28/02 município enviou e-mail dizendo estar em análise</p> <p>Envio de ofício pela FR em 31/03/2020 cobrando posicionamento.</p> <p>Em 17/04/2020 a PM enviou e-mail com os mesmos argumentos para não aceitação da proposta da FR, e solicitando outra proposta para o processo de reparação no seu município.</p> <p>Em 28/09/2020 o município envia e-mail manifestando interesse para uma nova conversa. Agendamento para outubro 2020.</p> <p>Em 30/10/2020, a FR enviou novamente e-mail chamando para renegociação, até o momento não houve retorno.</p> <p>Em novembro, sem mudança na informação.</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro.</p> <p>Sem resposta até o mês de janeiro/21.</p> <p>Reunião realizada em 08/02/2021 para nova tentativa de negociação do Plano.</p> <p>11/02/2021: município enviou ofício informando a não adesão do Plano após reunião.</p> <p>Reunião realizada em 23/02/2021 sobre a nova estratégia de reparação.</p> <p>Em 19/03/2021, foram enviados o novo plano e o termo de reparação.</p> <p>Enviado e-mail em 12/04/2021, solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 26/04/2021, o município enviou algumas dúvidas sobre os documentos. O PPS enviou ao jurídico para análise e posterior retorno a Gestora da Assistência Social.</p> <p>Maio 2021: Retorno à Gestora da Assistência Social sobre as dúvidas referente ao Termo.</p> <p>Em 29/06/2021, enviado Acordo de Cooperação Técnica ajustado. Encontra-se em análise pelo município.</p> <p>Julho 2021: agenda reunião com o município para 05/08/2021.</p> <p>24/08/2021 envio do Acordo de Cooperação para o município.</p> <p>Setembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Em 01/10/2021, município envia ofício reiterando a não adesão ao Acordo.</p> <p>Novembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Dezembro/21: sem mudança na informação.</p> <p>Janeiro/22: sem mudança na informação.</p> <p>10/02/2022: Reunião com o município para informar sobre o acionamento, por parte da Fundação Renova, da 12ª Vara para solicitar autorização na execução das ações do PPS via entidades.</p> <p>Março/22: ajustes no Plano de Trabalho e Minuta do Termo em conjunto com o município.</p> <p>Abril/22: município envia Plano e Minuta com solicitação de ajustes. Está sendo avaliado pelo jurídico da Renova.</p> <p>Maio/22: Fundação Renova retorna com a avaliação da Minuta ao município.</p> <p>Junho/22: município dá anuência no Termo e iniciado os trâmites internos para assinatura.</p> <p>Julho/22: Em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Agosto/22: aguardando retorno do município para seguir com os trâmites interno para assinatura.</p> <p>27/09/2022: Reunião presencial para negociação sobre o Termo de Cooperação.</p> <p>18/10/22: Audiência de conciliação para municípios não aderentes.</p> <p>Novembro/22: Algumas interações por e-mail com alterações do Termo e Plano tanto por parte do município quanto por parte da FR; reunião para alinhamento realizada dia 25/11/2022. Acordado que o retorno final do município sobre o Termo será dia 02/12/2022.</p> <p>Dezembro/22: Em 02/12/2022 município formalizou o aceite do Plano de Trabalho e termo de Cooperação. Abertura de processo de formalização via sistema.</p> <p>Janeiro/23: Processo de assinatura em andamento no sistema.</p> <p>Março/2023: Município ao receber a minuta para assinatura, solicitou alteração não consensuada com a Fundação Renova. Petição judicial será retomada para decisão via sentença.</p> <p>Junho/2023: Jurídico Fundação Renova peticionou a ação em 13/06/2023.</p> <p>Abril/24: Sentença da judicialização, sem resolução do mérito.</p> <p>Maio/24: Reunião com o município para retomada da negociação do Plano de Reparação em 21/05/2024.</p> <p>Junho/2024: Reunião com o município para ouvir propostas da negociação do Plano de Reparação em 18/06/2024.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
Rio Casca	MG	Plano encerrado	<p>Em 12/05/21, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em 14/06/21, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021: Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em novembro 2021: Reunião com gestores municipais para proposta de um Termo de Parceria com repasse financeiro para execução do Plano de Reparação em Proteção Social, devido alteração do conceito de vulnerabilidade da FR.</p> <p>Em dezembro de 2021 – Apoio e orientação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro de 2022 – Apoio, orientação e negociação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em fevereiro de 2022 - Orientação para ajustes na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social e seus documentos complementares.</p> <p>Março/22: ajustes no Plano de Trabalho com o município.</p> <p>Abril/22: iniciado trâmites internos para assinatura do Termo.</p> <p>Maio/22: em trâmite para assinatura.</p> <p>Junho/22: em trâmite para assinatura.</p> <p>Julho/22: assinado dia 13/07/2022, reunião inicial agendada, presencialmente, para 03/08/2022.</p> <p>Agosto/22: Reunião kickoff realizada em 03/08/22. Reunião de cadastro no webformat em 12/08/2022.</p> <p>01/09/2022: Realização do 1º repasse financeiro.</p> <p>03/10/2022: Entrega do veículo ao município.</p> <p>Outubro: Oferta e adesão de profissionais para a capacitação “Trabalho Social com Famílias”.</p> <p>Novembro/22: Realizada reunião sobre remanejamento/ aditivo solicitado pelo município dia 07/11/2022.</p> <p>Dezembro/22: Abertura do aditivo de remanejamento e baixa contábil.</p> <p>Janeiro/23: Reunião para instituição do Comapps em 26/01/2023.</p> <p>Março/2023: Reuniões para apoio na prestação de contas dias 23 e 28/03/2023.</p> <p>Abril/2023: Acompanhamento do Plano de Trabalho. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Maio.</p> <p>Maio/2023: Reunião de Comapps presencial em 18/05/2023.</p> <p>Junho/2023: Tratativas sobre relatórios do Plano de Trabalho via telefone.</p> <p>Julho/2023: Tratativas sobre relatórios do Plano de Trabalho via telefone.</p> <p>Agosto/2023: Reunião para acompanhamento do Plano de Trabalho em 17/08/2023.</p> <p>Outubro/2023: Reunião de Comapps online em 25/10/2023.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 07/12/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Assinatura do Termo de encerramento em 12/01/2024.</p> <p>Março/2024: Reunião de encerramento de COMAPPS em 21/03/2024.</p>
Rio Doce	MG	Plano encerrado	<p>01/04/2020- Reunião com o Município;</p> <p>03/04/2020 – Recebimento de ofício do município para alterações no Plano de Trabalho</p> <p>08/05/2020 - Envio do documento alterado para avaliação do município.</p> <p>04/06/2020 Recebimento de ofício do município solicitando alteração no Plano de Trabalho e Termo.</p> <p>Documento em avaliação jurídica pela FR;</p> <p>23/06/2020 – Envio do Plano e Termo para validação do município;</p> <p>Aguardando o retorno do Município.</p> <p>25/08/2020 - Recebimento de ofício do município solicitando alteração no Plano de Trabalho e Termo.</p> <p>Documento em avaliação pela FR;</p> <p>Agenda prevista para renegociação para 13/10/2020.</p> <p>13/10/2020 – Reunião realizada. Município informa que dará o retorno dia 09/11/2020.</p> <p>07/12/2020 – Retornos de informações pelo município e documento em processo de avaliação pela FR.</p> <p>23/12/2020 - Reunião para continuidade na negociação do plano, ficou acordado que o município enviará o plano até 20/01/21;</p> <p>19/01/21 – Ofício 01/2021 enviado pelo município com detalhamento das ações;</p> <p>28/01/21 – Resposta da Fundação Renova encaminhada ao município. Plano e Termo ainda em negociação.</p> <p>19/02/21- Ofício enviado pelo município com detalhamento de ações;</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>05/03/21- Envio de solicitação de especificações para finalização do Plano de Trabalho; 16/04/21 -Reunião de alinhamento de informações de Termo e Plano; 23/04/21- Envio do Plano e Termo com alterações para o Município; 04/05/21 -Reunião de negociação do Plano e envio das minutas do Plano e Termo para a análise do município; 21/05/21- Retorno do Município com informações do Plano e Termo; 26/05/21 – Reunião de negociação do Plano e solicitações em avaliação pela FR. 30/06/21- Reunião de negociação do Plano com organização da Sedese. 21/07/21 – De acordo do Município para a assinatura do Termo, documento em trâmites na FR para a assinatura. 25/08/2021- Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira. 24/09/2021 – Realização do 1º repasse financeiro. Outubro 2021- Gestão do termo junto ao município. Novembro 2021- Gestão do termo junto ao município. Dezembro 2021 - Gestão do termo junto ao município. Janeiro 2022- Gestão do termo junto ao município. Fevereiro 2022- Gestão do termo junto ao município. Março 2022- Gestão do termo junto ao município. Abril 2022- Gestão do termo junto ao município. Maio 2022- Gestão do termo junto ao município. Junho 2022- Gestão do termo junto ao município. Julho 2022- Gestão do termo junto ao município, prestação de contas e pagamento da 2ª parcela e mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Agosto 2022- Gestão do termo junto ao município. Realização da 2ª reunião do Comapps e início do curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Setembro 2022- Gestão do termo junto ao município. Conclusão do curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Outubro 2022- Gestão do termo junto ao município Novembro 2022 – Reuniões de acompanhamento do Plano. Dezembro 2022 –Abertura de aditivo para baixa contábil. Janeiro 2023- Aditivo assinado e repasse da 3ª parcela com baixa contábil em 30/01/2013. Fevereiro 2023 - Rio Doce - Reunião presencial COMAPPS em 09/02/2023. Março 2023 - Acompanhamento do Plano. Abril 2023 -Acompanhamento do Plano. Maio 2023 -Acompanhamento do Plano. Junho/ 2023 -Acompanhamento do Plano. Julho/ 2023 -Acompanhamento do Plano. Agosto/2023 – Acompanhamento do Plano. Setembro/2023 – Acompanhamento do Plano Outubro/2023 – Acompanhamento do Plano Novembro/2023 – Acompanhamento para finalização das ações do Plano e processo de encerramento do Termo. Dezembro/2023 - Acompanhamento do Plano para o encerramento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira. Janeiro/2024 – Acompanhamento do Plano e encerramento do Plano. Fevereiro/2024 – Acompanhamento do Plano e encerramento do Plano. Maio/2024 – Realização 5ª Reunião de COMAPPS, sendo encerramento.</p>
Santa Cruz do Escalvado	MG	Plano em execução	<p>15/06/2020- Termo Assinado. Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro, em 13/07/2020; Município solicitou o início das atividades para janeiro de 2021; as atividades para janeiro de 2021. Em processo para aditivo do prazo. Assinatura do aditivo do Termo de Cooperação Técnica e Financeira de Santa Cruz do Escalvado em 24/11/2020. Dezembro: Prestação de contas prevista para julho de 2021;</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>08/01/2021- Reunião de Alinhamento sobre o Plano e Termo. 09/02/2021- Ofício solicitando o aditivo. 15/02/2021 – Início do processo de aditivo pela FR (em andamento); 24/03/2021- Envio de aditivo para assinatura da prefeitura e aguardando retorno. 06/04/2021- Envio de ofício nº 046 solicitando a atenção da FR para prorrogação de assinatura de aditivo; 09/04/2021 – Envio de ofício pela FR solicitando esclarecimento; 16/04/2021 – Envio de ofício nº 51 – aceitando a prorrogação de prazo para início das ações; 26/04/2021 – Início de novo processo para elaboração do aditivo ao Termo de Cooperação Técnica e Financeira. 25/05/2021 – Assinatura do 2º aditivo para início das ações. 07/07/2021 – Reunião de alinhamento com o município para início das atividades. 25/08/2021- Recebimento de ofício solicitando aditivo para início das atividades em janeiro de 2022. 22/10/2021 – Início da elaboração do aditivo. Novembro – Processo de elaboração de aditivo. 06/12/2021- Assinatura do terceiro termo aditivo. Janeiro 2022- Apoio e orientação para alteração do Plano de Reparação em Proteção Social para realizar novo aditivo. 15/02/2022- Envio de ofício ao município solicitando informações sobre o início das atividades; 24/02/2022 – Reunião com o prefeito para alinhamento de informações sobre o início das atividades e aditivo atendendo a deliberação 533. Março 2022- Gestão do termo junto ao município. 29/04/2022 – Início das tratativas para o aditivo entre de valor ao Plano Municipal. Maio 2022- Gestão do termo junto ao município e início das atividades após contratação da equipe. Junho 2022- Gestão do termo junto ao município. Julho 2022- Gestão do termo junto ao município e mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Agosto 2022- Gestão do termo junto ao município e início do curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Setembro 2022- Gestão do termo junto ao município. Conclusão do curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial. Realização da primeira prestação de contas e segundo repasse. Outubro 2022- 2022- Gestão do termo junto ao município Novembro 2022- Reunião do COMAPPS e reunião do acompanhamento do Plano. Dezembro 2022 – Abertura de aditivo para baixa contábil. Janeiro 2023- Gestão do termo junto ao município e processo de prestação de contas. Fevereiro 2023 – Acompanhamento Plano reunião presencial COMAPPS em 07/02/2023 e postagem da 2ª Prestação de Contas em 07/02/2023 Março 2023 – Acompanhamento do Plano e repasse da 3ª parcela. Abril 2023 -Acompanhamento do Plano. Maio 2023 -Acompanhamento do Plano com reunião com a Secretária para as tratativas do Plano e reunião Comapps. Junho/ 2023 -Acompanhamento do Plano e orientação para a prestação de contas. Julho/ 2023 -Acompanhamento do Plano, prestação de contas da 3ª parcela e repasse de recursos da 4ª parcela. Agosto/2023 – Acompanhamento do Plano Setembro/2023 – Acompanhamento do Plano. Outubro/2023 – Acompanhamento do Plano. Novembro/2023 – Acompanhamento para finalização das ações do Plano e processo de encerramento do Termo. Dezembro/2023 – Acompanhamento do Plano, informações para encerramento do Termo de Cooperação Técnica e Financeira e realização de aditivo de prazo. Janeiro/2024 – Acompanhamento do Plano, reunião planejamento das ações para 2024 após aprovação do 5º Aditivo. Fevereiro/2024 – Acompanhamento do Plano – processo de baixa contábil com remanejamento de valores. Março/2024 – Acompanhamento do Plano e Prestação de Contas. Abril/2024 – Reunião presencial – 6º COMAPPS em 02/04/2024 Maio/2024 – Acompanhamento do Plano e elaboração 6º aditivo de prazo. Junho/2024 –Acompanhamento do Plano e elaboração</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
Santana do Paraíso	MG	Plano encerrado	<p>Termo assinado em 14/08/2020.</p> <p>Repasse da 1ª parcela do recurso financeiro em 28/08/2020.</p> <p>Em 24/11/2020 município encaminhou ofício justificando a não aquisição de equipamentos devido troca de governo, alegando que a Secretaria de Assistência Social não tem autorização para adquirir materiais permanentes.</p> <p>Em dezembro, foi encaminhado aditivo de correção de valores no Termo para assinatura, mas o município recusou assinar devido a mudança de prefeito.</p> <p>Em janeiro, reunião com novo prefeito e nova gestão de assistência social do município para esclarecimentos do Plano de Trabalho e Termo. Início de período de Prestação de contas semestral.</p> <p>Em fevereiro, município em período de PC. Realizada diversas reuniões de apoio e alinhamento sobre documentação a serem apresentadas na PC.</p> <p>Em 31/03/21, município insere documentação para 1ª PC no SAP FIORI.</p> <p>Em 27/04/21, após reprovação da medição pela ADMCT, município insere novamente documentação no sistema SAP FIORI para a 1ª PC.</p> <p>Em maio 2021, 1ª prestação de contas finalizada no SAPFIORI e 2º repasse realizado. Realizada orientação e acordo de fluxo para a 2ª prestação de contas.</p> <p>Junho/2021: reuniões de apoio e orientação para a 2ª PC.</p> <p>Julho/2021: município em período de PC. Realizadas reuniões de orientações sobre documentação a serem apresentadas na 2ª PC.</p> <p>Agosto/2021: município em período de PC, finaliza a entrega de documentação para a medição.</p> <p>27/08/21 – Realizada a primeira reunião do COMAPPS de Santana do Paraíso.</p> <p>Setembro/2021: 2ª Prestação de contas aprovada pela ADMCT.</p> <p>Outubro/2021: Realizado o 3º repasse.</p> <p>Dezembro/2021: Gestão do Termo e Plano de Trabalho junto ao município.</p> <p>Janeiro/2022: Alinhamento para a realização da 3ª prestação de contas, prevista para março/22.</p> <p>Fevereiro/2022: Município em período da 3ª prestação de contas. Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”</p> <p>Março/22: período de prestação de contas.</p> <p>Abril/22: período de prestação de contas.</p> <p>Maio/22: período de prestação de contas. Reunião online em 13/05.</p> <p>Junho/22: 3ª prestação de contas encerrada e aprovada. Realizado o 4º repasse ao município.</p> <p>Julho/22: Gestão do termo junto ao município.</p> <p>Agosto/22: desmobilização das atividades de início da última prestação de contas.</p> <p>Setembro/22: período da última prestação de contas.</p> <p>Outubro/22: em 27/10/2022 realizada apresentação do Programa e do Plano de Trabalho no Resulta/ Diálogo para os atingidos com participação do município. A reunião foi também a reunião de encerramento do COMAPPS.</p> <p>Novembro/22: período da 4ª prestação de contas.</p> <p>Abril/2023: Acompanhamento de encerramento da parceria. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Maio/2023: Assinatura do Termo de Encerramento da Parceria em 10/05/2023.</p>
São Domingos do Prata	MG	Plano encerrado	<p>Em maio, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social, e assinatura do Plano.</p> <p>Em 19/05/21, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021: Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS.</p> <p>Em fevereiro 2022 – Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: sem mudança na informação.</p> <p>Setembro/22: sem mudança na informação.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Outubro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Novembro: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Janeiro/2024: Contato telefônico para tratativas sobre o termo de encerramento em 31/01/2024.</p> <p>Fevereiro/2024: Reunião com o prefeito e a procuradora sobre termo de encerramento, em 01/02/2024.</p> <p>Março/2024: Assinatura do termo de encerramento em 21/03/2024.</p>
São José do Goiabal	MG	Plano encerrado	<p>Em 13/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação, mas sem retorno do município até final de agosto.</p> <p>Em 30/10/2020, a FR enviou novamente e-mail chamando para renegociação, até o momento não houve retorno.</p> <p>Em novembro, sem mudança na informação.</p> <p>Em dezembro, ainda sem resposta.</p> <p>Em 02/03/2021, reunião com a secretária de assistência social para apresentação da Nova Estratégia para a realização das ações de reparação em Proteção Social.</p> <p>Em 24/03/21, PPS enviou a Minuta de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho.</p> <p>Em 14 e 15 de maio, PPS realizou reunião com prefeito e secretária de assistência social para negociação do Acordo de Cooperação Técnica (Edital). Município solicitou prazo para a documentação passar pelo jurídico.</p> <p>Em maio, reunião de negociação de assinatura do Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social, com participação da SEDESE/Comitê pró-Rio Doce com o município de São José do Goiabal, em 24/05/21.</p> <p>Em 11/06/21, assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o Programa de Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021 – realizada reunião com a gestora da assistência social para apresentação da entidade selecionada via Edital, FA.VELA, que executará o Plano de reparação em Proteção Social no município.</p> <p>Repasse da 1ª parcela para a entidade selecionada no edital.</p> <p>Em novembro 2021 – 1ª RIA - Takeoff/Remanejamento - São José do Goiabal</p> <p>Em dezembro de 2021 – Reunião com secretária de Assistência Social para proposta/negociação para o município executar do Plano de Reparação em Proteção Social, e apresentação da alteração do conceito de vulnerabilidade da FR.</p> <p>Em janeiro de 2022 – Município confirma anuência para executar o Plano de Reparação em Proteção Social. Iniciado apoio, orientação e negociação na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em fevereiro de 2022 - Orientação para ajustes na elaboração do Plano de Reparação em Proteção Social e seus documentos complementares.</p> <p>Março/22: ajustes no Plano de Trabalho e Minuta do Termo com o município.</p> <p>Abril/22: aceite do Plano e Termo pelo município.</p> <p>Maio/22: em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Junho/22: em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Julho/22: em trâmite interno para assinatura.</p> <p>Agosto/22: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira.</p> <p>01/09/2022: Realização do 1º repasse financeiro.</p> <p>Outubro: Oferta de capacitação "Trabalho Social com Famílias". Sem adesão do município.</p> <p>Novembro: Sem mudança nas informações.</p> <p>Dezembro/22 – 15/12/2022: Reunião do COMAPPS e acompanhamento do Plano.</p> <p>Janeiro/2023: 2ª reunião de Comapps em formato presencial em 25/01/2023.</p> <p>Fevereiro: Entrega do veículo previsto do termo de cooperação técnica e financeira em 09/02/2023.</p> <p>Fevereiro/2023: Encerramento do aditivo e realização do último repasse ao município em 13/02/2023.</p> <p>Março/2023: Reuniões para apoio na prestação de contas dias 07 e 14/03/2023.</p> <p>Abril/2023: Acompanhamento do Plano. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Maio.</p> <p>Maio/2023: Reunião de Comapps presencial e reunião de acompanhamento do Plano com a nova equipe, ambas em 17/05/2023.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Julho/2023: Reuniões para tratativas sobre o Plano de Trabalho em 10 e 19/07/2023.</p> <p>Outubro/23: Contato com o município para tratativas sobre o relatório técnico, em 04/10/2023.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Novembro/23: Reunião de COMAPPS em 20/11/2023.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 05/12/2023.</p> <p>Janeiro/2024: Contato telefônico para tratativas sobre o termo de encerramento em 24/01/2024.</p> <p>Fevereiro/2024: Termo de encerramento assinado em 06/02/2024.</p> <p>Março/2024: Reunião de encerramento de COMAPPS em 20/03/2024.</p>
São Pedro dos Ferros	MG	Plano encerrado	<p>Em junho – reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social, e assinatura do Plano.</p> <p>Em 25/06/21 – assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021 – Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Agosto/22: mobilização para capacitação, conforme pactuado no Acordo.</p> <p>Setembro/22: sem mudança na informação.</p> <p>Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, porém sem adesão e participação deste.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 15 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em maio.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 15 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho</p> <p>Novembro/2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Fevereiro/2024: Contato sobre solicitação de devolutiva do município do Termo de encerramento, em 02/02/2024.</p> <p>Março/2024: Tentativa de contato para devolutiva sobre o termo de encerramento em 14/03/2024.</p>
Sem-Peixe	MG	Plano encerrado	<p>Em 12/05/21, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em 02/06/21, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021: Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS.</p> <p>Em fevereiro 2022 – Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: sem mudança na informação.</p> <p>Setembro/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Outubro/2023: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Dezembro/2023: Assinatura do Termo de Encerramento do município em 04/12/2023.</p>
Sobralia	MG		<p>Em 11/05/21, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em junho, tentativas de negociação para assinatura do acordo.</p> <p>Em julho, município deu o “de acordo” para o Plano de Adesão, porém, ainda não assinou o Acordo.</p> <p>17/08/21 – município assina o Acordo para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021 – Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
		Plano encerrado	<p>Em fevereiro 2022 – Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: mobilização para capacitação, conforme pactuado no Acordo.</p> <p>Setembro/22: sem mudança na informação.</p> <p>Outubro: Oferta de capacitação “Trabalho Social com Famílias”. Sem adesão do município.</p> <p>Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, porém sem adesão e participação deste.</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Maio.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 10 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Outubro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Novembro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Março/2024: Tentativa de contato para devolutiva sobre o termo de encerramento em 14/03/2024.</p>
Timóteo	MG	Acordo Assinado	<p>Em maio, reunião de negociação para o Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social e assinatura do Plano.</p> <p>Em 19/05/21, assinatura do Acordo para Plano de Adesão para Reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro 2021 – Realizada reunião com representantes e lideranças comunitárias para informação sobre a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o município e o PPS para a reparação em Proteção Social.</p> <p>Em janeiro 2022 – solicitação de confirmação de número de vagas para participação dos profissionais para Capacitação SUAS.</p> <p>Em fevereiro 2022 – Envio do convite para a Capacitação SUAS “Trabalho Social com Famílias em situação de desastre e calamidade, com enfoque em questões de gênero”.</p> <p>Março/22: sem mudança na informação.</p> <p>Abril/22: sem mudança na informação.</p> <p>Maio/22: sem mudança na informação.</p> <p>Junho/22: sem mudança na informação.</p> <p>Julho/22: mobilização para a participação no curso de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Agosto/22: Capacitação iniciada.</p> <p>Setembro/22: sem mudança na informação.</p> <p>Outubro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Novembro/23: Contato com o município para informações sobre o encerramento do Acordo.</p> <p>Março/2024: Tentativa de contato para devolutiva sobre o termo de encerramento, sem sucesso.</p> <p>Maio/2024: Tentativa de contato para devolutiva sobre o termo de encerramento, sem sucesso.</p> <p>Junho/2024: Assinatura do termo de encerramento em 10/06/2024.</p>
Tumiritinga	MG	Acordo Assinado	<p>Em 13/08/2020 a FR enviou e-mail chamando para renegociação, mas sem retorno do município até final de agosto.</p> <p>Sem retorno do município até final de setembro de 2020.</p> <p>Em 30/10/2020, a FR enviou novamente e-mail chamando para renegociação, até o momento não houve retorno.</p> <p>Em novembro, sem mudança na informação.</p> <p>Sem resposta até o mês de dezembro.</p> <p>Sem resposta até o mês de janeiro/21.</p> <p>Reunião agendada para dia 01/03/2021 com a nova gestão para apresentação do Programa.</p> <p>Realizada reunião em 01/03/2021.</p> <p>Em 19/03/2021, foram enviados o novo plano e o termo de reparação.</p> <p>Enviado e-mail em 12/04/2021, solicitando devolutiva sobre a análise do Plano e Termo.</p> <p>Em 30/04/2021, município solicitou reunião para esclarecimento de dúvidas.</p>

Município	UF	Status do plano de trabalho	Status de aprovação do termo e plano
			<p>Reunião agendada para 03/05/2021.</p> <p>Em 03/05/2021, realizada reunião com o município e jurídico sobre dúvidas do Termo e Plano.</p> <p>Em 24/05/2021, realizada reunião com o município e a Sedese.</p> <p>Em 21/06/2021, município assinou o Acordo de Cooperação Técnica.</p> <p>Em setembro/21, mobilização para reunião com município e lideranças das comunidades sobre o processo de reparação em Proteção Social.</p> <p>Em outubro/21 – realizada reunião com a gestora da assistência social para apresentação da entidade selecionada via Edital, Rede Vidas, que executará o Plano de reparação em Proteção Social no município. Repasse da 1ª parcela para a entidade selecionada no edital.</p> <p>Novembro/21: agendada reunião com município e lideranças das comunidades atingidas sobre o processo de reparação em Proteção Social.</p> <p>Dezembro/21: realizada reunião com município, entidade aprovada no Edital e lideranças das comunidades atingidas sobre o processo de reparação em Proteção Social.</p> <p>Janeiro/22: gestão do termo junto ao município e entidade.</p> <p>Fevereiro/22: gestão do termo junto ao município e entidade.</p> <p>Março/22: gestão do termo junto ao município e entidade. Nova reunião para criação do Comitê.</p> <p>Abril/22: gestão do termo junto ao município e entidade. Comitê criado.</p> <p>Maio/22: 1ª prestação de contas finalizada. Realizado o 2º repasse de recursos financeiros à entidade. Gestão do termo junto ao município e entidade.</p> <p>Junho/22: gestão do plano junto ao município e à entidade.</p> <p>Julho/22: gestão do plano junto ao município e à entidade.</p> <p>Agosto/22: mobilização para capacitação, conforme pactado no Acordo. Capacitação iniciada.</p> <p>Setembro/22: abertura de takeoff/remanejamento a pedido da entidade Rede Vidas.</p> <p>Outubro/22: encerramento do take off.</p> <p>Novembro/22: Oferta de capacitação com o tema de Vigilância Socioassistencial.</p> <p>Dezembro/22: Conclusão do curso em Vigilância Socioassistencial, ofertado ao município, porém sem adesão e participação deste.</p> <p>Dezembro/22: Finalização da prestação de contas, com baixa contábil da instituição Rede Vidas.</p> <p>Janeiro/23: Repasse financeiro da 3ª parcela em 09/01/2023.</p> <p>Fevereiro/2023: Reuniões de acompanhamento do projeto da entidade Rede Vidas nos dias 01/02/2023 e 16/02/2023.</p> <p>Março/2023: Reunião com entidade Rede Vidas em 17/03/2023 em conjunto com entidades de Governador Valadares sobre Comapps, encaminhamentos do workshop de entidades (aproximação com poder público).</p> <p>Março de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em abril.</p> <p>Abril/2023: Reunião de COMAPPS em 12/04/2023 com a presença da entidade Rede Vidas. Envio da informação de baixa contábil para o CMAS.</p> <p>Abril de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Vigilância Socioassistencial, a ser iniciada em Maio.</p> <p>Maio/2023: Reunião em 08/05/2023 sobre acompanhamento do projeto.</p> <p>Maio de 2023: Envio de convite, com oferta de 05 vagas na capacitação com o tema Trabalho Social com Famílias, a ser iniciada em junho.</p> <p>Junho/2023: Reuniões para tratativas sobre último repasse e prestação de contas em 02/06 e 07/06/2023.</p> <p>Agosto/2023: Reunião de acompanhamento do Plano de Trabalho em 01/08/2023 e reunião de acompanhamento das ações do Plano em 22/08/2023.</p> <p>Outubro/2023: Finalização da execução do projeto.</p> <p>Novembro/2023: Última prestação de contas finalizada.</p> <p>Dezembro/2023: Reunião de orientações para o encerramento do Termo de Cooperação, em 27/12/2023.</p> <p>Fevereiro/2024: Reunião de encerramento do COMAPPS, em 27/02/2024.</p> <p>Março/2024: Assinatura do Termo de encerramento em 21/03/2024.</p>

ANEXO 2: Síntese de Cenário dos Planos

Status dos Planos Estaduais e Municipais		
	MG	ES
Nº de Planos Assinados	33 ⁵	07 ⁶
Nº de Planos Não Assinados	01 ⁷	0

Planos Não Pactuados	
Nome	Motivo
Resplendor	Processo judicial

Obs.: Estado de Minas Gerais declinou de tratar o Plano Estadual de Proteção Social junto à Renova porque entende que ele está sendo tratado na repactuação. Desta forma, foi retirado do universo total de planos.

⁵ Aimorés, Alpercata, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Bugre, Caratinga, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Governador Valadares, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Mariana, Marliéria, Naque, Periquito, Pingo D'Água, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, Sobrália, Timóteo, Tumiritinga e Galileia.

⁶ Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Sooretama e Estado do Espírito Santo, os demais são novas áreas.

⁷ Resplendor.

ANEXO 3: número de famílias vulneráveis cadastradas por município

MUNICÍPIO	UF	Nº FAMÍLIAS VULNERÁVEIS
Aimorés	MG	2616
Alpercata	MG	28
Aracruz	ES	2496
Baixo Guandu	ES	2689
Barra Longa	MG	427
Belo Oriente	MG	1184
Bom Jesus do Galho	MG	743
Bugre	MG	65
Caratinga	MG	130
Colatina	ES	890
Conselheiro Pena	MG	405
Córrego Novo	MG	03
Dionísio	MG	35
Fernandes Tourinho	MG	74
Galileia	MG	234
Governador Valadares	MG	1034
Iapu	MG	03
Ipaba	MG	274
Ipatinga	MG	198
Itueta	MG	414
Linhares	ES	3652
Mariana	MG	455 ⁸
Marilândia	ES	56
Marliéria	MG	01
Naque	MG	620
Periquito	MG	856
Pingo D'Água	MG	68
Raul Soares	MG	0

⁸ Ressaltamos que o cadastro de famílias no município de Mariana ainda não foi finalizado, por isso os números de famílias cadastradas e vulneráveis pode sofrer alterações.

MUNICÍPIO	UF	Nº FAMÍLIAS VULNERÁVEIS
Resplendor	MG	458
Rio Casca	MG	72
Rio Doce	MG	449
Santa Cruz do Escalvado	MG	516
Santana do Paraíso	MG	316
São Domingos do Prata	MG	20
São José do Goiabal	MG	648
São Pedro dos Ferros	MG	03
Sem Peixe	MG	33
Sobralia	MG	29
Sooretama	ES	137
Timóteo	MG	14
Tumiritinga	MG	1025
TOTAL		23.370*

**Número atualizado conforme tratamento da base de dados.*

ANEXO 4: oferta de vagas de capacitação por município*

INDICADORES		I-02	I-03	I-04	
Título do indicador		Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos.	Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos.	Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos.	
Número de Vagas acordadas nos Termos e Planos. <small>Atenção: Os números abaixo se referem ao acordado nos termos e planos com os municípios. Nos termos/planos não há separação por indicador.</small>	Município	Número de ofertas realizadas até o momento.	Número de ofertas realizadas até o momento.	Número de ofertas realizadas até o momento.	Somatório das ofertas:
10	Aimorés	18	15	4	37
15	Belo Oriente	13	28	2	43
25	Barra Longa	19	24	8	51
4	Bom Jesus do Galho	7	7	6	20
10	Bugre	5	7	4	16
7	Caratinga	5	9	4	18
4	Conselheiro Pena	8	10	4	22
10	ES	7	4	6	17
10	Fernandes Tourinho	6	7	5	18
5	Ipaba	3	6	0	9
4	Ipatinga	0	14	6	20
4	Itueta	6	8	4	18
25	Linhares	44	46	18	108
7	Naque	5	6	5	16
4	Periquito	4	4	6	14
10	Pingo D'Água	5	6	1	12
10	Rio Casca	11	8	6	25
10	Rio Doce	8	14	2	24
10	Santa Cruz do Escalvado*	5	6	2	13
6	Santana do Paraíso	4	7	3	14
10	São José do Goiabal	8	8	6	22
5	Galileia*	15	12	6	33
13	Alpercata	0	12	7	15

15	Aracruz	0	15	4	19
10	Baixo Guandu	0	8	5	13
10	Colatina	1	16	19	36
8	Córrego Novo	4	10	7	21
10	Dionísio	0	13	2	15
15	Governador Valadares	1	11	7	19
6	Iapu	0	4	6	10
6	Marilândia	0	5	6	11
5	Marliéria	0	12	6	18
12	São Domingos do Prata	0	12	3	15
Até 50	São Pedro dos Ferros	0	80	32	112
10	Sem-Peixe	0	6	7	13
10	Sobralia	0	8	6	12
5	Sooretama	0	9	4	13
Até 50	Timóteo	0	40	17	57
5	Tumiritinga	0	8	2	10

*Tabela alterada com as informações de oferta do ano 2024.
