FUNDAÇÃO renova

Masterplan MARÇO/21

Data de Corte: 31/03/2021

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline
1	**MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA**	**Qui 05/11/15**	**Qua 19/03/36**	**Qui 05/11/15**	**Qua 19/03/36**
2	**EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade**	**Ter 01/12/15**	**Ter 31/12/30**	**Sex 06/11/15**	**Ter 31/12/30**
3	**Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados**			**ND**	**ND**
4	Fase do Programa: 01 - Definição			ND	ND
5	Fase do Programa: 02 - Execução			ND	ND
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento			ND	ND
7	**Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)**			**ND**	**ND**
8	Fase do Programa: 01 - Definição			ND	ND
9	Fase do Programa: 02 - Execução			ND	ND
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento			ND	ND
11	**Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas**	**Sex 04/03/16**	**Seg 30/12/30**	**Sex 04/03/16**	**Seg 30/12/30**
12	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 23/03/16	Ter 28/12/21	Qua 23/03/16	Seg 16/05/22
13	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 04/03/16	Sex 22/11/30	Sex 04/03/16	Qua 27/11/30
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 25/11/30	Seg 30/12/30	Qui 28/11/30	Seg 30/12/30
15	**Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades**	**Ter 06/09/16**	**Ter 31/12/30**	**Ter 06/09/16**	**Seg 30/12/30**
16	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 22/12/16	Qui 08/07/21	Qui 22/12/16	Qua 23/06/21
17	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 06/09/16	Seg 25/11/30	Ter 06/09/16	Qua 27/11/30
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 26/11/30	Ter 31/12/30	Qui 28/11/30	Seg 30/12/30
19	**Programa: PG005 - Proteção Social**	**Qua 15/03/17**	**Sex 29/09/23**	**Qua 15/03/17**	**Qua 13/03/24**
20	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Qua 30/09/20	Sex 20/07/18	Qua 30/09/20
21	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 15/03/17	Sex 29/09/23	Qua 15/03/17	Sex 29/09/23
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 21/09/23	Sex 29/09/23	Qui 21/09/23	Sex 29/09/23
23	**Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social**	**Ter 01/12/15**	**Ter 31/12/30**	**Ter 01/12/15**	**Ter 31/12/30**
24	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 10/05/21	Qua 02/03/16	Sex 19/03/21
25	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/12/30	Ter 31/12/30	Seg 02/12/30	Ter 31/12/30
27	**Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar**	**Sex 01/01/16**	**Qua 24/07/24**	**Sex 01/01/16**	**Qua 24/07/24**
28	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 16/05/17	Seg 06/08/18	Ter 16/05/17	Seg 06/08/18
29	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/01/16	Ter 25/06/24	Sex 01/01/16	Ter 25/06/24
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 26/06/24	Qua 24/07/24	Qua 26/06/24	Qua 24/07/24
31	**Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística**	**Qui 10/12/15**	**Sex 30/12/22**	**Qui 10/12/15**	**Sex 30/12/22**
32	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Sex 29/06/18	Sáb 01/04/17	Sex 29/06/18
33	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/12/15	Ter 29/11/22	Qui 10/12/15	Ter 29/11/22
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 29/11/22	Sex 30/12/22	Ter 29/11/22	Sex 30/12/22
35	**Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer**	**Ter 04/10/16**	**Sex 31/01/25**	**Ter 04/10/16**	**Sex 31/01/25**
36	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 02/03/17	Sex 30/11/18	Qui 02/03/17	Sex 30/11/18
37	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/12/24	Sex 31/01/25	Ter 31/12/24	Sex 31/01/25
39	**Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada**	**Qua 02/03/16**	**Qui 31/12/26**	**Qua 02/03/16**	**Qua 21/03/29**
40	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21
41	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 27/11/26	Qua 02/03/16	Ter 20/03/29
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26	Seg 19/02/29	Qua 21/03/29
43	**Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias**	**Qua 02/11/16**	**Qui 31/10/30**	**Qua 02/11/16**	**Qui 31/10/30**
44	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/11/16	Sex 30/04/21	Qua 02/11/16	Seg 29/03/21
45	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/01/17	Seg 08/04/30	Seg 30/01/17	Seg 08/04/30
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 10/04/30	Qui 31/10/30	Qua 10/04/30	Qui 31/10/30
47	**Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras**	**Sex 01/07/16**	**Ter 30/12/25**	**Sex 01/07/16**	**Qua 30/12/26**
48	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Qui 08/04/21	Qui 01/06/17	Sex 05/02/21
49	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Sex 26/09/25	Sex 01/07/16	Sex 27/11/26
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Seg 30/11/26	Qua 30/12/26
51	**Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria**	**Seg 02/01/17**	**Seg 30/12/30**	**Seg 02/01/17**	**Seg 30/12/30**
52	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Ter 14/09/21	Seg 02/01/17	Seg 15/03/21
53	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/03/17	Ter 01/10/30	Seg 13/03/17	Seg 02/12/30
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Ter 03/12/30	Seg 30/12/30
55	**Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios**	**Ter 01/11/16**	**Ter 30/12/25**	**Ter 01/11/16**	**Sex 30/12/22**
56	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Sex 28/05/21	Seg 02/01/17	Qua 31/03/21
57	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/11/16	Qua 01/10/25	Ter 01/11/16	Sex 30/12/22
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Ter 29/11/22	Sex 30/12/22
59	**Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório**	**Seg 13/06/16**	**Ter 31/12/30**	**Seg 13/06/16**	**Ter 31/12/30**
60	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qua 07/07/21	Seg 13/06/16	Qua 07/07/21
61	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	Seg 13/06/16	Seg 02/12/30
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Ter 26/11/30	Ter 31/12/30
63	**Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial**			**ND**	**ND**
64	Fase do Programa: 01 - Definição			ND	ND
65	Fase do Programa: 02 - Execução			ND	ND
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento			ND	ND
67	**Programa: PG033 - Educação Ambiental**	**Seg 24/04/17**	**Qua 21/06/28**	**Seg 24/04/17**	**Qua 21/06/28**
68	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 27/09/17	Qui 25/10/18	Qua 27/09/17	Qui 25/10/18
69	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 24/04/17	Sex 19/05/28	Seg 24/04/17	Sex 19/05/28
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 22/05/28	Qua 21/06/28	Seg 22/05/28	Qua 21/06/28
71	**Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais**	**Qua 02/03/16**	**Seg 30/06/25**	**Qua 02/03/16**	**Qua 01/06/22**
72	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20
73	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Qui 27/03/25	Qua 02/03/16	Seg 25/11/24
74	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 28/03/25	Seg 30/06/25	Ter 26/11/24	Ter 31/12/24

Data de Impressão: Qui 15/04/21

FUNDAÇÃO renova

Masterplan MARÇO/21

Data de Corte: 31/03/2021

Id	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline
75	**Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1**	**Sex 30/12/16**	**Seg 23/12/30**	**Sex 30/12/16**	**Seg 23/12/30**
76	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Seg 03/05/21	Sex 30/12/16	Sex 19/03/21
77	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/08/17	Seg 25/11/30	Qui 10/08/17	Seg 25/11/30
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 26/11/30	Seg 23/12/30	Ter 26/11/30	Seg 23/12/30
79	**Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional**	**Qua 01/06/16**	**Ter 31/12/30**	**Qua 01/06/16**	**Ter 31/12/30**
80	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Seg 10/05/21	Sex 30/12/16	Sex 19/03/21
81	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/11/30	Ter 31/12/30	Qui 28/11/30	Ter 31/12/30
83	**Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos**	**Ter 10/01/17**	**Ter 30/11/21**	**Ter 10/01/17**	**Sex 04/06/21**
84	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Seg 31/05/21	Ter 10/01/17	Qua 31/03/21
85	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Qua 13/10/21	Ter 10/01/17	Qui 06/05/21
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 25/03/21	Ter 30/11/21	Sex 07/05/21	Sex 04/06/21
87	**EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água**	**Qui 05/11/15**	**Qua 19/03/36**	**Qui 05/11/15**	**Qua 19/03/36**
88	**Programa: PG007 - Assistência aos Animais**	**Qui 05/11/15**	**Qui 10/02/22**	**Qui 05/11/15**	**Qui 10/02/22**
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 05/11/15	Qui 01/10/20	Qui 05/11/15	Qui 01/10/20
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 18/12/15	Ter 11/01/22	Sex 18/12/15	Ter 11/01/22
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 11/01/22	Qui 10/02/22	Ter 11/01/22	Qui 10/02/22
92	**Programas: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias**	**Qua 08/08/18**	**Seg 26/06/23**	**Qua 08/08/18**	**Seg 19/06/23**
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 05/11/18	Qui 01/04/21	Seg 05/11/18	Seg 01/03/21
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 08/08/18	Ter 30/05/23	Qua 08/08/18	Ter 30/05/23
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 24/05/23	Seg 26/06/23	Qua 24/05/23	Seg 26/06/23
96	**Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão**	**Seg 04/01/16**	**Qui 18/04/24**	**Seg 04/01/16**	**Qui 18/04/24**
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 21/06/21	Sáb 01/04/17	Qui 20/05/21
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 19/01/24	Qui 18/04/24	Seg 18/03/24	Qui 18/04/24
100	**Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos**	**Qua 02/12/15**	**Seg 14/12/26**	**Ter 01/12/15**	**Qua 23/09/26**
101	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/12/18	Ter 21/12/21	Seg 03/12/18	Ter 21/12/21
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/12/15	Seg 21/09/26	Ter 01/12/15	Sex 21/08/26
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 21/09/26	Seg 14/12/26	Sex 21/08/26	Qua 23/09/26
104	**Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)**	**Seg 31/10/16**	**Ter 17/10/34**	**Seg 31/10/16**	**Ter 17/10/34**
105	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 31/10/16	Seg 19/07/21	Seg 31/10/16	Qua 24/03/21
106	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 31/08/17	Qui 14/09/34	Qui 31/08/17	Qui 14/09/34
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 14/09/34	Ter 17/10/34	Qui 14/09/34	Ter 17/10/34
108	**Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes**	**Qua 02/03/16**	**Qua 19/03/36**	**Qua 02/03/16**	**Qua 19/03/36**
109	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 30/06/21	Qua 02/03/16	Qua 30/06/21
110	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Seg 18/02/36	Qua 02/03/16	Seg 18/02/36
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 18/02/36	Qua 19/03/36	Seg 18/02/36	Qua 19/03/36
112	**Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha**	**Qua 29/06/16**	**Qua 28/10/26**	**Qua 29/06/16**	**Seg 31/05/32**
113	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 27/06/17	Ter 25/05/21	Ter 27/06/17	Sex 26/02/21
114	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Ter 27/10/26	Qua 29/06/16	Seg 31/05/32
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 21/10/26	Qua 28/10/26	Qua 28/04/32	Seg 31/05/32
116	**Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre**	**Qua 29/06/16**	**Qua 02/06/27**	**Qua 29/06/16**	**Ter 01/06/27**
117	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Seg 03/05/21	Qua 29/06/16	Sex 26/02/21
118	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/05/18	Qua 02/06/27	Qua 02/05/18	Qua 28/04/27
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/04/27	Ter 01/06/27	Qui 29/04/27	Ter 01/06/27
120	**Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre**	**Qua 29/06/16**	**Sex 27/12/24**	**Qua 29/06/16**	**Qui 11/07/30**
121	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qua 05/05/21	Qua 29/06/16	Sex 19/02/21
122	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qui 24/10/24	Seg 08/08/16	Qui 11/07/30
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 04/10/24	Sex 27/12/24	Ter 11/06/30	Qui 11/07/30
124	**Programa: PG38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce**	**Ter 01/03/16**	**Sex 17/04/26**	**Ter 01/03/16**	**Sex 17/04/26**
125	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18
126	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	Ter 01/03/16	Seg 16/03/26
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	Ter 17/03/26	Sex 17/04/26
128	**Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação**	**Qua 29/06/16**	**Sex 10/05/30**	**Qua 29/06/16**	**Sex 10/05/30**
129	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21	Qua 29/06/16	Sex 05/02/21
130	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 08/04/30	Sex 10/05/30	Seg 08/04/30	Sex 10/05/30
132	**Programa: PG040 - CAR e PRAS**	**Seg 30/04/18**	**Ter 13/06/23**	**Seg 30/04/18**	**Seg 20/03/23**
133	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20
134	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/04/18	Ter 13/06/23	Seg 30/04/18	Seg 20/03/23
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 11/05/23	Ter 13/06/23	Seg 13/02/23	Seg 20/03/23
136	**EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura**	**Sex 01/07/16**	**Seg 31/01/28**	**Seg 09/11/15**	**Seg 31/01/28**
137	**Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves**	**Seg 01/01/18**	**Ter 29/11/22**	**Seg 01/01/18**	**Ter 29/11/22**
138	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 31/12/19	Ter 31/12/19	Ter 31/12/19	Ter 31/12/19
139	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/01/18	Ter 29/11/22	Seg 01/01/18	Ter 29/11/22
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 25/10/22	Ter 29/11/22	Ter 25/10/22	Ter 29/11/22
141	**Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos**	**Qua 28/12/16**	**Seg 31/01/28**	**Qua 28/12/16**	**Seg 31/01/28**
142	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 20/03/17	Qua 17/03/21	Seg 20/03/17	Qua 17/03/21
143	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 28/12/16	Ter 04/01/28	Qua 28/12/16	Ter 04/01/28
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 05/01/28	Seg 31/01/28	Qua 05/01/28	Seg 31/01/28
145	**Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água**	**Sex 01/07/16**	**Sex 01/07/16**	**Seg 09/11/15**	**Seg 05/09/22**
146	Fase do Programa: 01 - Definição			ND	ND
147	Fase do Programa: 02 - Execução			ND	ND
148	Fase do Programa: 03 - Encerramento			ND	ND

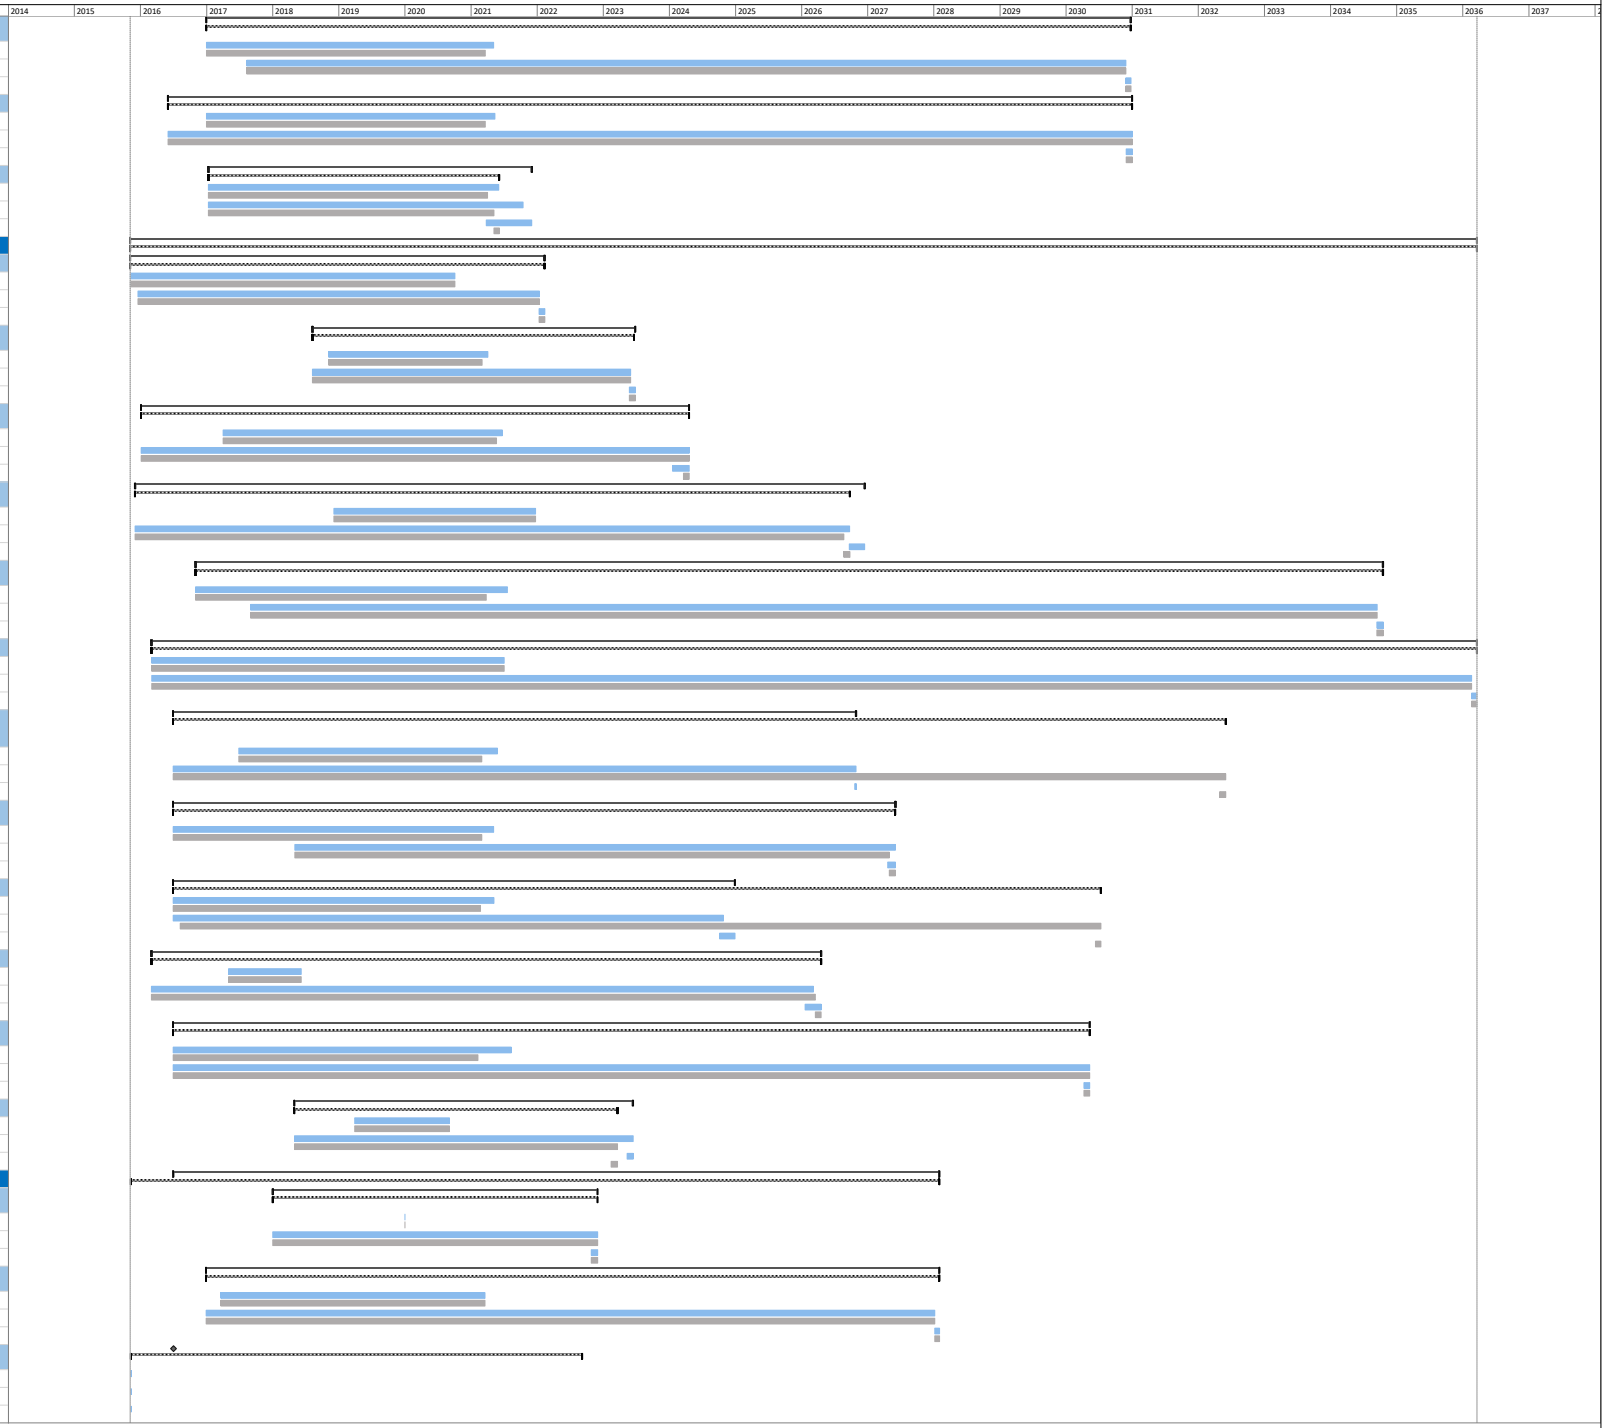

Data de Impressão: Qui 15/04/21
