BNDES

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

IBAMA MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

FORTFISC

FUNDO AMAZÔNIA

Status de Projeto

Ponto de controle de Projeto

Número do Processo: 02001.018416/2025-66

Coordenador do Projeto: Adriano Oliveira Fahel

16/09/2025

Conteúdo

1 FortFisc

Panorama sobre o contexto e principais objetivos

2 Cronograma

Prazos

3 Status

Visão das atividades e entregas executadas na contratação

4 Objeto

Informações específicas sobre a contratação

5 Tarefas

Atividades necessárias para continuidade do Projeto

1

FortFisc

Visão Geral

FORTFISC

CLICK!

61 Produtos

5 anos

R$ 825M

Gestão e Governança do Projeto

Fiscalização remota do desmatamento

Sistemas informatizados de controle e fiscalização

Meios operacionais

Meios aéreos

2

Cronograma

Cronograma | P4241 - Contêineres para Guarda de Bens Apreendidos

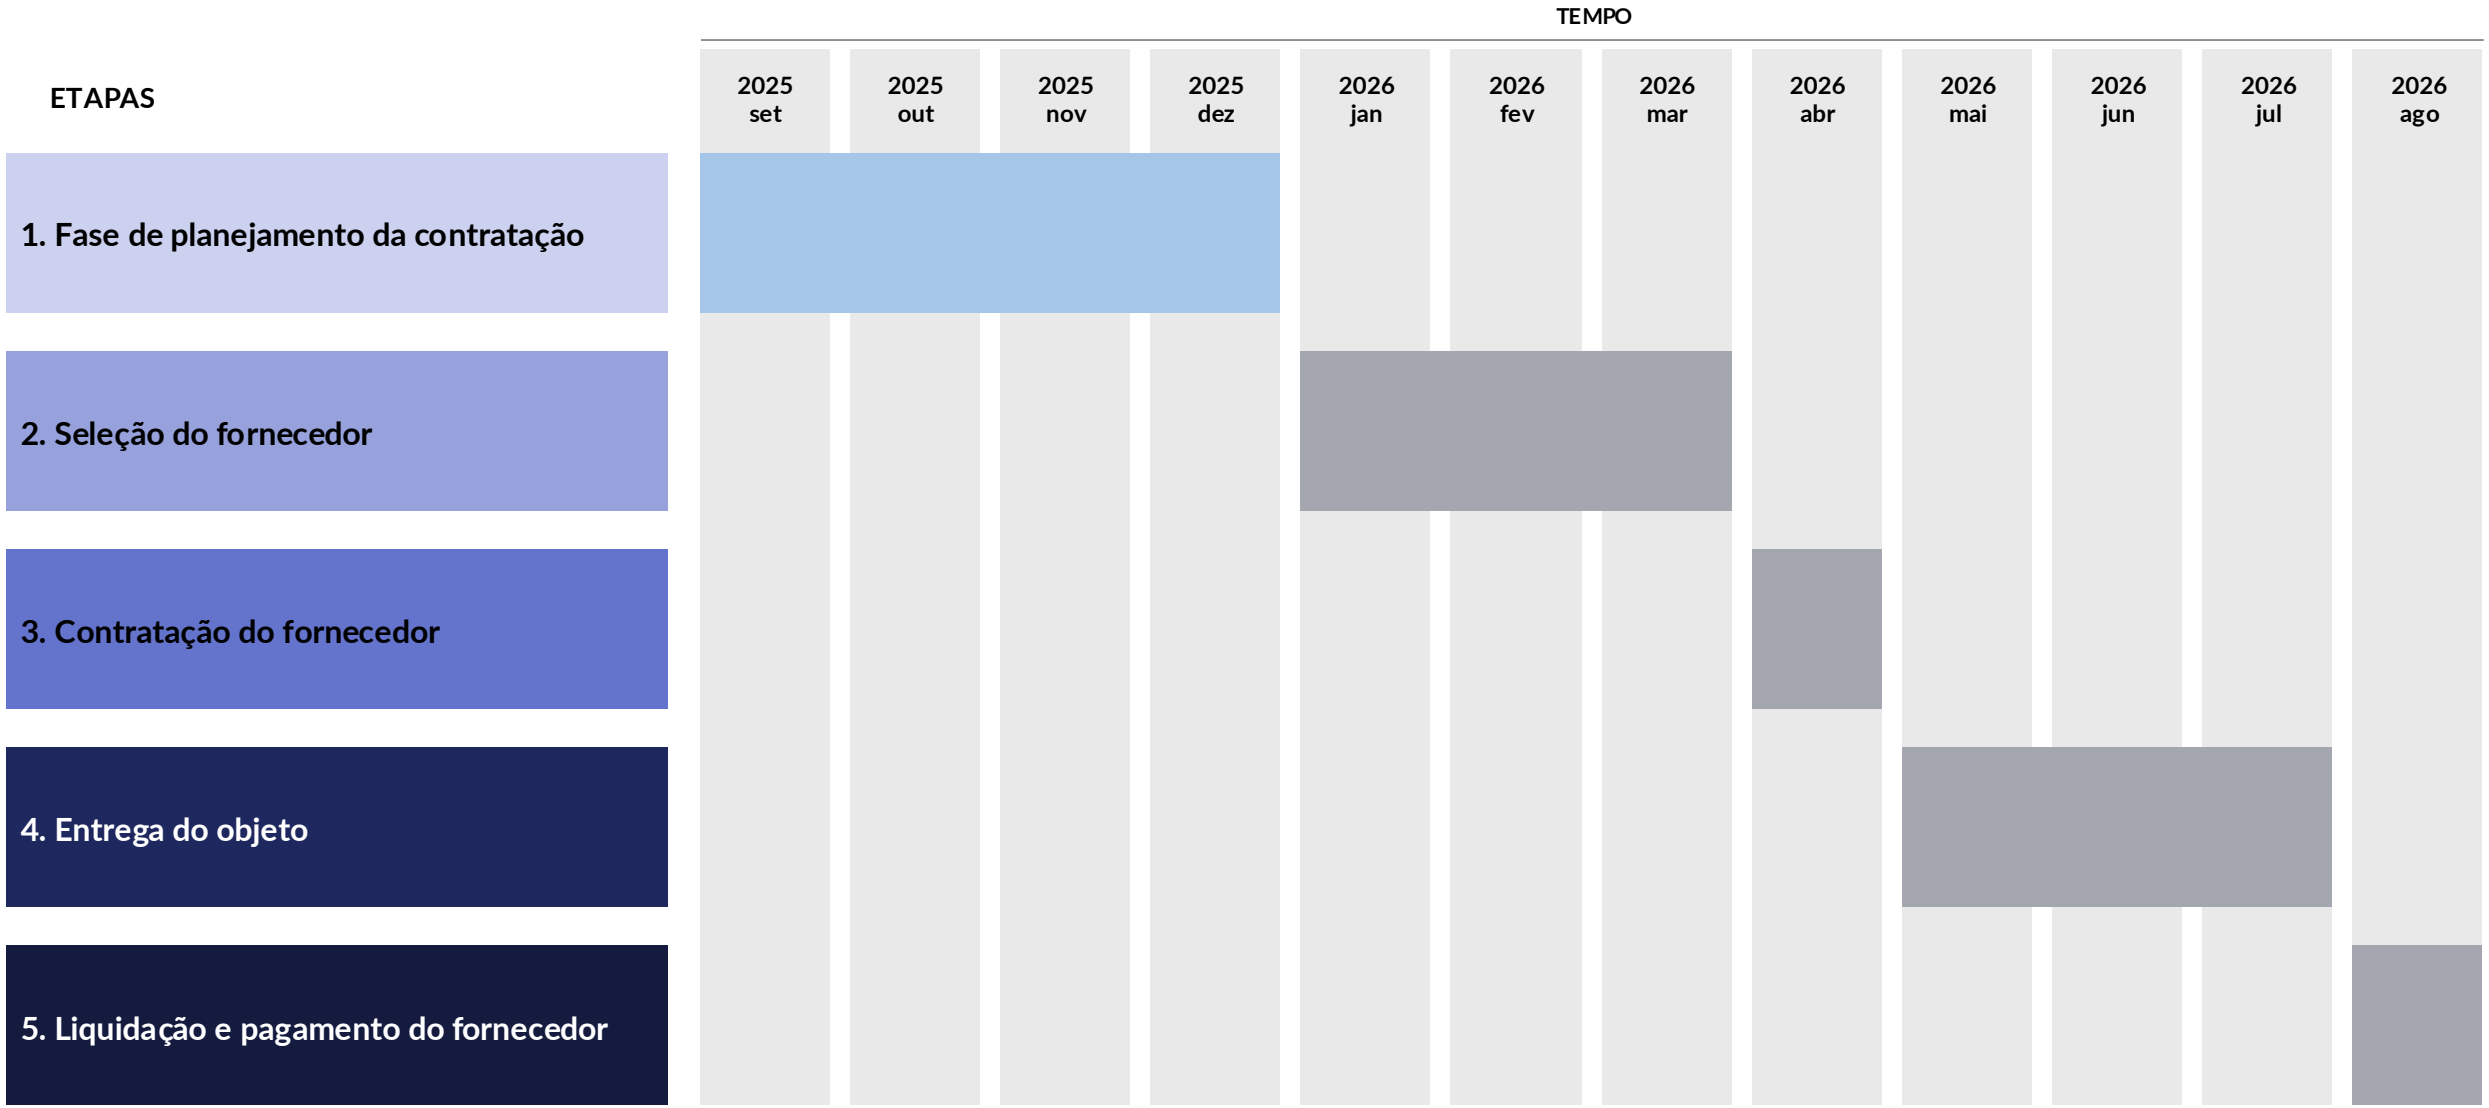

LEGENDA: Não Iniciado · Em andamento · Concluído · Atrasado

Etapas da Fase de Planejamento

	1. Alinhamento de Atividades	2. Formalização da demanda	3. Estudo Técnico Preliminar	4. Análise de Riscos	5. Termo de Referência
ATIVIDADES	1.1 Reuniões de alinhamento e trabalho com os atores envolvidos; 1.2. Estabelecimento de pontos de controle e discussões sobre a contratação.	2.1. Inclusão da demanda no PCA; 2.2. Designação da Equipe de Planejamento da Contratação; 2.3. Definição do escopo preliminar da contratação e do cronograma macro. 2.4. Publicação da OS para condução da contratação.	3.1. Definição dos requisitos da contratação: • Definição da necessidade • Levantamento de requisitos • Estimativas de quantidades • Levantamento e análise de mercado • Pesquisa de preços • Avaliação de parcelamento do objeto. • Identificação de resultados • Identificação de contratações correlatas • [...]	4.1. Identificação e definição dos riscos: • Identificação de riscos associados à contratação (planejamento, execução, mercado, orçamentários). • Classificação dos riscos (probabilidade x impacto).Definição de medidas de mitigação e contingência.	5.1. Definição da solução como um todo, incluindo: • Consolidação de todas as informações do ETP e da análise de riscos. • Descrição detalhada do objeto, requisitos de execução e desempenho. • Definição de critérios de julgamento • Definição das condições de entrega/execução, prazos e obrigações da contratada. • Estimativa orçamentária • Definição da fiscalização/gestão contratual.
PRODUTO	**Entregas:** **E1:** Agendamento de pontos de controle	**E2:** • Inclusão da Demanda no PCA • Elaboração do DFD • Publicação da Ordem de Serviço	**E3:** • Estudo Técnico Preliminar da Contratação	**E4:** • Matriz de riscos da contratação	**E4:** • Termo de Referência

3

Status

Legenda

2. Em Andamento
Quais são as atividades sendo realizadas no momento?

1. Progresso
O que foi realizado?
Quais foram os avanços da última semana para esta?

3. Pontos de Atenção
O que precisamos ficar atentos?
Quais são os possíveis impedimentos?

4. Outros tópicos
Há mais algum ponto que o time deseja compartilhar?

PROGRESSO

1. **Fase de Planejamento**

- ✓ Abertura do processo administrativo
- ✓ Publicação de Ordem de Serviço 227 (24422963)
- ✓ Enviado Ofício-Circular 48 (24740245)
- ✓ Levantada demanda dos órgãos de controle (não foram identificadas questões específicas sobre gestão física de bens, mas sim de necessidade de desenvolvimento de sistemas).

EM ANDAMENTO

1. **Fase de Planejamento**

- Elaboração do ETP

PONTOS DE ATENÇÃO

1. **Fase de Planejamento**

- Levantar distribuição de bens apreendidos por unidades da Amazônia (atraso de algumas superintendências no Processo 02001.031454/2025-12)

OUTROS TÓPICOS

Reuniões de Trabalho

- ➢ Agendamento de pontos de controle quinzenais para verificação do Status da contratação

4

Objeto da contratação

Produto apresentado ao BNDES

Produtos e Serviços

Contêineres para a guarda de pequenos bens apreendidos para as unidades do Ibama na Amazônia.

Atividades

Aquisição de 25 (vinte e cinco) contêineres para a guarda de pequenos bens apreendidos para as unidades do Ibama na Amazônia.

Metas

Ampliar a atuação do Ibama no combate ao desmatamento na Amazônia, por meio Presencial.

Produto ou Serviço	Categoria ajustada	Item *(campo livre)*	Quantidade (Valores Inteiros)	Unidade de Referência (Unidade, Km, Litro, Metros ...)	Valor Unitário (R$)	Valor Total Estimado (R$) (Valor Unitário x Quantidade)
C4 . Infraestrutura operacional	Máquinas, equipamentos e outros bens	Aquisição de contêineres para a guarda de pequenos bens apreendidos	25	unidade	R$ 80.000,00	R$ 2.000.000,00

Matriz de soluções

Alternativa	Descrição sintética	Aplicabilidade aos bens apreendidos	Prós	Contras
A1 – Contêiner 20’ Dry adaptado	6m; porta dupla; lockbox; prateleiras; elétrica/LED; ventilação forçada; pintura anticorrosiva	Volumes pequenos/médios; unidades com menor área	Custo e logística favoráveis; ampla oferta e modificação rápida (fortrakcontainers.com.br)	Segurança padrão (exige lockbox/reforço); sem isolamento térmico nativo
A2 – Contêiner 40’ HC Dry adaptado	12m; maior volume; mesma adaptação do A1	Unidades com maior volume/centralização	Maior capacidade; pode receber **duas zonas** internas	Transporte/assentamento mais caro e área maior; risco de subutilização
A3 – Contêiner Reefer (20’ ou 40’)	Estruturalmente isolado; pode operar **climatizado**	Itens sensíveis a temperatura/umidade	**Controle de temperatura** e isolamento; vedação superior (TOWER BRASIL CONTAINERS)	**Custo energético/manutenção**; ruído; necessidade de tomada dedicada
A4 – Módulo metálico sob projeto	Fabricado ad hoc (almoxarifado metálico)	Quando layout/acessos especiais forem críticos	**Alta customização** (acessos, janelas, mobiliário, climatização) (bmbox.com.br)	Prazo e custo potencialmente maiores; menos padronização
A5 – Container-cofre	Blindagem/monitoramento embarcados	Bens de alto valor (joias, eletrônicos de alto risco)	**Segurança elevada** (blindagem, câmeras, GPS) (Brink's Brasil)	Custo alto e operação especializada
A6 – Container para químicos/inflamáveis	Ventilação técnica, retenção, normas específicas	Apenas quando houver apreensões de risco	Conformidade segurança/ambiente (Soluções Industriais)	Solução **especializada**; não é padrão p/ pequenos bens comuns

Fornecedores

CNPJ	Fornecedor	Marca ofertada
03.709.445/0001-33	Guaporé Containers Ltda (GOBOX)	GOBOX CONTAINERS
52.531.596/0001-50	Bianka Carta Nicolau Vinholy Sociedade Unipessoal Ltda (Leopoldina Soluções)	R/BRAVO
82.687.930/0001-20	Ajatto Indústria e Comércio de Móveis Ltda	PRÓPRIA
81.571.010/0001-89	Ultramar Importação Ltda	TC&C
25.102.370/0001-60	MyBox Estruturas Modulares Ltda	PRÓPRIA
46.748.508/0001-73	XWC Atacadista Serviços e Transportes Ltda	PRÓPRIA
52.093.855/0001-08	Dodisa Ltda	DVS
46.902.549/0001-72	Conspru Engenharia Ltda	CONSPRU
44.721.769/0001-74	Eurobras Construções Metálicas Modulares Ltda	PRÓPRIA
53.180.356/0001-10	Casa Container Ltda	CASA CONTAINER
46.390.582/0001-60	Ricardo Barboza da Silva (Flexbox Comércio de Container Ltda)	FLEXBOX CONTAINER
23.694.923/0001-96	Imprimax Construtora Ltda	PRÓPRIA
36.957.071/0001-24	MLG Metalúrgica Ltda	MLG MET.
13.798.385/0002-07	DSM Modular Comércio e Serviços Ltda (filial)	DSM
18.409.351/0001-16	Construtora Leicam Ltda	PRÓPRIA
05.547.825/0001-44	Engvan Comércio e Serviços Ltda	WS
31.734.910/0001-21	Átrio Indústria e Comércio de Conteiners Ltda	PRÓPRIO
42.178.604/0001-72	Construções e Saneamento Carandaí Ltda (CSC)	PRÓPRIA
15.658.767/0001-80	Carlos Henrique Machado (Thermomix/Henrinox)	Thermomix / Henrinox
09.176.584/0001-25	ITP Indústria, Comércio e Serviços de Tubos & Perfis Ltda (ITP Sistemas Construtivos)	PRÓPRIO/PRÓPRIO
10.284.459/0002-07	Morumbi Industrial Ltda	MORUMBI
14.279.615/0001-03	NKS Indústria de Máquinas Ltda	PRÓPRIA
45.136.243/0001-90	SM Facilities Ltda	SM

5

Tarefas

Encaminhamentos da reunião anterior

Encaminhamentos	Responsáveis
Entrar em contato com as Supes que não responderam o processo 02001.031454/2025-12	Márcia
Realizar levantamento de mercado e soluções disponíveis no ETP	Adriano
Cancelar a próxima reunião tendo em vista atraso nas respostas das Supes no processo 02001.031454/2025-12	Adriano

Encaminhamentos

Encaminhamentos	Responsáveis
Elaborar ETP	Adriano
Entrar em contato com as Supes que não responderam o processo 02001.031454/2025-12	Márcia

BNDES

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

IBAMA MMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Adriano Oliveira Fahel

adriano.fahel@ibama.gov.br

(71) 9 99318-5806

Agatha Cristinny Silva de Moura

agatha.moura.terceirizada@ibama.gov.br

(61) 3316-1661

Chiara Laboissiere Barreto

chiara.barreto@ibama.gov.br

(61) 3316-1661

Millene Mitsue Ribeiro Ito

millene.ito.terceirizada@ibama.gov.br

(61) 3316-1661
