

REVISÃO DE PROGRAMAS  
PROGRAMA 11 | REPARATÓRIO

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar



# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).



STATUS / DATA DOC. DEFINIÇÃO

Aprovado integralmente

Deliberação CIF 508/2021

ORÇAMENTO DOC DEFINIÇÃO

R\$ 32,3 MM 

PRAZO DE ENC. DOC DEFINIÇÃO

DEZEMBRO / 2025

AVANÇO FÍSICO PLURIANUAL (Cronogr. Vigente)

89% 

TÉRMINO PREVISTO

ABRIL / 2027

AVANÇO FINANCEIRO PLURIANUAL (Draft 22)

78% 

ORÇAMENTO BASE DRAFT 22

R\$ 56,7 MM 

ITENS DE CL. DE AÇÃO

0  4

ENCERRADOS

TOTAL

GESTOR / CÂMARA TÉCNICA

Felipe Moura de Andrade / CTECLET


# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

## Projetos

Informações referentes a Ago02024

### PROJ01

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)




### PROJ02

Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna)



### PROJ03

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana



### PROJ04

Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa



### PROJ05

Projeto de Apoio Pedagógico às Escolas Impactadas e às Redes Públicas de Ensino de Mariana



### PROJ06

Projeto de Apoio Pedagógico às Escolas Impactadas e às Redes Públicas de Ensino de Barra Longa



### PROJ07

Projeto Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção de Saberes para Escolas e Alunos Impactados de Mariana



### PROJ08

Projeto Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção de Saberes para Escolas e Alunos Impactados de Barra Longa




\*A porcentagem referente à “Cota Avanço Real” do projeto é 39%

\*\*A porcentagem referente à “Cota Avanço Real” do projeto é 3%  
A porcentagem referente a "cota avanço real" considera também os pesos atribuídos às atividades e não somente a duração como porcentagem concluído

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

## Entregas finalísticas

Informações referentes a abril/2024

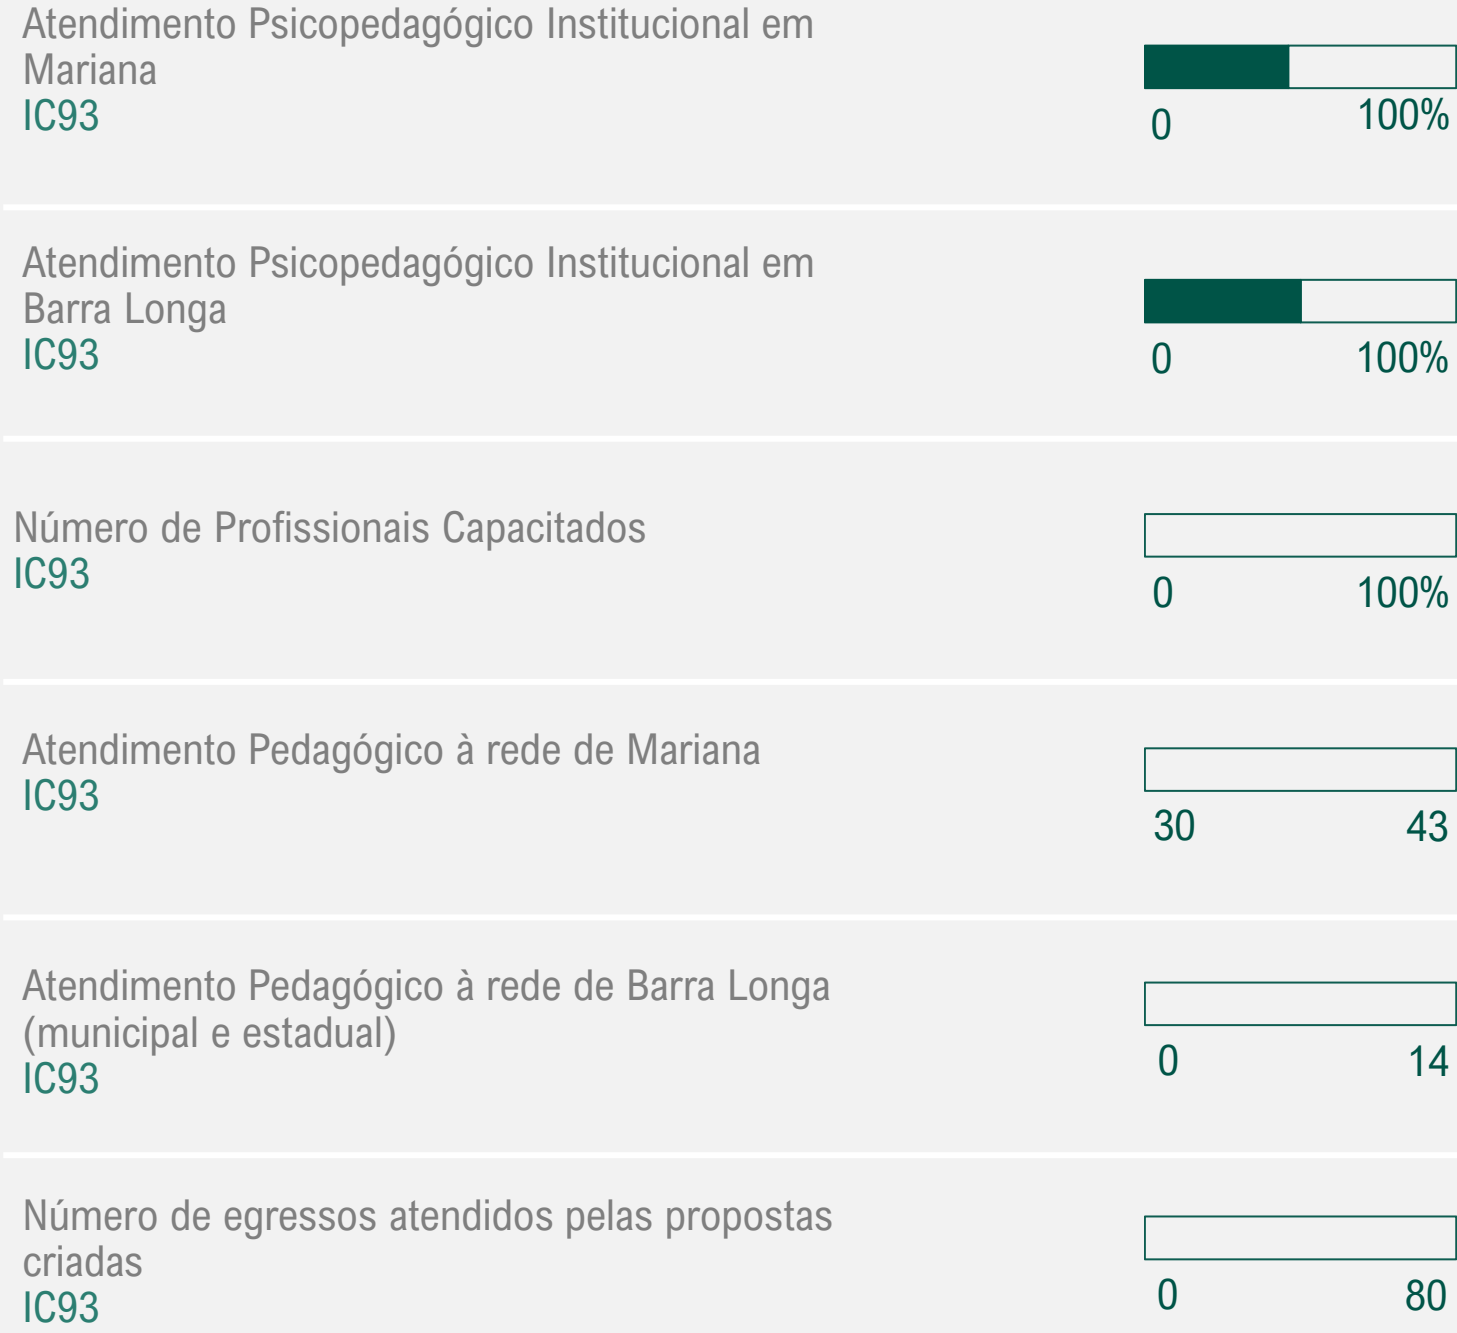

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

## Novas Entregas finalísticas

Informações referentes a setembro/2024

Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana IC93	<div><div></div></div> <div>030und</div>	Cumprir o Calendário de eventos anual das escolas temporárias e definitivas de Mariana. IC93	<div><div></div></div> <div>04und</div>
Atendimento Pedagógico à rede de Barra Longa (municipal e estadual) e rede Estadual de Mariana. IC93	<div><div></div></div> <div>027und</div>	Cumprir o Calendário de eventos anual das escolas impactadas de Barra Longa.. IC93	<div><div></div></div> <div>2und</div>
Oferta de formação e pagamento de bolsa aos jovens aptos a recebê-las IC93	<div><div></div></div> <div>0300un</div>	Atendimento Psicopedagógico Institucional para as escolas temporárias e definitivas em Mariana IC93	<div><div></div></div> <div>04un</div>
Dar condições operacionais para as escolas temporárias em Mariana durante os anos letivos necessários IC89	<div><div></div></div> <div>02und</div>	Atendimento Psicopedagógico Institucional em Barra Longa IC89	<div><div></div></div> <div>04und</div>
Dar condições operacionais para as escolas temporárias/reconstruídas em Barra Longa durante os anos letivos necessários. IC89	<div><div></div></div> <div>02und</div>	Fornecer capacitações para emergência nas escolas reassentadas de Mariana IC92	<div><div></div></div> <div>02und</div>
Oferta de transporte para alunos e profissionais da educação – Mariana IC91	<div><div></div></div> <div>02und</div>		
Oferta de transporte de alunos e profissionais da educação - Barra Longa IC91	<div><div></div></div> <div>01und</div>		



# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

## SÍNTESE DA PROPOSTA

Adequação de estrutura analítica do Programa para facilitar o acompanhamento da execução dos projetos e os processos de evidências de cumprimento de obrigações e cláusulas. Desta forma, projetos com o escopo semelhantes foram unificados e o Projeto Escolas Impactadas de Mariana foi desmembrado em três novos projetos: Transporte Escolar (Cláusula 91), Escolas Temporárias (Cláusula 89) e Capacitação para Emergências (Cláusula 92)

## MOTIVAÇÃO

**Revisão** da estrutura analítica dos projetos

## PROPOSTA



















**Unificação e redivisão** de projetos, bem como alteração em nomes, escopos, prazos e orçamentos. O PG passa de 8 projetos para 6 projetos

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar


## Projetos antigos:

- PROJ01: Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)
- PROJ02: Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna)
- PROJ03: Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana
- PROJ04: Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa
- PROJ05: Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana
- PROJ06: Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa
- PROJ07: Arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana
- PROJ08: Arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa

## Alterações propostas:

<div>PROJ01'</div> <div>PROJ01</div> <div>Gestão Renova</div> <div>Escolas Temporárias de Mariana e Barra Longa</div> <div><div>sem incremento</div></div> <div><div>- 6 meses</div></div> <div><div>Desdobramento em 1 novo projeto a fim de adequar a estrutura conforme quantidades de itens de cláusula</div></div>	<div>PROJ02'</div> <div>PROJ01</div> <div>Gestão Renova</div> <div>Transporte Escolar</div> <div><div>sem incremento</div></div> <div><div>- 12 meses</div></div> <div><div>Desdobramento em 1 novo projeto a fim de adequar a estrutura conforme quantidades de itens de cláusula</div></div>	<div>PROJ03'</div> <div>PROJ03 + PROJ04</div> <div>Gestão Renova</div> <div>Apoio Psicopedagógico Mariana e Barra Longa</div> <div><div>R\$ 2,7 MM</div></div> <div><div>+ 12 meses</div></div> <div><div>Adequação da estrutura de projetos para facilitar evidências e cumprimento de obrigações. O incremento é referente a definição do escopo com a confirmação da adesão de Barra Longa e aumento de 12 meses no Apoio Psicopedagógico, referente a Escola de Paracatu</div></div>
<div>PROJ04'</div> <div>PROJ05 + PROJ06</div> <div>Gestão Renova</div> <div>Apoio Pedagógico nas Redes Públicas de Ensino de Mariana e Barra Longa</div> <div><div>sem incremento</div></div> <div><div>sem incremento</div></div> <div><div>Adequação da estrutura de projetos para facilitar evidências e cumprimento de obrigações</div></div>	<div>PROJ05'</div> <div>PROJ07 + PROJ08</div> <div>Gestão Renova</div> <div>Fortalecimento da Comunidade Escolar</div> <div><div>R\$ 0,7 MM</div></div> <div><div>+ 12 meses</div></div> <div><div>Adequação da estrutura de projetos para facilitar evidências e cumprimento de obrigações. Inclusão das atividades dos calendários escolares até o ano de 2027 para a escola de Paracatu de Baixo</div></div>	<div>PROJ06'</div> <div>PROJ01</div> <div>Gestão Renova</div> <div>Capacitação para Emergências em Mariana</div> <div><div>sem incremento</div></div> <div><div>sem incremento</div></div> <div><div>Desdobramento em 1 novo projeto a fim de adequar a estrutura conforme quantidades de itens de cláusula</div></div>

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar




NOVO ORÇAMENTO

R\$ 66,1 MM

Plurianual Estimado (R\$MM) Draft 23

+ R\$ 9,4 MM

+ 16,6%



NOVO PRAZO

Junho/2028

TÉRMINO PREVISTO

+14 MESES

INTERFACES:

- PG08
- PG10
- PG33
- PG34



# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

APROVADO	PROPOSTA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
<p>Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94)</p>	<p>Reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio do fornecimento das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem, contribuindo ainda para o processo de transição para as Escolas dos Reassentamentos Coletivos</p>	9	7		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
I	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (BentoRodrigues e Paracatu de Baixo)	ICs 89, 91 e 92	Alteração da Estrutura Analítica de Projetos.	O projeto foi dividido em três projetos: - Escolas Temporárias de Mariana e Barra Longa (Cláusula 89); -Transporte Escolar (Cláusula 91); - Capacitação para Emergências (Cláusula 92). As adequações foram realizadas visando separar os projetos de acordo com o item de cláusula que estão vinculados.	28	15		
II	Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna)	ICs 89 e 91	Alteração da Estrutura Analítica de Projetos.	Passou a integrar o Escolas Temporárias de Mariana e Barra Longa como um subprojeto. Adequação de estrutura analítica de projetos para facilitar os processos de evidências e cumprimento de obrigações.	29	15		
III	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	IC 93	Alteração da Estrutura Analítica de Projetos; Alteração de Prazo; Alteração de Orçamento.	O projeto foi renomeado para "Projeto Psicopedagógico Mariana e Barra Longa", tendo como subprojetos: - Apoio psicopedagógico Institucional Mariana e Barra Longa; - Egressos Mariana e Barra Longa. Adequação de estrutura analítica de projetos para facilitar os processos de evidências e cumprimento de obrigações. Ressalta-se que a alteração no prazo, refere-se a execução do projeto no ano de 2027 na escola de Paracatu de Baixo, uma vez que para a conclusão do projeto, faz-se necessário a execução do mesmo no período de 3 anos após a transição para escola definitiva para o reassentamento. A alteração no orçamento, refere-se a definição do escopo do projeto Egressos, além da extensão de mais 1 ano do projeto de Apoio Psicopedagógico em Paracatu de Baixo (2027).	31	18		
IV	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	IC 93	Alteração da Analítica de Projetos.	Passou a integrar o Projeto Psicopedagógico Mariana e Barra Longa. Adequação de estrutura analítica de projetos para facilitar os processos de evidências e cumprimento de obrigações.	32	18		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV. <small>PÁGINA</small>	DOC. DEF. PROP. <small>PÁGINA</small>	CONSENSO <small>SIM / NÃO</small>	PROPOSTA ALTERNATIVA <small>TEXTO LIVRE</small>
V	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana	IC 93	Alteração da Estrutura do Projeto.	Passou a ser denominado Apoio Pedagógico as Redes Públicas de Ensino de Mariana e Barra Longa. Adequação de estrutura analítica de projetos para facilitar os processos de evidências e cumprimento de obrigações.	36	19		
VI	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	IC 93	Alteração da Estrutura do Projeto.	Passou a a integrar o projeto Apoio Pedagógico as Redes Públicas de Ensino de Mariana e Barra Longa. Adequação de estrutura analítica de projetos para facilitar os processos de evidências e cumprimento de obrigações.	37	19		
VII	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	IC 93	Alteração da Estrutura Analítica de Projetos; Alteração de Escopo; Alteração de Prazo; Alteração de Orçamento.	O projeto passa a ser denominado "Fortalecimento das Comunidades Escolares de Mariana e Barra Longa". A alteração foi realizada readequando o escopo visto que parte das atividades do projeto anterior é realizado pelo apoio Psicopedagógico Institucional. Para este projeto, o escopo atende os calendários escolares e atividades de transição para os Reassentamentos, como já tem sido realizado. Adequação para que não haja sobreposição de projetos. A alteração referente a prazo e orçamento refere-se a Escola de Paracatu, no qual o projeto será estendido por mais 1 ano devido o período de transição para a Escola Definitiva para o Reassentamento.	37	20		
VIII	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa	IC 93	Alteração da Estrutura Analítica de Projeto.	Passou a a integrar o projeto Fortalecimento das Comunidades Escolares de Mariana e Barra Longa. Adequação de estrutura analítica de projetos para facilitar os processos de evidências e cumprimento de obrigações.	37	20		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar



	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	JUSTIFICATIVA	IMPACTO NO ORÇAMENTO	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
I	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	IC 93	Incremento de R\$ 2.7MM referente ao novo escopo do projeto Alunos Egressos e Apoio Psicopedagógico em 2027 para a Escola de Paracatu (Plurianual total: R\$ 11.182.729,76)	R\$2.700.000,00	54	19		
II	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	IC 93	Incremento de R\$ 700.000,00 referente a execução das atividades dos calendários escolares até o ano de 2027 para a escola de Paracatu de Baixo (Plurianual total: R\$ 8.165.138,7). Alem disso, em 2024 houve a intensificação das atividades para incentivo da transição da escola de Paracatu de Baixo.	R\$700.000,00	54	20		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
I	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo); Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna)	IC 89 e 91	I01	I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	(Demandas atendidas / Total de demandas encaminhadas pelas escolas aderentes ao escopo) *100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	55	NA		
II	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo);	IC 89 e 91	I02	I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	(Serviços realizados/Serviços solicitados) x 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	56	NA		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
III	Projeto de Escolas Impactadas deMariana (Bento Rodrigues eParacatu de Baixo); Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema eJosé de Vasconcelos Lanna)	IC 89 e 91	I03	I03 – Disponibilidad e de vagas para transporte de estudantes	Nº vagas disponibilizadas / Nº alunos atingidos e profissionais em deslocamento físico que solicitaram os transportes)* 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	57	NA		
IV	Projeto de Escolas Impactadas deMariana (Bento Rodrigues eParacatu de Baixo); Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema eJosé de Vasconcelos Lanna)	IC 89 e 91	I04	I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo	(Manifestações atendidas / Total de manifestações sobre transporte escolar aderentes ao escopo de atendimento)*100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	57	NA		



# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
V	Projeto arte, cultura, sociabilidadee produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana eBarra Longa	IC 89 e 93	I05	I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	(Número de ações realizadas / Número de ações solicitadas) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	58	NA		
VI	Projeto arte, cultura, sociabilidadee produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana eBarra Longa	IC 89 e 93	I06	I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas	I06 - (Somatório da pontuação dada ao evento em todos os questionários respondidos / (Nº total de pontos possível por questionário * Nº de questionários respondidos) ) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	58	NA		
	Projeto arte, cultura, sociabilidadee produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana eBarra Longa	IC 89 e 93	I07	I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade	I07 - (Somatório da pontuação dada ao evento em todos os questionários respondidos /Nº total de pontos possível por questionário x Nº de questionários respondidos)) *100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	59	NA		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
VI	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana	IC 93	I08	I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana	I08 - Passo 1: Somatório da pontuação dos questionários respondidos / número de pontuação possível na pesquisa x n° de formulários respondidos) Considera-se satisfatório o alcance de 0,75 como nota final por escola Passo 2: (Número de PROFISSIONAIS que avaliam como satisfatório (> 0,75) / Número de PROFISSIONAIS que responderam o questionário) *100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	60	NA		
	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	IC93	I09	I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa	I09 (passo 1) = Somatório da pontuação dos questionários respondidos /número de pontuação possível na pesquisa x n° de formulários respondidos) I09 (passo 2) = (Número de PROFISSIONAIS que avaliam como satisfatório (> 0,75)/Número de PROFISSIONAIS que responderam o questionário)* 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	61	NA		

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
V	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana; Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	IC 93	I10	I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	I10 - (Nº de escolas e anexos que receberam apoio pedagógico em Mariana e Barra Longa/Nº de total de escolas públicas e anexos existentes em Mariana e Barra Longa) x 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	62	NA		
VI	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	IC 93	I11	I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico	I11 - (Nº de avaliações psicopedagógicas clínicas com devolutiva / Nº de encaminhamentos para apoio psicopedagógico clínico aderidos pelas famílias) * 100 ou escola	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	63	NA		
	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana; Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	IC 93	I12	I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	I12 - (Nº escolas impactadas que receberam apoio psicopedagógico em Mariana e Barra Longa / Nº total de escolas impactadas Mariana e Barra Longa) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	64	NA		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
V	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	IC 93	I13	I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico	I13 - (Número de profissionais capacitados / Número de profissionais apresentados pela escola) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	64	NA		
VI	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	IC 93	I14	I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados	I15 -(Número de egressos contemplados pelas propostas criadas/Número de egressos das escolas impactadas não atendidos até junho de 2021)* 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	65	NA		
	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	IC 93	I15	I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana	I15 (passo 1) = Somatório da pontuação dos questionários respondidos/Pontuação máxima possível x (nº de formulários respondidos) I15 (passo 2) = (Número de escolas que avaliam como satisfatório (> 0,75)/Número de escolas da rede pública do município de Mariana) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	66	NA		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
V	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa	IC 93	I16	I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa	I16 (passo 1) = Somatório da pontuação dos questionários respondidos/Pontuação máxima possível x (nº de formulários respondidos) I16 (passo 2) = (Número de escolas que avaliam como satisfatório (> 0,75)/Número de escolas da rede pública do município de Barra Longa) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	66	NA		
VI	Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)		I17	I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos	I17 - (Nº profissionais capacitados / Nº total de profissionais) * 100	Excluído	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	68	NA		



# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
V	Escolas Temporárias de Mariana, Barra Longa e Transporte Escolar.	IC89 e 91	I01	Número de Escolas com Necessidades temporárias de transporte e estruturas, atendida por ano letivo	N=Escolas com Necessidade de atendimento (Transporte e Estruturas) no Ano Letivo  Obs.: O indicador I01 será encerrado quando seu resultado for igual a zero.	Inclusão	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	NA	33		
VI	Fortalecimento das Comunidades Escolares de Mariana e Barra Longa	IC 93	I02	I02 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	N= (Número de ações realizadas)/(Número de ações solicitadas) x 100	Inclusão	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	NA	33		
	Apoio Pedagógico as Redes Públicas de Ensino de Mariana e Barra Longa	IC93	I03	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	N=(Número de escolas que receberam a oferta Apoio Pedagógico em Mariana e Barra Longa)/(Número total de escolas públicas existentes em Mariana e Barra Longa ) x 100	Inclusão	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	NA	34		



# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	N. DE INDICADOR	NOME INDICADOR	DETALHAMENTO DA TAXA	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
V	Projeto Psicopedagógico Mariana e Barra Longa / Subprojeto Institucional	IC 93	I04	Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	N=(Número de escolas impactadas que receberam Apoio Psicopedagógico em Maria e Barra Longa)/(Número total de escolas impactadas em Mariana e Barra Longa ) x 100	Inclusão	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	NA	35		
VI	Projeto Psicopedagógico Mariana e Barra Longa / Subprojeto Egressos	IC 93	I05	Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados	N=(Número de Egressos aptos ao recebimento de bolsas)/(Número total de bolsas ofertadas ) x 100	Inclusão	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	NA	35		
	Capacitação Para Emergências	IC 92	I06	Capacitação das escolas reassentadas para atuação em situações de emergência	N=(Número de escolas impactadas que reberam o projeto Capacitação para Emergências)/(Número total de escolas impactadas de Mariana) x 100	Inclusão	Adequação e otimização frente a nova estrutura analítica de projetos refletindo as obrigações do Programa/FR	NA	36		

Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

FUNDAÇÃO

renova

PÁGINA

PÁGINA

SIM / NÃO

TEXTOS LIVRES

APROVADO	PROPOSTA	DOC.DEF. APROV.	DOC. DEF. PROP.	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
<p>O Programa será encerrado três anos após a entrega das escolas definitivas nos reassentamentos das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, considerando três anos letivos completos, de acordo com as definições do TTAC e o cumprimento dos indicadores (I1, I2, I3, I5, I10, I11, I12, I13, I14 e I17). As escolas definitivas devem estar devidamente construídas e equipadas, prontas para ofuncionamento adequado e uso duradouro pela comunidade escolar.</p>	<p>O Programa será encerrado três anos letivos completos após a entrega das escolas definitivas nos reassentamentos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Em Gesteira, a atuação do PG11 foi encerrada conforme acordo1029089-63.2022.4.01.3800. Nas 3 escolas com sede em Barra Longa o encerramento será após 36 meses do projeto de Apoio Psicopedagógico Institucional, a contar a partir de 2022.</p>	55	32		

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

## CLÁUSULAS QUE POSSUEM ITENS DE AÇÃO

### IC 89 Caput

A FUNDAÇÃO deverá providenciar a reconstrução, observada a SITUAÇÃO ANTERIOR e conforme padrão e parâmetros da política pública, aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais necessários às escolas impactadas de Fundão até Candonga, providenciando os meios para reintegração de seus respectivos alunos e profissionais envolvidos às rotinas escolares.

### IC 91 Caput

Enquanto não estiverem disponibilizadas as estruturas definitivas, deverá a FUNDAÇÃO providenciar a oferta de condições de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias.

### IC 92 Caput

Deverão ser previstas ações de capacitação dos profissionais de educação para atuação em situações de emergências, bem como para a prestação dos serviços decorrentes do EVENTO, de Fundão até UHE Risoleta Neves.

### IC 93 Caput

O programa deverá prever, ainda, ações de apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas durante o período de 36 meses da assinatura do acordo.

# Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

### DELIBERAÇÕES

- Deliberação CIF nº 183, de 30 de julho de 2018
- Deliberação CIF nº 238, de 30 de novembro de 2018
- Deliberação CIF nº 390, de 11 de fevereiro de 2020
- Deliberação CIF nº 508, de 22 de junho de 2021
- Deliberação CIF nº 587, de 06 de maio de 2022
- Deliberação CIF nº 674, de 04 de abril de 2023

### DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO

Aprovado integralmente pela Deliberação 508/2021 – Revisão 3, de Maio/2021

## PROGRAMAS COM INTERFACE

### PG08

Reconstrução de Vilas

### PG10

Programa de Recuperação das demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga

### PG33

Programa de Educação Ambiental

### PG34

Emergências Ambientais

