

## Recomendação do Conselho Consultivo

<b>Recomendação dirigida a:</b>	
<b>Conselho Curador</b>	X
<b>Diretoria</b>	
<b>CIF/CTOS</b>	X

<b>Número</b>	REC CCO 01/2019
<b>Data reunião origem</b>	31/01/2019
<b>Assunto</b>	Redução de prazos para implantação da Política do Pescador de Fato

### 1 Sumário da recomendação

O Conselho Consultivo recomenda que sejam reduzidos os prazos de execução do Projeto Piloto, de pagamento das indenizações dos reconhecidos como pescadores de fato no Projeto Piloto e de início da aplicação da Política do Pescador de Fato ao restante da calha.

### 2 Assunto e contexto da recomendação

Durante a reunião de 31/01/2019, uma equipe técnica da Fundação Renova apresentou o cronograma de execução do Projeto Piloto da Política do Pescador de Fato, considerando o prazo de junho/2019 para finalização da execução e apresentação dos resultados ao sistema de Governança.

Com base no cronograma apresentado pela equipe técnica da Fundação Renova e considerando que os pescadores de fato sem documentação comprobatória estão há mais de 3 anos aguardando reconhecimento pela Fundação Renova; que o grupo de trabalho do Conselho Consultivo elaborou a proposta de metodologia de reconhecimento do pescador de fato em abril/18; que a mesma foi apresentada à CTOS em maio/18; que, em julho/18, o CIF deliberou pela aprovação do Projeto Piloto e início de sua execução em 45 dias; que os resultados do Projeto Piloto serão ainda submetidos às instâncias do sistema de Governança para sua apreciação e aprovação; que só então a equipe técnica da Fundação Renova avançará os atendimentos dos atingidos reconhecidos como pescadores de fato, trabalhando no fechamento dos acordos e pagamento das indenizações; e que, com isso, o processo de pagamento e o início da aplicação da Política

do Pescador de Fato ao restante da calha se arrastarão para o segundo semestre/19, o Conselho Consultivo deliberou recomendar a redução de prazos em todas as etapas para permitir que os pagamentos e a expansão da Política do Pescador de Fato aconteçam no menor prazo possível.


### 3 Documento(s) complementar(es) e anexo(s)

Cronograma apresentado

## Planejamento 2018/2019 - Linha do tempo

PIM - Pescador de Fato

Povoação, Regência Augusta e Conselheiro Pena

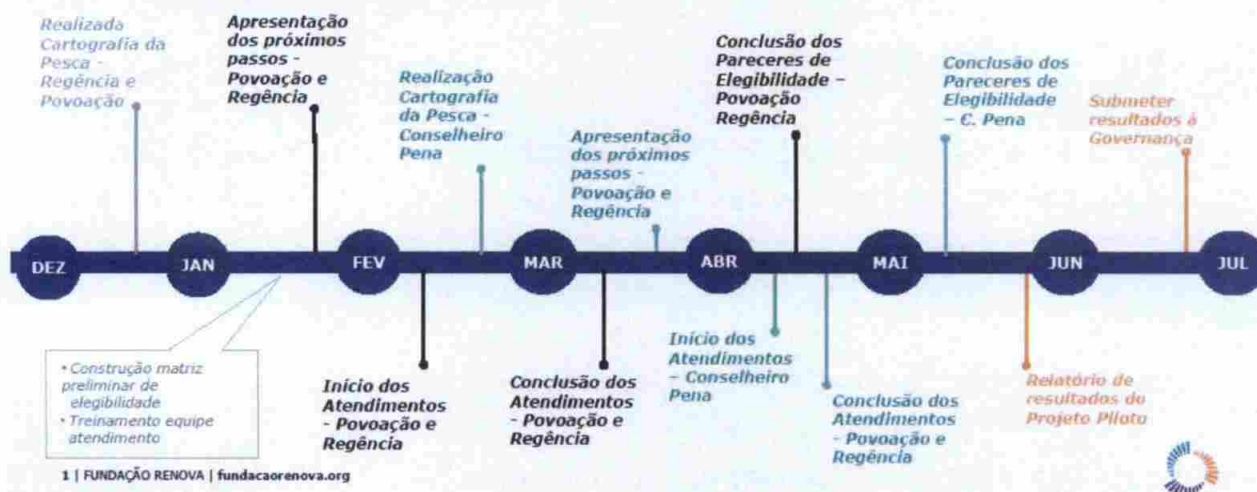

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2019.

Cláudio Boechat

Coordenador do Conselho Consultivo
